



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

22 JUNE 2023

แผนงาน 3 Week KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week SIAM WING

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์



โครงการ : Boulevard Hotel สุขุมวิท ซอย 5

ผู้รับจ้าง : บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด

แผนงานตั้งแต่ วันที่ 16 มิ.ย. ถึง 7 ก.ค. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน วัน	แผนงาน		ช่วงวันดำเนินการ		ผลงาน	ผลงาน	ผลงานสะสม	มิ.ย.-66														ความก้าวหน้า /ความล่าช้า	หมายเหตุ
			เริ่ม	เสร็จสิ้น	เริ่ม	เสร็จสิ้น	%	%		วัน															
										8/6/23	9/6/23	10/6/23	11/6/23	12/6/23	13/6/23	14/6/23	15/6/23	16/6/23	17/6/23	18/6/23	19/6/23	20/6/23	21/6/23		
SIAM WING																									
1	งานระบบ MEP Bed Room Phase 1 (Floor 7,8,9)								100%														ผลงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว		
2	งานระบบ MEP Bed Room Phase 2 (Floor 6,10,11)																								
2.1	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (MEP 2nd Fix Works)																								
	- งานติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 6	14	8 เม.ย. 23	22 เม.ย. 23	12 พ.ค. 23	22 มิ.ย. 23				Plan											-61		พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %		
							95%	0%	95%	Actual															
	- งานติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 11	14	8 เม.ย. 23	22 เม.ย. 23	20 เม.ย. 23	22 มิ.ย. 23				Plan											-61		พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %		
							90%	0%	90%	Actual															
2	งานระบบ MEP Bed Room Phase 3 (Floor 12,14,15)																								
2.1	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (MEP 2nd Fix Works)																								
	- งานติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 12	14	1 มิ.ย. 23	15 มิ.ย. 23	21 พ.ค. 23	22 มิ.ย. 23				Plan											-7		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							70%	10%	80%	Actual															
	- งานติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 14	14	1 มิ.ย. 23	15 มิ.ย. 23		22 มิ.ย. 23				Plan											-7		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							20%	0%	20%	Actual															
	- งานติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิตช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 15	14	8 มิ.ย. 23	22 มิ.ย. 23		22 มิ.ย. 23				Plan											0		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							0%	0%	0%	Actual															
2.2	หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย (MEP 2nd Fix Works)																								
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 12	14	1 มิ.ย. 23	15 มิ.ย. 23	21 พ.ค. 23	15 มิ.ย. 23				Plan											0				
							100%	0%	100%	Actual															
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 14	14	1 มิ.ย. 23	15 มิ.ย. 23	21 พ.ค. 23	22 มิ.ย. 23				Plan											-7		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							50%	20%	70%	Actual															
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 15	14	8 มิ.ย. 23	22 มิ.ย. 23	21 พ.ค. 23	22 มิ.ย. 23				Plan											0		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							50%	0%	50%	Actual															
2.3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MEP 2nd Fix Works)																								
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 12	14	1 มิ.ย. 23	15 มิ.ย. 23	21 พ.ค. 23	25 พ.ค. 23				Plan											21		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							100%	0%	100%	Actual															
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 14	14	1 มิ.ย. 23	15 มิ.ย. 23		22 มิ.ย. 23				Plan											-7		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							0%	0%	0%	Actual															
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 15	14	8 มิ.ย. 23	22 มิ.ย. 23		22 มิ.ย. 23				Plan											0		ยังไม่ส่งมอบพื้นที่และยังไม่ถึงแผนงาน		
							0%	0%	0%	Actual															


ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II



- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 8-12/06/66

6 FL.


10th FLOOR PLAN

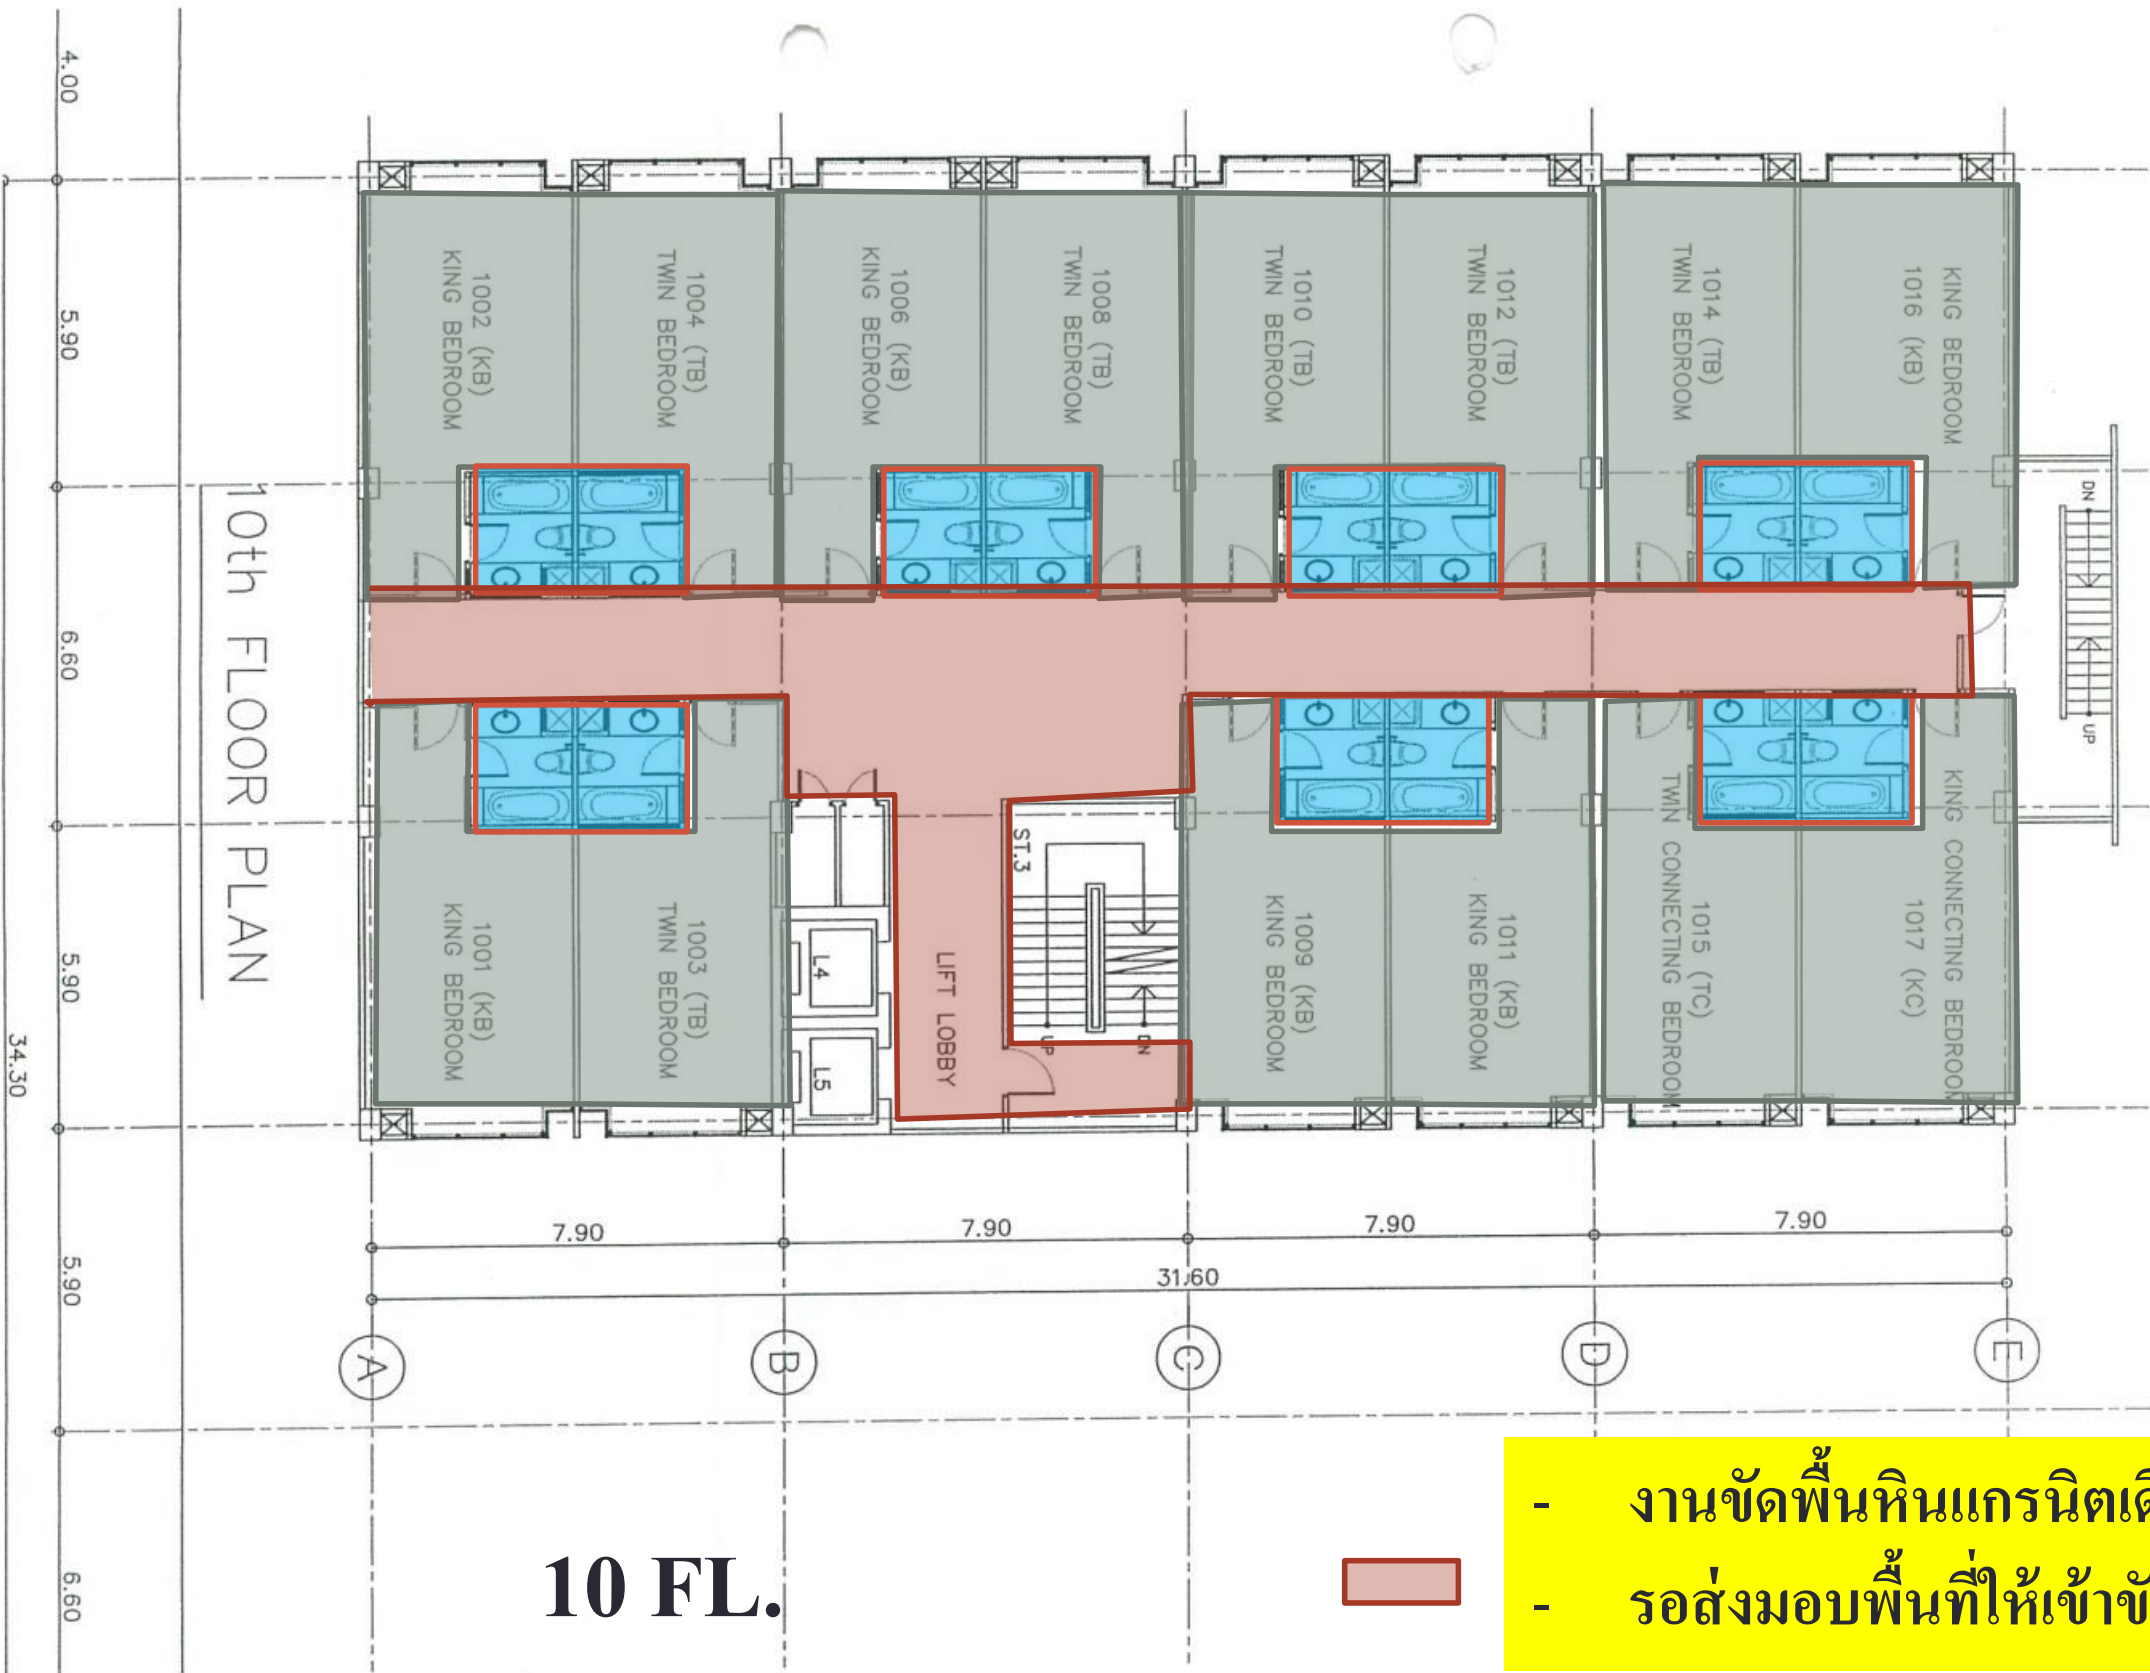

10 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- รอสั่งมอบพื้นที่ให้เข้าขัดพื้น

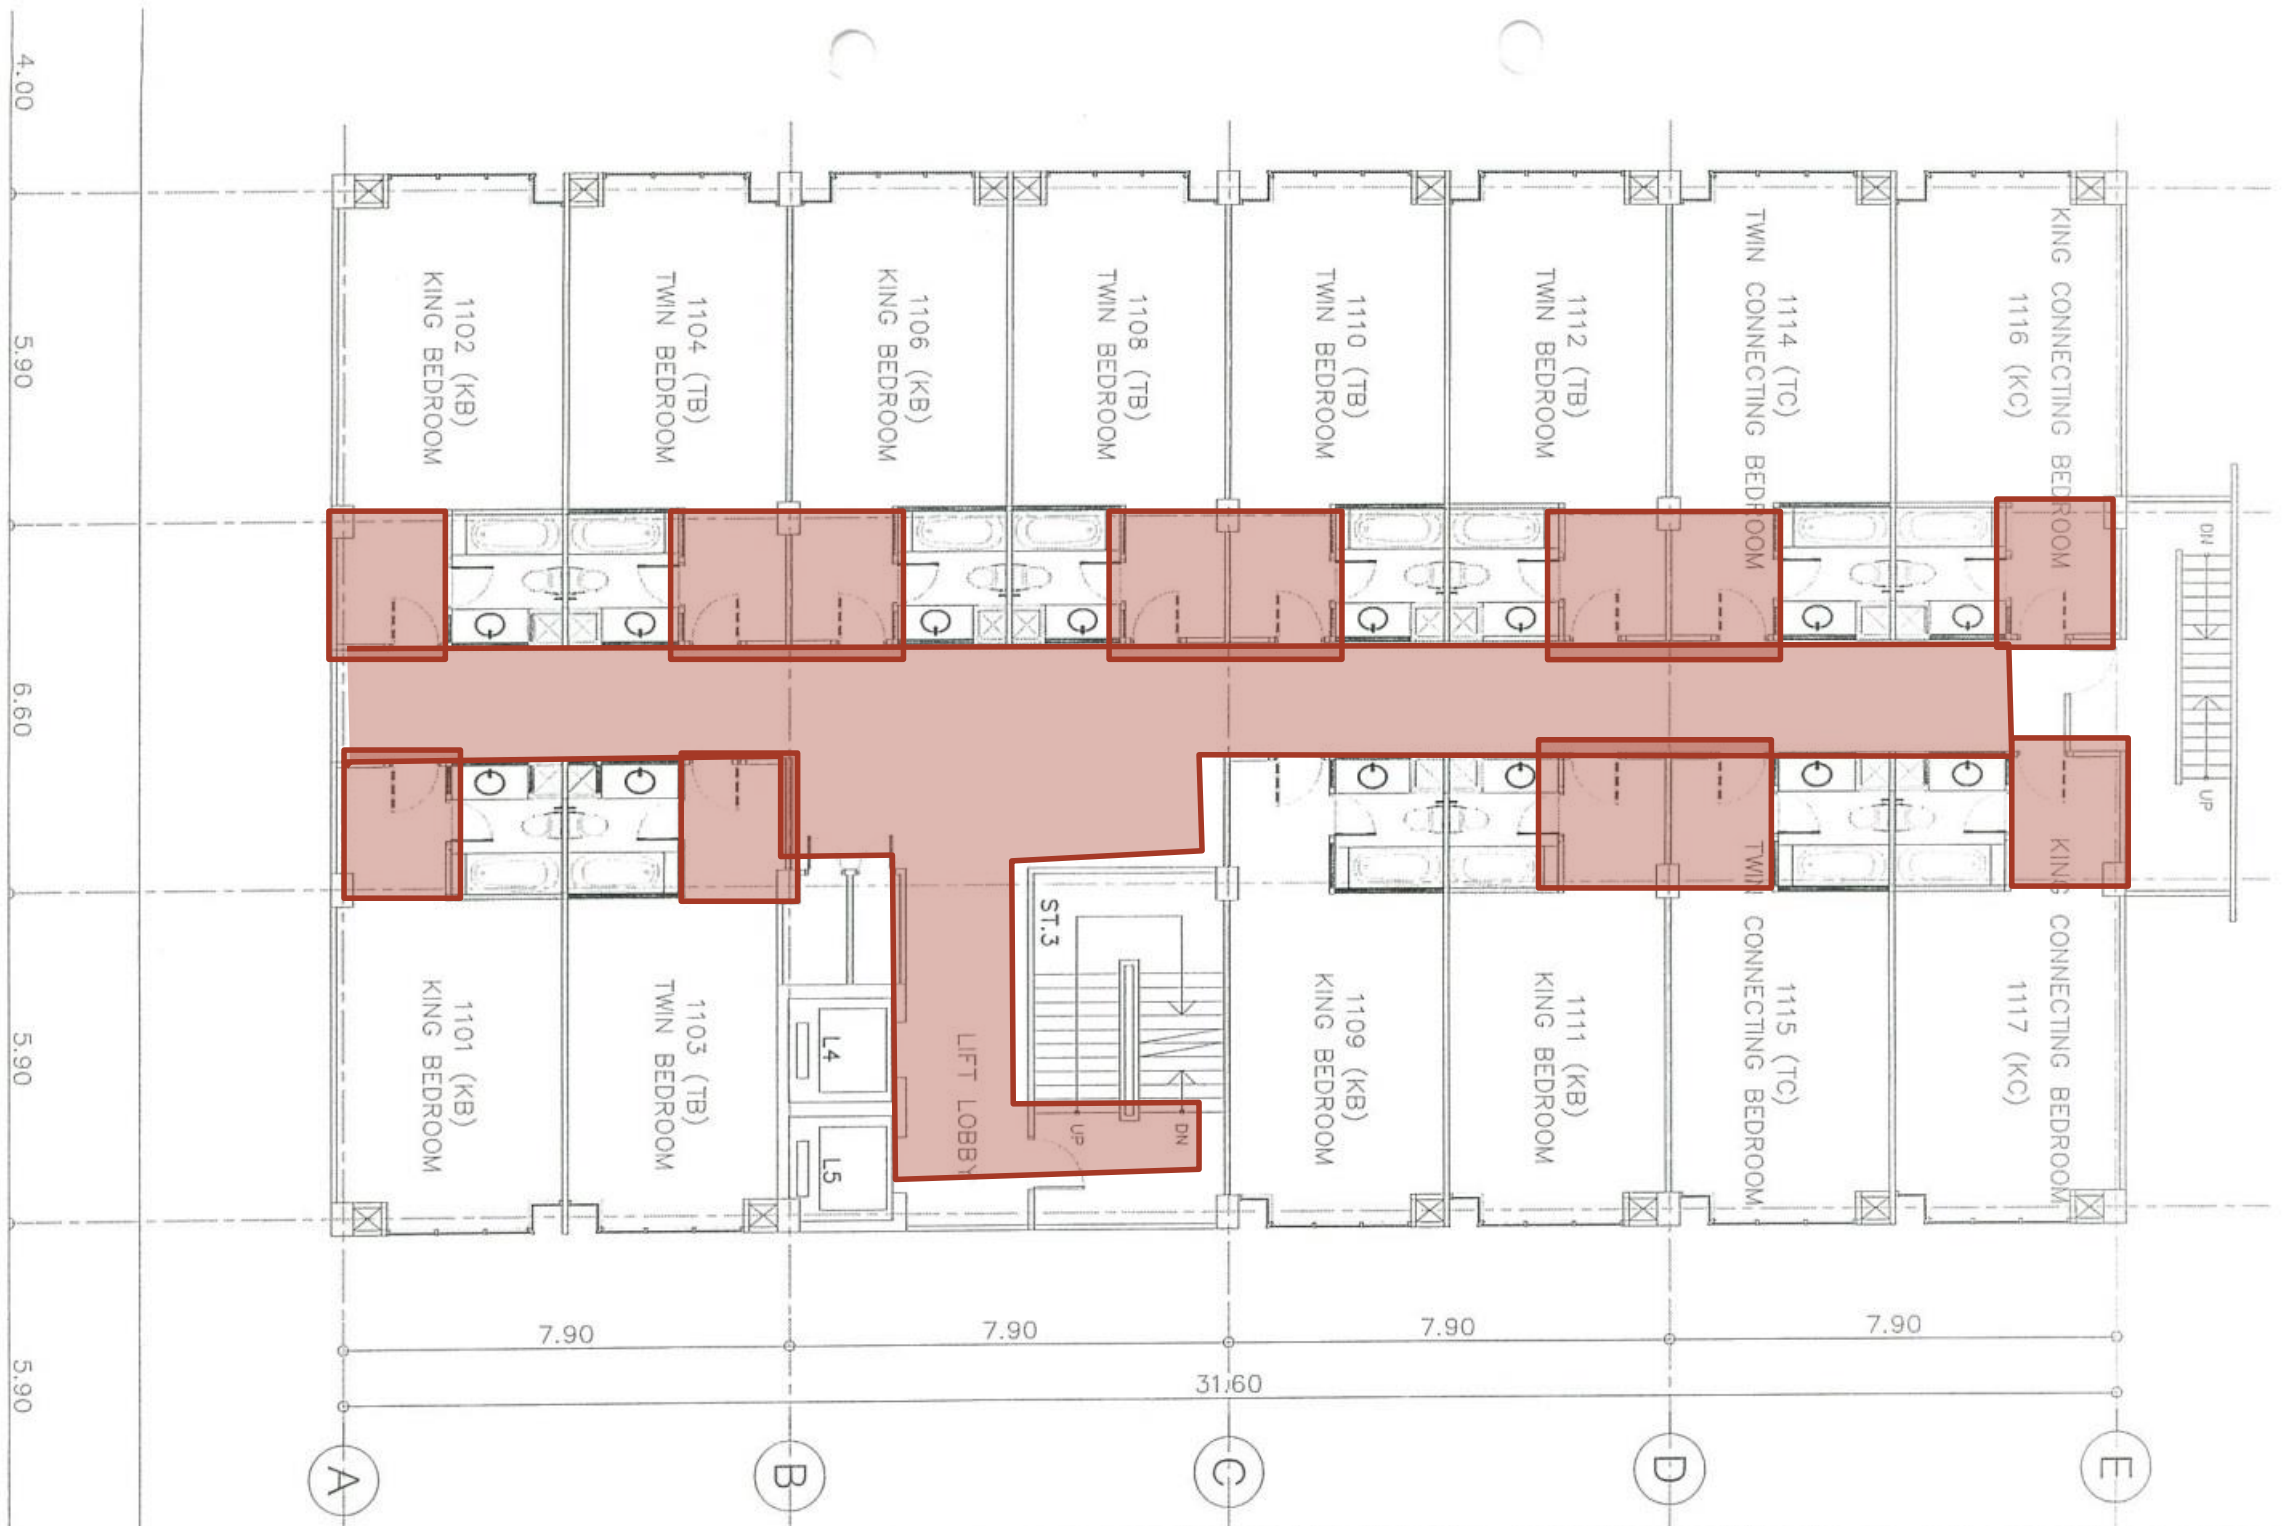

11 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- รองมอบพื้นที่ให้เข้าขัดพื้น

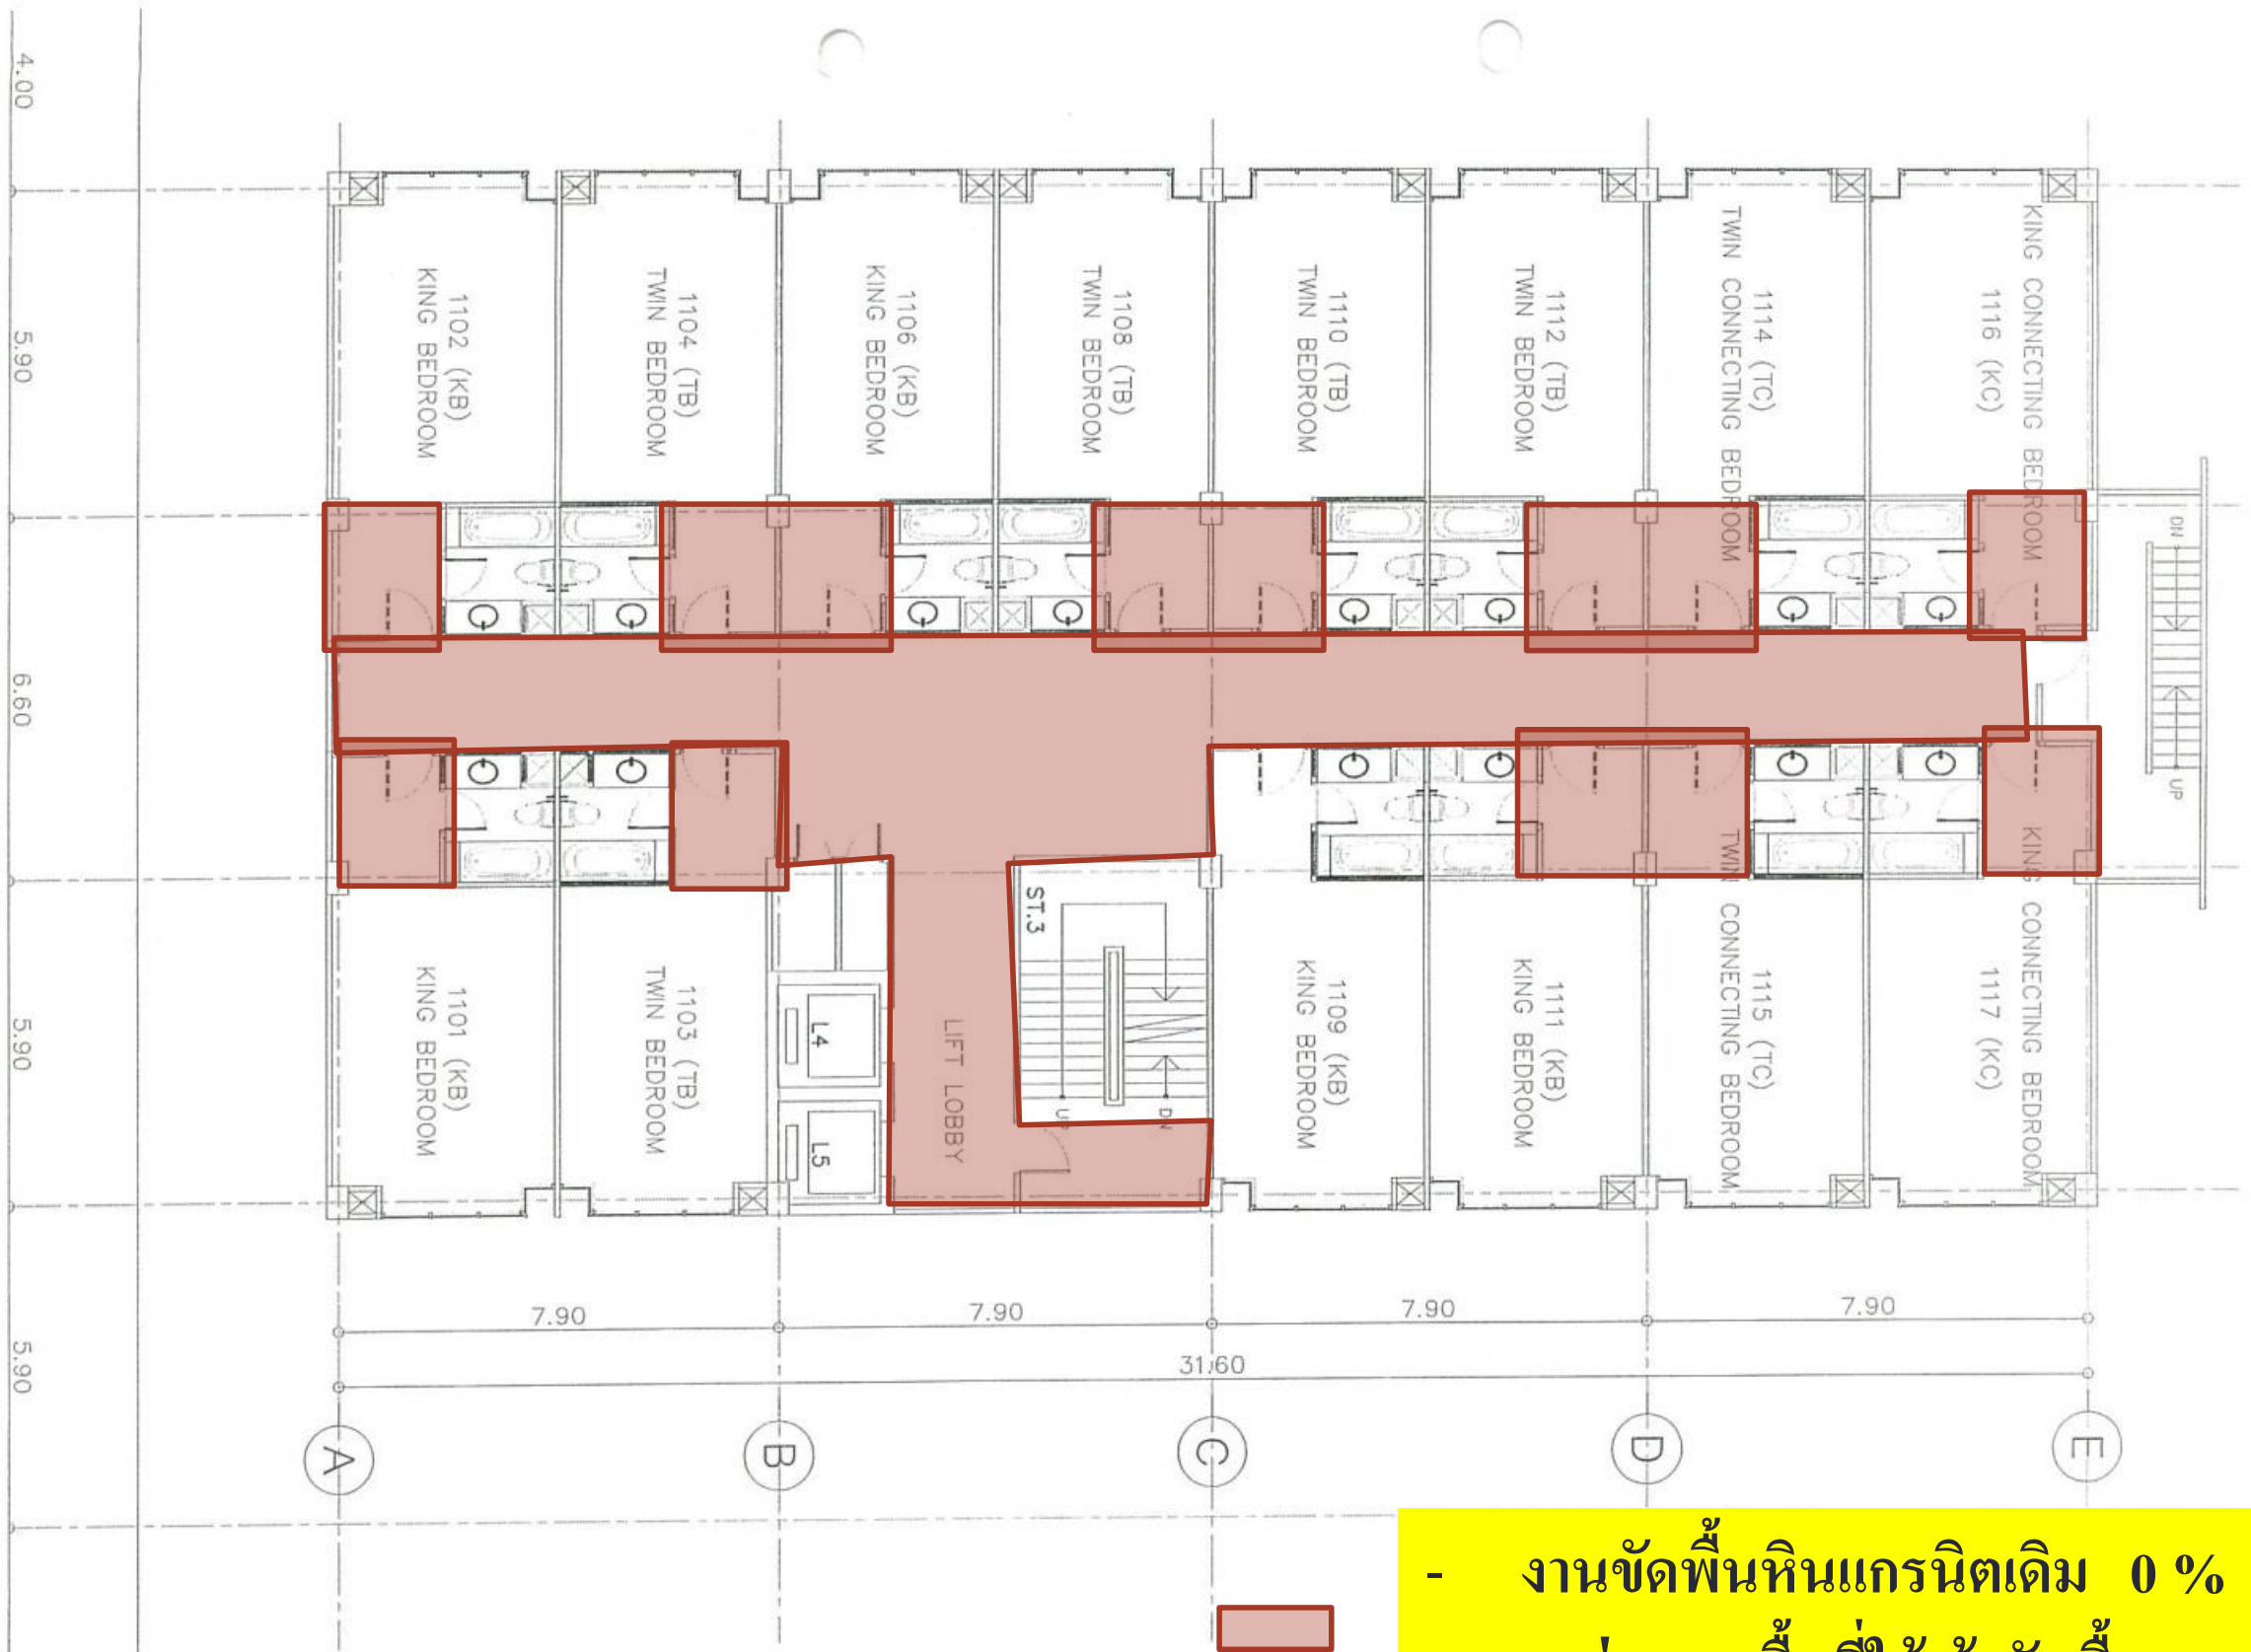

12 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- รอสั่งมอบพื้นที่ให้เข้าขัดพื้น

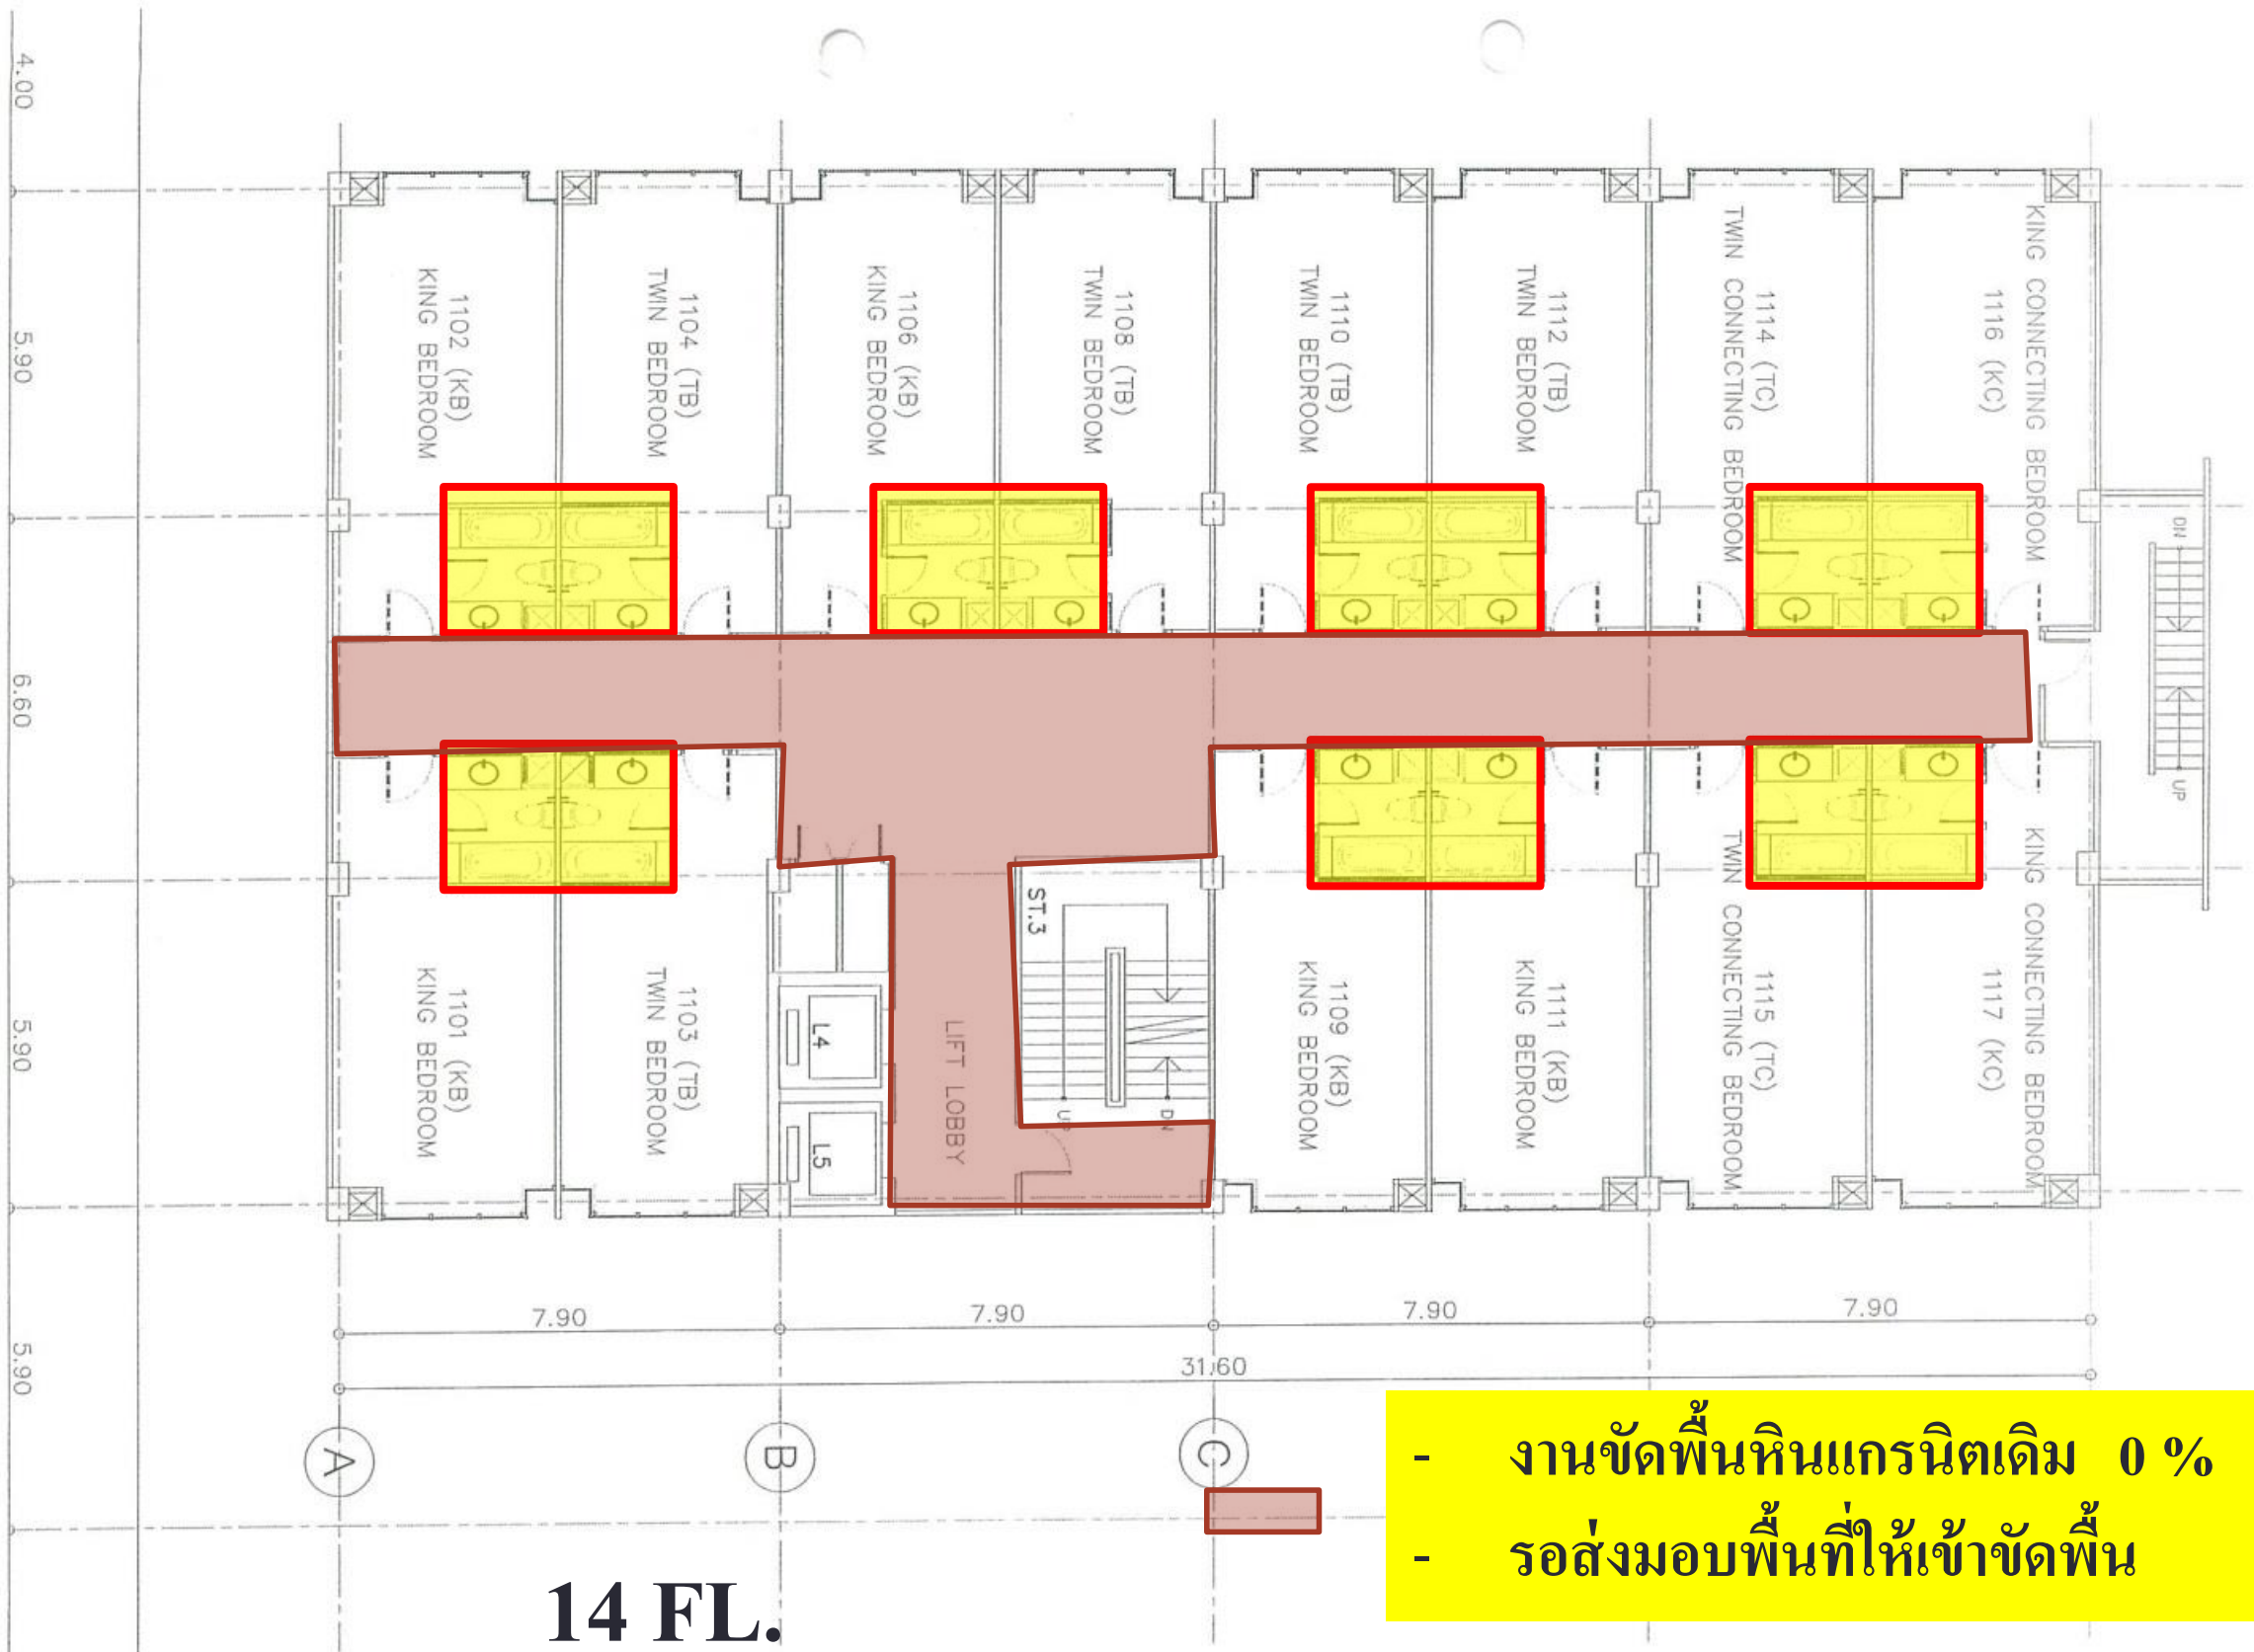

14 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- ร่องมอบพื้นที่ให้เข้าขัดพื้น



15 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- รองมอบพื้นที่ให้เข้าขัดพื้น

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug, โคมไฟหัวเตียงภายในห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 12,14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug, โคมไฟหัวเตียงภายในห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 12,14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug, โคมไฟหัวเตียงภายในห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 12,14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบคีย์การ์ดบริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12,14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์แสดงสถานะบริเวณหน้าห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12,14




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งอุปกรณ์ Power Relay บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


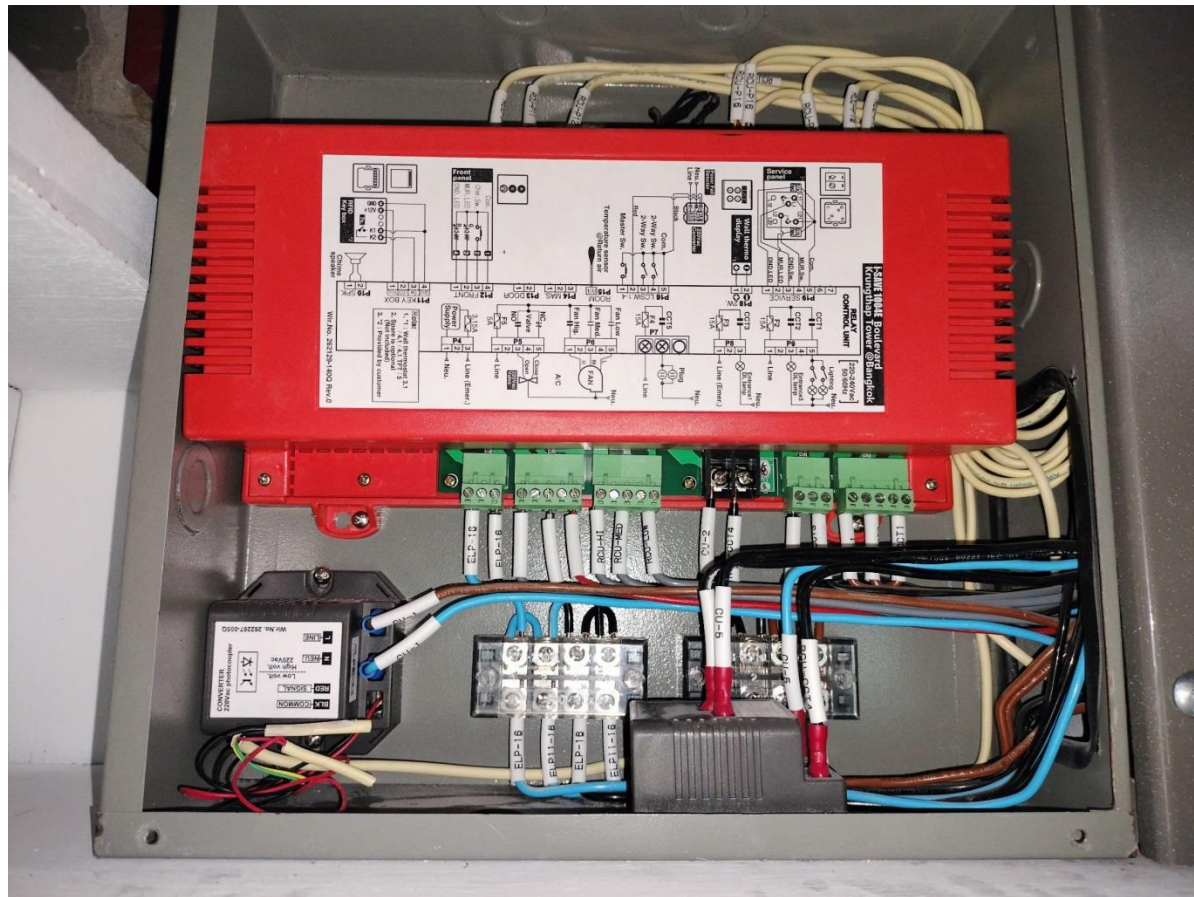


งานติดตั้งอุปกรณ์ Power Relay บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-17

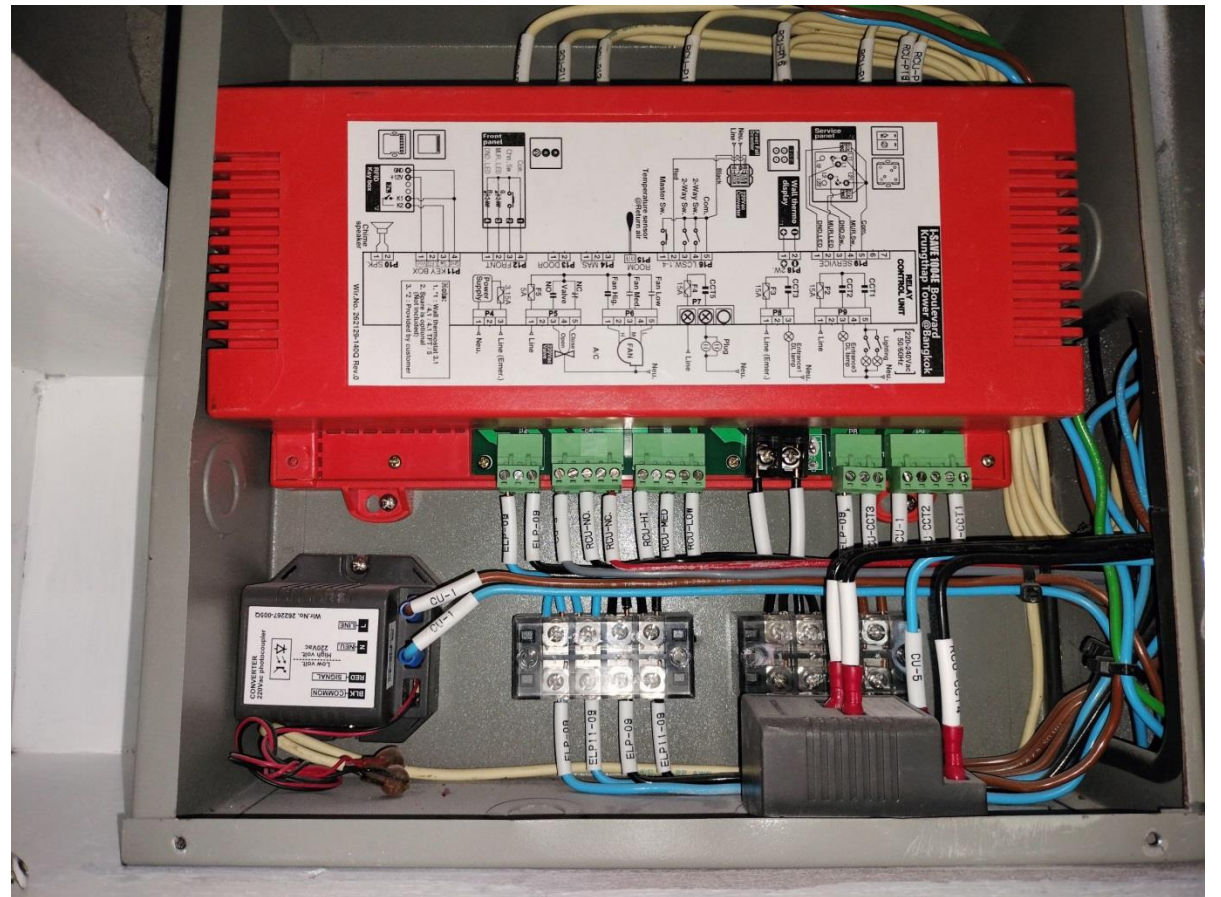

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Power Relay บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-17

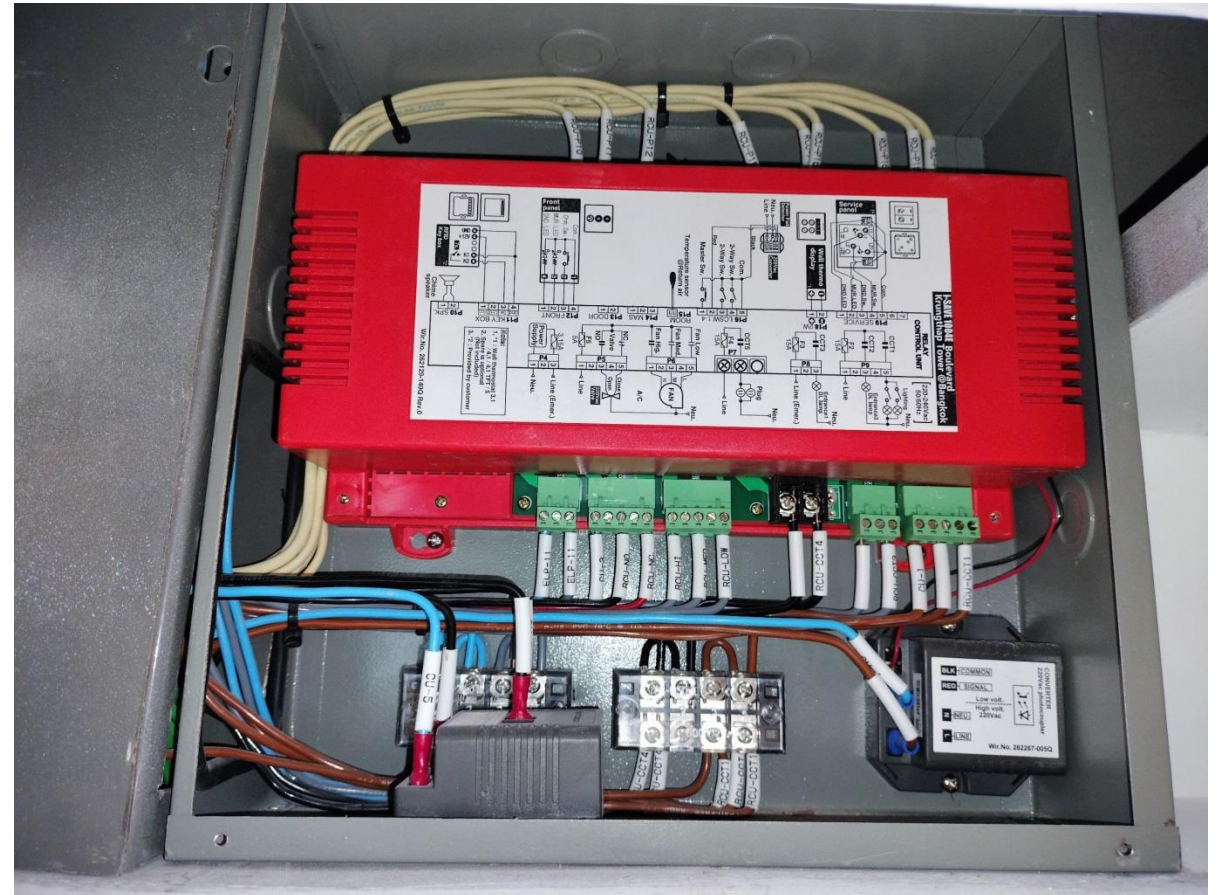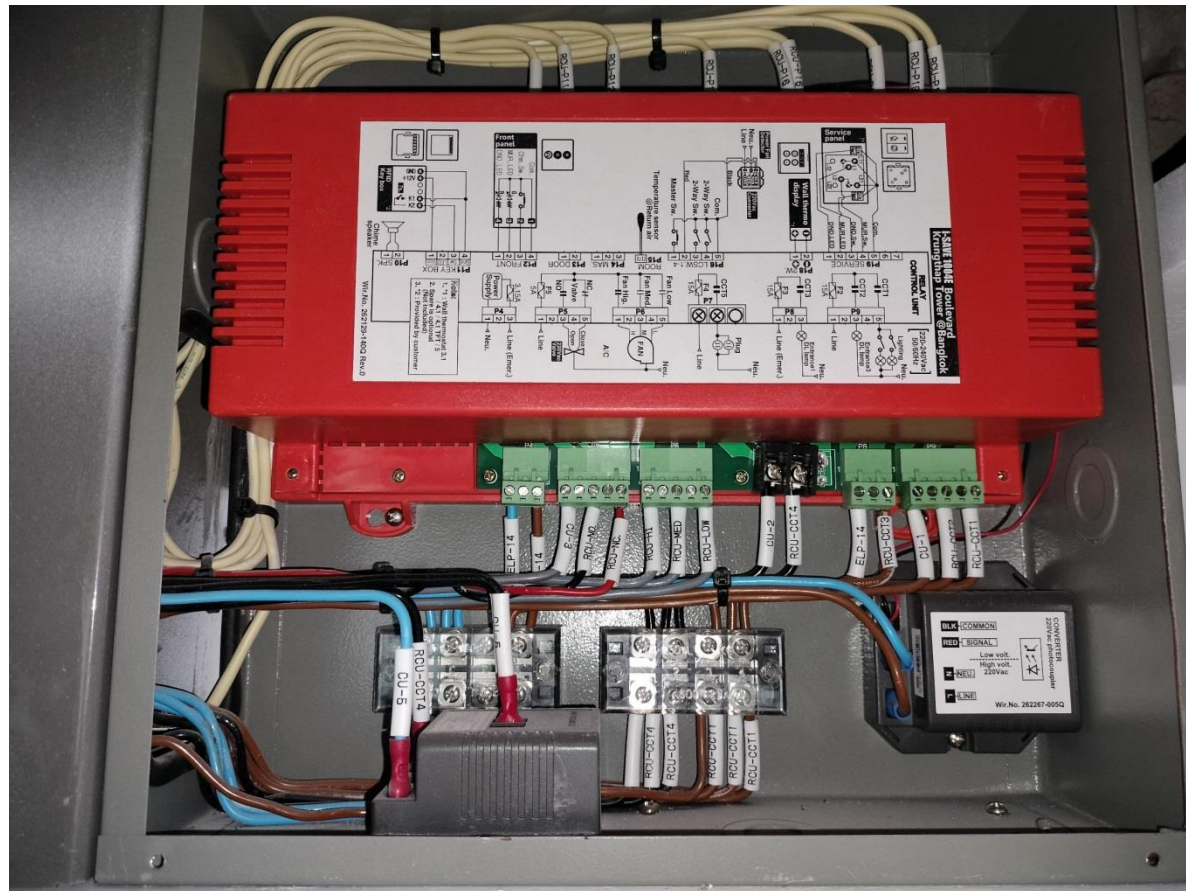

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Control Lighting และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน พร้อมเข้าสายบริเวณ
หน้าลิฟต์ Service อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Control Lighting และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน พร้อมเข้าสายบริเวณ
หน้าลิฟต์ Service อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ Control Lighting และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน พร้อมเข้าสายบริเวณ
หน้าลิฟต์ Service อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU + Consumer พร้อมเข้าสายบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU + Consumer พร้อมเข้าสายบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14

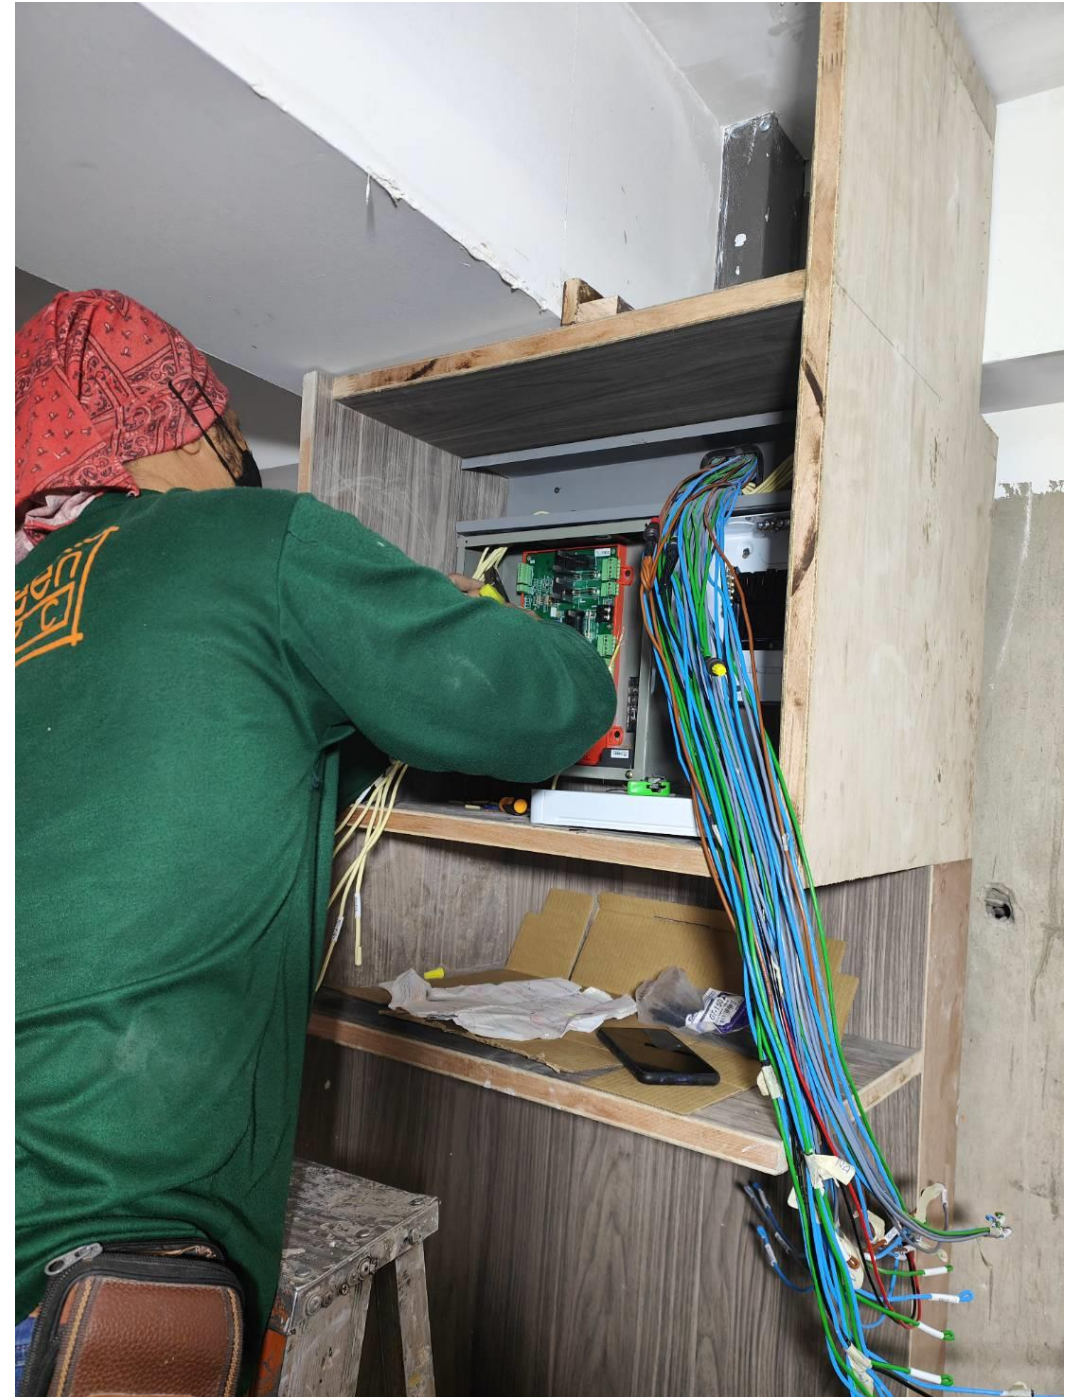

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานปูกระเบื้องผนังบริเวณหน้าลิฟต์ อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานปูกระเบื้องผนังบริเวณหน้าลิฟต์ อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานทำความสะอาดกระเบื้องพื้นเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงด์ ชั้น 12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานทำความสะอาดกระเบื้องพื้นเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงด์ ชั้น 12



วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน



คอมไฟ

อุปกรณ์คอมไฟและป้าย Exit ของอาคารกรุงเทพและสยาม
งานระบบไฟฟ้า



ป้าย Exit
