



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

1 JUNE 2023

แผนงาน 3 Week KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

โครงการ : Boulevard Hotel สุขุมวิท ซอย 5
 ผู้รับจ้าง : บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด


แผนงานตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2566 ถึง 14 มิ.ย. 2566



ลำดับ	รายการ	จำนวนวัน	แผนงาน		ช่วงวันดำเนินการ		ผลงาน ปิดก่อน %	ผลงาน ปิดวันนี้ %	ผลงานสะสม %	WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3														ความก้าวหน้า /ความล่าช้า	หมายเหตุ								
			เริ่ม	เสร็จสิ้น	เริ่ม	เสร็จสิ้น				พ.ค.-66																							
										25/5/23	26/5/23	27/5/23	28/5/23	29/5/23	30/5/23	31/5/23	1/6/23	2/6/23	3/6/23	4/6/23	5/6/23	6/6/23	7/6/23			8/6/23	9/6/23	10/6/23	11/6/23	12/6/23	13/6/23	14/6/23	
KRUNGTHEP WING																																	
2.2	หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย (MEP 2nd Fix Works)																																
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 10	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	1 มี.ค. 23	27 เม.ย. 23			100%	0%	100%																	Plan		-28	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %		
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 11	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	3 มี.ค. 23	27 เม.ย. 23			100%	0%	100%																	Actual		-28	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %		
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 12	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	5 มี.ค. 23	27 เม.ย. 23			100%	0%	100%																	Plan		-28	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %		
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 12	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	5 มี.ค. 23	27 เม.ย. 23			100%	0%	100%																	Actual		-28	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %		
2.3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MEP 2nd Fix Works)																																
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 10	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	10 เม.ย. 23	22 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Plan		-53	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 11	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	17 เม.ย. 23	22 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Plan		-53	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 12	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	1 เม.ย. 23	22 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Plan		-53	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 12	15	15 มี.ค. 23	30 มี.ค. 23	1 เม.ย. 23	22 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Actual		-53	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
3	งานระบบ MEP Bed Room Phase 3 (Floor 14,15,16,17)																																
3.1	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (MEP 2nd Fix Works)																																
	- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิทช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 14	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	22 เม.ย. 23	1 มิ.ย. 23																							Plan		-30	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิทช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 15	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	22 เม.ย. 23	1 มิ.ย. 23			90%	2%	92%																		Actual		-30	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิทช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 16	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	24 เม.ย. 23	1 มิ.ย. 23			90%	2%	92%																		Plan		-30	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิทช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 17	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	2 พ.ค. 23	1 มิ.ย. 23			90%	2%	92%																		Actual		-30	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างและสวิทช์ ปลั๊กห้องพัก ชั้น 17	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	2 พ.ค. 23	1 มิ.ย. 23			90%	2%	92%																		Actual		-30	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
3.2	หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย (MEP 2nd Fix Works)																																
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 14	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	10 เม.ย. 23	5 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Plan		-3	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 15	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	17 เม.ย. 23	5 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Actual		-3	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 16	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	17 เม.ย. 23	5 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Plan		-3	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงบริเวณห้องพัก ชั้น 17	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	22 เม.ย. 23	5 พ.ค. 23			100%	0%	100%																		Actual		-3	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
3.3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (MEP 2nd Fix Works)																																
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 14	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	10 เม.ย. 23	18 พ.ค. 23			100%	0%	100%																			Plan		-16	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 15	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	17 เม.ย. 23	27 พ.ค. 23			95%	5%	100%																		Actual		-25	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 16	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	17 เม.ย. 23	1 มิ.ย. 23			90%	0%	90%																			Plan		-30	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 17	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	4 พ.ค. 23	27 พ.ค. 23			90%	0%	90%																		Actual		-25	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	
	- งานติดตั้งหน้ากากแอร์ SAG,RAG,EAG บริเวณห้องพัก ชั้น 17	10	22 เม.ย. 23	2 พ.ค. 23	4 พ.ค. 23	27 พ.ค. 23			95%	5%	100%																		Actual		-25	พื้นที่ติดตั้งส่งให้ติดตั้งได้ไม่ 100 %	

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)

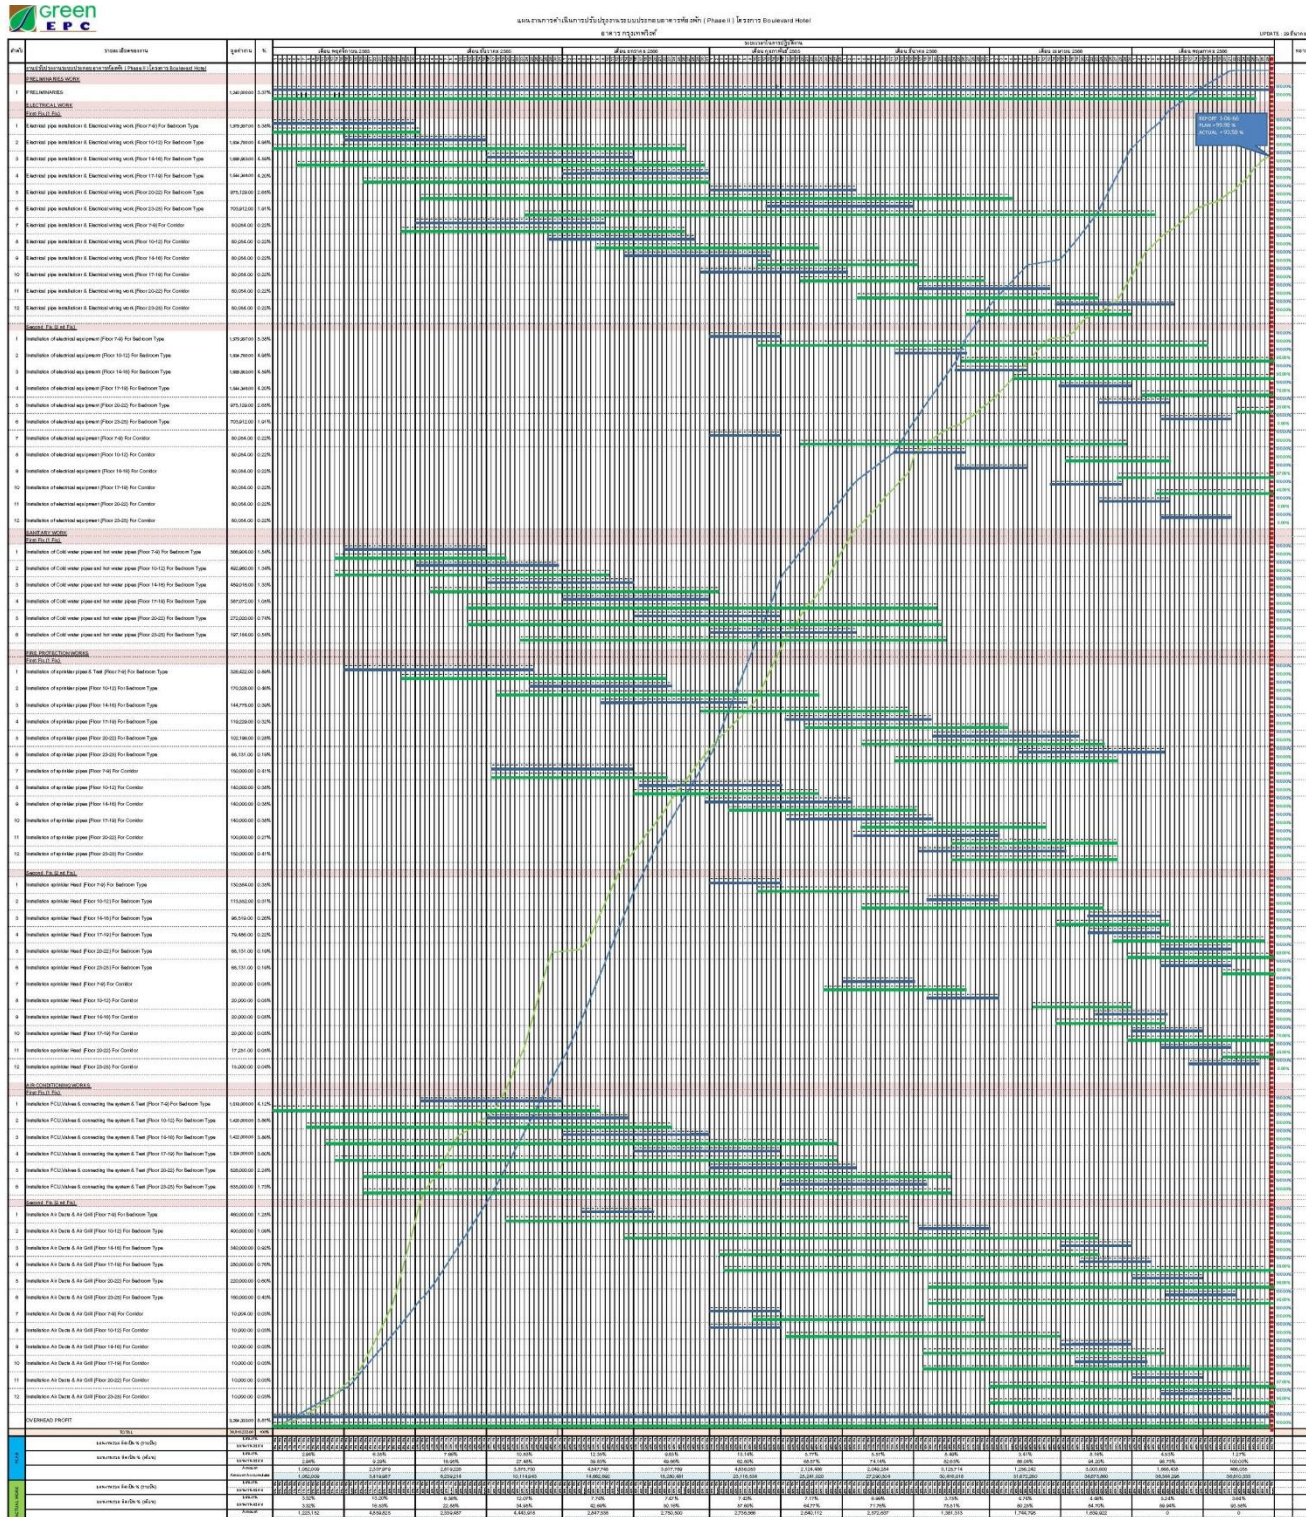

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (1-06-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
			- 6.91 % ล่าช้า 14 วัน

MAN POWER

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟฟ้าและร้อยสายบริเวณ Service Area อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟฟ้าและร้อยสายบริเวณ Service Area อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟฟ้าและร้อยสายบริเวณ Service Area อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9

