



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

15 JUNE 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

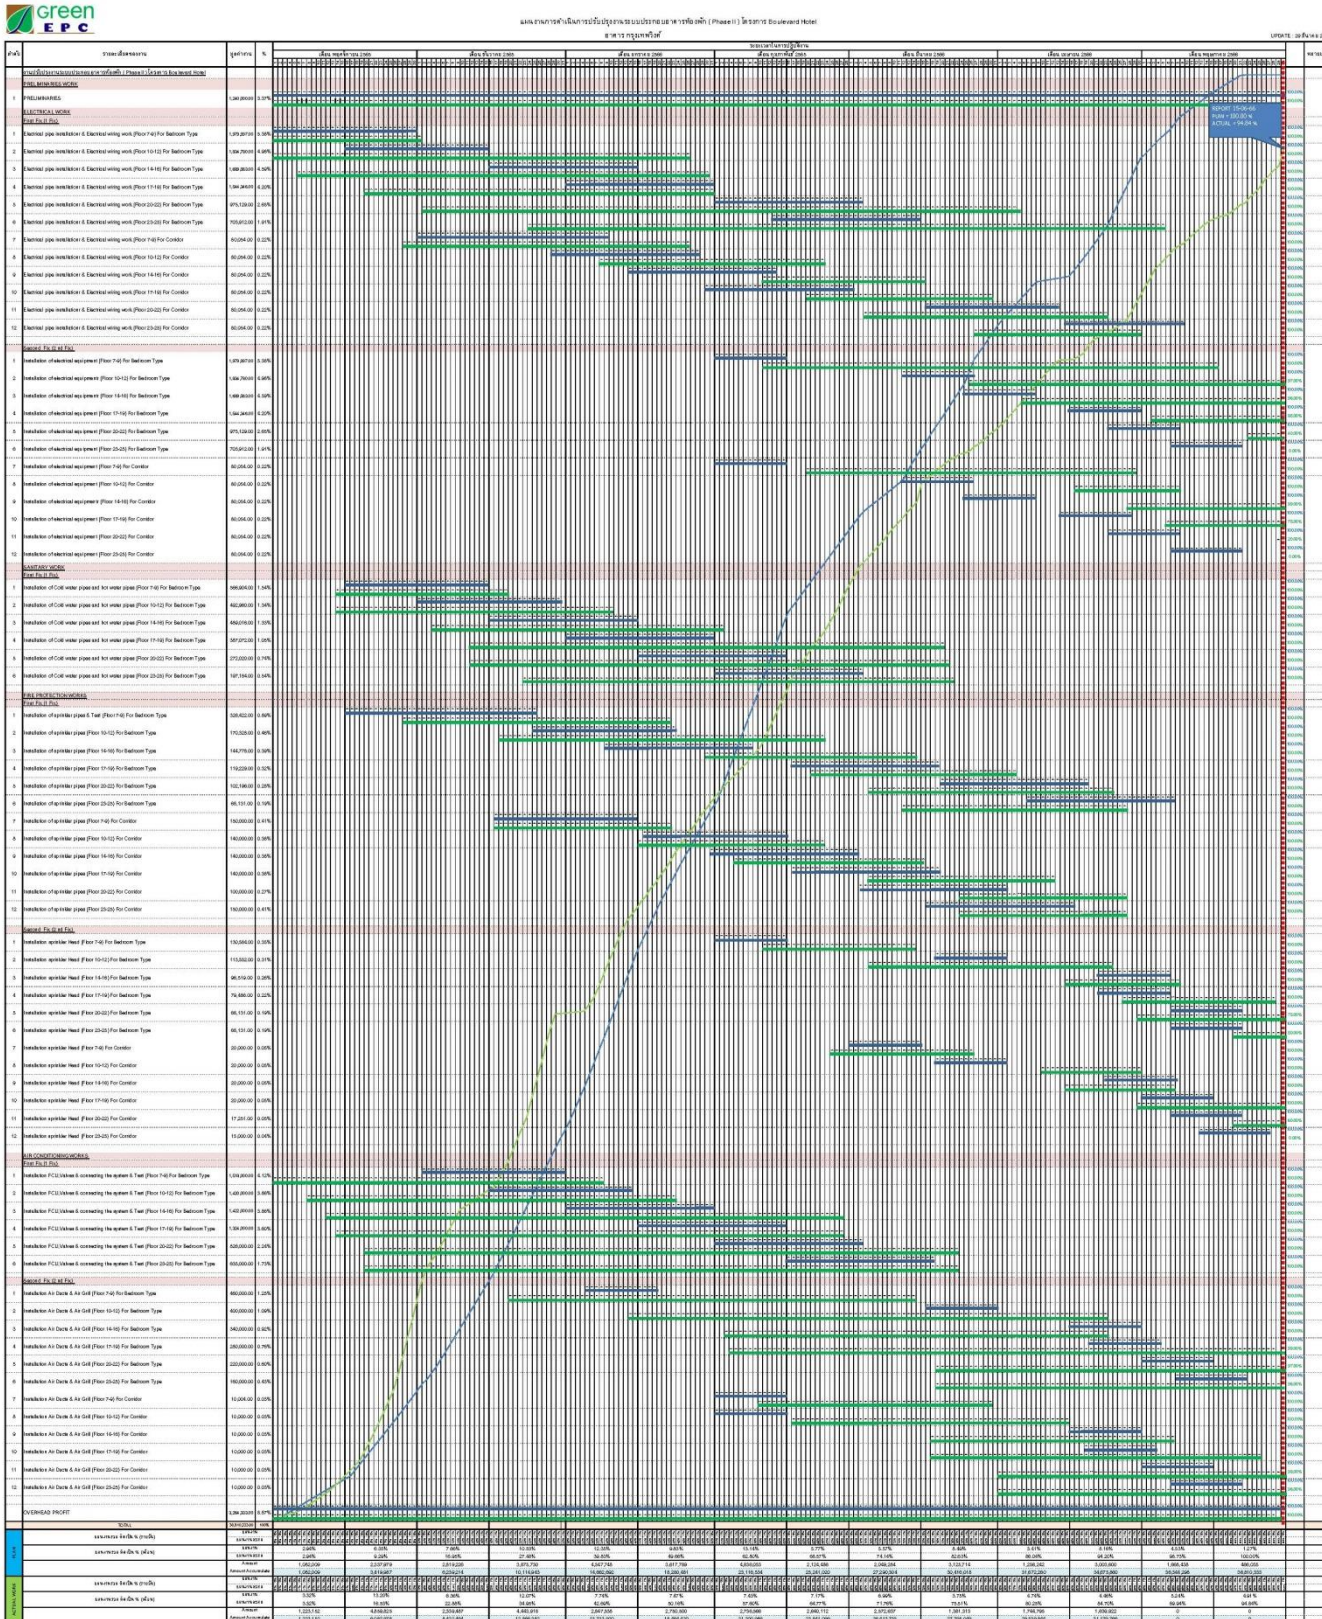

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (15-06-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	94.84%	- % ล่าช้า 28 วัน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนมิถุนายน 2566																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Project Manager	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1																	
2	Architecture Engineer	2	2	-	-	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1																
3	Electrical Engineer	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1																
4	Air Conditioning Engineer	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-																
5	Safety	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1																
6	Sanitary Foreman	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1																
7	Electrical Foreman	2	2	2	-	2	2	2	2	2	1	-	2	2	2																
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-																
9	Site Admin	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1																
10	Electricians	15	19	18	-	15	15	19	19	19	9	-	18	18	18																
11	Plumber	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	6																
12	Sprinkler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-																
14	General Technician	10	10	10	-	11	15	9	4	4	4	4	8	3	4																
15	Store	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3																
16	Tiler	11	8	8	-	8	8	11	6	11	4	4	4	4	4																
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-																
	รวม	45	47	41	9	51	56	58	47	51	32	18	55	38	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 8

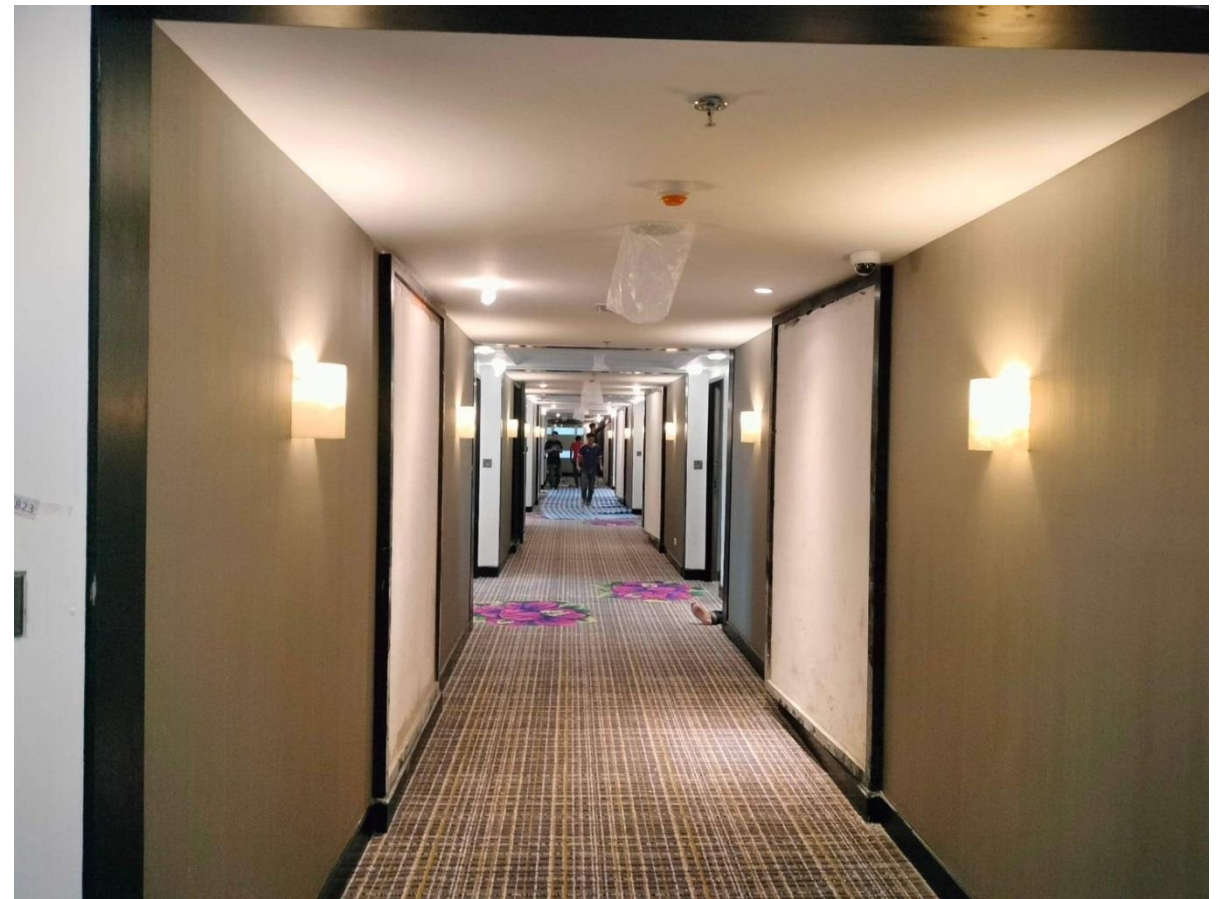

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพงและงานใส่หัวสปีงเกอร์บริเวณทางเดิน
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบบริเวณห้อง Booster Pump อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบบริเวณห้อง Booster Pump อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบบริเวณห้อง Booster Pump อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบบริเวณห้อง Booster Pump อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานซ่อมแซมประตูเบี่ยงบริเวณหน้าลิฟต์
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6-14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานปูกระเบื้องผนังหน้าลิฟต์ อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานปูกระเบื้องผนังหน้าลิฟต์ อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

