



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK
HOTEL SUKHUMVIT SOI 5**

17 Nov 2022

แผนงานดำเนินการ (งานอุปกรณ์หลัก)

แผนงานการดำเนินงาน (งานหลัก) ที่คงเหลือ

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ลำดับ	รายละเอียดงาน	แผนงานดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลงาน (%)
1	งาน โมดิฟายตู้ EDB อาคารสยาม แยกตู้ EDB เพิ่มเติม	1/11/65 ถึง 20/11/65		
3	ตู้ Load Center - ชั้น 6,16 อาคารสยาม - ชั้นควดฟ้า อาคารกรุงเทพ	1/11/65 ถึง 15/11/65		30%
4	งานเมนไฟฟ้าจ่าย Heat Pump - อาคารกรุงเทพ - อาคารสยาม	5/11/65 ถึง 20/11/65 10/11/65 ถึง 25/11/65		60% 40%
5	งานเมนไฟฟ้าจ่าย Cooling Tower	1/11/65 ถึง 20/11/65		

แผนงานการดำเนินงาน (งานหลัก) ที่คงเหลือ

งานระบบสุขาภิบาล & งานระบบดับเพลิง

ลำดับ	รายละเอียดงาน	แผนงานดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลงาน (%)
	<u>อาคารกรุงเทพ</u>			
2	งานเชื่อมต่อท่อเมนและหุ้มฉนวนห้องเครื่องถึงน้ำร้อนห้องเครื่องชั้นควดฟ้า	1/11/65 ถึง 15/11/65		80 %
3	งานระบบคอนโทรล Heat Pump – Return Pump	1/11/65 ถึง 15/11/65		60 %
4	งานปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน ชั้นลานจอดรถ	1/11/65 ถึง 10/11/65		75 %


งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ลำดับ	รายละเอียดงาน	แผนงานดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลงาน (%)
1	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 3 ชุด ชั้นควดฟ้า	1/11/65 ถึง 10/11/65		100%
2	งานติดตั้งประกอบและติดตั้งชุด Control Cooling Tower	1/11/65 ถึง 25/11/65		
3	งานเดินท่อ HDPE PN10 ของระบบ Cooling Tower	1/11/65 ถึง 15/11/65		90 %

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานหลัก)


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

Before

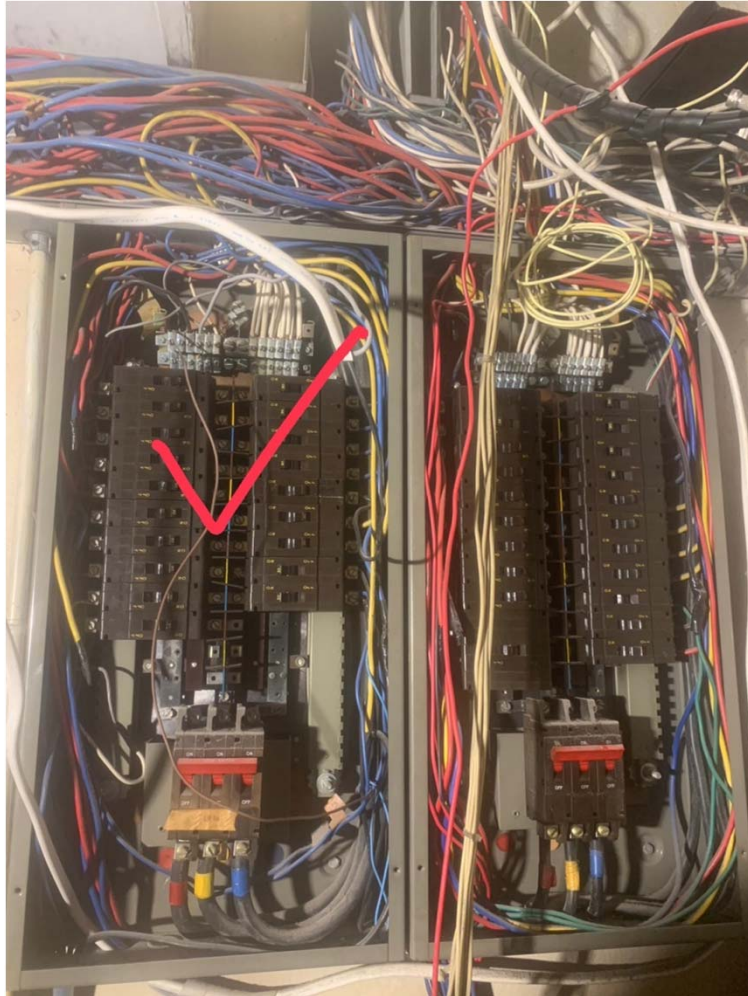

งานเปลี่ยนตู้โหนด ชั้น 16 อาคารสยาม

After

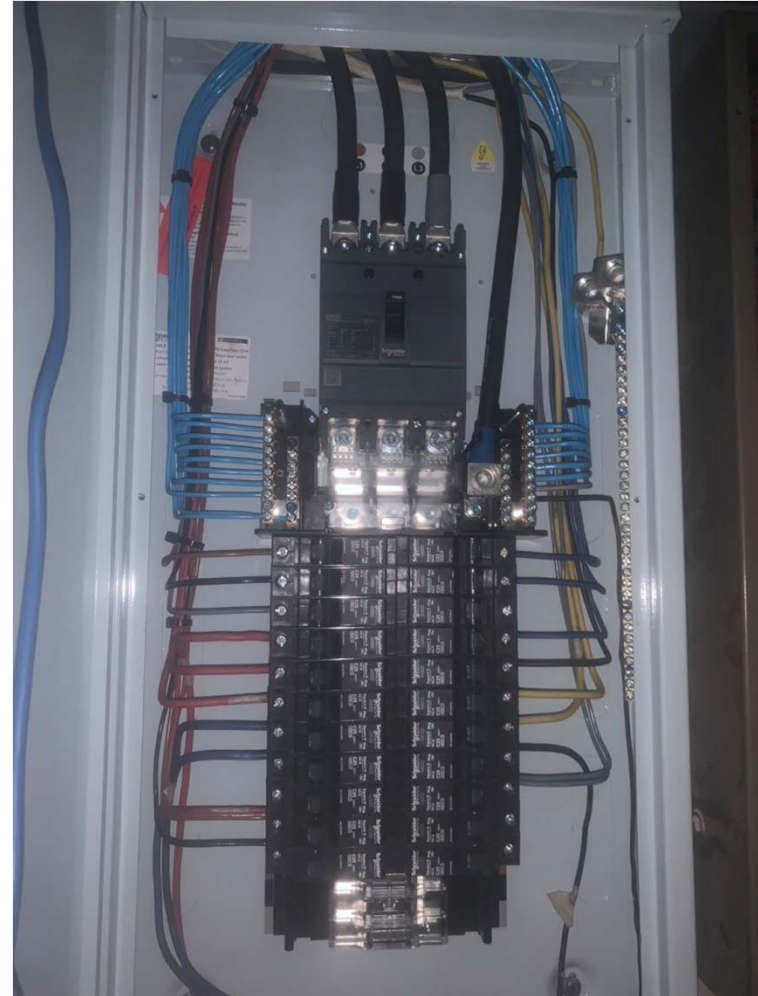

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อไฟ Main Heat Pump ชั้นดาดฟ้า อาคารสยาม



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ Main Heat Pump ชั้นดาดฟ้า อาคารกรุงเทพ

