



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

28 Sep 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพัสดุอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (27-09-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.83%	- % ล่าช้า 134 วัน


หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เช่างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel
อาคารสยามวิล์ด

UPD DATE : 28 กันยายน 2560

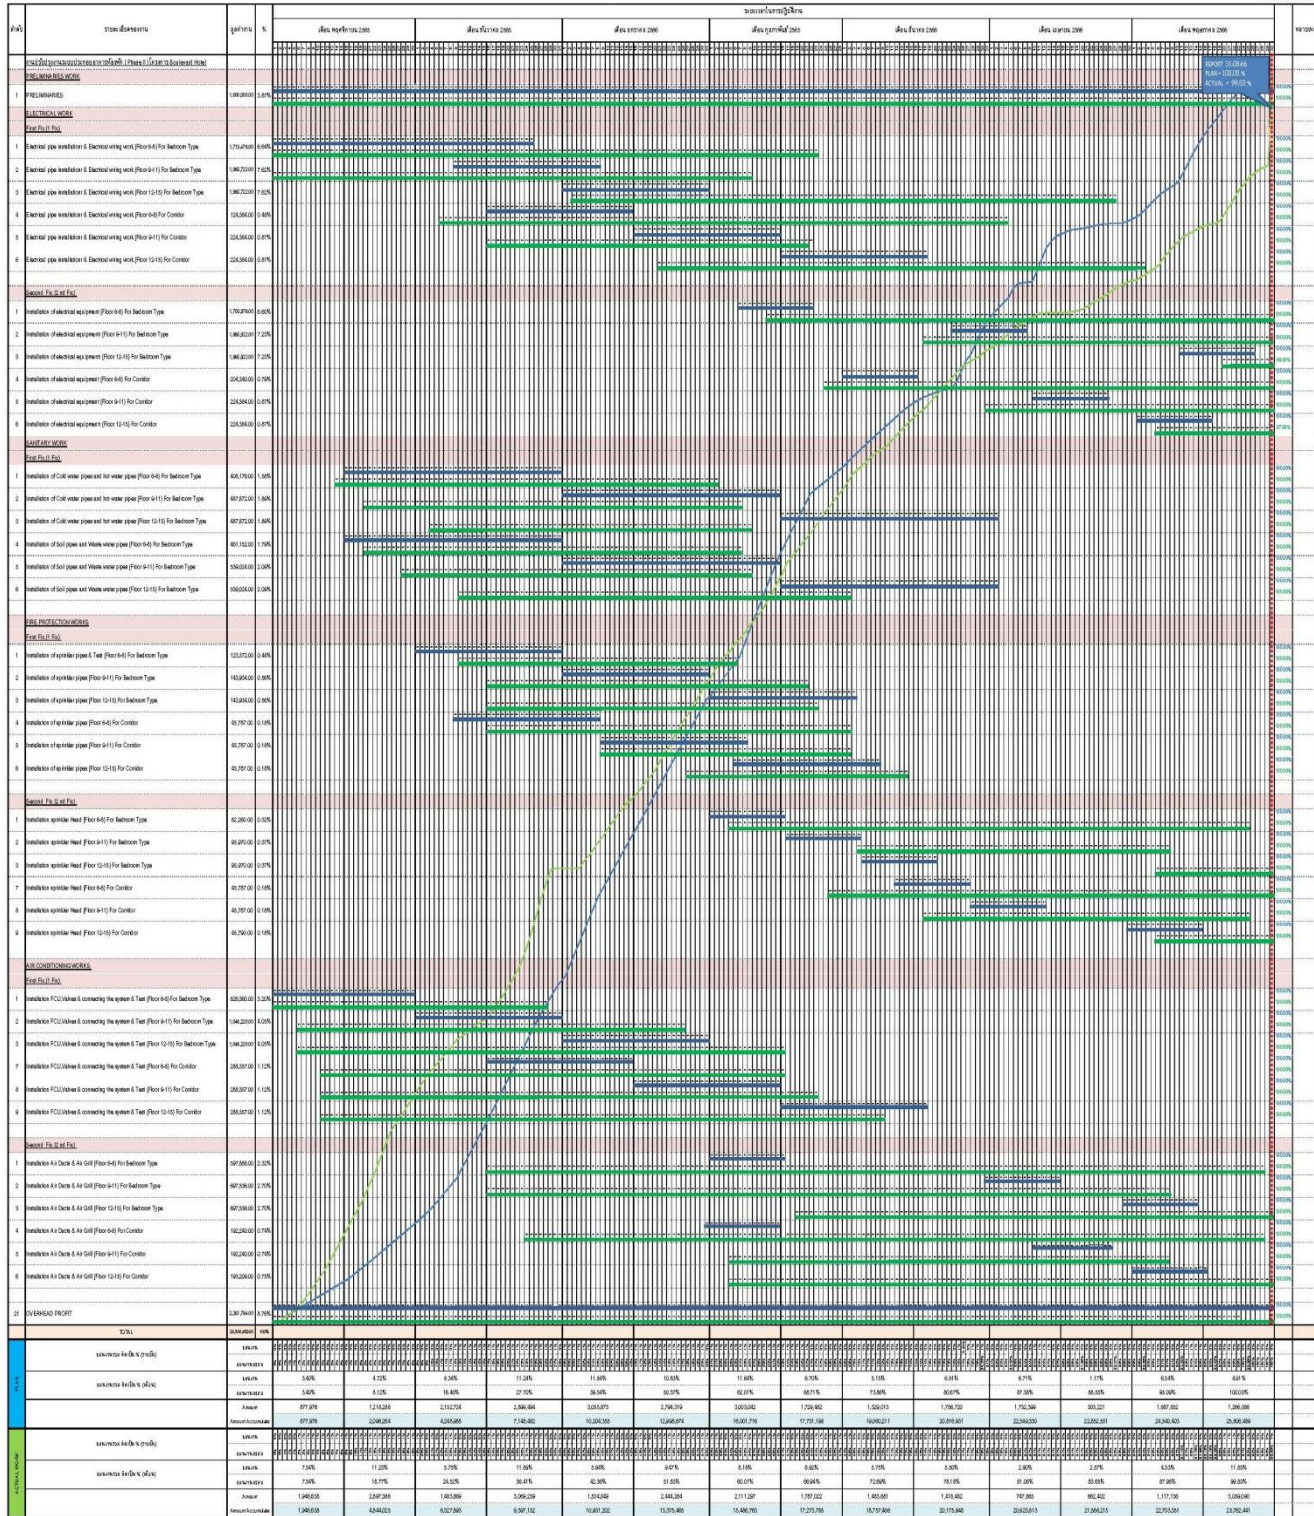

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (27-09-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	100.00%	99.84%	- % ล่าช้า 134 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเดือนกันยายน 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกันยายน 2566																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Project Manager	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-					
2	Architecture Engineer	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1					
3	Electrical Engineer	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-					
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	Safety	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1					
6	Sanitary Foreman	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1					
7	Electrical Foreman	1	1	-	1	1	1	2	2	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1					
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	Site Admin	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1					
10	Electricians	7	5	-	6	6	6	11	12	10	-	5	5	5	-	4	4	-	6	5	6	5	6	6	-	7	6	7					
11	Plumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	Sprinkler	-	-	-	5	5	4	3	3	-	-	3	-	3	3	3	3	-	3	3	3	-	3	-	-	-	3	3					
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	General Technician	11	8	-	6	6	8	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	4	4					
15	Store	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2				
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	รวม	24	17	0	21	23	23	23	25	16	0	18	13	14	9	15	16	0	17	13	17	15	20	16	0	15	22	21	0	0	0	0	

หมายเหตุ


 วันอาทิตย์

 วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเดินท่อไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

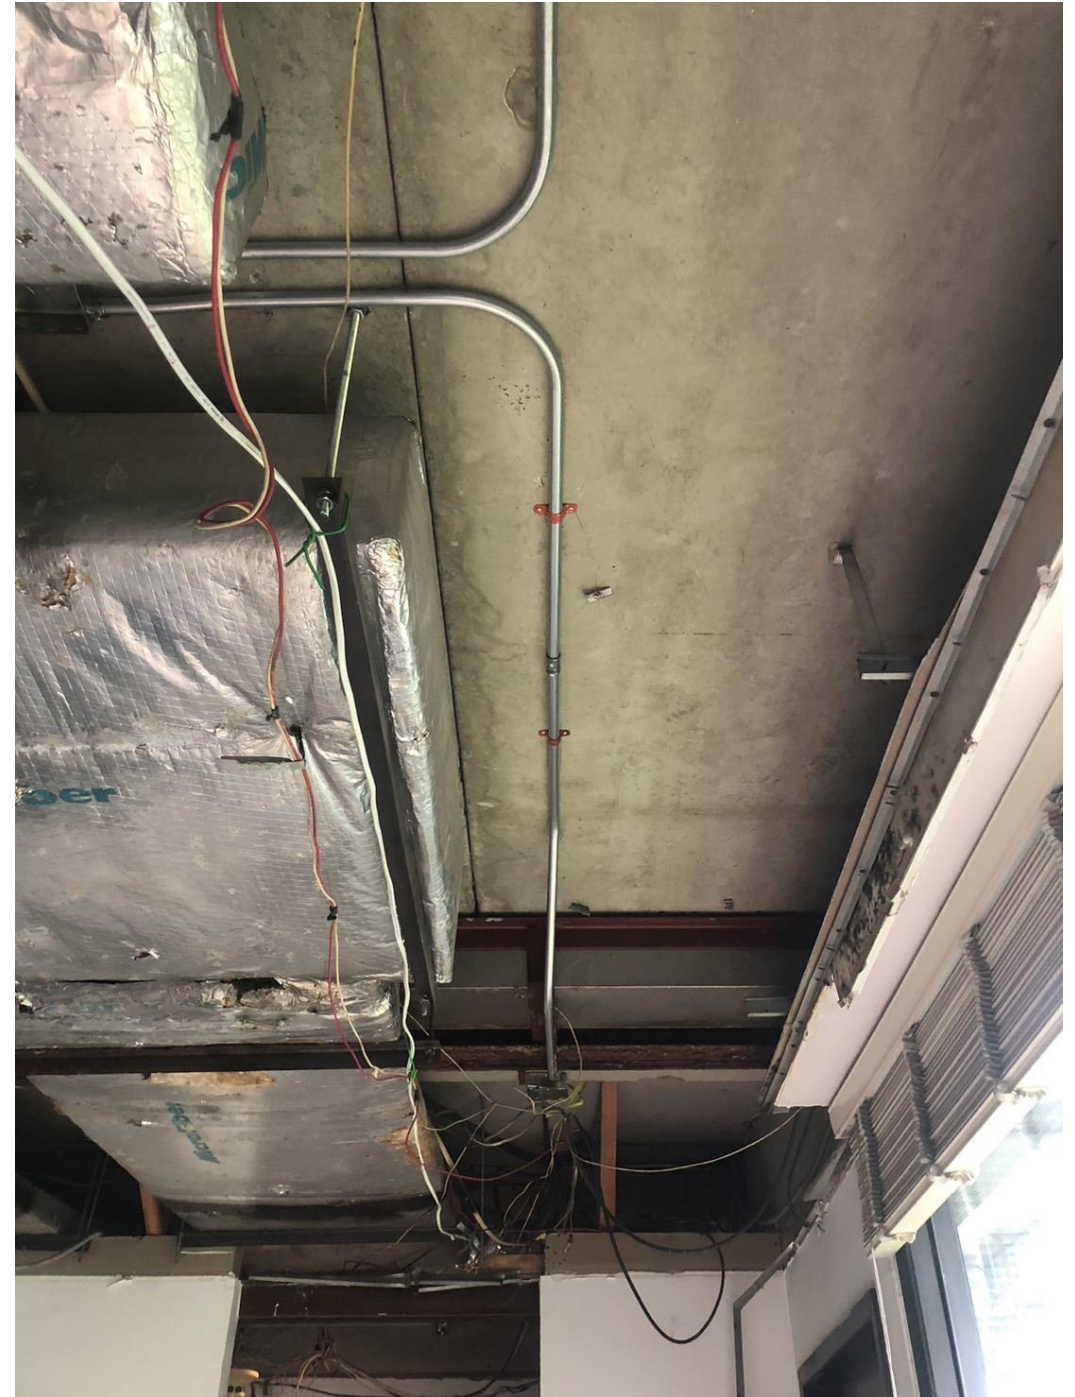

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





งานเดินท่อไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งซัพพอร์ตสำหรับท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

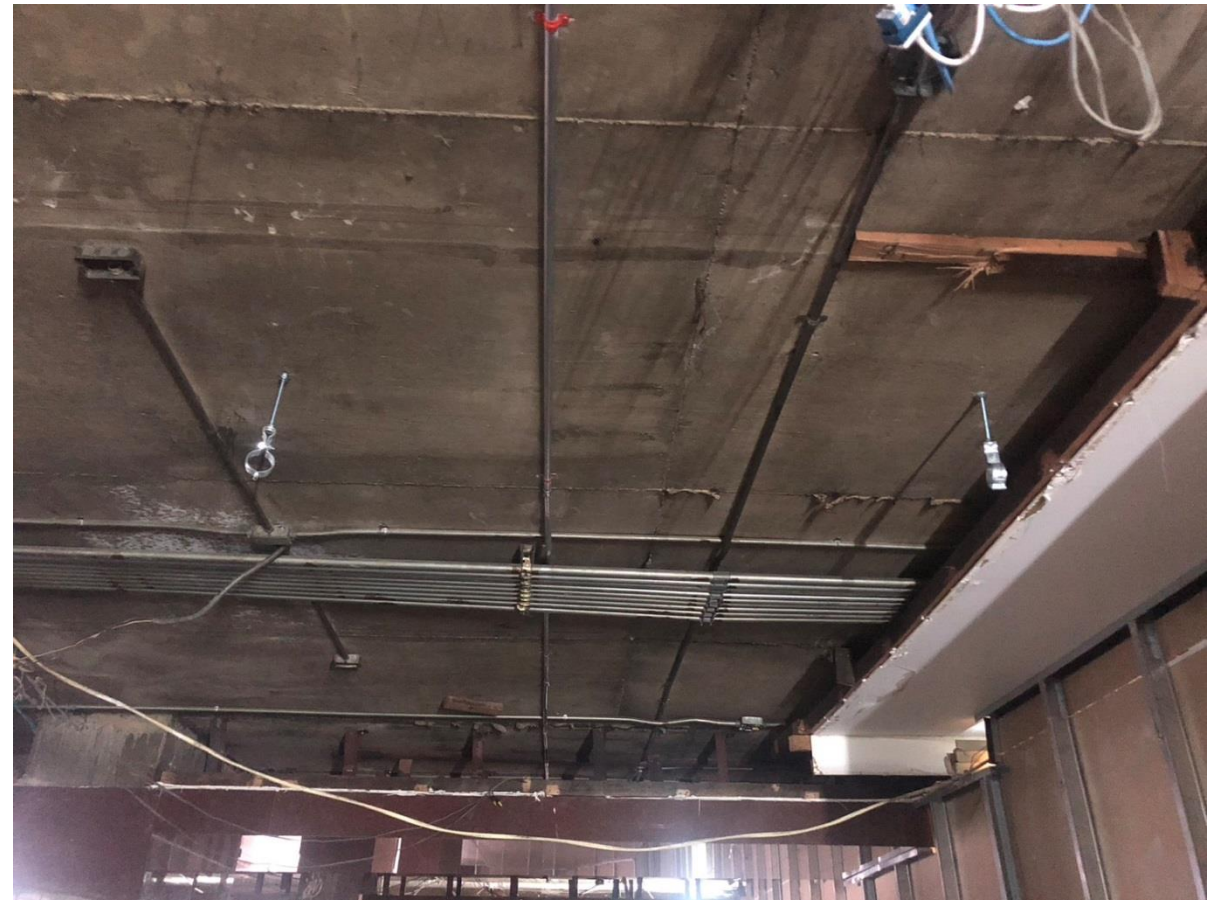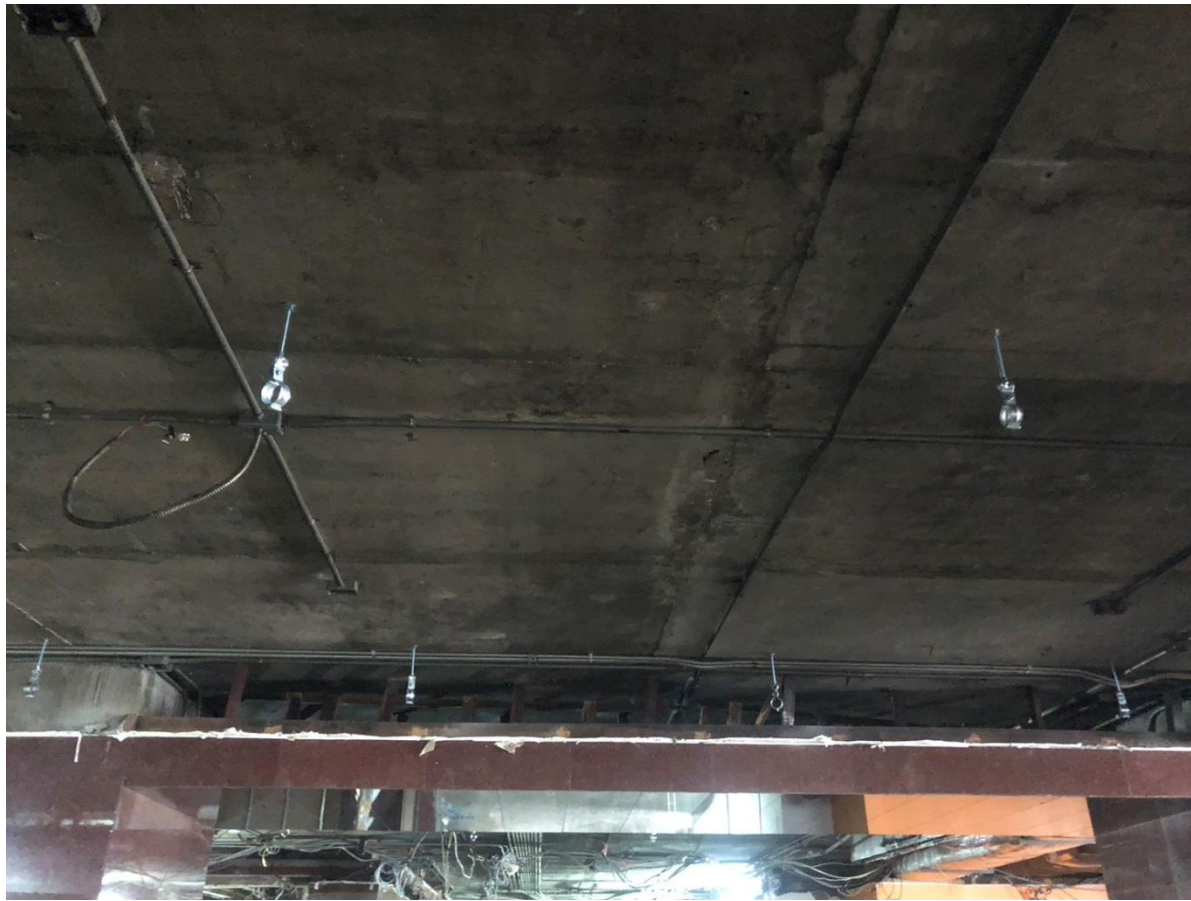

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งซัพพอร์ตสำหรับท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

