



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT


**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

11 May 2023

แผนงาน 3 Week KRUNGTHEP WING


แผนงาน 3 Week SIAM WING

ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II

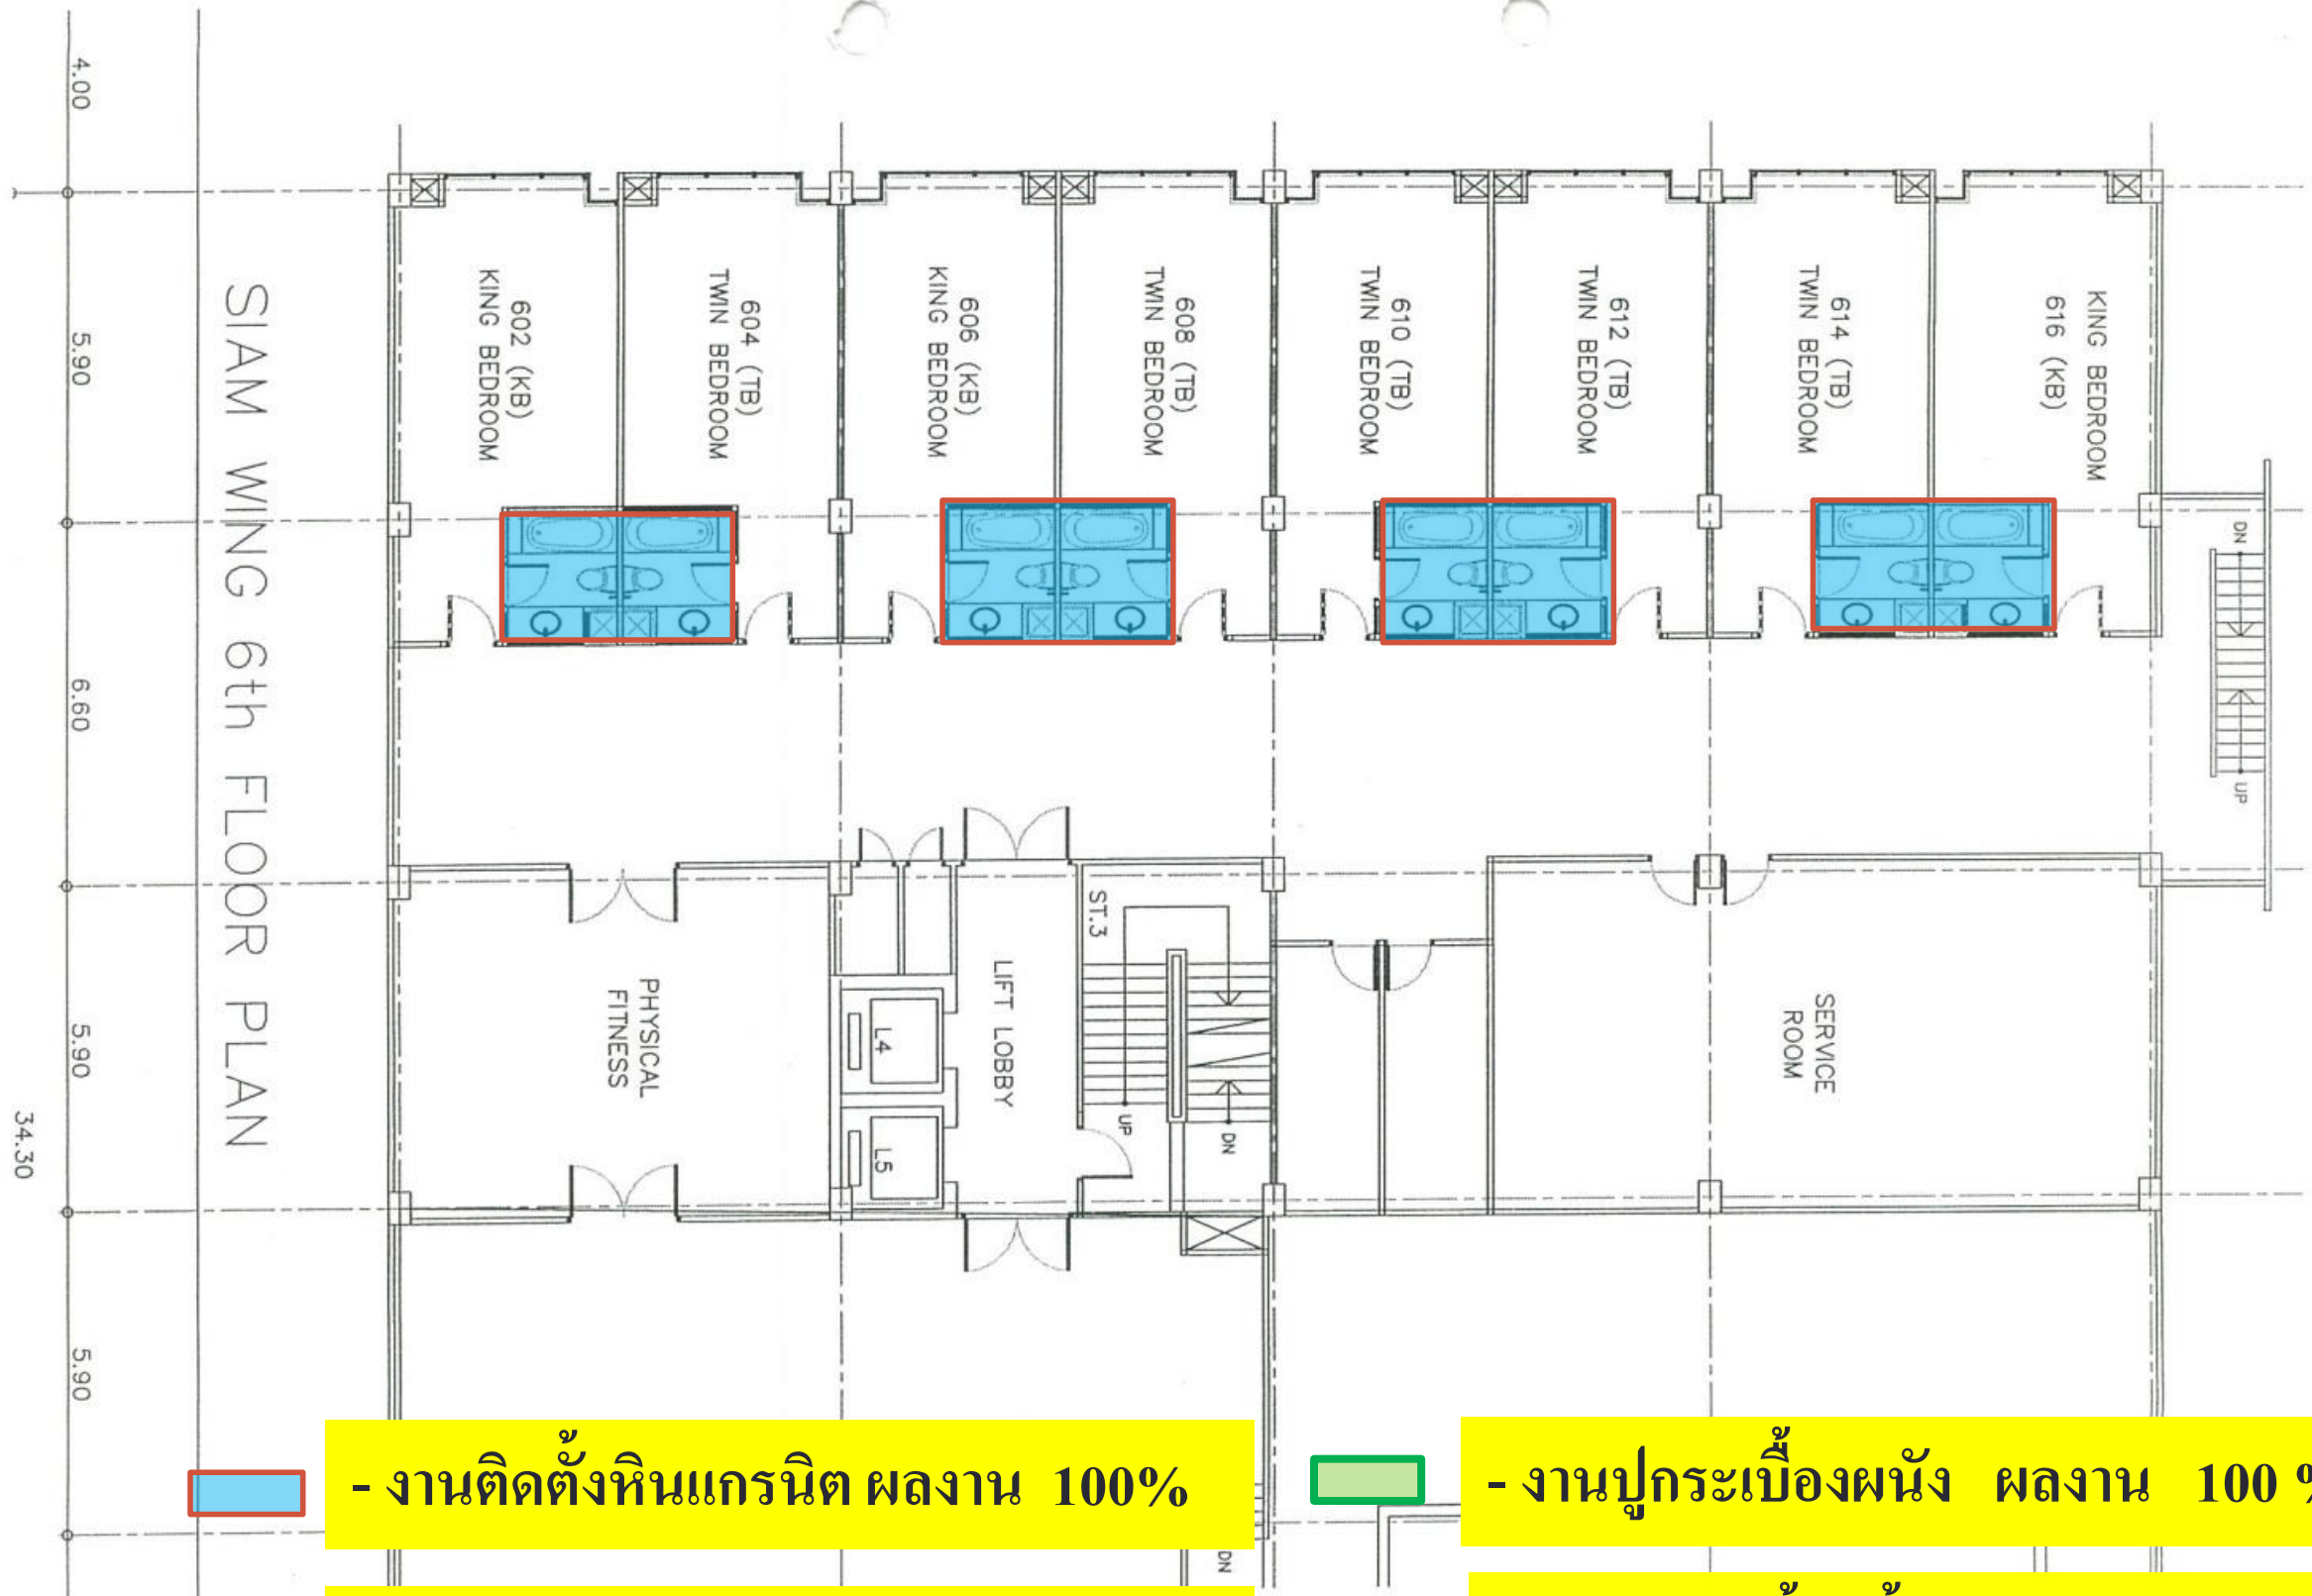

6 FL.


7th FLOOR PLAN

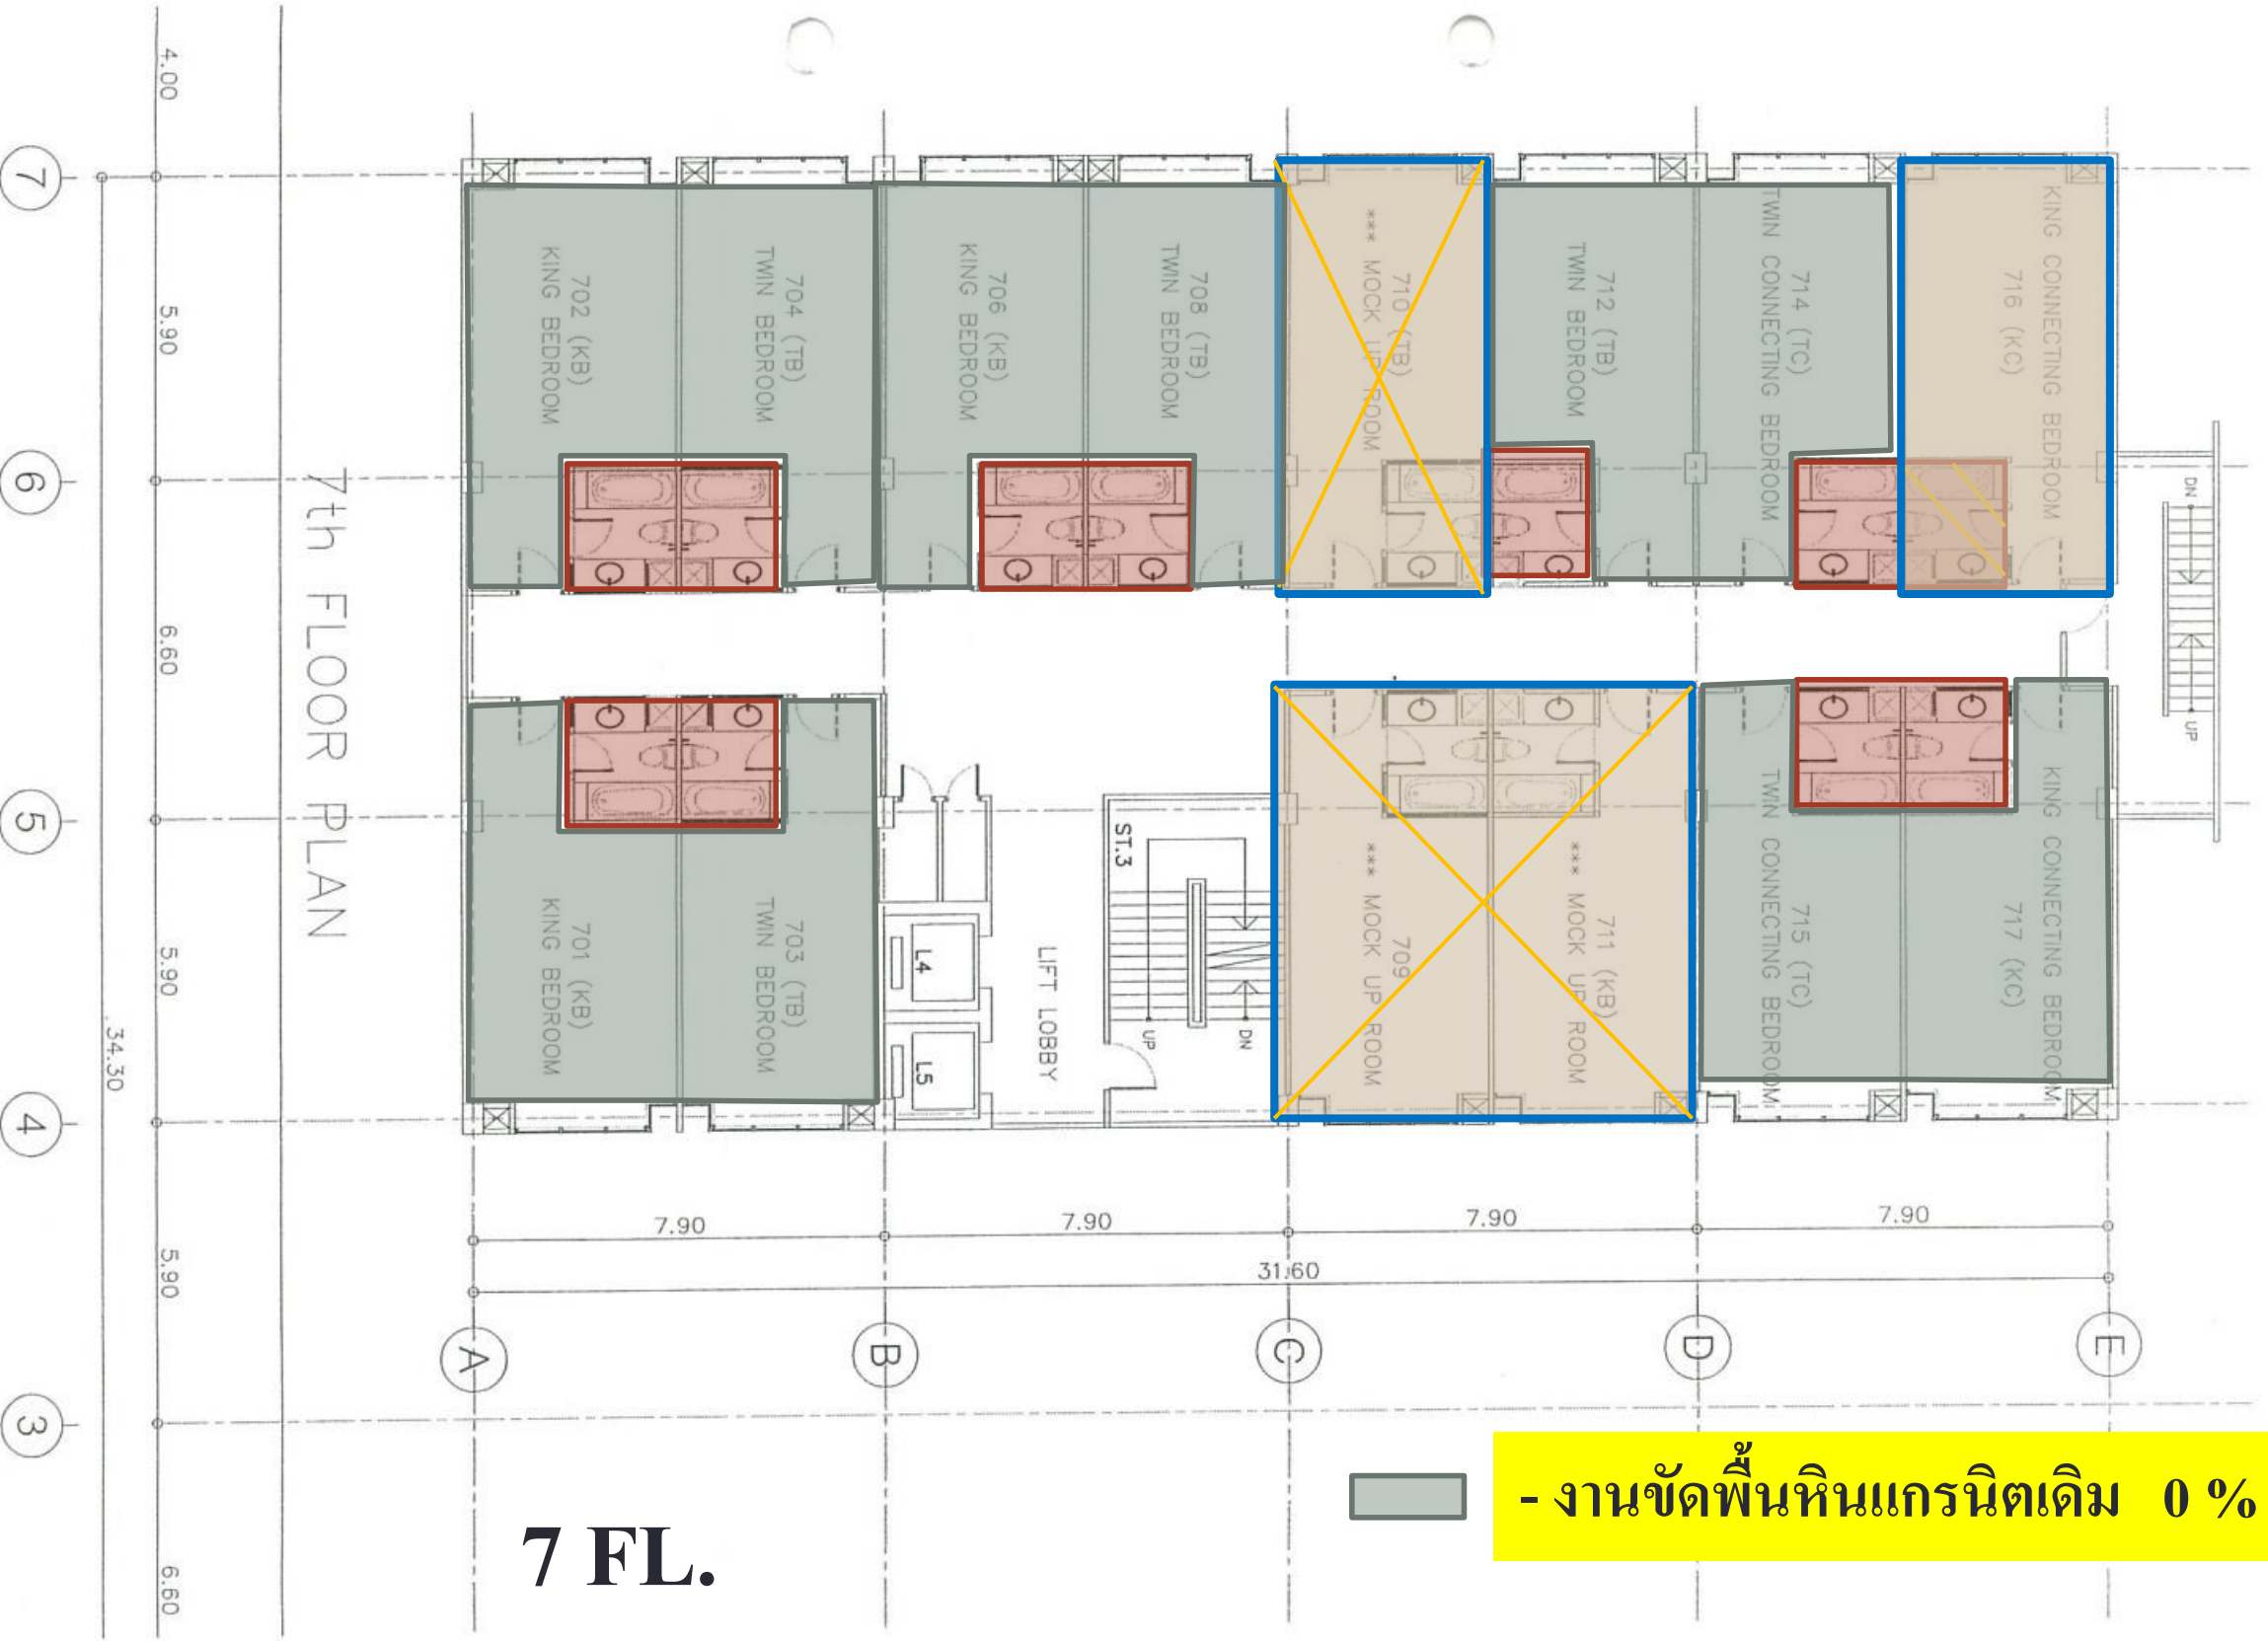

7 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %

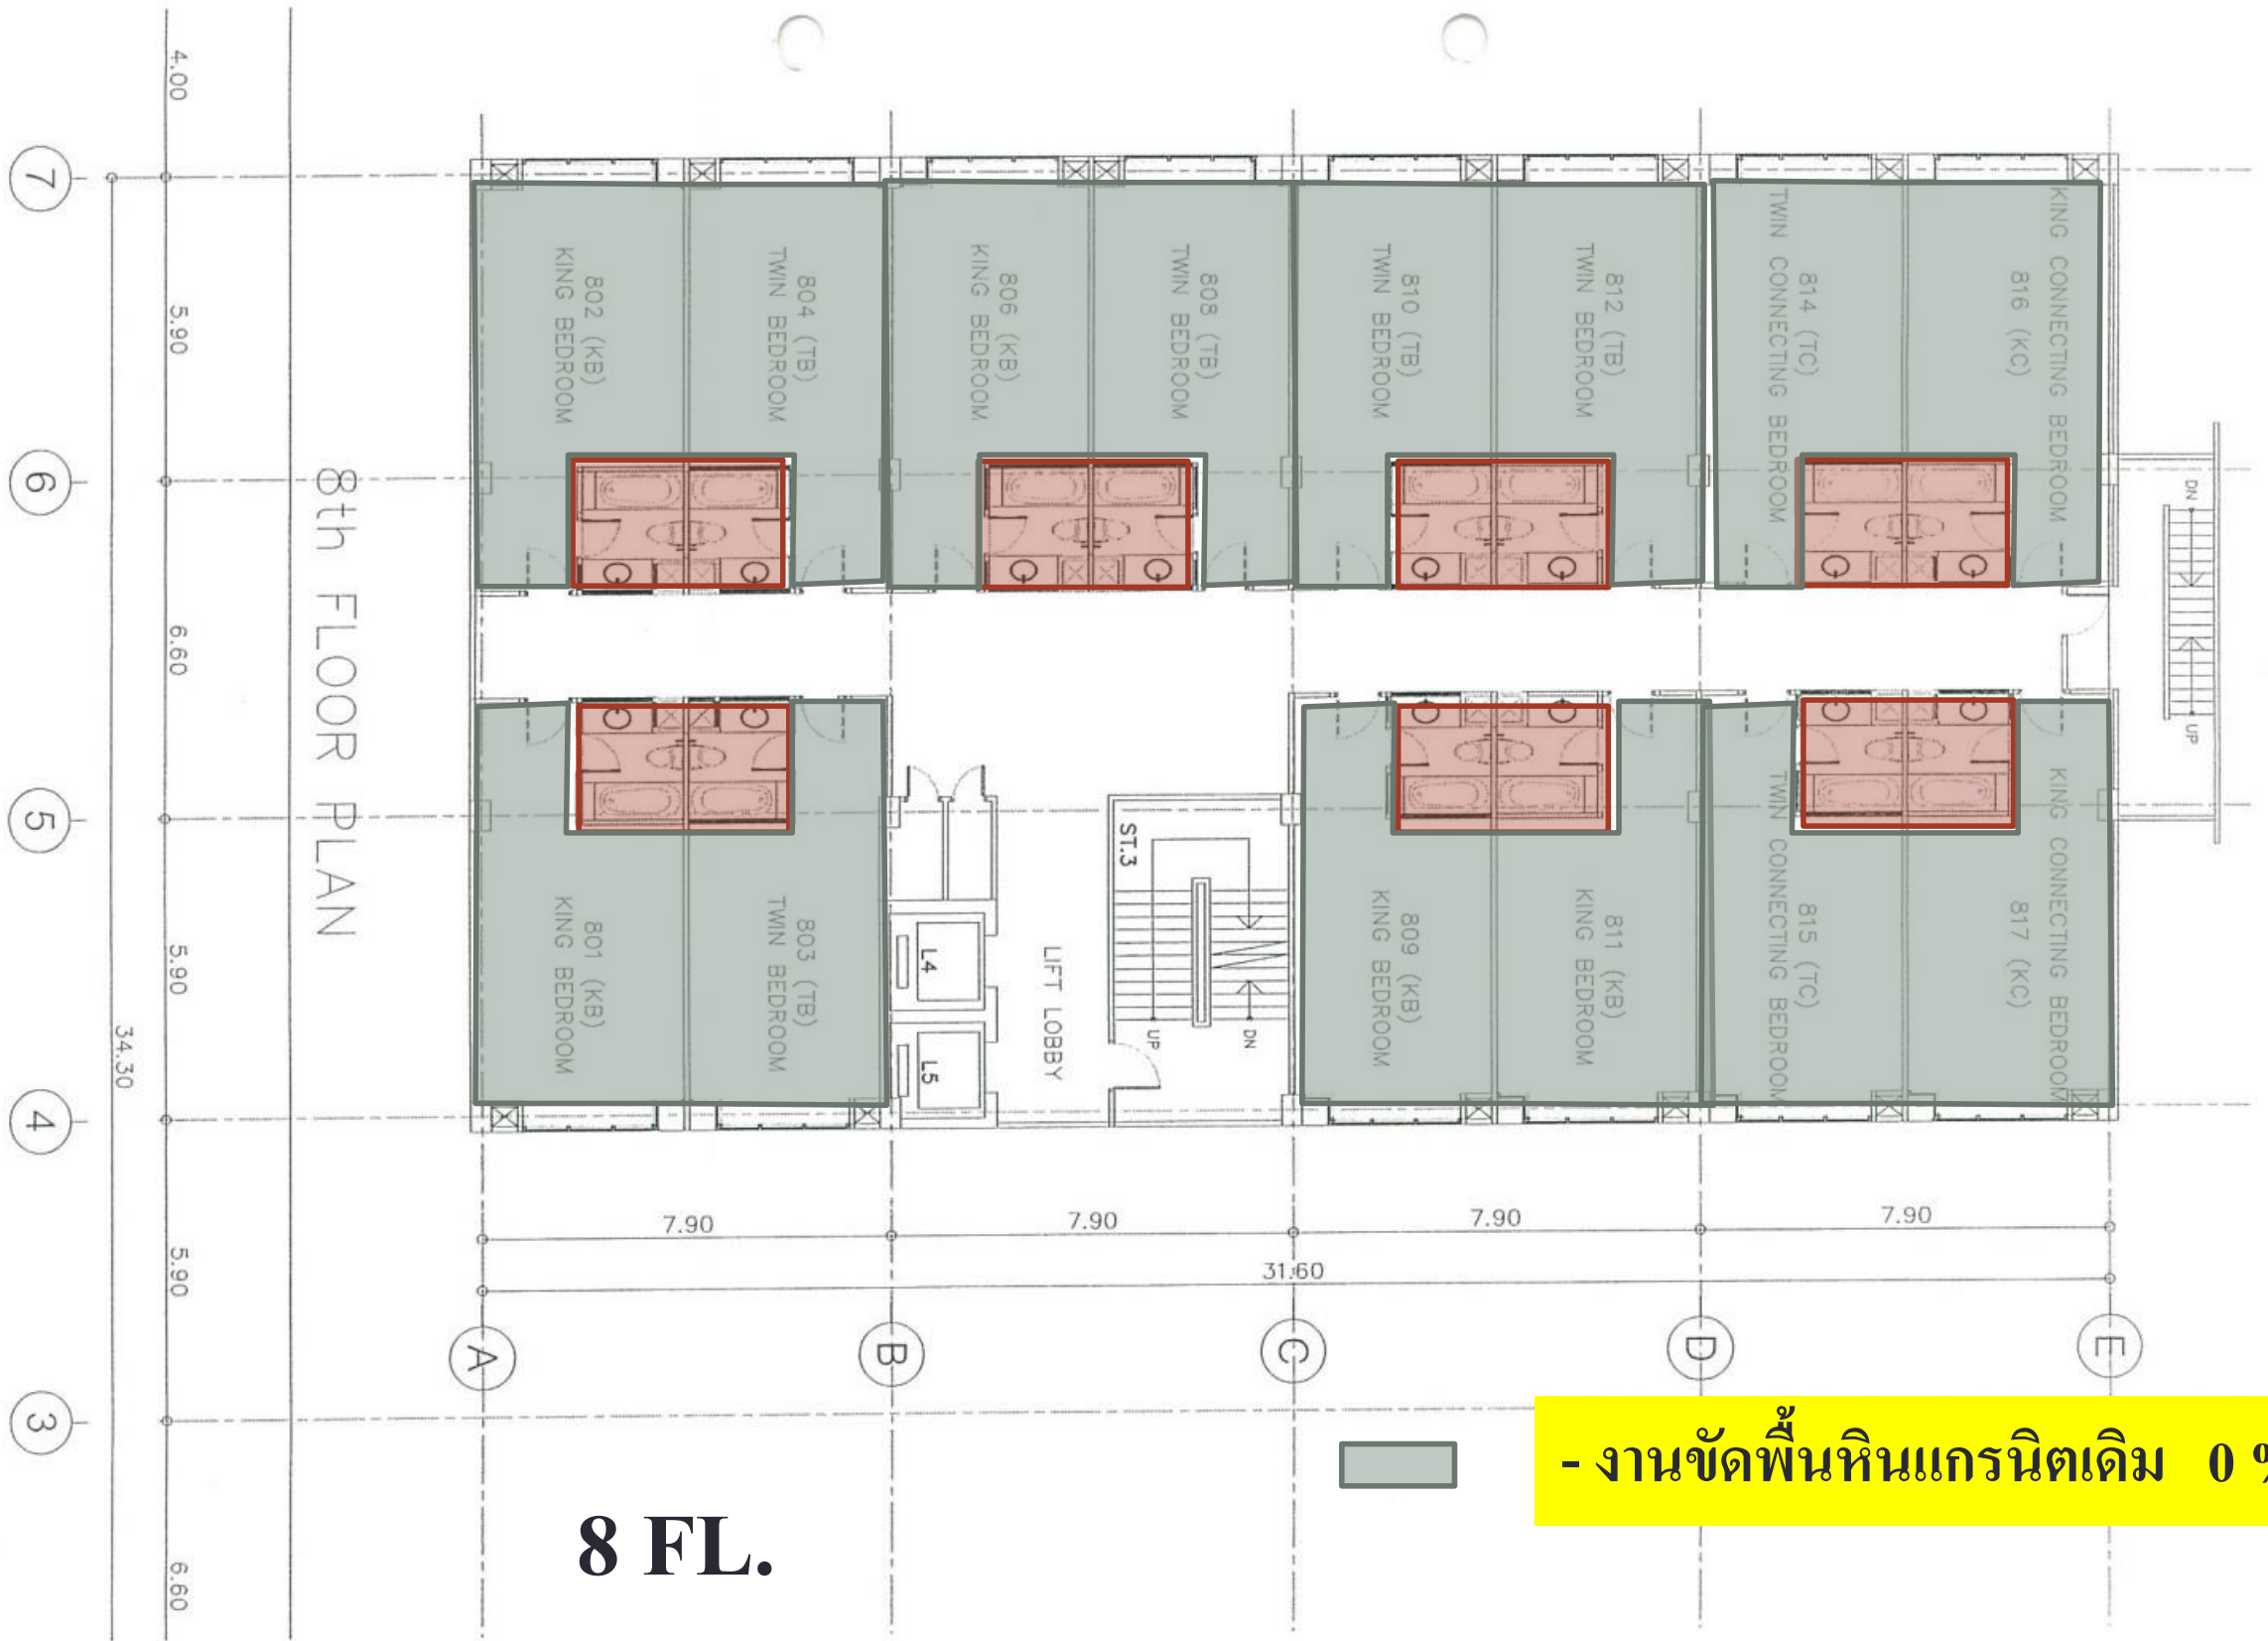

8 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %


SIAM WING 9th FLOOR PLAN

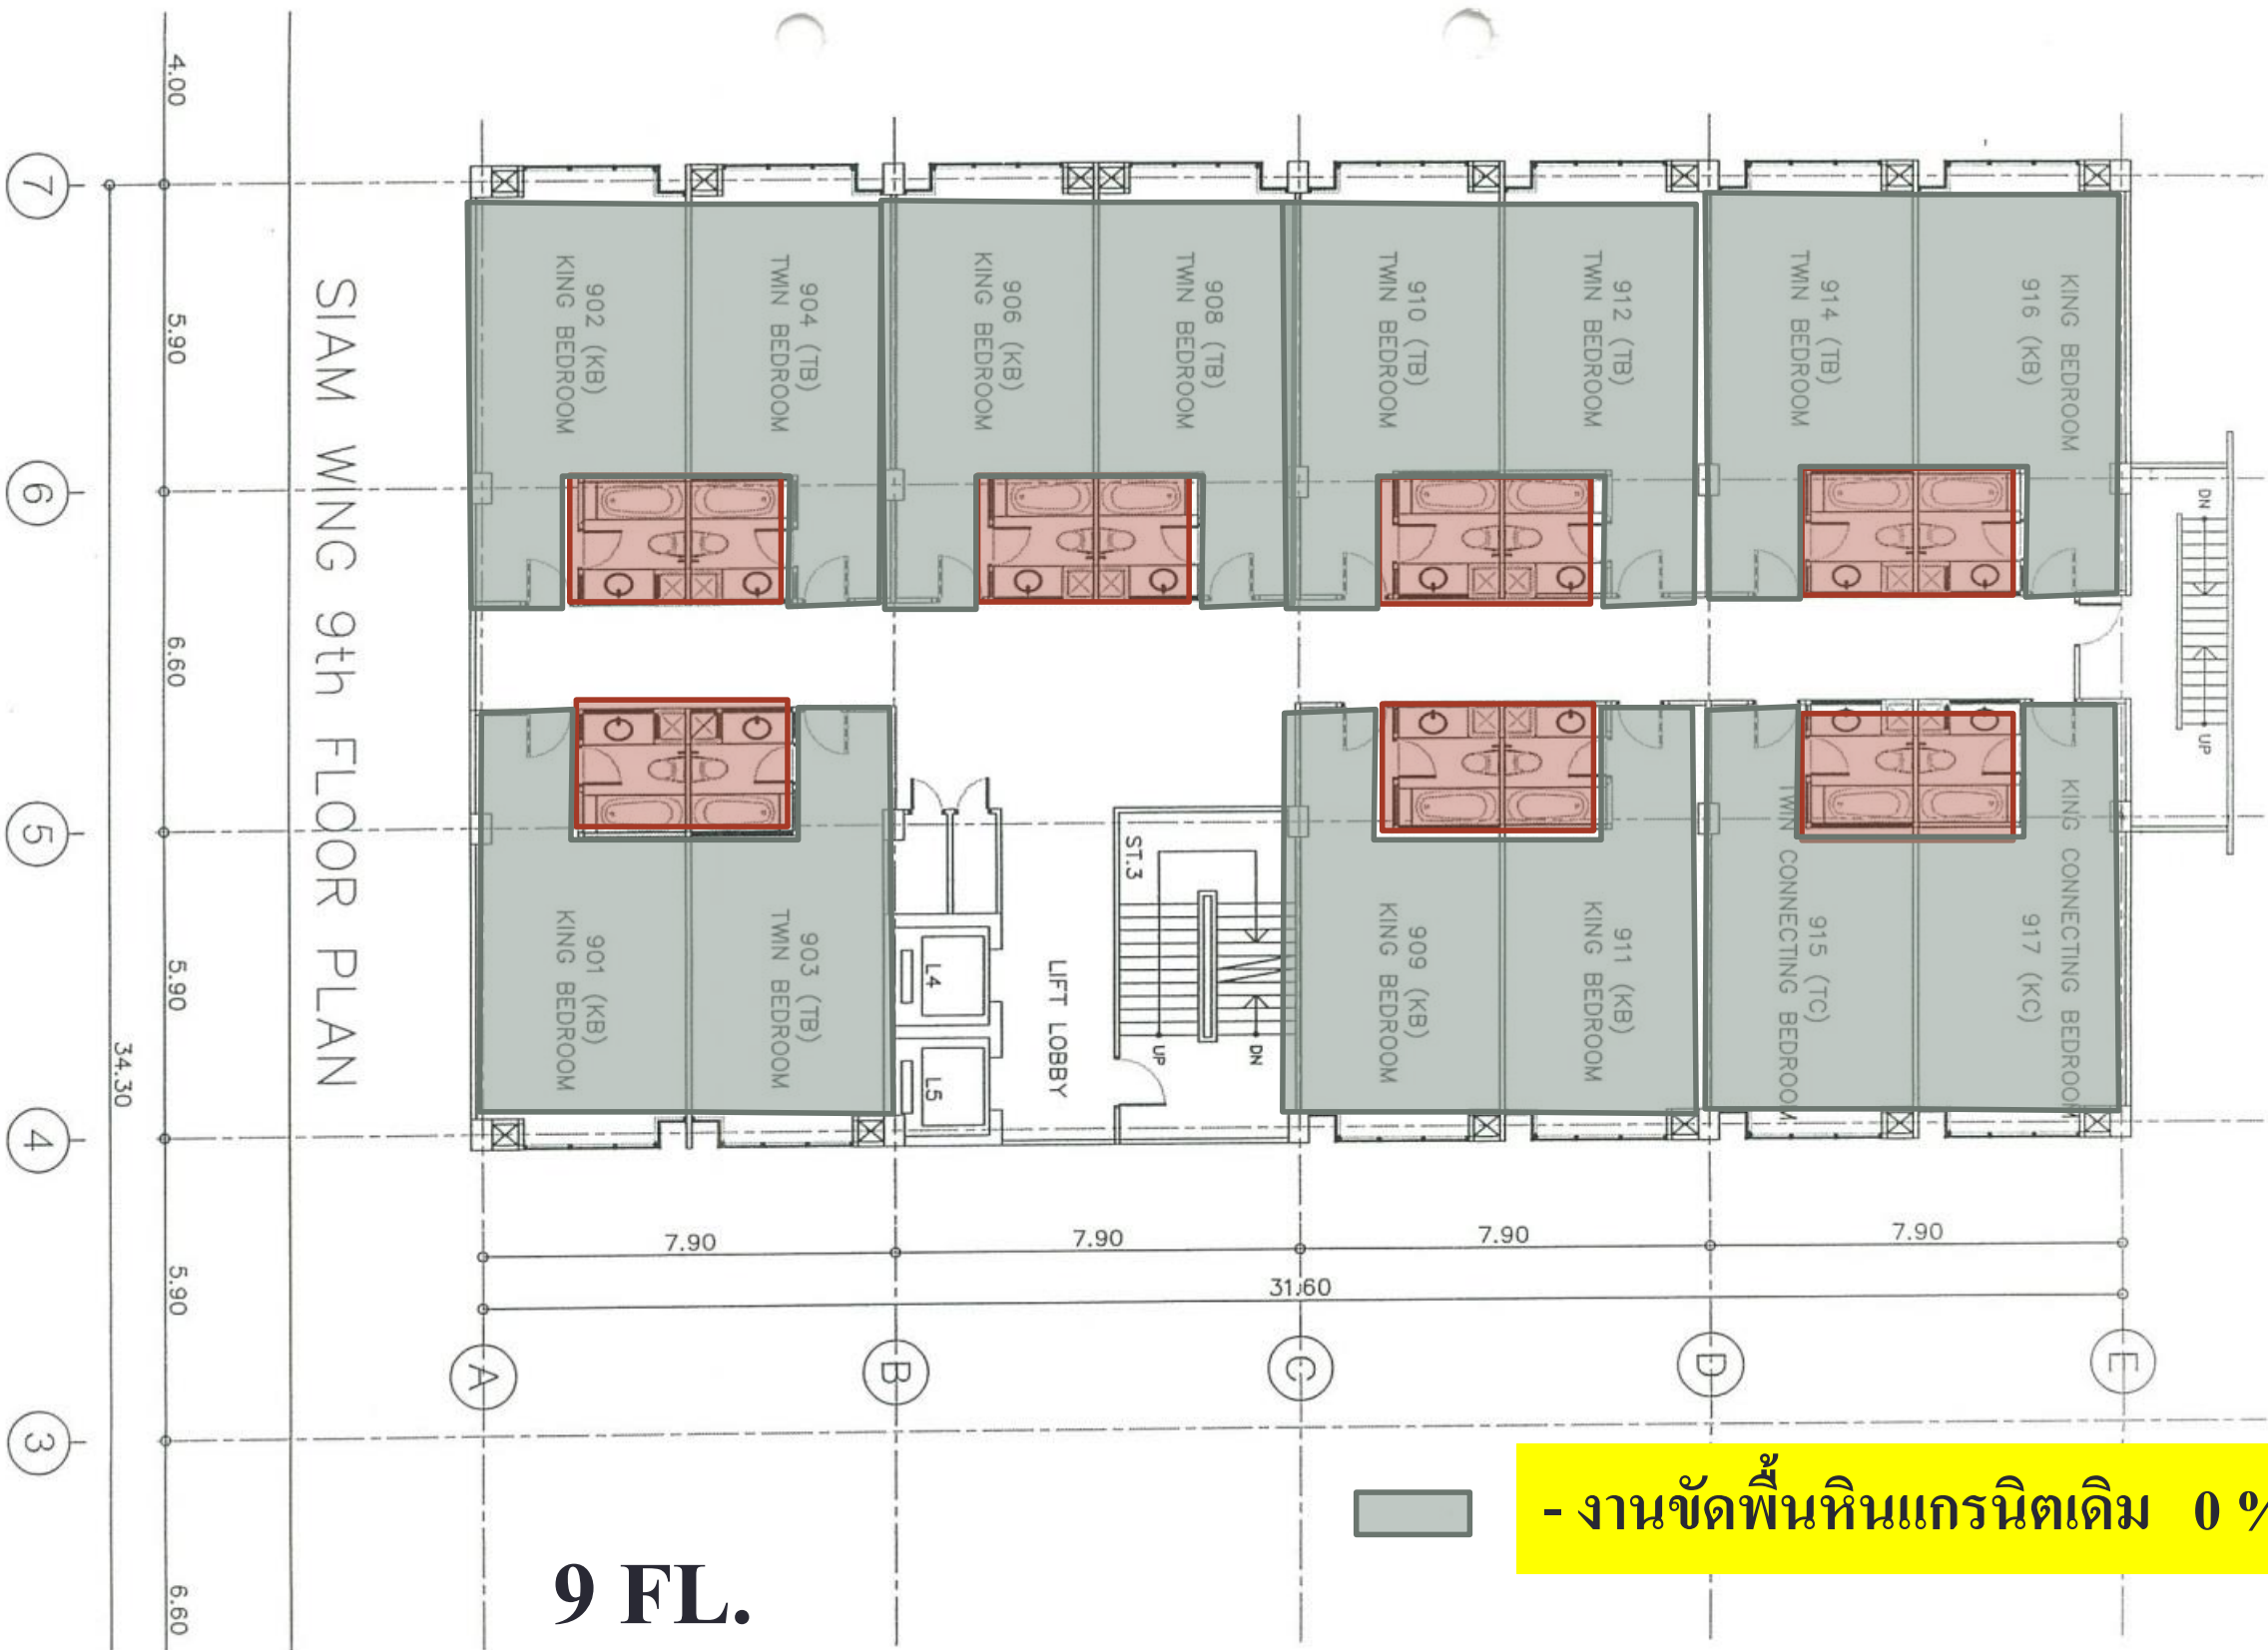


9 FL.



- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %

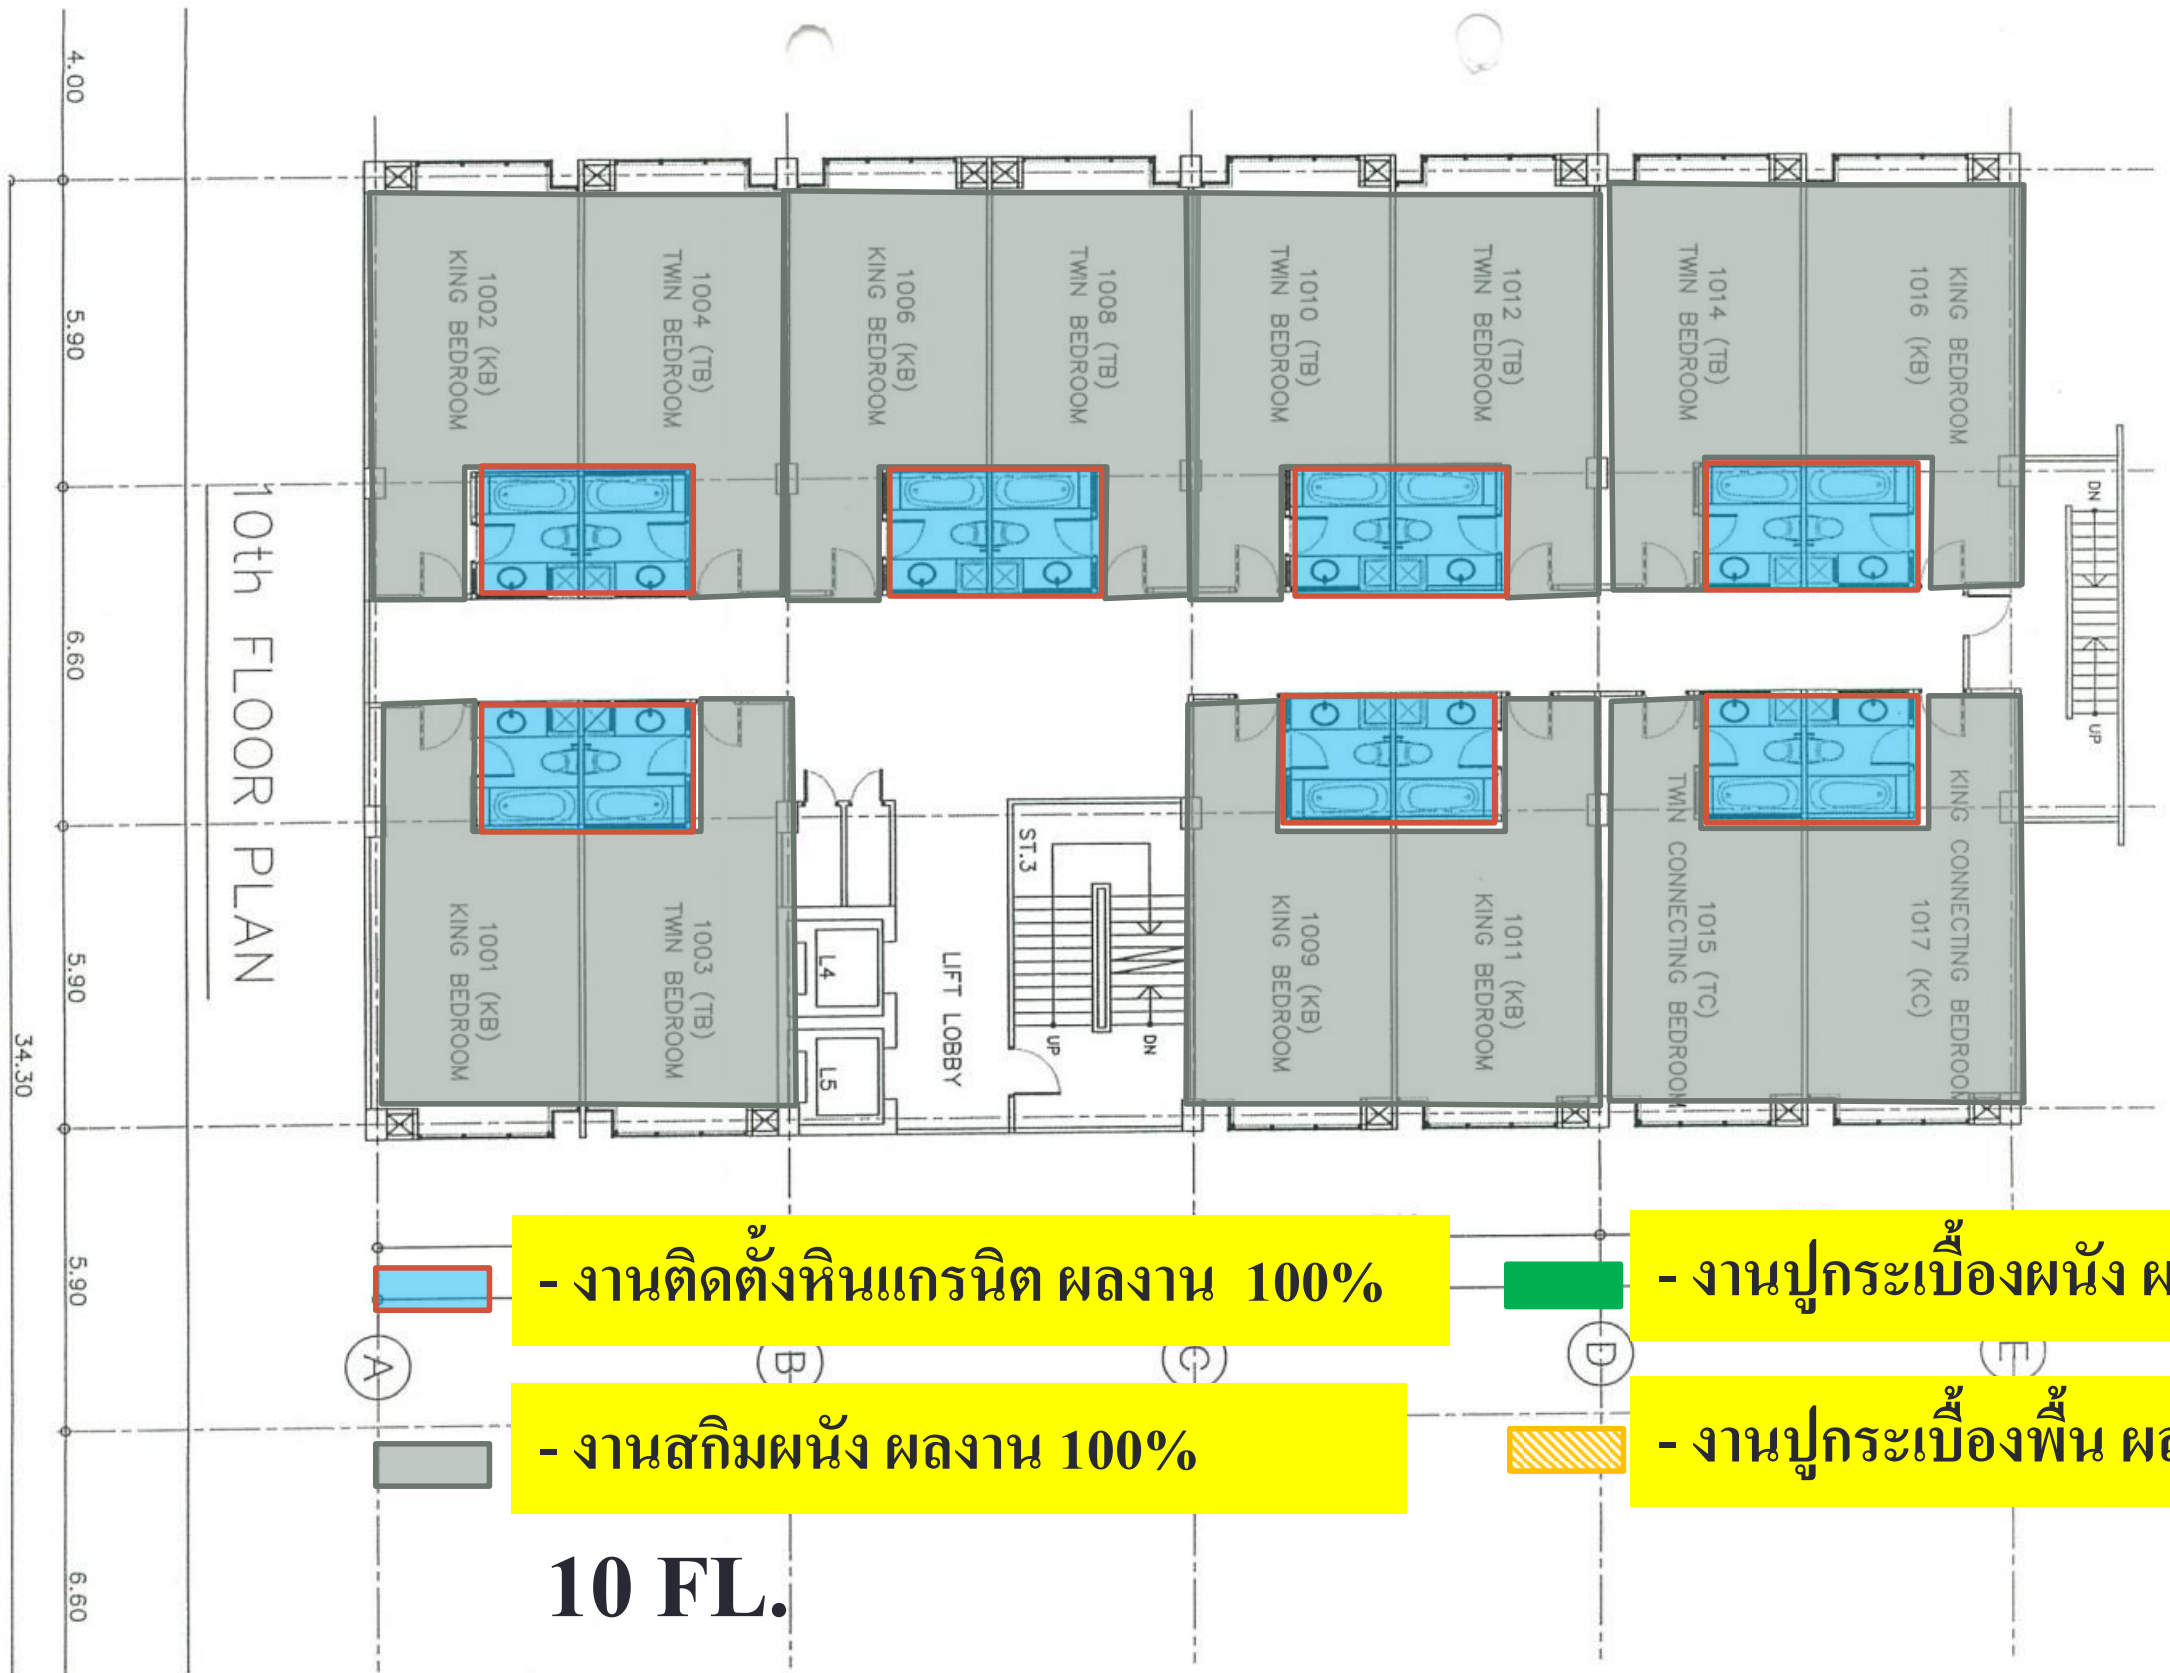

10 FL.

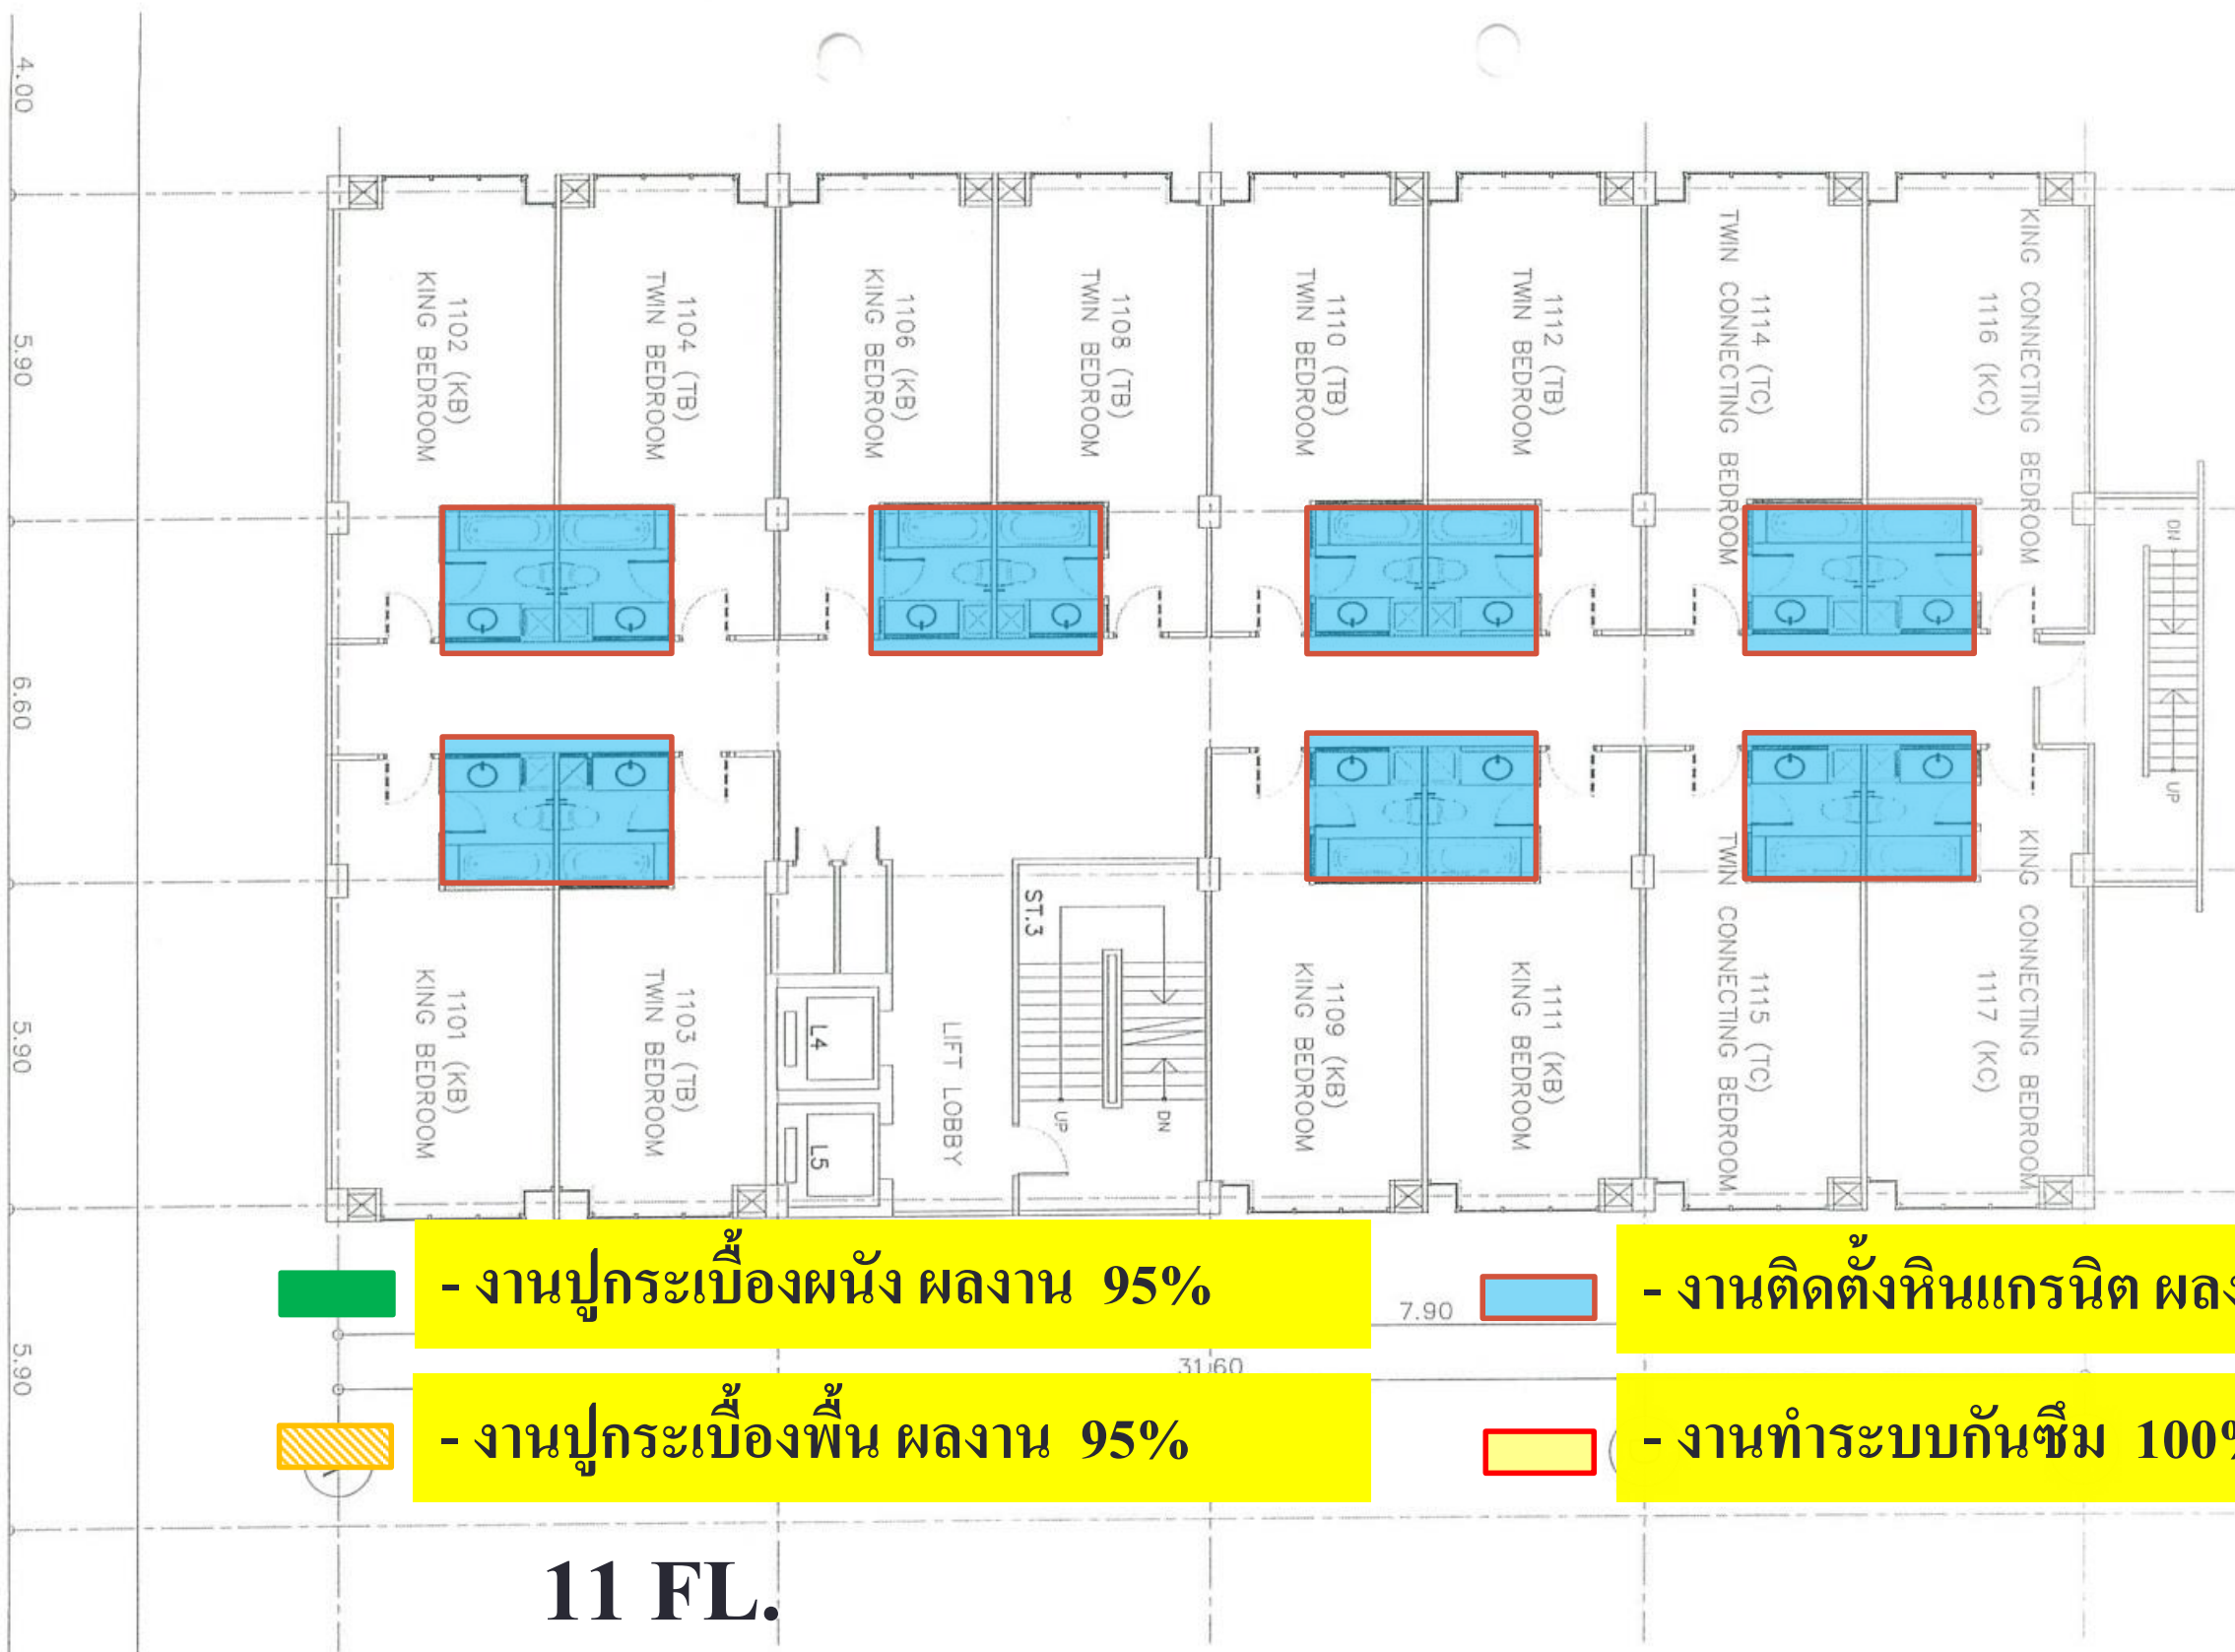

 - งานปูกระเบื้องผนัง ผลงาน 95%

 - งานปูกระเบื้องพื้น ผลงาน 95%

 - งานติดตั้งหินแกรนิต ผลงาน 100%


 - งานทำระบบกันซึม 100%

11 FL.



- - งานปูกระเบื้องผนัง ผลงาน 70 %
- - งานปูกระเบื้องพื้น ผลงาน 50%
- - งานฉาบผนังผลงาน 100%
- - งานทำระบบกันซึม 100%

12 FL.

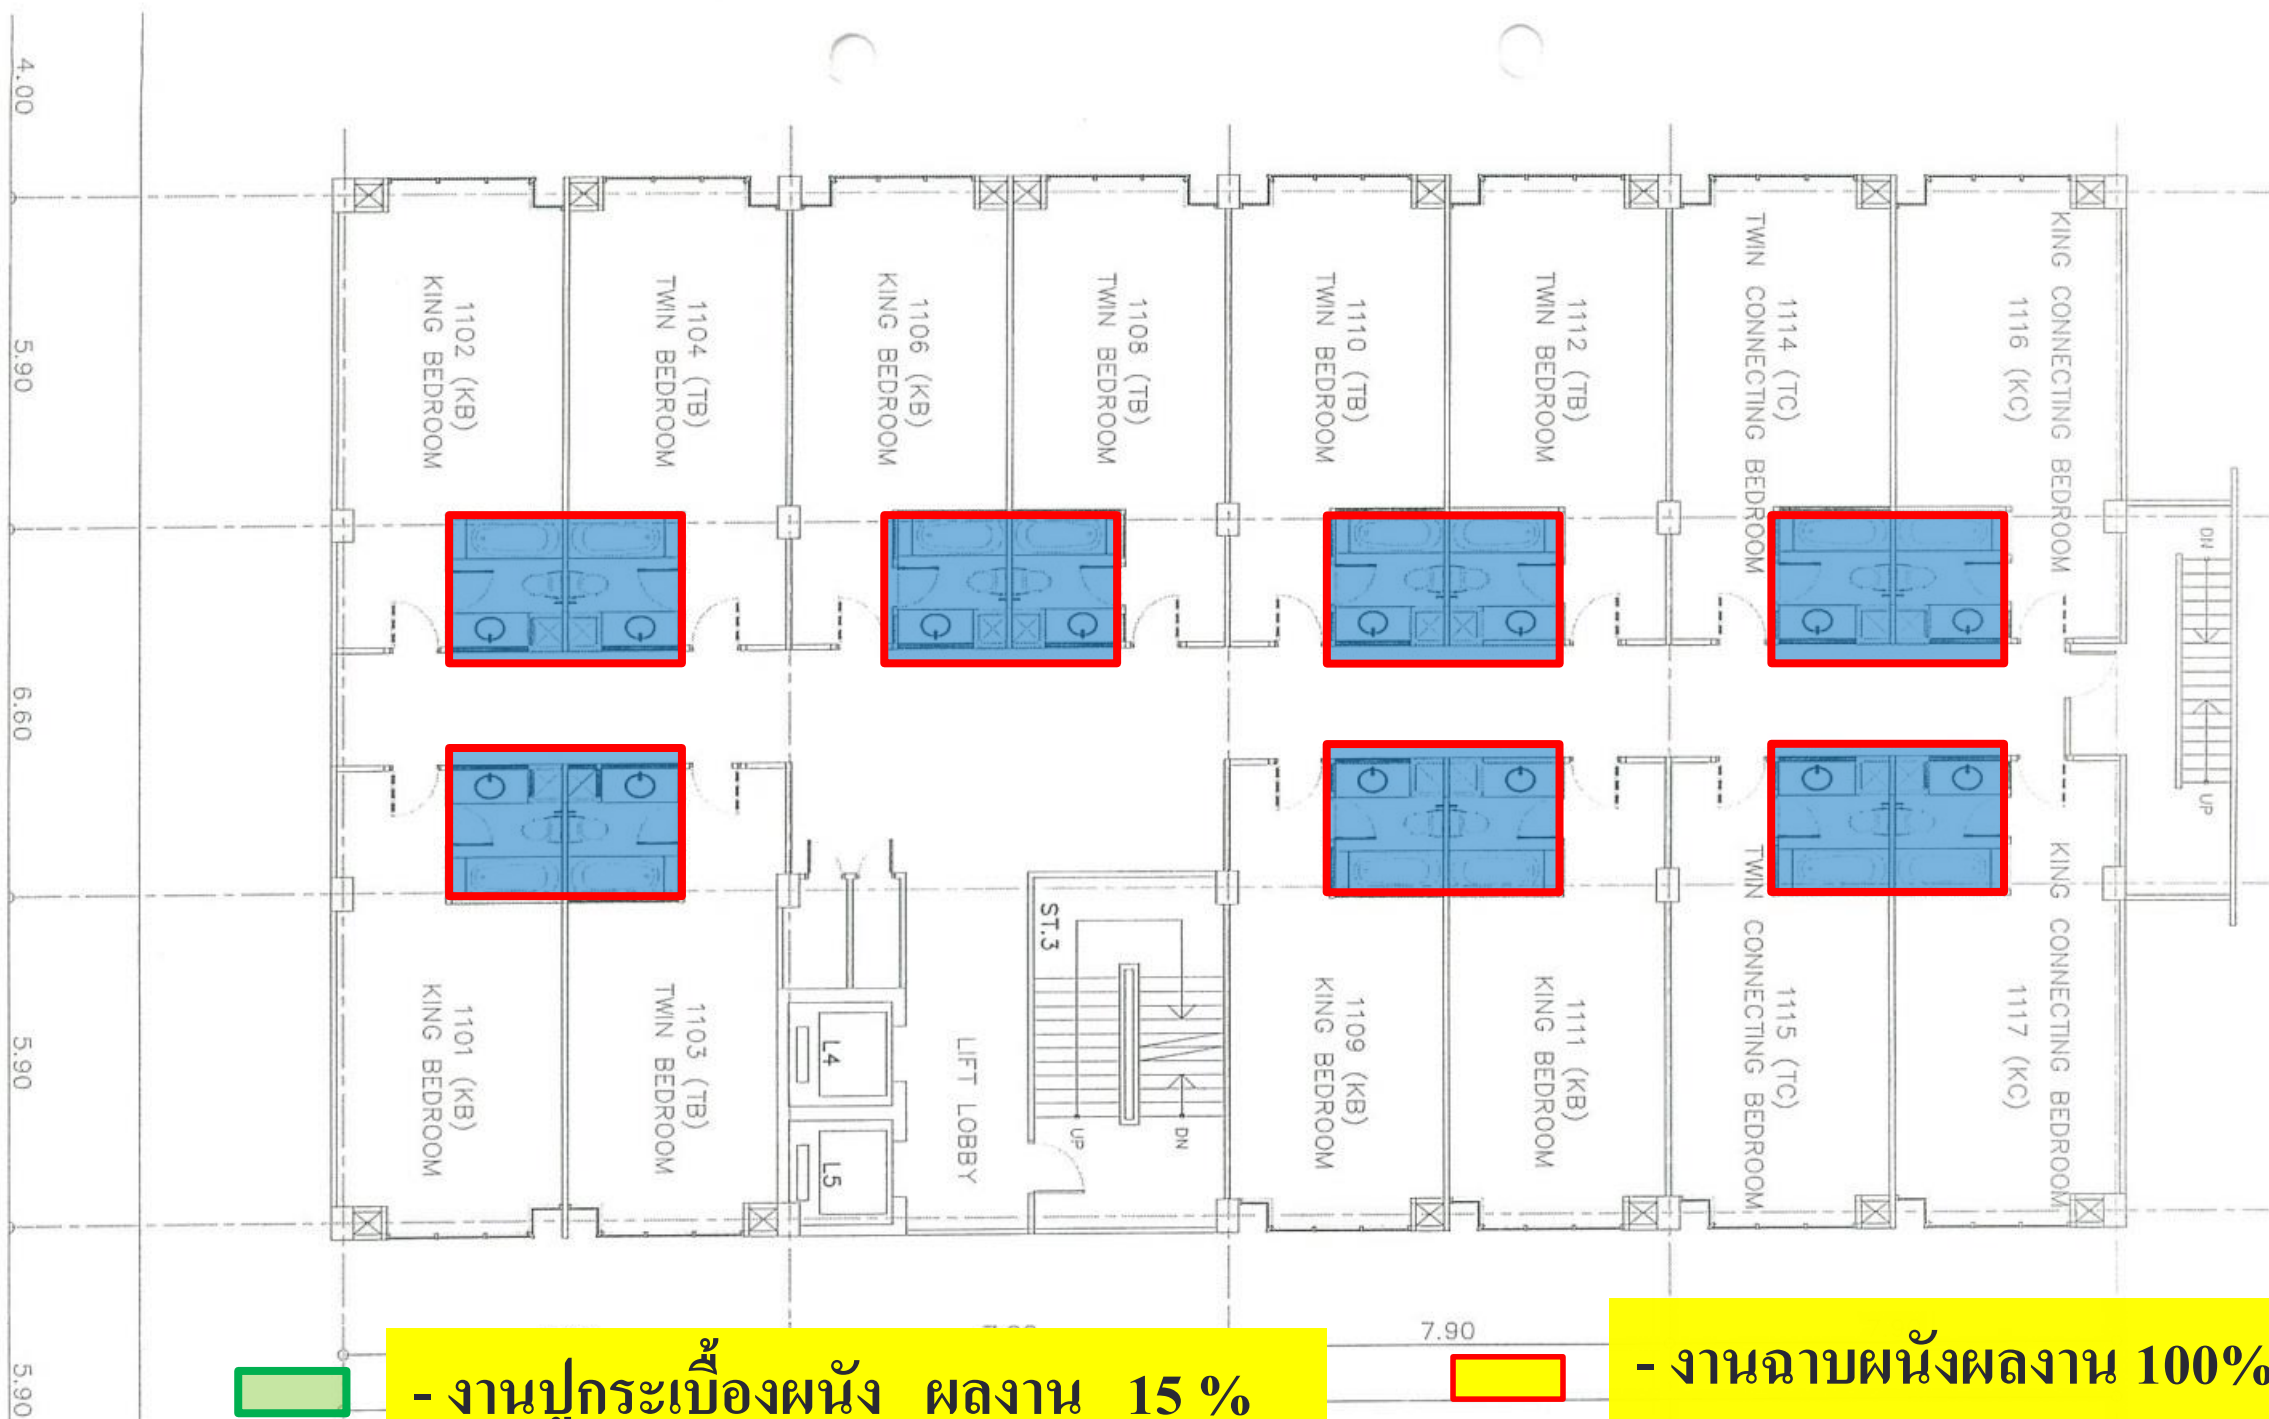

- งานปูกระเบื้องผนัง ผลงาน 15 %



- งานปูกระเบื้องพื้น ผลงาน 0%




- งานฉาบผนังผลงาน 100%



- งานทำระบบกันซึม 80%

14 FL.

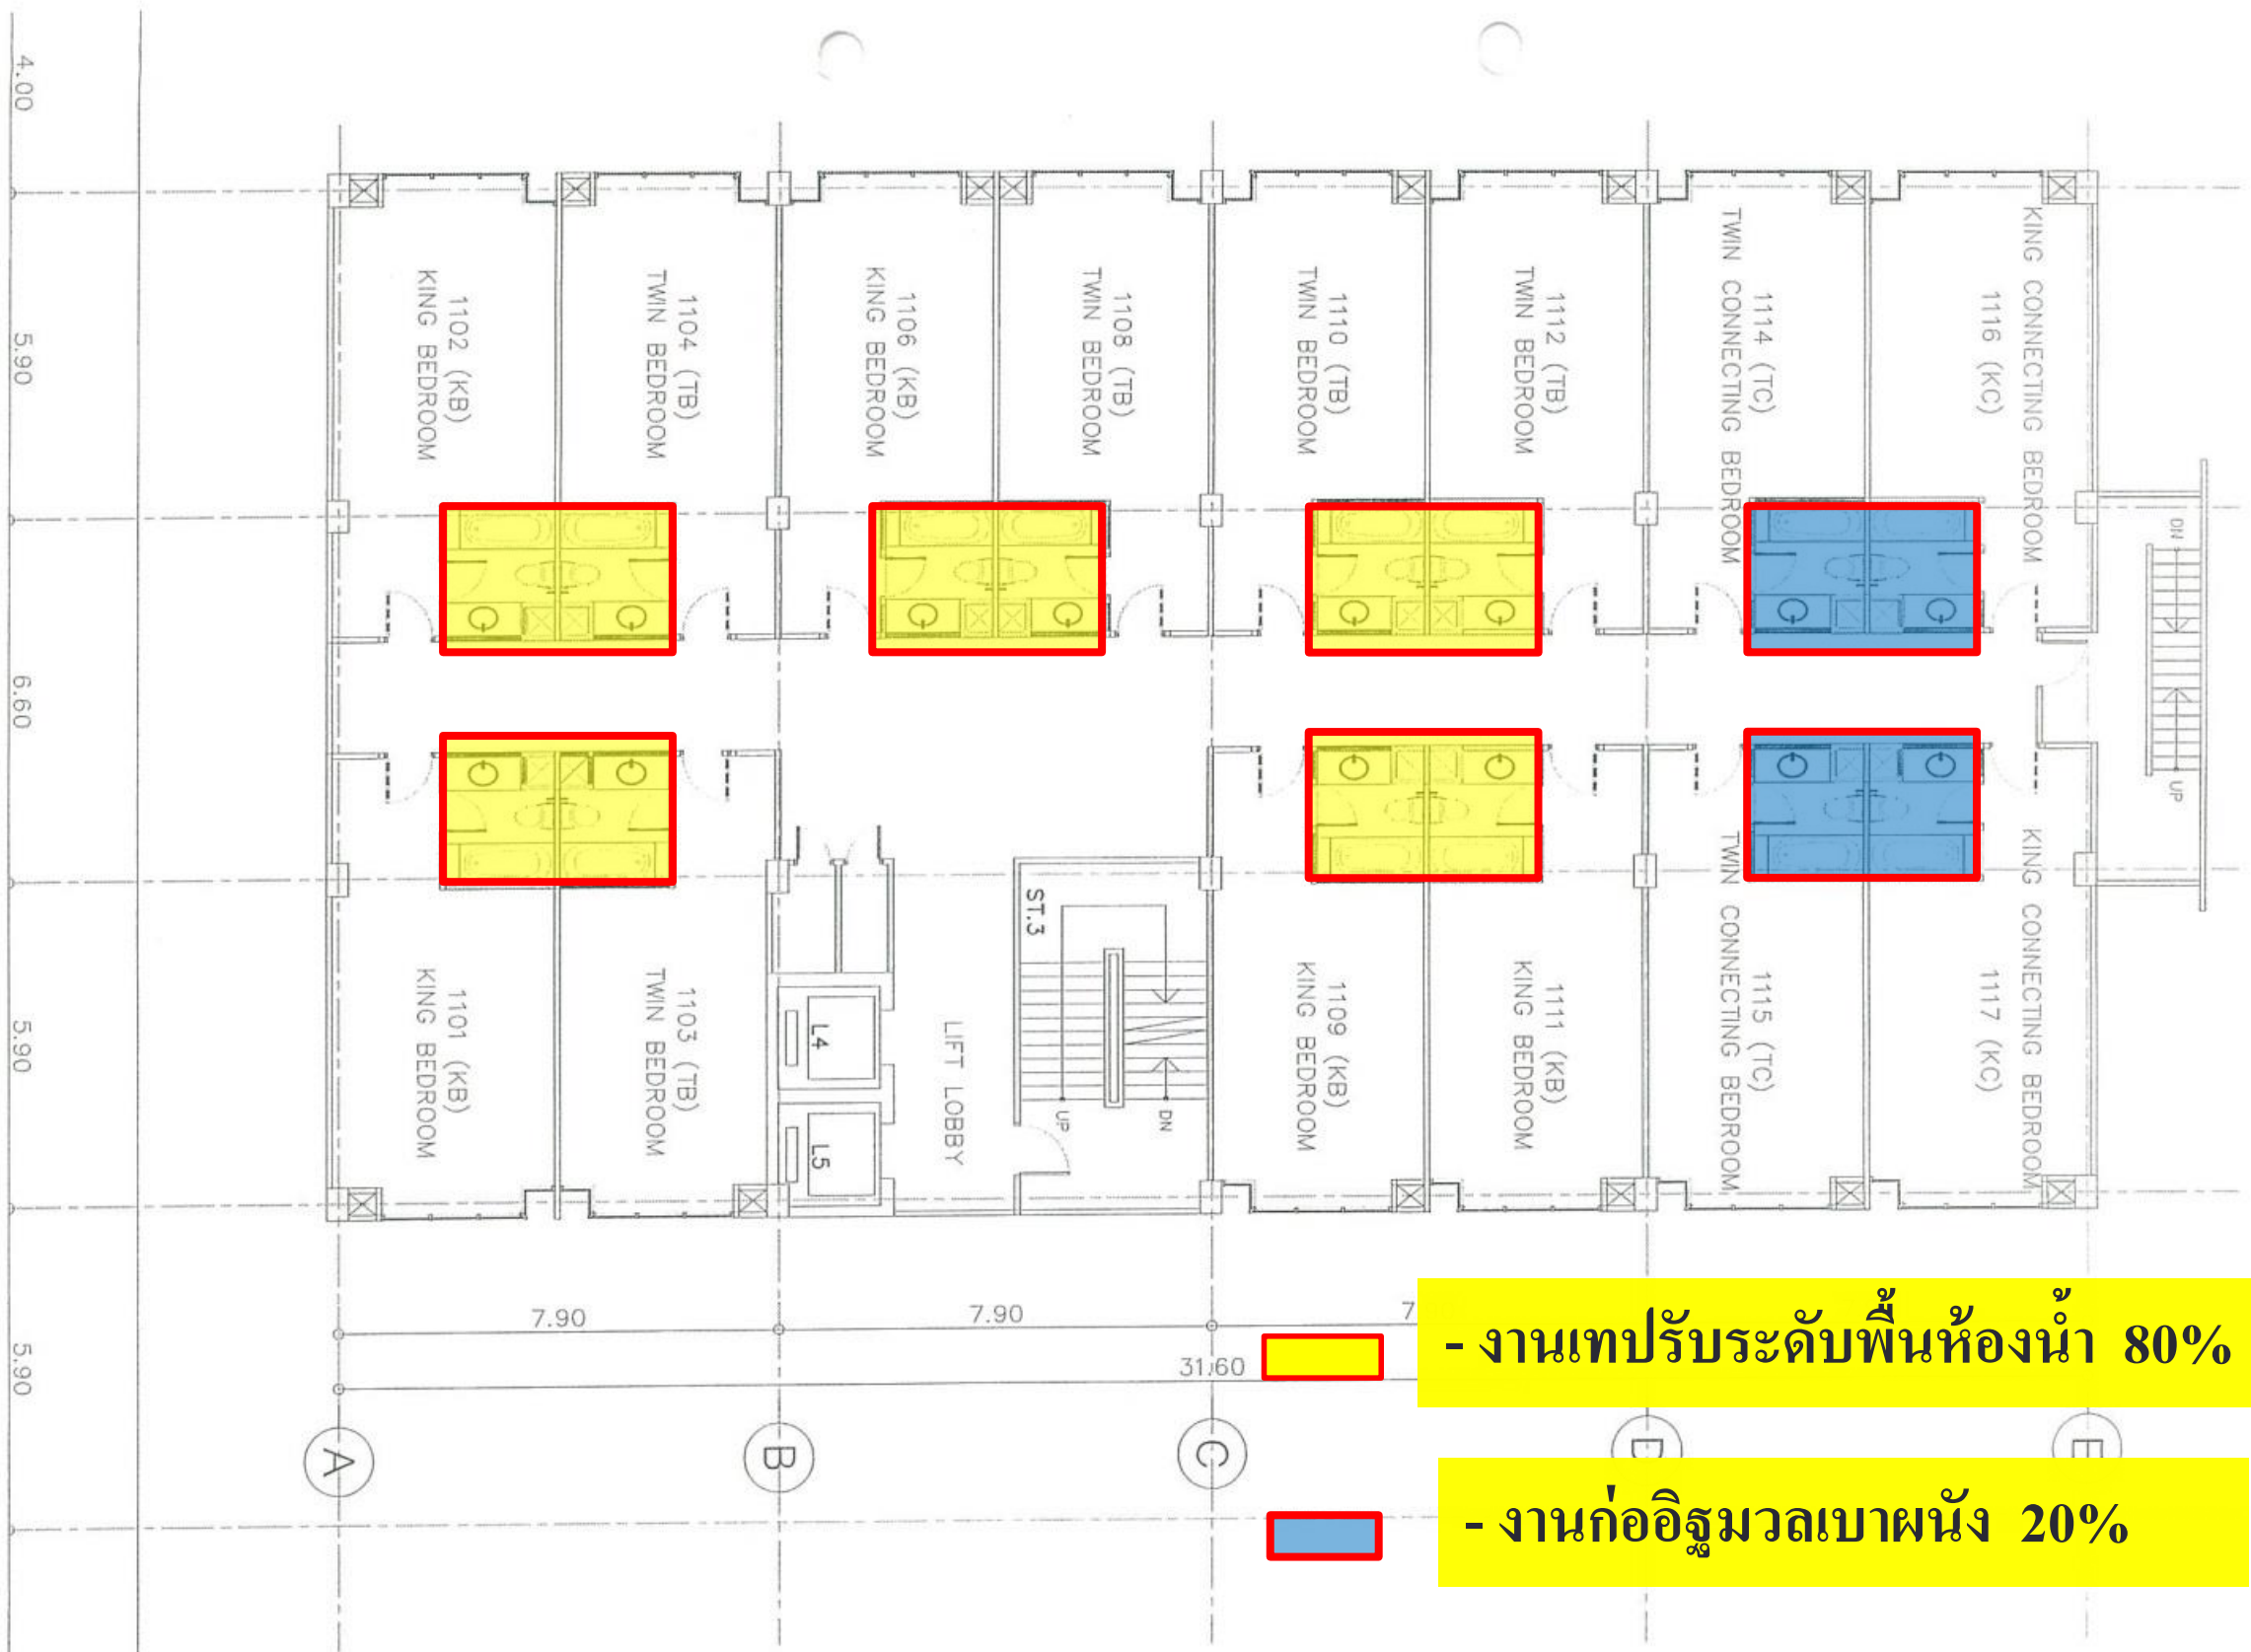

- งานเทพรับระดับพื้นห้องน้ำ 80%

- งานก่ออิฐมวลเบาผนัง 20%

15 FL.

ตรวจสอบงานกับทาง NTL

สถานะตรวจสอบงานกับทาง NTL

อาคารกรุงเทพวิงค์

ชั้น	ภายในห้องพัก										ทางเดิน	
	ติดตั้ง Box ไฟ		ทดสอบวงจรไฟ		สปริงเกอร์		ติดตั้งแอร์+ อุปกรณ์	ทดสอบรอยรั่ว ท่อ CHS,CHR	ซ่อมแซมท่อ V,W	ท่อ CW,HW	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบรอยรั่วสปริงเกอร์
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2 (No.20,21)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2 (No.20,21)	ติดตั้งท่อ	ทดสอบรอยรั่ว						
7	8-Oct , 14 -Nov-65	20-Jan-66	19,25-Nov-65	21-Jan-66	28-Dec-65	15-Jan-66	28-Dec-65	21-Dec-65	19-Nov-65	15-Dec-65	19-Jan-66	15-Jan-66
8	9,14-Nov-65	23-Jan-65	25-Nov,1-Dec-65	23-Jan-66	28-Dec-65	12-Jan-66	28-Dec-65	23-Dec-65	25-Nov-65	2-Dec-65	16-Jan-66	12-Jan-66
9	4,14-Nov-65	28-Nov,8-Dec-65	9-Dec-65	8,12-Dec-65	28-Dec-65	26-Dec-65	28-Dec-65	23-Dec-65	22-Nov-65	28-Nov-65	16-Jan-66	26-Dec-65
10	11,15-Nov-65	6-Feb-66	2-Dec-65	14-Feb-66	4-Jan-66	15-Feb-66	7-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	7-Jan-66	14-Feb-66	15-Feb-66
11	12,15-Nov-65	6-Feb-66	30,26-Dec-65	14-Feb-66	4-Jan-66	15-Feb-66	11-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	26-Nov-65	27-Jan-66	15-Feb-66
12	21-Nov,12-Dec-65	2-Feb-66	21-Dec-65	2-Feb-66	4-Dec-66	15-Feb-66	11-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	21-Feb-66	13-Feb-66	15-Feb-66
14	14,25-Nov-65	23-Feb-66	22-Dec-65	2-Mar-66	7-Feb-66	6-Mar-66	7-Feb-66	3-Feb-66	25-Feb-66	25-Feb-66	9-Feb-66	6-Mar-66
15	16-Nov-65	23-Feb-66	30-Nov-65	2-Mar-66	10-Feb-66	6-Mar-66	22-Feb-66	3-Feb-66	1-Mar-66	1-Mar-66	27-Feb-66	6-Mar-66
16	24,29-Nov-65	17-Feb-66	21-Dec-65	22-Feb-66	10-Mar-66	7-Mar-66	24-Feb-66	4-Feb-66	4-Mar-66	4-Mar-66	27-Feb-66	7-Mar-66
17	13-Dec-65	23-Feb-66	23-Jan-66	2-Mar-66	10-Mar-66	7-Mar-66	24-Feb-66	31-Jan-66	9-Mar-66	9-Mar-66	27-Feb-66	7-Mar-66
18	13-Dec-65	23-Feb-66	11-Jan-66	7-Mar-66	5-Apr-66	28-Mar-66	14-Mar-66	2-Feb-66	10-Mar-66	10-Mar-66	25-Mar-66	28-Mar-66
19	23-Dec-65	23-Mar-66	29-Jan-65	24-Mar-66	7-Apr-66	28-Mar-66	14-Mar-66	4-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	8-Mar-66	28-Mar-66
20	23-Dec-65	7-Mar-66	6-Feb-66	11-Mar-66	7-Apr-66	10-Apr-66	14-Mar-66	20-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	8-Mar-66	10-Apr-66
21	23-Dec-65	7-Mar-66	6-Feb-66	11-Mar-66	18-Apr-66	13-Apr-66	14-Mar-66	26-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	13-Mar-66	13-Apr-66
22	25-Jan-66	26-Apr-66	16-Feb-66	27-Apr-66	21-Apr-66	20-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	11-Mar-66	11-Mar-66	4-Apr-66	20-Apr-66
23	25-Jan-66	7-Mar-66	16-Feb-66	13-Mar-66	24-Apr-66	23-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	11-Mar-66	11-Mar-66	10-Apr-66	23-Apr-66
24	31-Jan-65	7-Mar-66	14-Feb-66	13-Mar-66	24-Apr-66	15-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	13-Mar-66	13-Mar-66	10-Apr-66	15-Apr-66
25	9-Feb-66		14-Feb-66		24-Apr-66	17-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	13-Mar-66	13-Mar-66	18-Apr-66	17-Apr-66

สถานะตรวจสอบงานกับทาง NTL

อาคารสยามวิงค์

ชั้น	ภายในห้องพัก								ทางเดิน	
	ติดตั้ง Box ไฟ	ทดสอบวงจรไฟ	สปริงเกอร์		ติดตั้งแอร์+อุปกรณ์	ทดสอบรอยรั่วท่อ CHS,CHR	ท่อ CW,HW	ท่อ S,W,V	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบรอยรั่วสปริงเกอร์
			ติดตั้งท่อ	ทดสอบรอยรั่ว						
6	09-Nov-65	09-Feb-66	15-Feb-66	07-Feb-66	30-Nov-65	23-Dec-65	03-Feb-66	03-Feb-66	04-April-66	07-Feb-66
7	26-Oct-65	15-Dec-65	23-Dec-65	13-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	02-Dec-65	15-Dec-65	16-Jan-66	13-Jan-66
8	26-Oct-65	16-Dec-65	28-Dec-65	19-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	28-Nov-65	15-Dec-65	15-Jan-66	19-Jan-66
9	08-Nov-65	13-Dec-65	28-Dec-65	19-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	28-Nov-65	15-Dec-65	15-Jan-66	19-Jan-66
10	09-Nov-65	21-Dec-65	14-Feb-66	03-Feb-66	07-Jan-66	07-Jan-66	23-Dec-65	23-Dec-65	14-Feb-66	03-Feb-66
11	13-Jan-66	14-Feb-66	14-Feb-66	03-Feb-66	11-Jan-66	11-Jan-66	27-Dec-65	26-Dec-65	07-Feb-66	03-Feb-66
12	24-Jan-66	03-Feb-66	14-Feb-66	03-Feb-66	21-Feb-66	17-Jan-66	26-Dec-65	26-Dec-65	03-Feb-66	03-Feb-66
14	18-Feb-66	25-Feb-66	09-Feb-66	03-Feb-66	21-Mar-66	09-Feb-66	03-Feb-66	03-Feb-66	22-Feb-66	03-Feb-66
15	18-Mar-66	8-Apr-66	14-Feb-66	07-Feb-66	21-Mar-66	09-Feb-66	04-Feb-66	04-Feb-66	04-May-66	07-Feb-66

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟบริเวณห้องพัก (Suit Room)
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟบริเวณห้องพัก (Suit Room)
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25

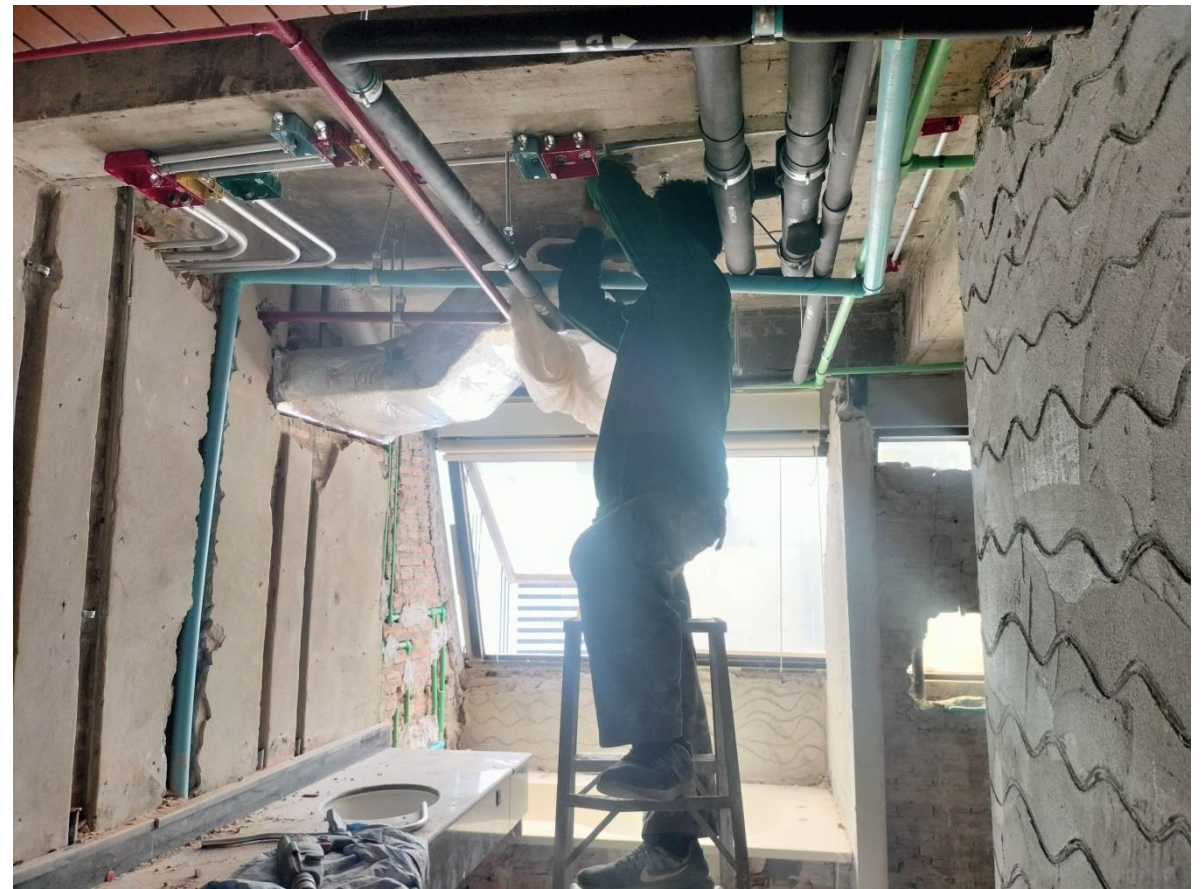

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟบริเวณห้องพัก (Suit Room)
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25

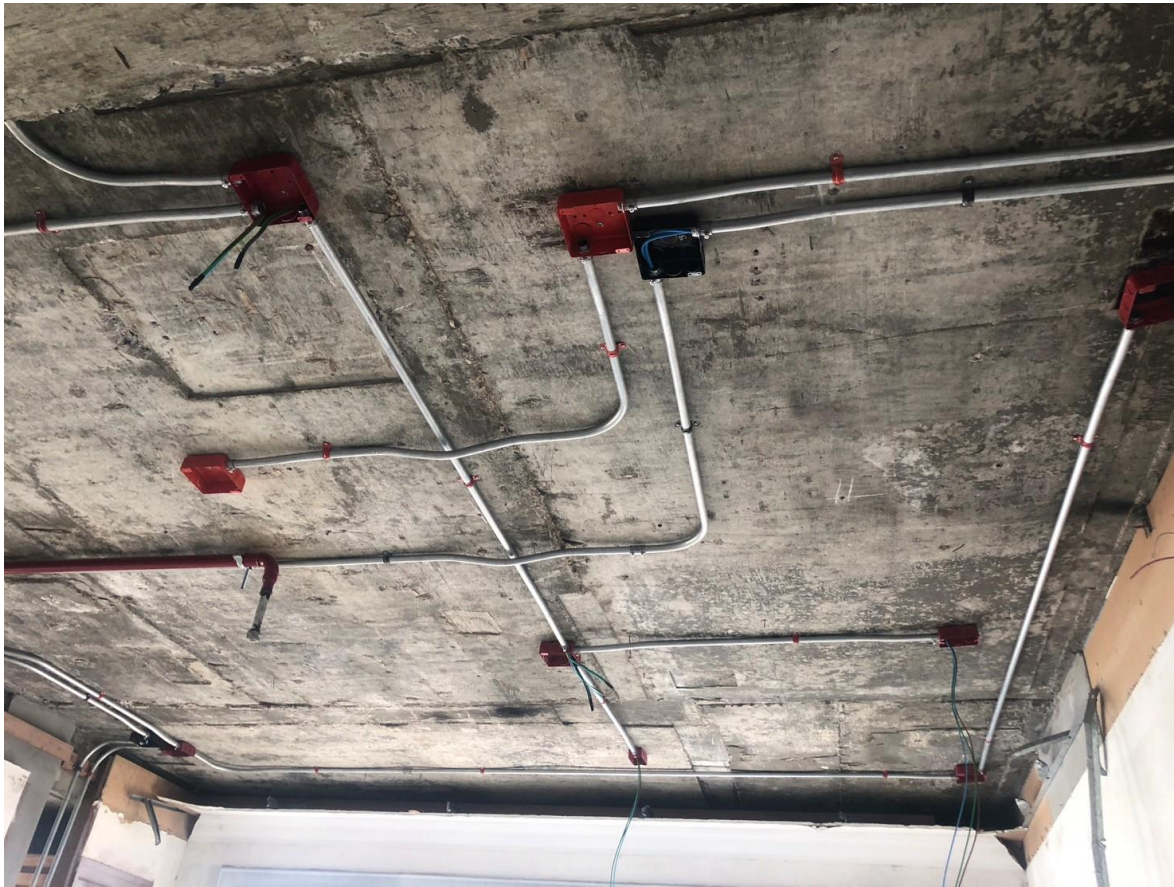

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟบริเวณห้องพัก (Suit Room)
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟและ Smoke Detector บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟและ Smoke Detector บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16,17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงก์ ชั้น 16,17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงก์ ชั้น 16,17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16,17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงก์ ชั้น 16,17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้ง Decorative Lights , Switch Plug
บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Decorative Lights , Switch Plug
บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 9

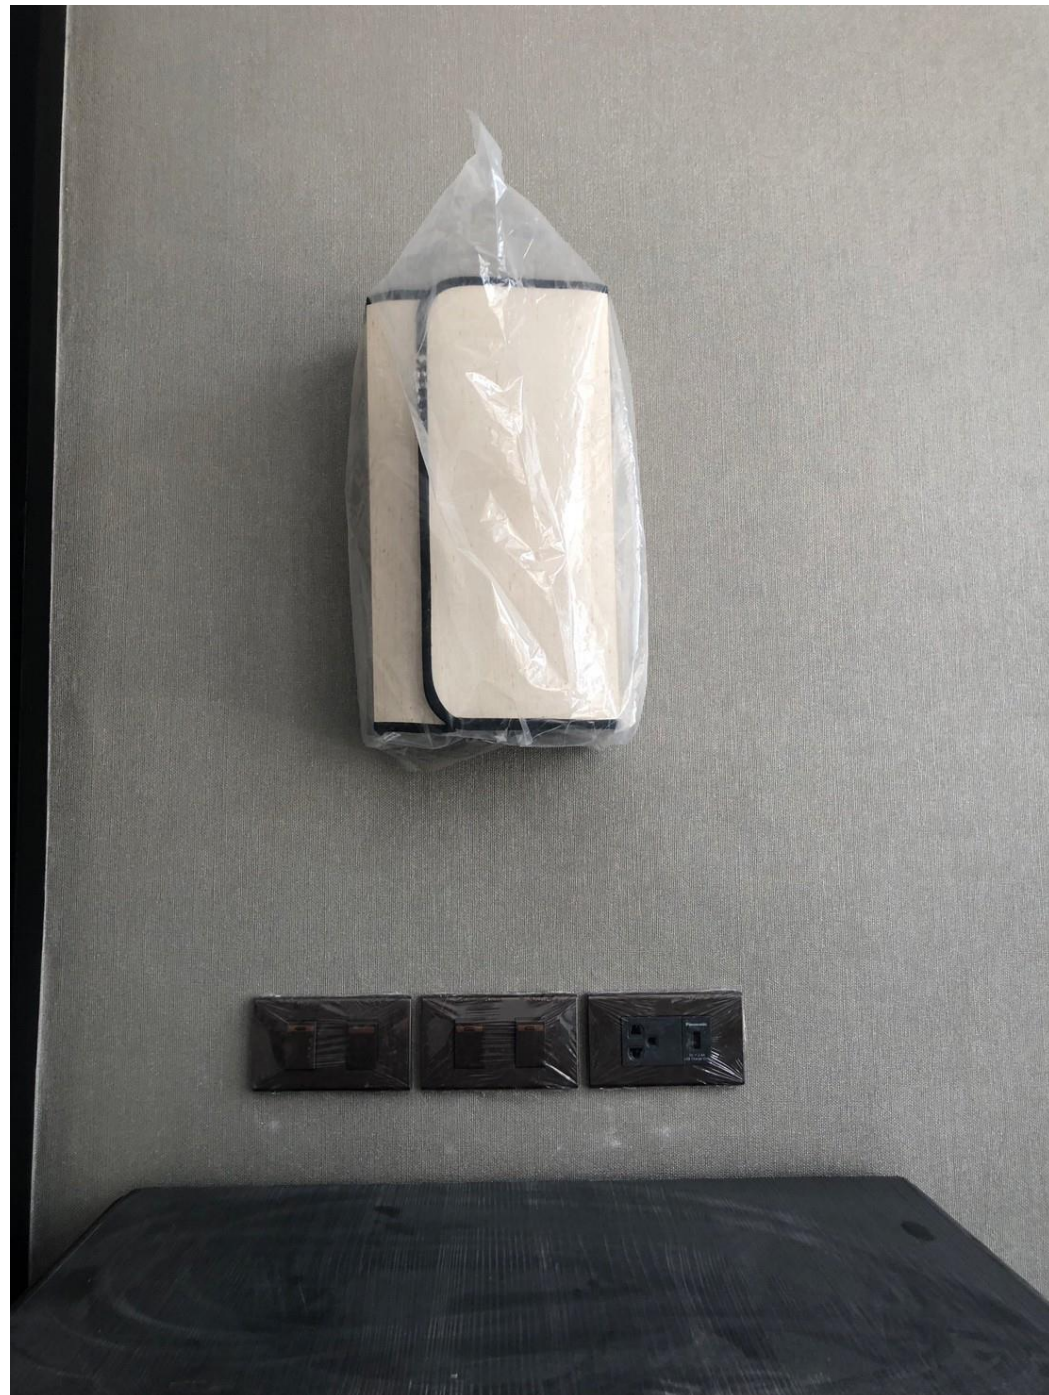

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17

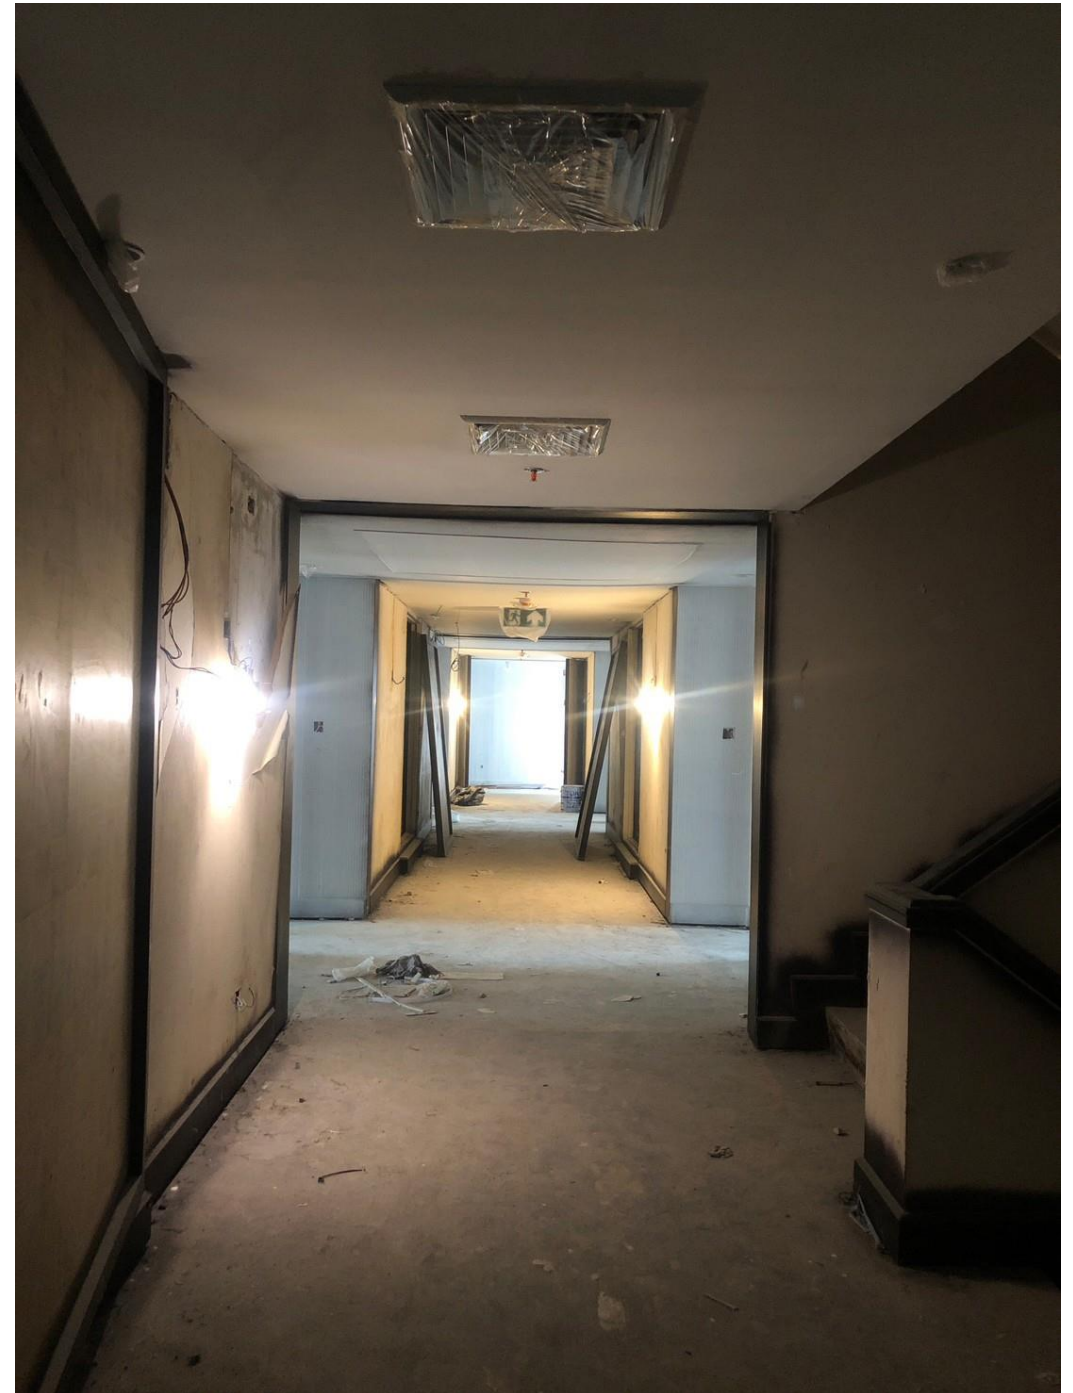

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อ Main สำหรับจ่าย Exhaust บริเวณบันไดหนีไฟ
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้ง Decorative Lights บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Decorative Lights บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7

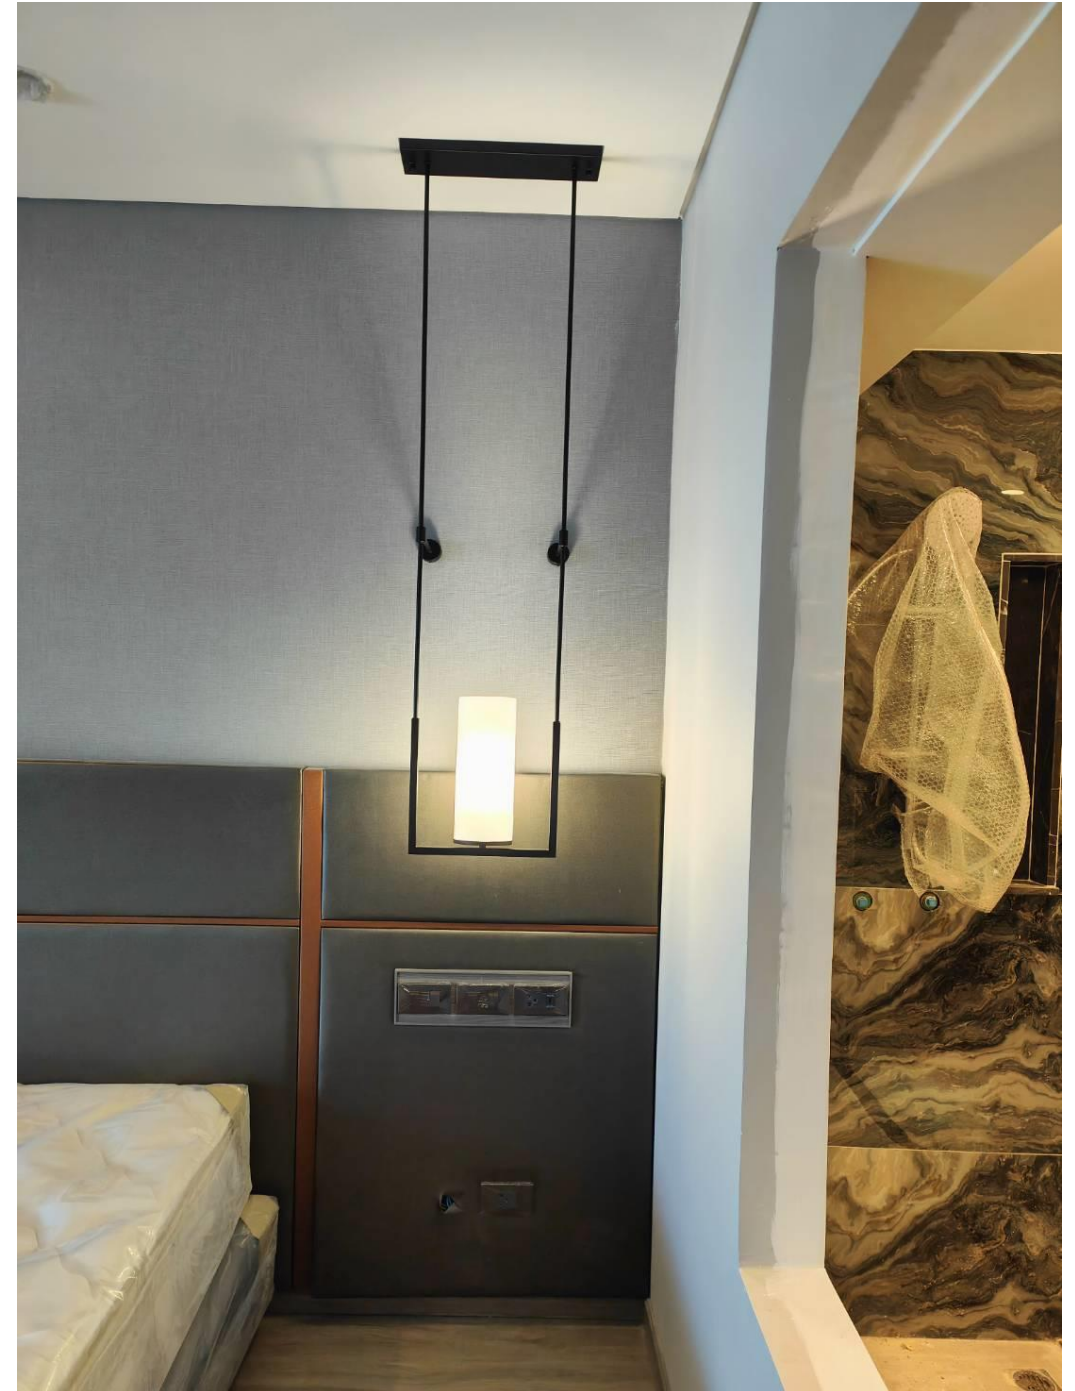

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Key Card และ Switch Plug
บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Key Card และ Switch Plug
บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Key Card, และ Switch Plug
บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 9





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งแผงสวิตช์ควบคุมแอร์บริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานปูกระเบื้องและหินธรรมชาติผนัง, พื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12

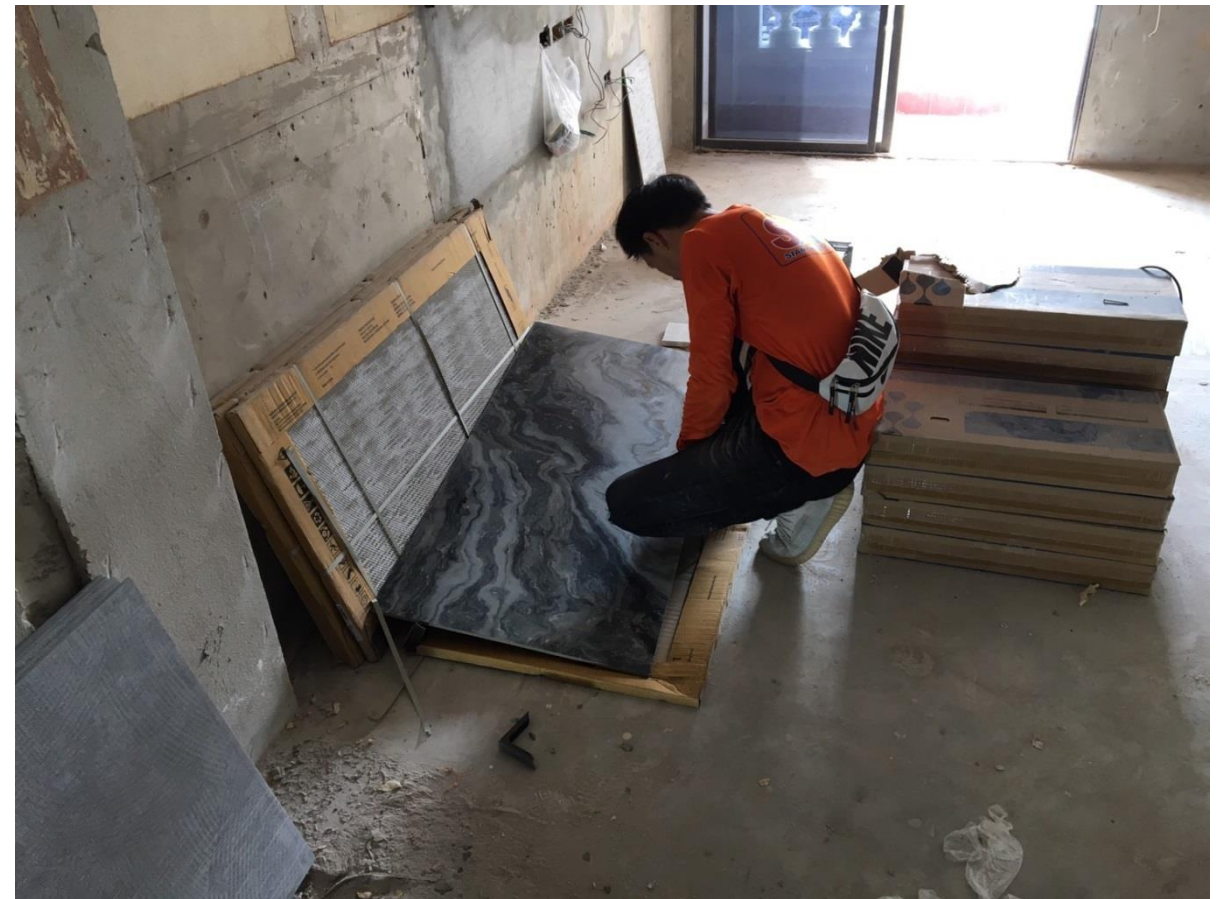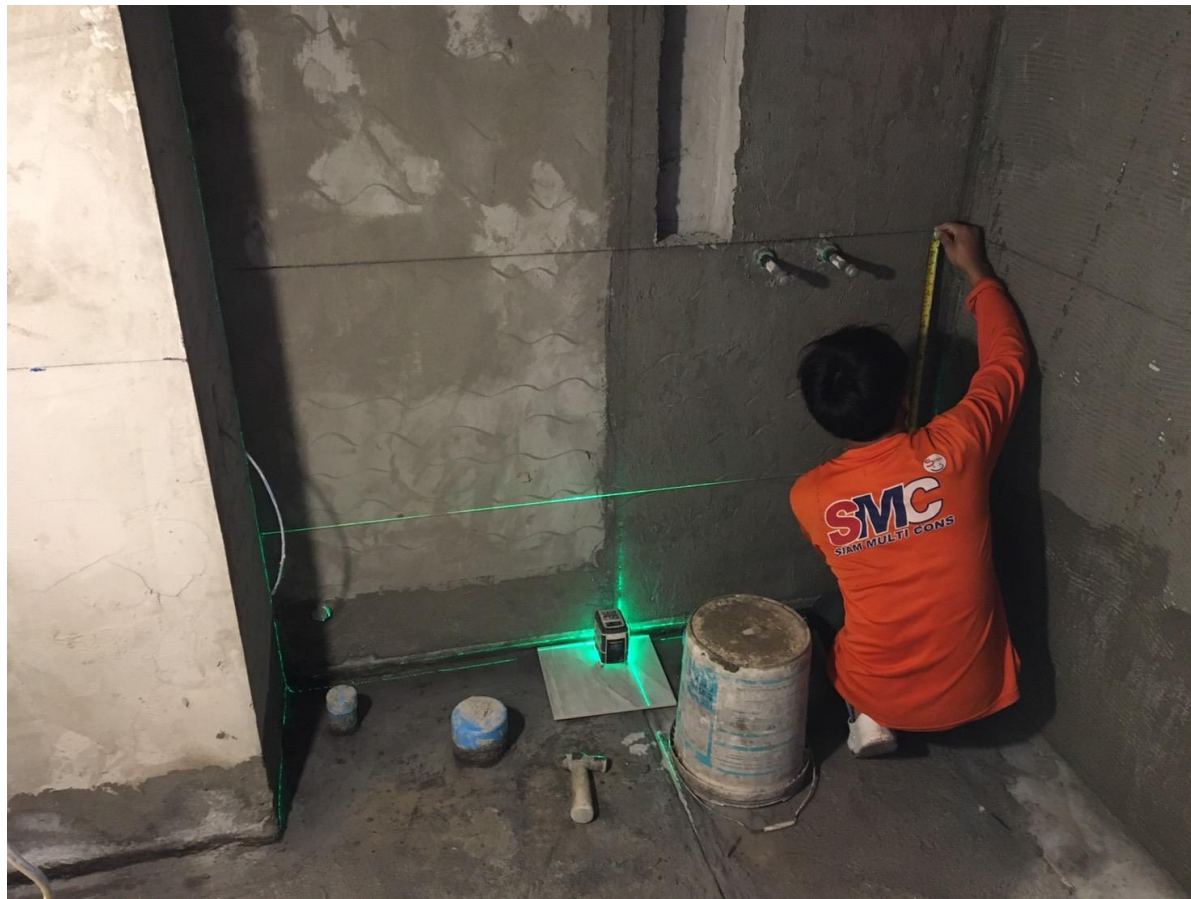

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานปูกระเบื้องและหินธรรมชาติผนัง, พื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานปูกระเบื้องและหินธรรมชาติผนัง, พื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหินธรรมชาติวงกบประตูห้องน้ำบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12

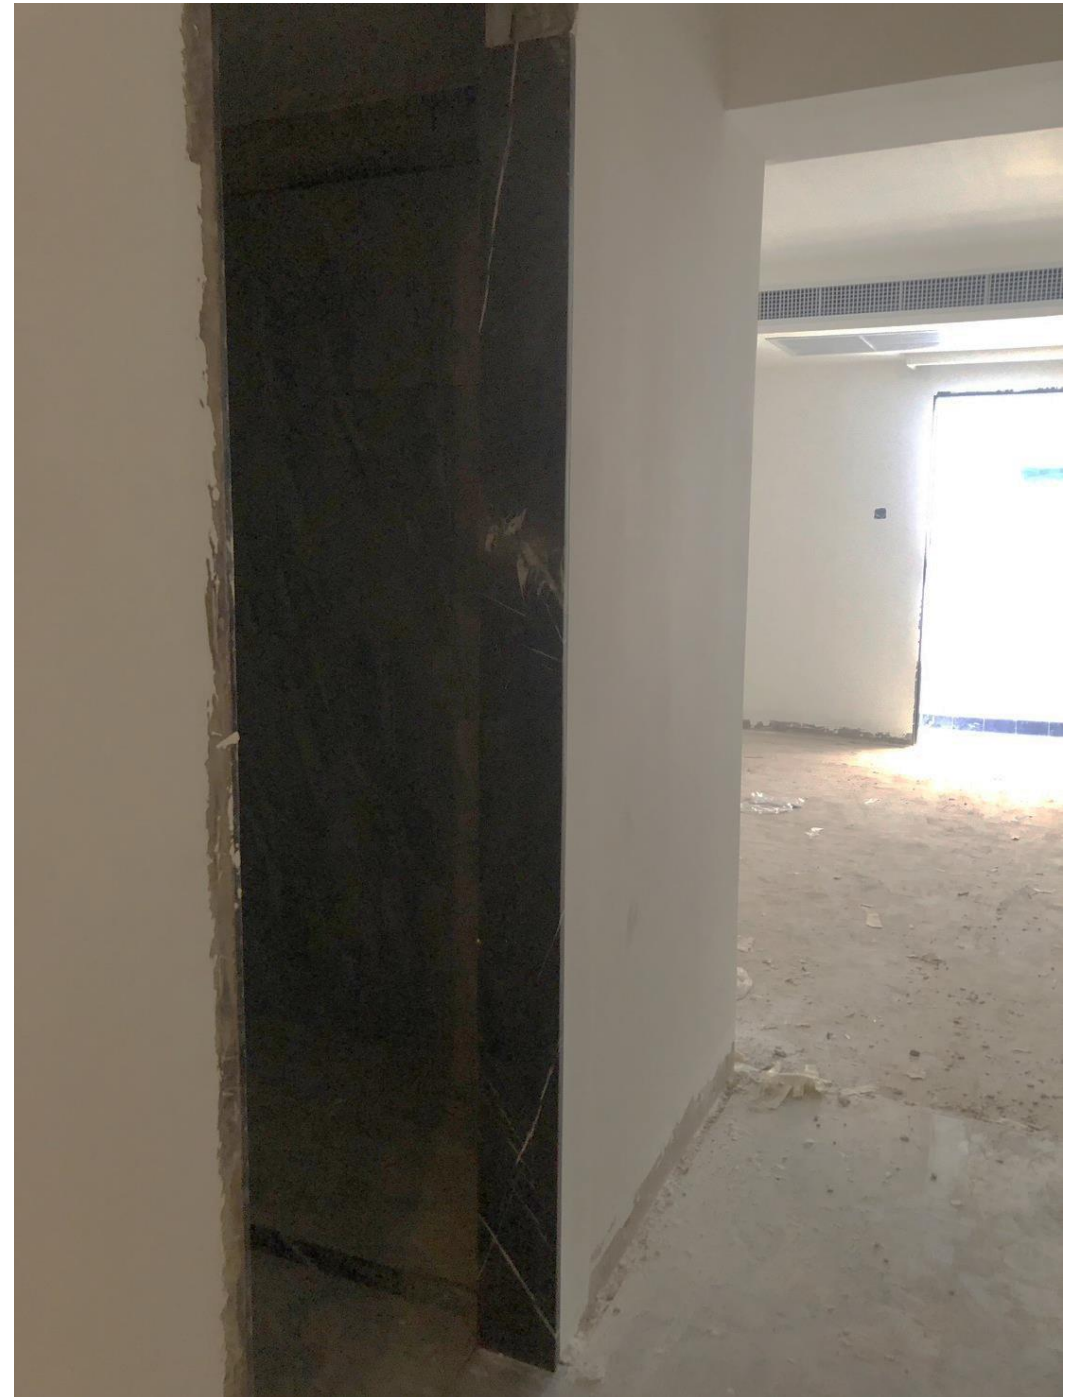


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 6-11

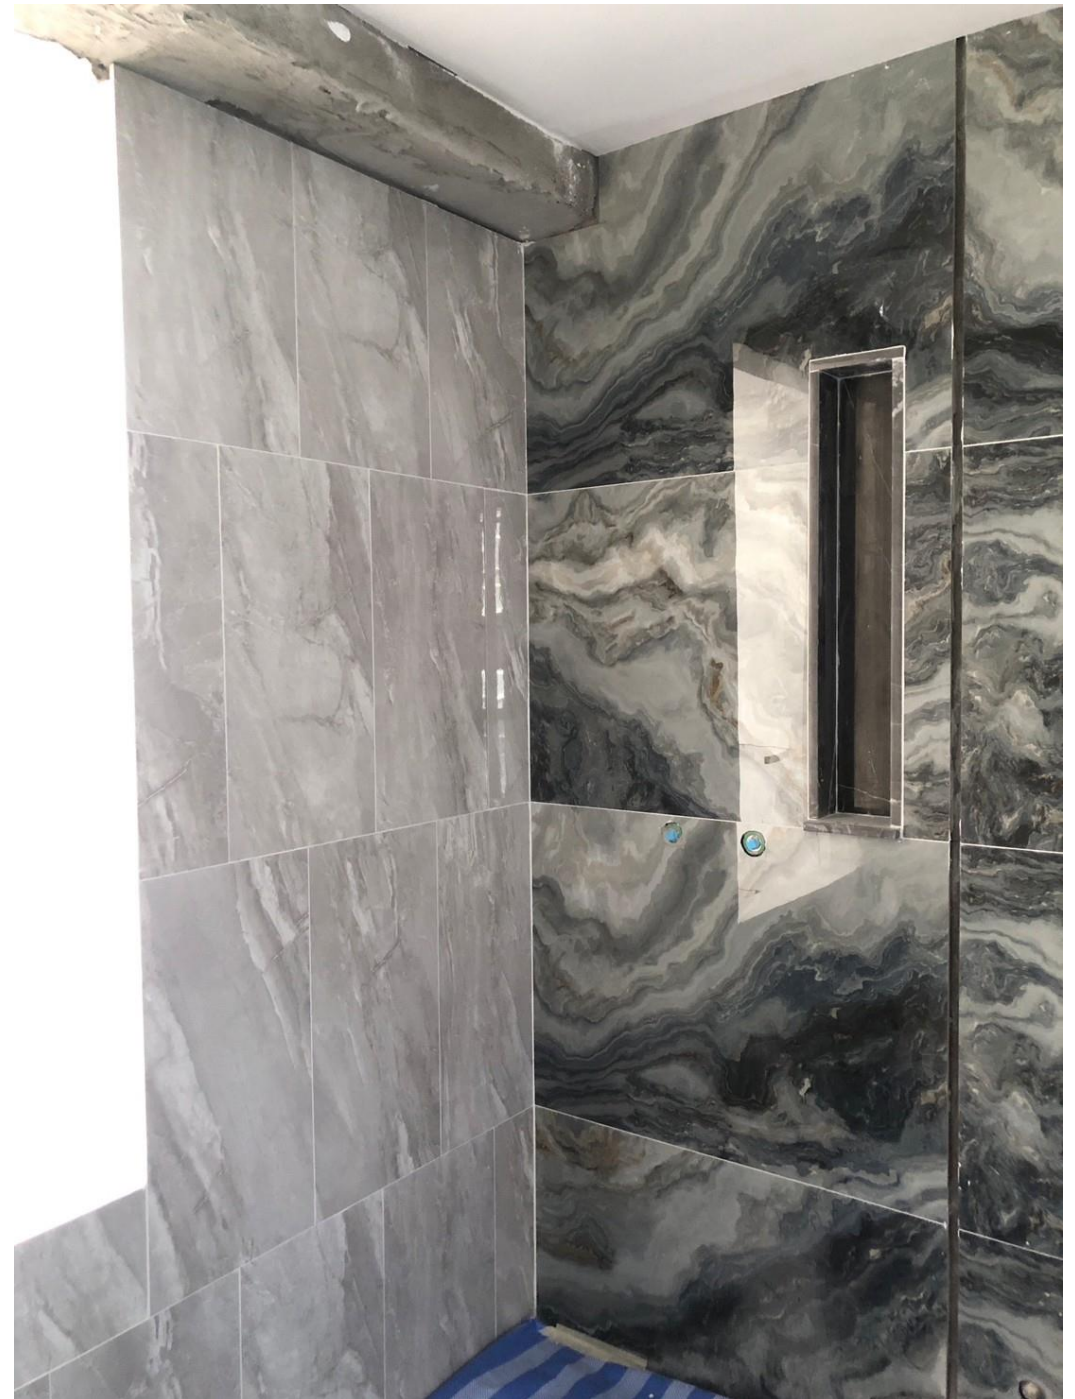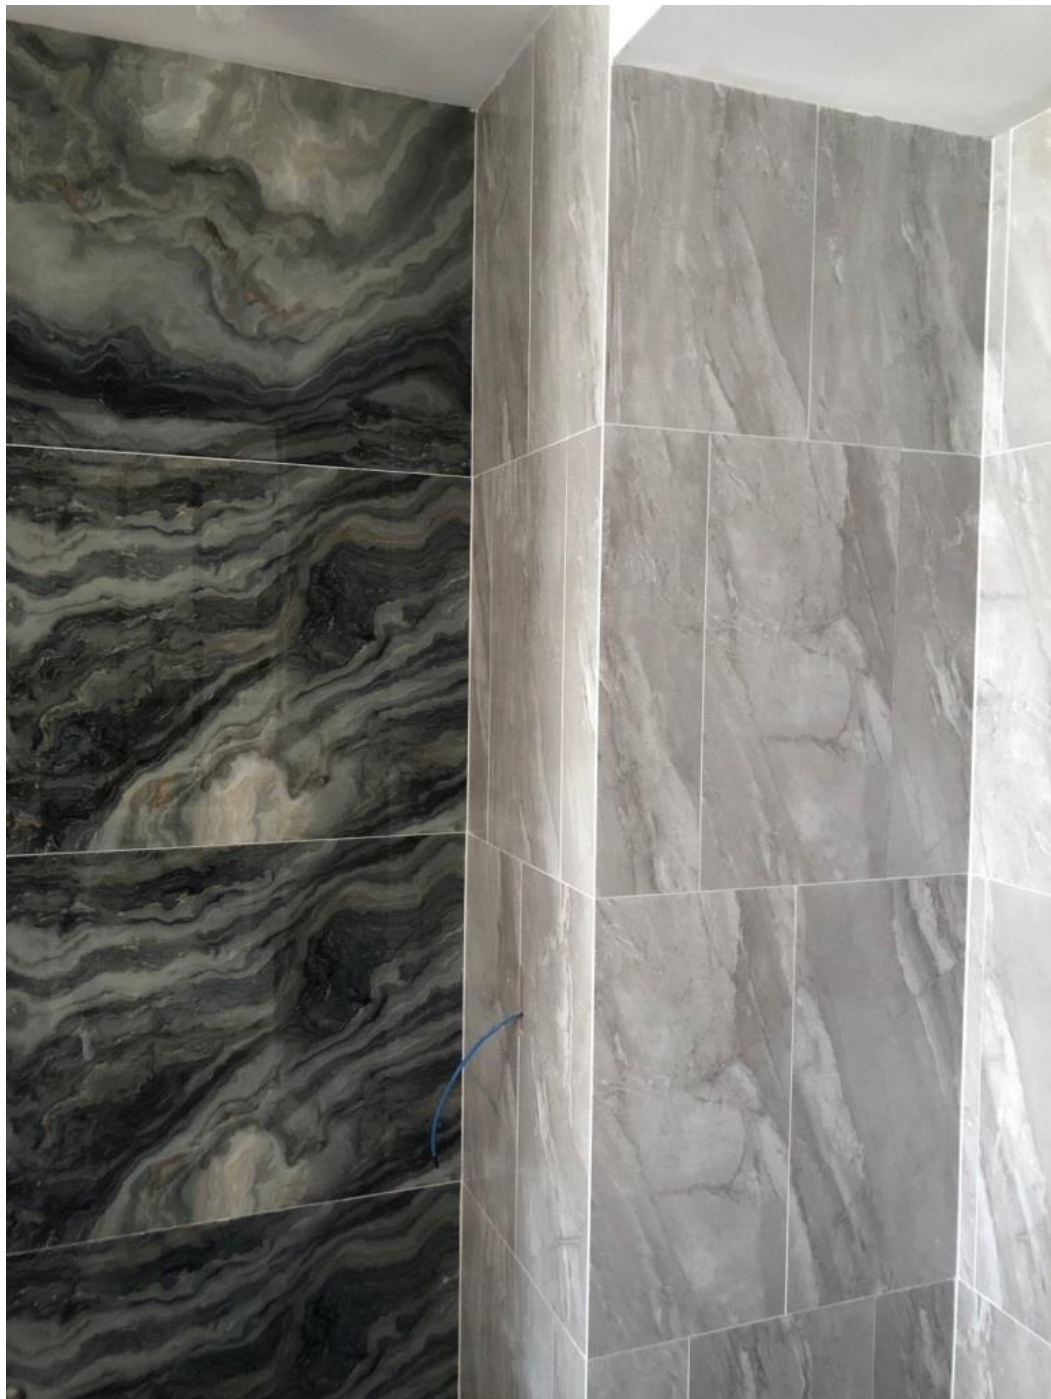

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 6-11

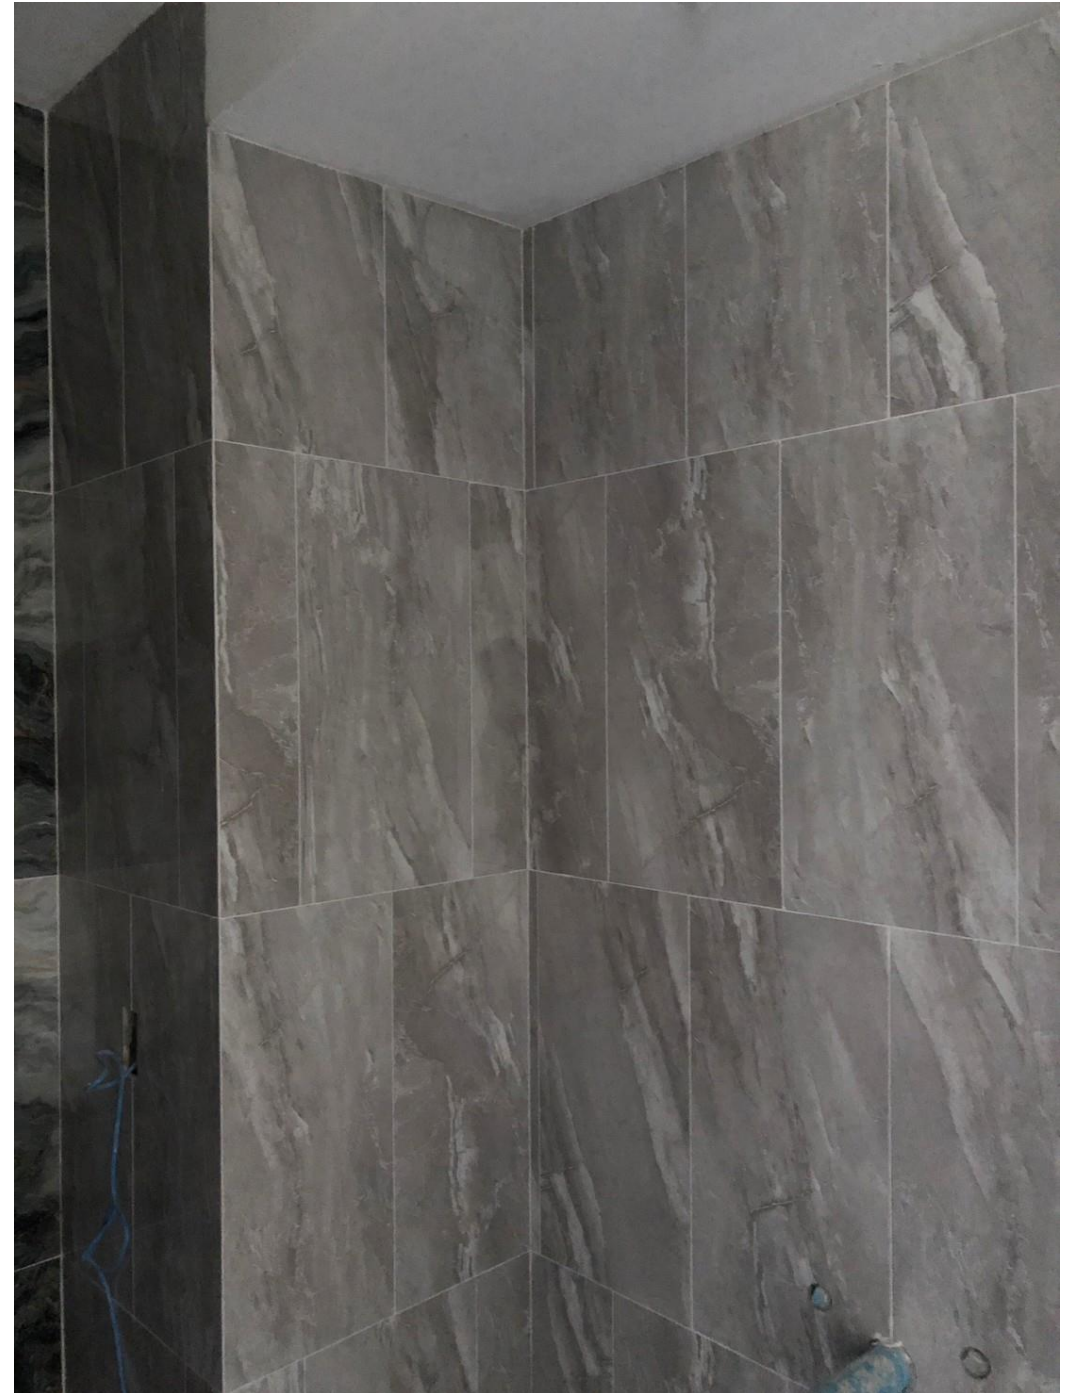

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเทพื้นปรับระดับพื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเทพื้นปรับระดับพื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานสกริมโค้ทผนังห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานสกิมโค้ทผนังห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12



วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน



อุปกรณ์ สวิตช์ ปลั๊ก (Phase- 3,4,5) อาคารกรุงเทพและสยาม ระบบไฟฟ้า

