



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

14 Sep 2023

แผนงาน KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบ พื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
3	(Phase 4)					
3.1	ชั้น 18	12 ก.ค. 66	13 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 22 ก.ค. 66
3.2	ชั้น 19	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 25 ก.ค. 66
3.3	ชั้น 20	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 27 ก.ค. 66
3.4	ชั้น 21	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 11 ส.ค. 66
4	(Phase 5)					
4.1	ชั้น 22	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	85%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.2	ชั้น 23	25 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	85%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.3	ชั้น 24	26 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	85%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.4	ชั้น 25	28 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	1 ส.ค. 66	85%	รองาน Wall Paper Bed Room

แผนงาน SIAM WING

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์


แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารสยาม					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 6	10 ก.ค. 66	9 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	100%	
1.2	ชั้น 10	14 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	100%	
1.3	ชั้น 11	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	100%	
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 12	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	100%	
2.2	ชั้น 14	26 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	90%	รองาน Wall Paper Corridos
2.3	ชั้น 15	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	90%	รองาน Wall Paper Corridos

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์

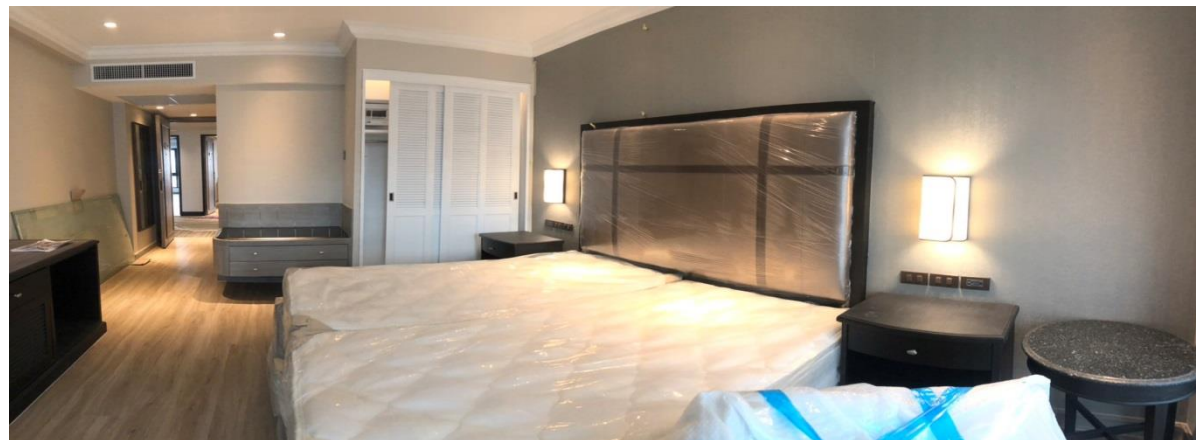



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์

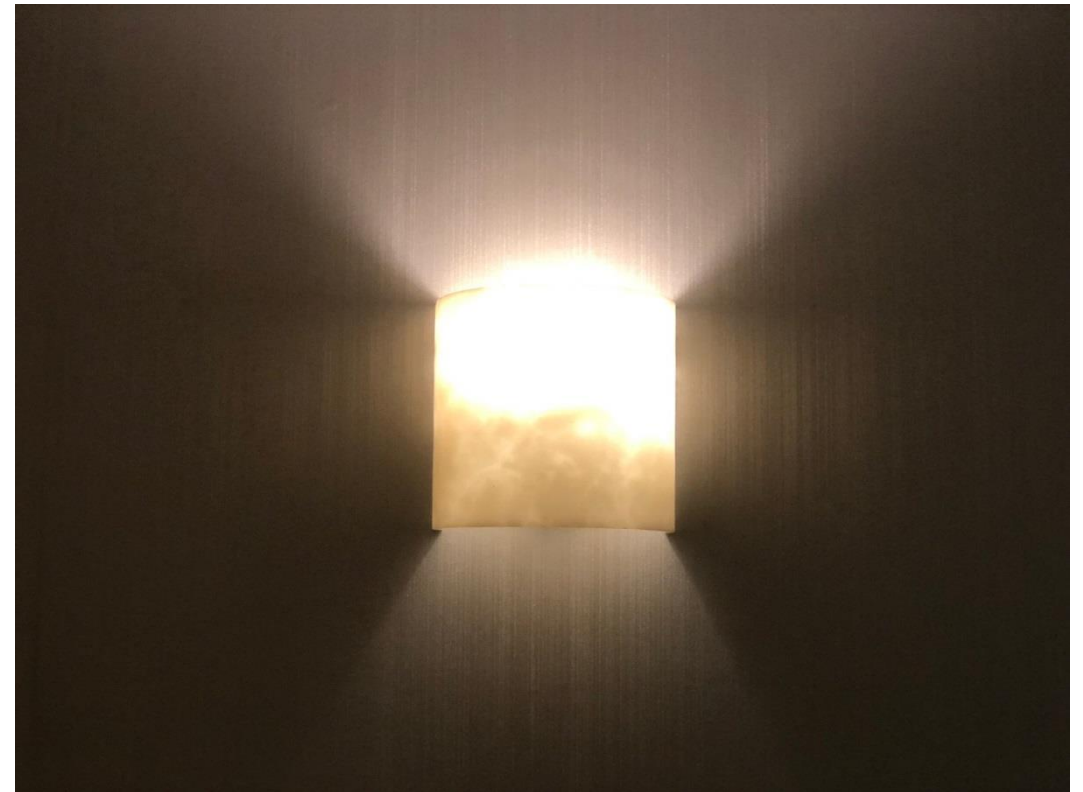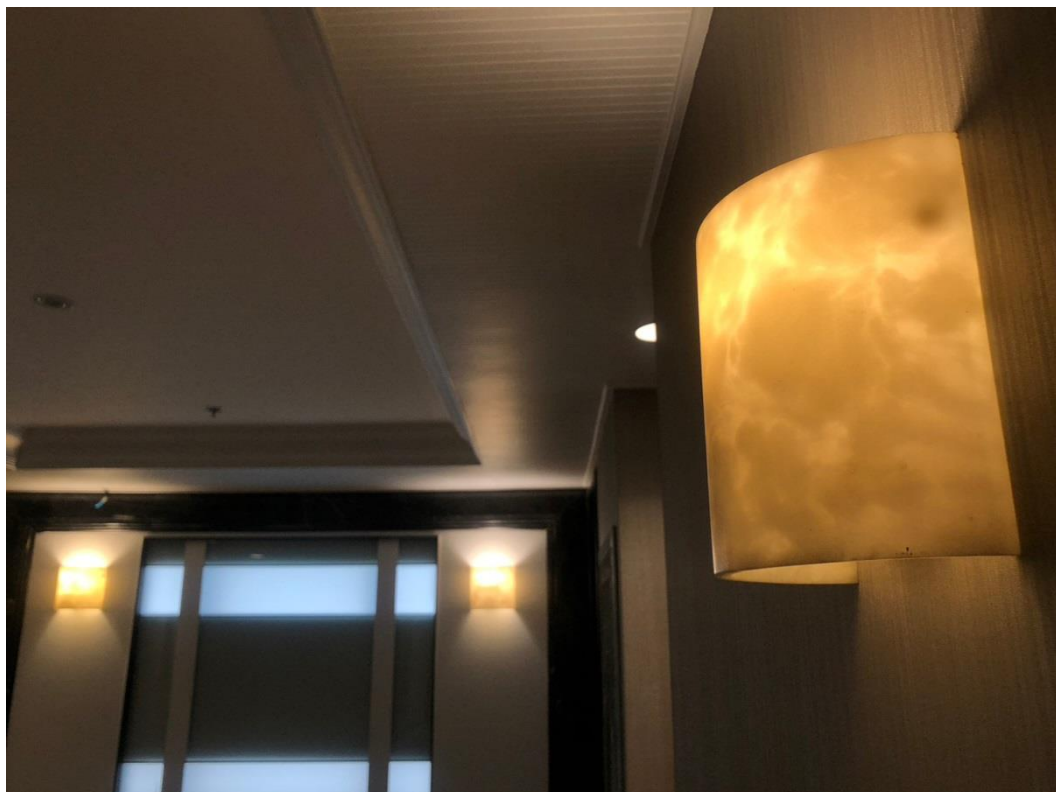

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

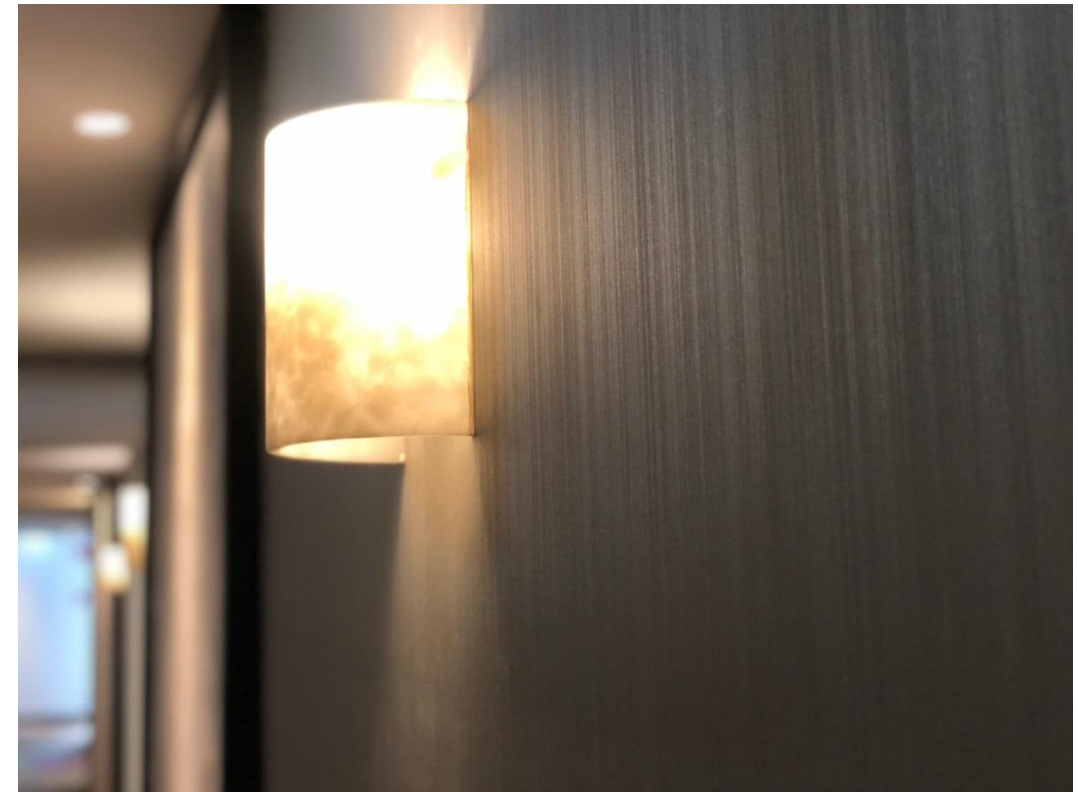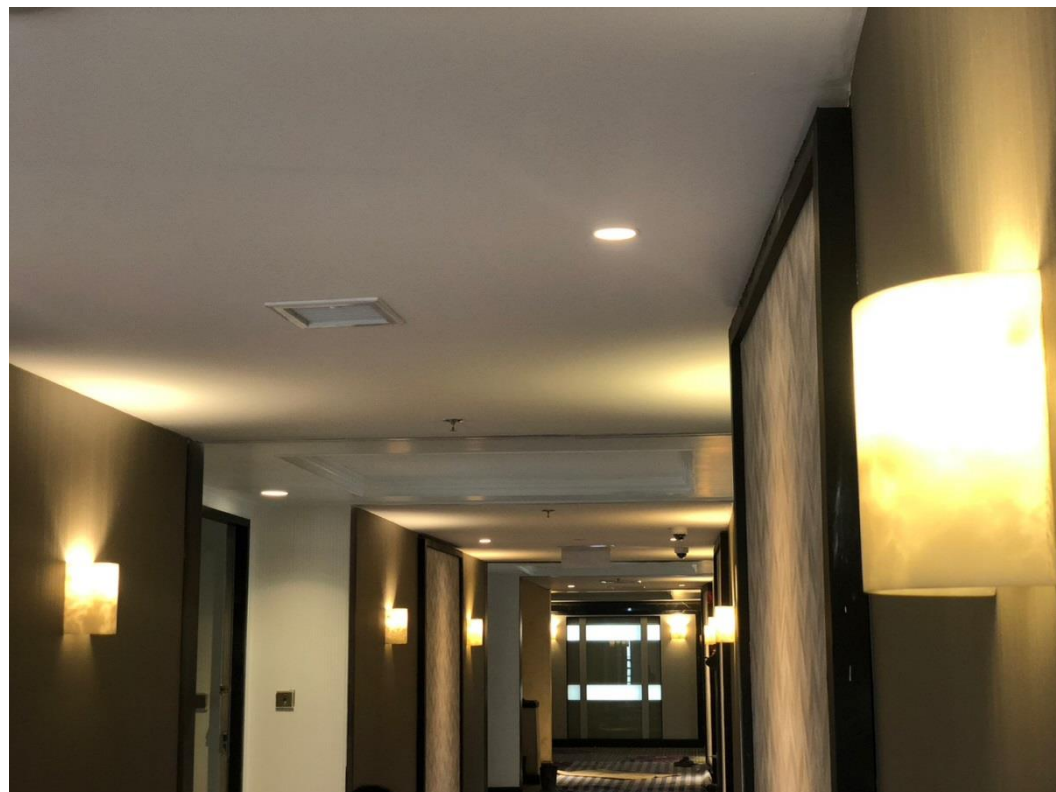

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก
อาคารสยามวิงค์




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก
อาคารสยามวิงค์




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารสยามวิงค์

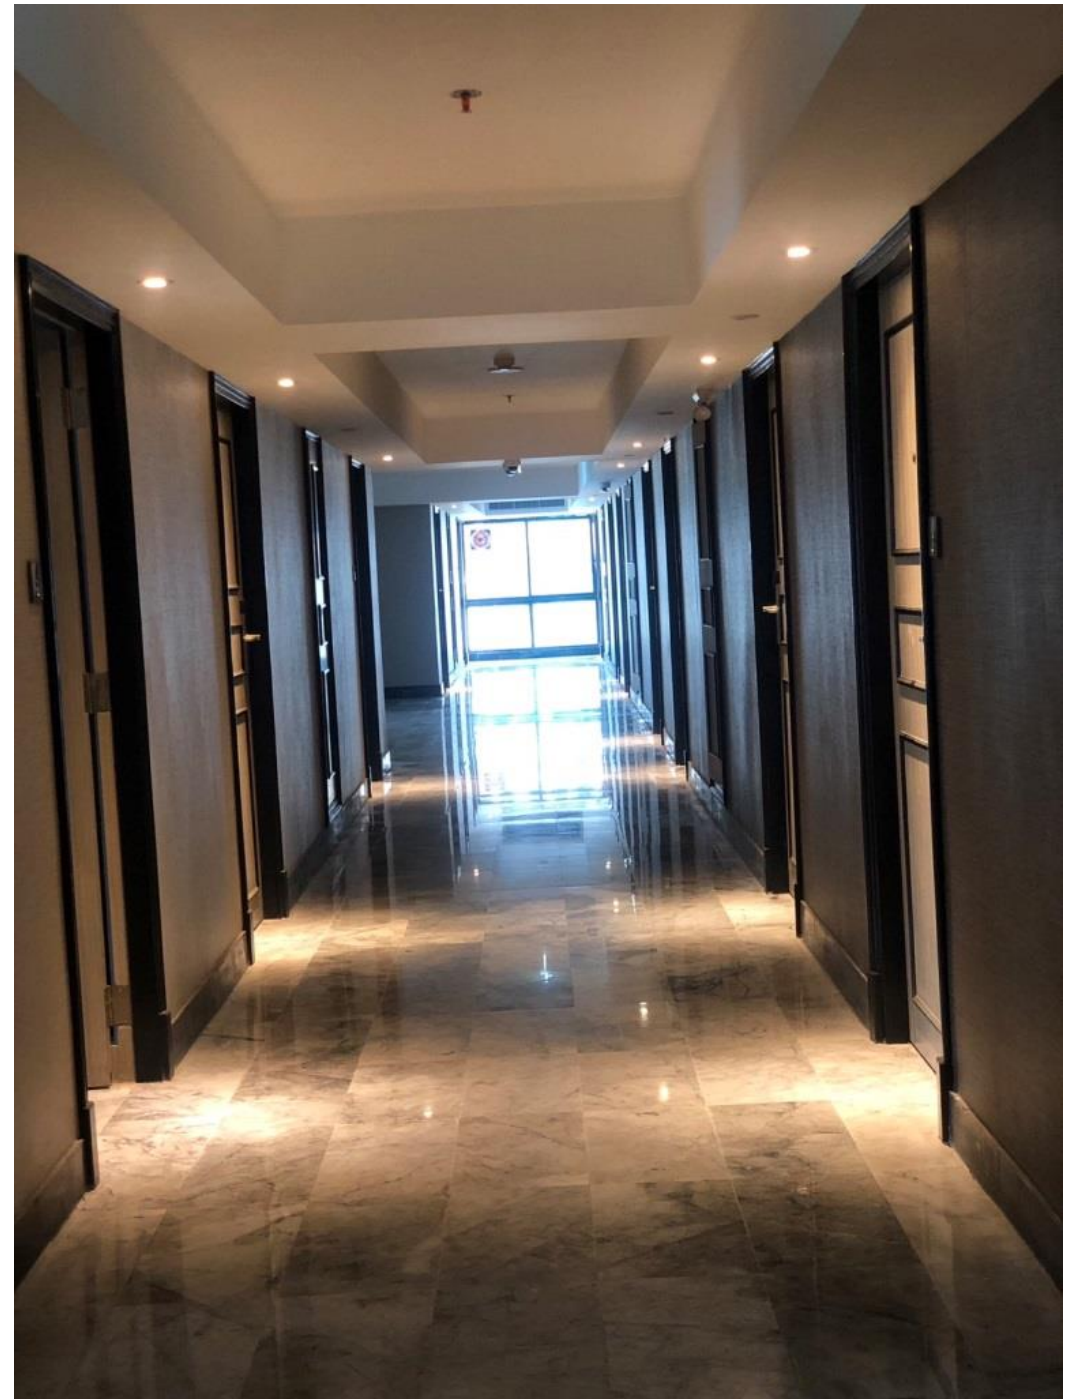


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารสยามวิงค์

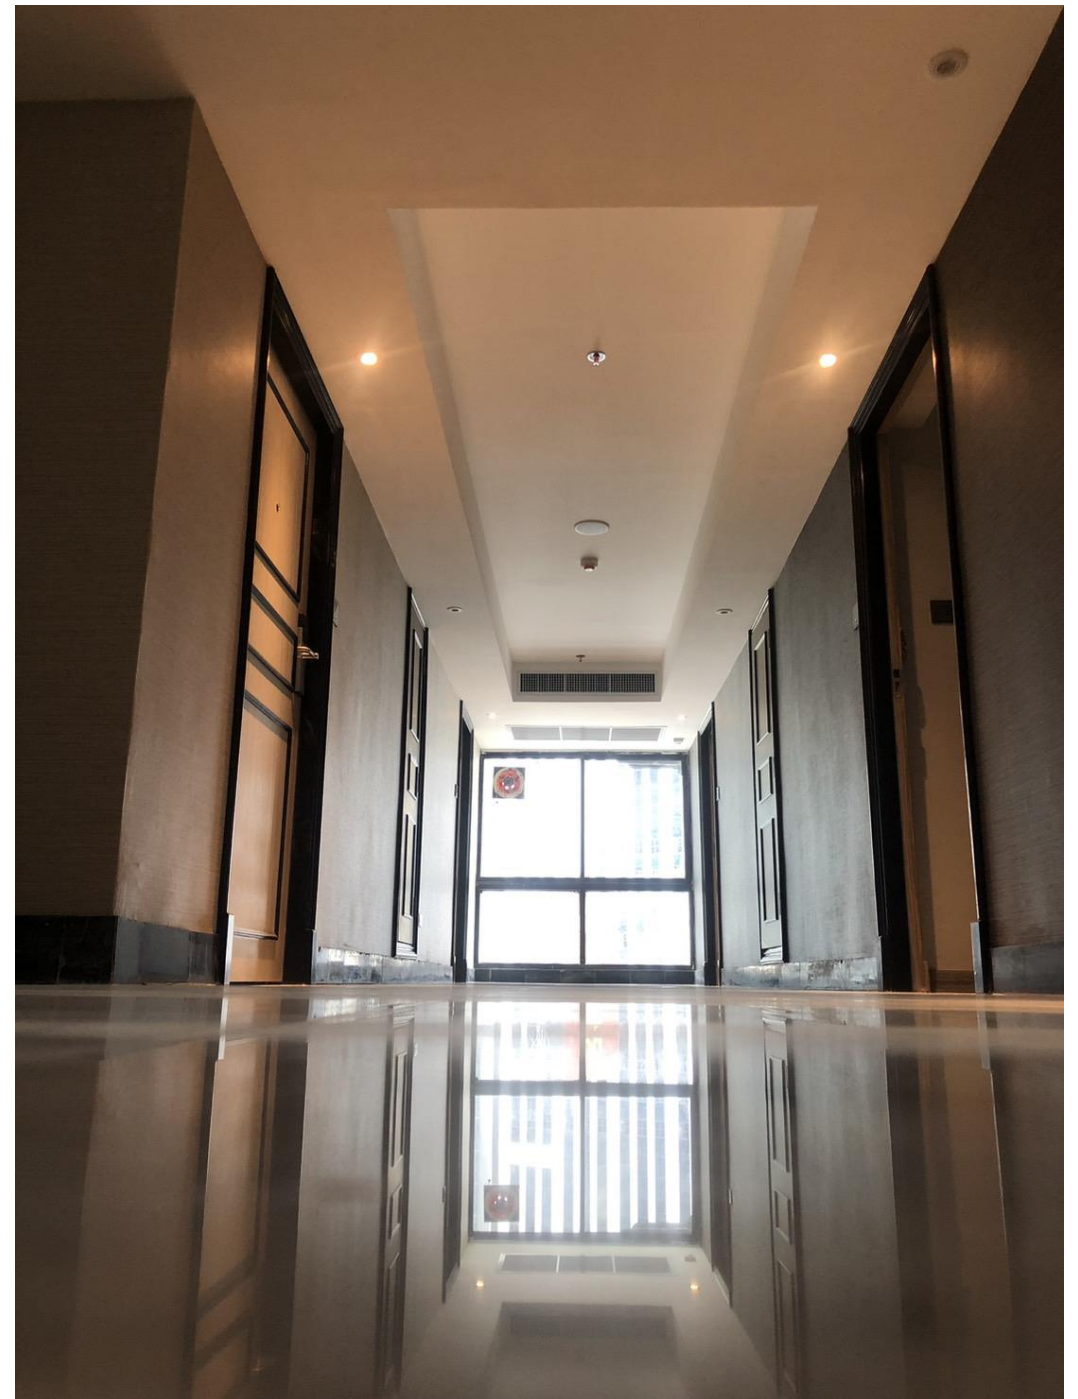

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

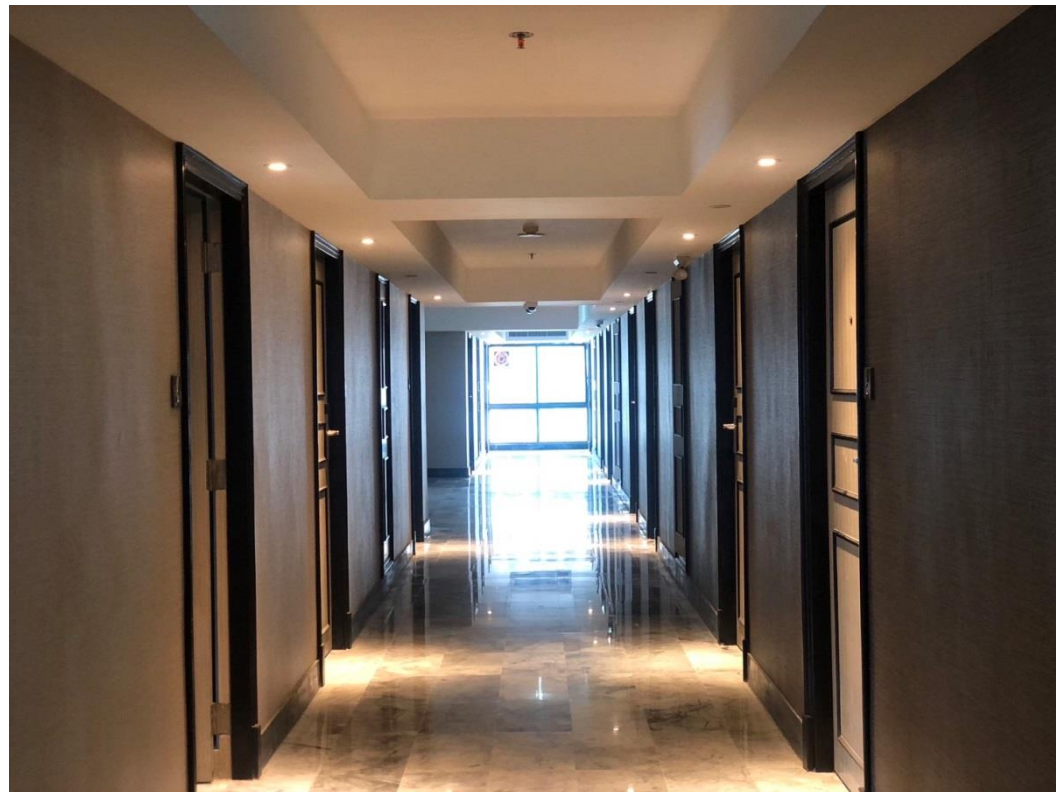

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารสยามวิงค์

