



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

16 March 2023

แผนงาน 3 Week KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week SIAM WING

สถานะ Material ของงานระบบและงานสถาปัตยกรรม

สถานะแบบ Material งานระบบประกอบอาคารและงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	Descriptions	MANUFACTURERS		Planning	Actual	Status
		Brand	Model of Type	Submitted Date	Submitted Date	
	งานระบบไฟฟ้า (Gate Room Phase 2)					
1	อุปกรณ์ลำโพง Ceiling Mounted Loudspeaker สำหรับอาคารกรุงเทพและสยาม	TOA	PC-658R	28-Feb-66		
	งานสถาปัตยกรรม (Gate Room Phase 2)					
1	วัสดุskim coat ผนัง (Skim Coat) อาคารสยาม	ลูกตั้ง	CP015/A	9-Mar-66	10-Mar-66	APP
2	วัสดุปูนฉาบ อาคารสยาม	TPI	M210	9-Mar-66	10-Mar-66	APP
3	วัสดุคอนกรีตปรับระดับพื้น Topping อาคารสยาม	TPI	M403	9-Mar-66	10-Mar-66	APP
4	วัสดุปูนกาวปูกระเบื้อง อาคารสยาม	จิ้งจี้	2 in 1 (CP007)	9-Mar-66	10-Mar-66	APP
5	วัสดุปูนก่อบล็อกรวมมวลเบา อาคารสยาม	TPI	M310	9-Mar-66	10-Mar-66	APP
6	วัสดุกันซึมและป้องกันความชื้น อาคารสยาม	Sika	Sika Top-107 Seal TH	9-Mar-66	10-Mar-66	APP

หมายเหตุ

APP = Approved

DAN = Disapproved as noted

AAN = Approved as noted

Clarified = Clarified

สถานะแบบ Shop DWG ของงานระบบและงานสถาปัตยกรรม

สถานะแบบ Shop DWG งานระบบประกอบอาคาร

หมายเหตุ

APP = Approved

AAN = Approved as noted

Clarified = Clarified

DAN = Disapproved as noted

ลำดับ	Description	First Submit		
		Submitted	Returned	Result (code)
	<u>งานระบบไฟฟ้า (Gate Room Phase 2)</u>			
	อาคารกรุงเทพ			
1	ตารางโหลดไฟฟ้า (Load Schedule) สำหรับอาคารกรุงเทพ ชั้น 7-25	1 Mar 66		
2	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 17th Floor Plan (Corridor Area)	1 Mar 66	11-Mar-66	AAN
3	Power And Receptacle System 17th Floor Plan (Corridor Area)	1 Mar 66	11-Mar-66	AAN
4	Brash Feeder Electrical Routing 17th Floor Plan (Corridor Area)	1 Mar 66	11-Mar-66	AAN
5	Fire Alarm System 17th Floor Plan (Corridor Area)	1 Mar 66	11-Mar-66	AAN
6	Fire Alarm System 16th Floor Plan (Corridor Area)	1 Mar 66	11-Mar-66	AAN
7	Fire Alarm System 15th Floor Plan (Corridor Area)	1 Mar 66	11-Mar-66	AAN
8	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 18th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
9	Power And Receptacle System 18th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
10	Brash Feeder Electrical Routing 18th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
11	Fire Alarm System 18th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
12	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 19th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
13	Power And Receptacle System 19th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN

สถานะแบบ Shop DWG งานระบบประกอบอาคาร

หมายเหตุ

APP = Approved

AAN = Approved as noted

Clarified = Clarified

DAN = Disapproved as noted

ลำดับ	Description	First Submit		
		Submitted	Returned	Result (code)
	<u>งานระบบไฟฟ้า (Gate Room Phase 2)</u>			
	อาคารกรุงเทพ			
14	Brash Feeder Electrical Routing 19th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
15	Fire Alarm System 19th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
16	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 20th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
17	Power And Receptacle System 20th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
18	Brash Feeder Electrical Routing 20th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
19	Fire Alarm System 20th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
20	CCTV & Pubile Address 12th,14th,15th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
21	CCTV & Pubile Address 16th,17th,18th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
22	CCTV & Pubile Address 19th,20th,21th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
23	CCTV & Public Address 22th,23th,24th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN
24	CCTV & Public Address 25th Floor Plan (Corridor Area)	9 Mar 66	11-Mar-66	AAN

สถานะแบบ Shop DWG งานสถาปัตย์

หมายเหตุ

APP = Approved

Clarified = Clarified

AAN = Approved as noted

DAN = Disapproved as noted

ลำดับ	Description	First Submit		
		Submitted	Returned	Result (code)
	งานสถาปัตย์ (Gate Room Phase 2)			
	อาคารสยาม			
1	Pattern งานกระเบื้อง (Plan Bed Room Twin)	11 Mar 66	11 Mar 66	AAN
2	Pattern งานกระเบื้อง (Plan Bed Room King)	11 Mar 66	11 Mar 66	AAN

ตรวจสอบงานกับทาง NTL

สถานะตรวจสอบงานกับทาง NTL

อาคารกรุงเทพวิงค์

ชั้น	ภายในห้องพัก										ทางเดิน	
	ติดตั้ง Box ไฟ		ทดสอบวงจรไฟ		สปริงเกอร์		ติดตั้งแอร์+ อุปกรณ์	ทดสอบรอยรั่ว ท่อ CHS,CHR	ซ่อมแซมท่อ V,W	ท่อ CW,HW	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบรอย รั่วสปริงเกอร์
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2 (No.20,21)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2 (No.20,21)	ติดตั้งท่อ	ทดสอบรอยรั่ว						
7	8-Oct , 14 -Nov-65	20-Jan-66	19,25-Nov-65	21-Jan-66	28-Dec-65	15-Jan-66	28-Dec-65	21-Dec-65	19-Nov-65	15-Dec-65	19-Jan-66	15-Jan-66
8	9,14-Nov-65	23-Jan-65	25-Nov,1-Dec-65	23-Jan-66	28-Dec-65	12-Jan-66	28-Dec-65	23-Dec-65	25-Nov-65	2-Dec-65	16-Jan-66	12-Jan-66
9	4,14-Nov-65	28-Nov,8-Dec-65	9-Dec-65	8,12-Dec-65	28-Dec-65	26-Dec-65	28-Dec-65	23-Dec-65	22-Nov-65	28-Nov-65	16-Jan-66	26-Dec-65
10	11,15-Nov-65	6-Feb-66	2-Dec-65	14-Feb-66	4-Jan-66	15-Feb-66	7-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	7-Jan-66	14-Feb-66	15-Feb-66
11	12,15-Nov-65	6-Feb-66	30,26-Dec-65	14-Feb-66	4-Jan-66	15-Feb-66	11-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	26-Nov-65	27-Jan-66	15-Feb-66
12	21-Nov,12-Dec-65	2-Feb-66	21-Dec-65	2-Feb-66	4-Dec-66	15-Feb-66	11-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	21-Feb-66	13-Feb-66	15-Feb-66
14	14,25-Nov-65	23-Feb-66	22-Dec-65	2-Mar-66	7-Feb-66	6-Mar-66	7-Feb-66	3-Feb-66	25-Feb-66	25-Feb-66	9-Feb-66	6-Mar-66
15	16-Nov-65	23-Feb-66	30-Nov-65	2-Mar-66	10-Feb-66	6-Mar-66	22-Feb-66	3-Feb-66	1-Mar-66	1-Mar-66	27-Feb-66	6-Mar-66
16	24,29-Nov-65	17-Feb-66	21-Dec-65	22-Feb-66	10-Mar-66	7-Mar-66	24-Feb-66	4-Feb-66	4-Mar-66	4-Mar-66	27-Feb-66	7-Mar-66
17	13-Dec-65	23-Feb-66	23-Jan-66	2-Mar-66	10-Mar-66	7-Mar-66	24-Feb-66	31-Jan-66	9-Mar-66	9-Mar-66	27-Feb-66	7-Mar-66
18	13-Dec-65	23-Feb-66	11-Jan-66	7-Mar-66			14-Mar-66	2-Feb-66	10-Mar-66	10-Mar-66		
19	23-Dec-65		29-Jan-65				14-Mar-66	4-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	8-Mar-66	
20	23-Dec-65	7-Mar-66	6-Feb-66	11-Mar-66			14-Mar-66	20-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	8-Mar-66	
21	23-Dec-65	7-Mar-66	6-Feb-66	11-Mar-66			14-Mar-66	26-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	13-Mar-66	
22	25-Jan-66		16-Feb-66						11-Mar-66	11-Mar-66		
23	25-Jan-66	7-Mar-66	16-Feb-66	13-Mar-66					11-Mar-66	11-Mar-66		
24	31-Jan-65	7-Mar-66	14-Feb-66	13-Mar-66					13-Mar-66	13-Mar-66		
25	9-Feb-66		14-Feb-66						13-Mar-66	13-Mar-66		

สถานะตรวจสอบงานกับทาง NTL

อาคารสยามวิงค์


ชั้น	ภายในห้องพัก								ทางเดิน	
	ติดตั้ง Box ไฟ	ทดสอบวงจรไฟ	สปีเกอร์		ติดตั้งแอร์+อุปกรณ์	ทดสอบรอยรั่วท่อ CHS,CHR	ท่อ CW,HW	ท่อ S,W,V	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบรอยรั่วสปีเกอร์
			ติดตั้งท่อ	ทดสอบรอยรั่ว						
6	09-Nov-65	09-Feb-66	15-Feb-66	07-Feb-66	30-Nov-65	23-Dec-65	03-Feb-66	03-Feb-66		07-Feb-66
7	26-Oct-65	15-Dec-65	23-Dec-65	13-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	02-Dec-65	15-Dec-65	16-Jan-66	13-Jan-66
8	26-Oct-65	16-Dec-65	28-Dec-65	19-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	28-Nov-65	15-Dec-65	15-Jan-66	19-Jan-66
9	08-Nov-65	13-Dec-65	28-Dec-65	19-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	28-Nov-65	15-Dec-65	15-Jan-66	19-Jan-66
10	09-Nov-65	21-Dec-65	14-Feb-66	03-Feb-66	07-Jan-66	07-Jan-66	23-Dec-65	23-Dec-65	14-Feb-66	03-Feb-66
11	13-Jan-66	14-Feb-66	14-Feb-66	03-Feb-66	11-Jan-66	11-Jan-66	27-Dec-65	26-Dec-65	07-Feb-66	03-Feb-66
12	24-Jan-66	03-Feb-66	14-Feb-66	03-Feb-66	21-Feb-66	17-Jan-66	26-Dec-65	26-Dec-65	03-Feb-66	03-Feb-66
14	18-Feb-66	25-Feb-66	09-Feb-66	03-Feb-66		09-Feb-66	03-Feb-66	03-Feb-66	22-Feb-66	03-Feb-66
15	14-Mar-66		14-Feb-66	07-Feb-66		09-Feb-66	04-Feb-66	04-Feb-66		07-Feb-66

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





งานเดินท่อไฟบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18

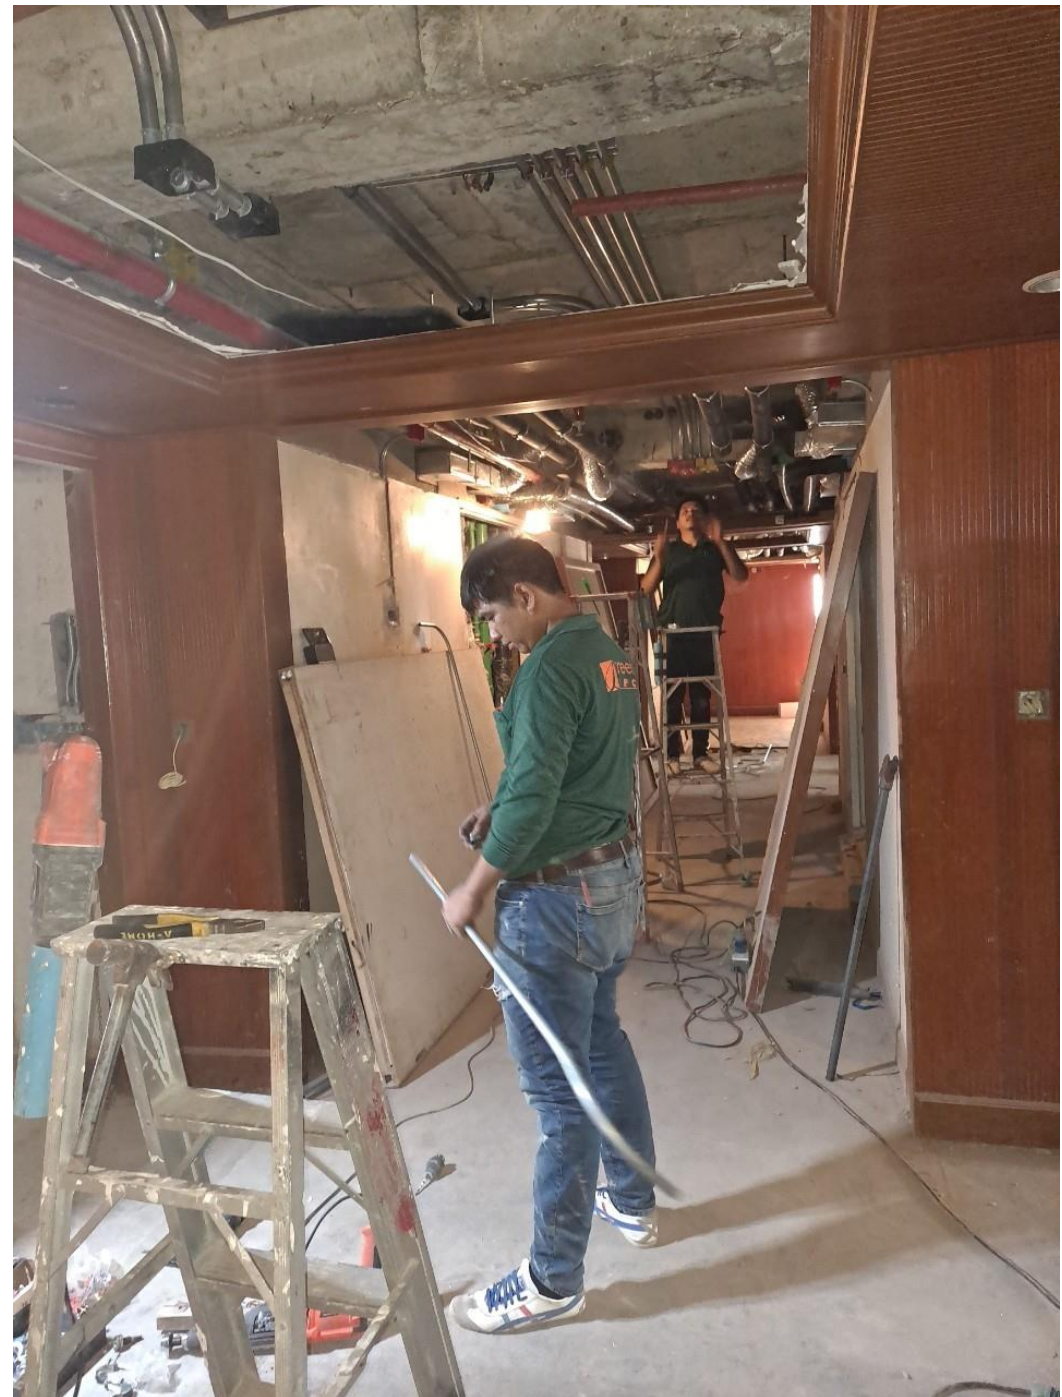









รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายไฟบริเวณห้องพัก (Type Deluxe A) อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 23

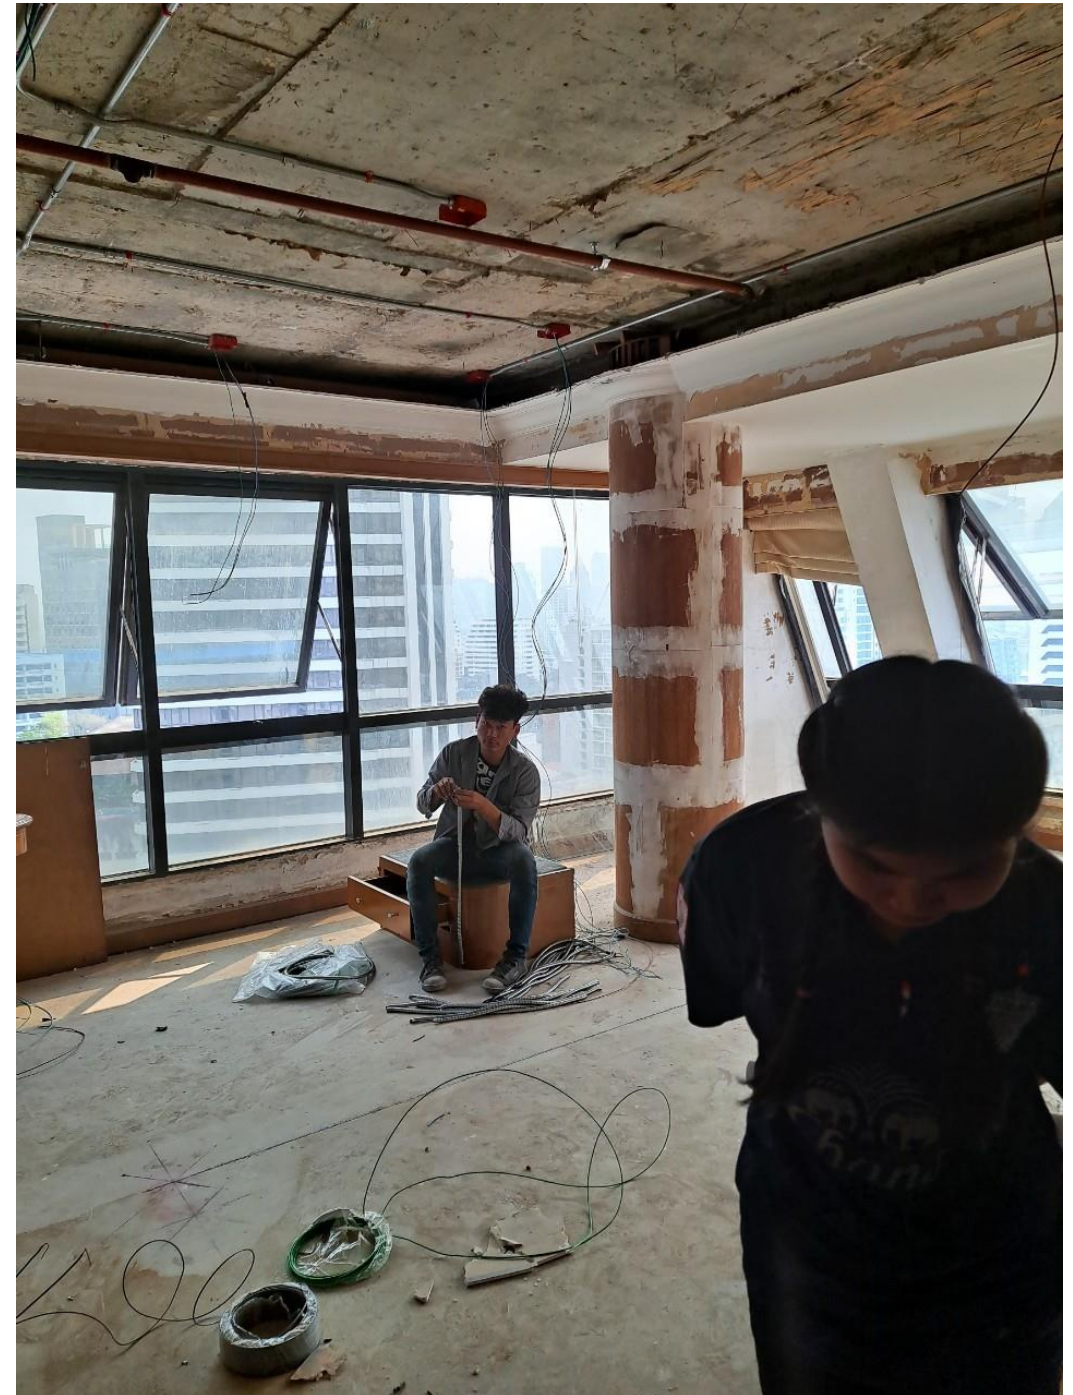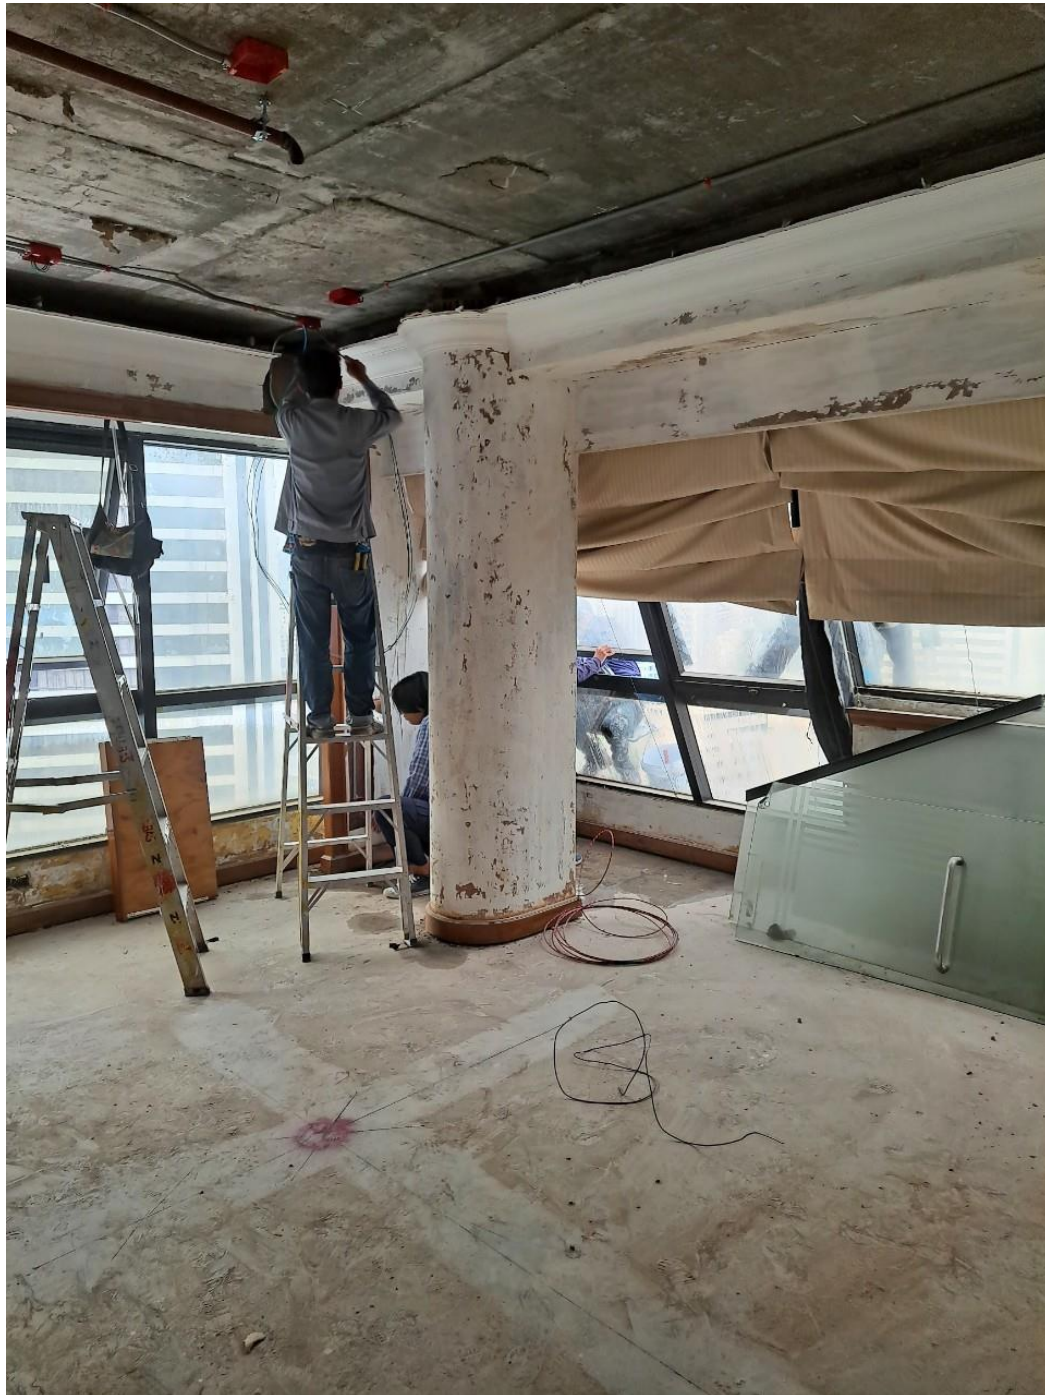









รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานทดสอบวงจร Lighting And Power Receptacle บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21 (Type Deluxe A,B)

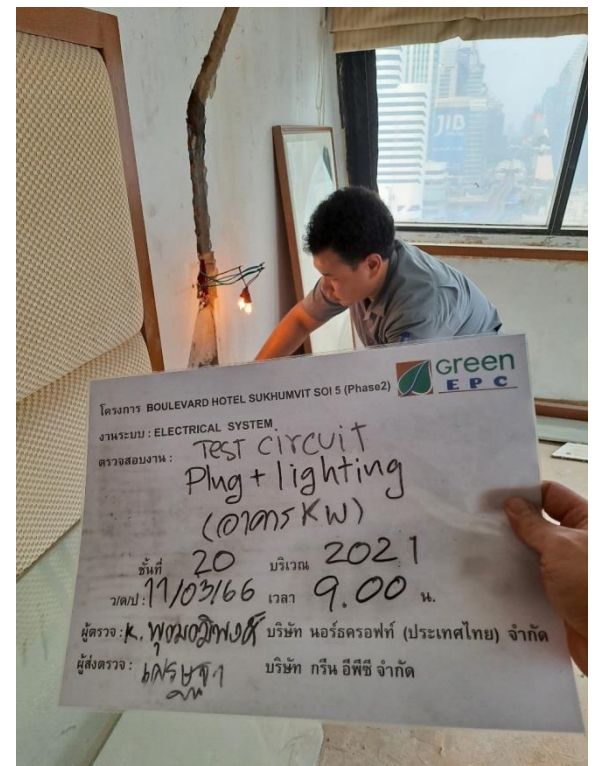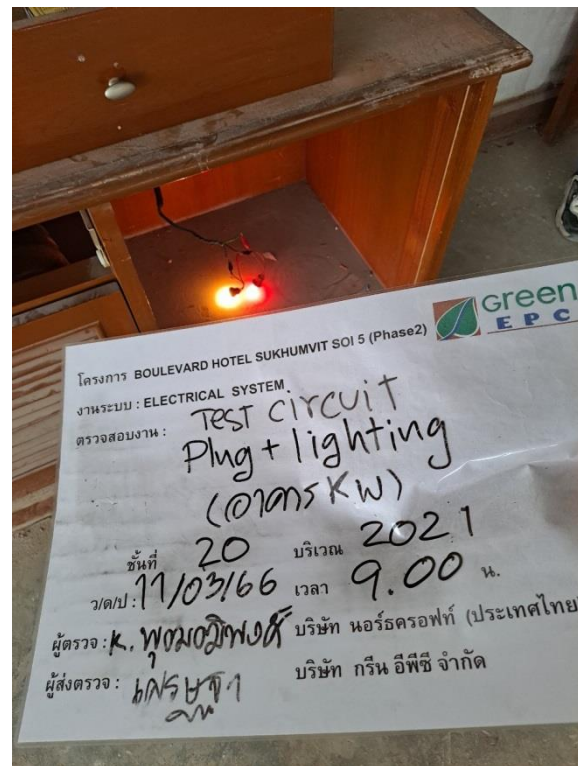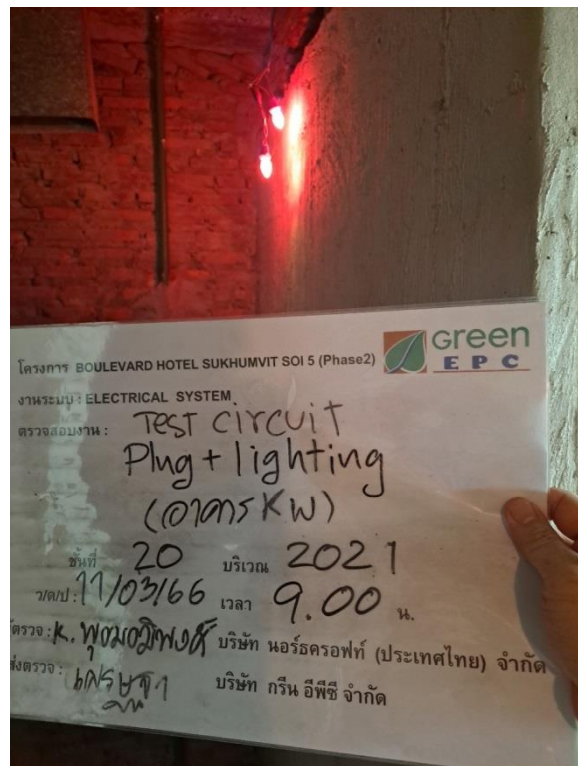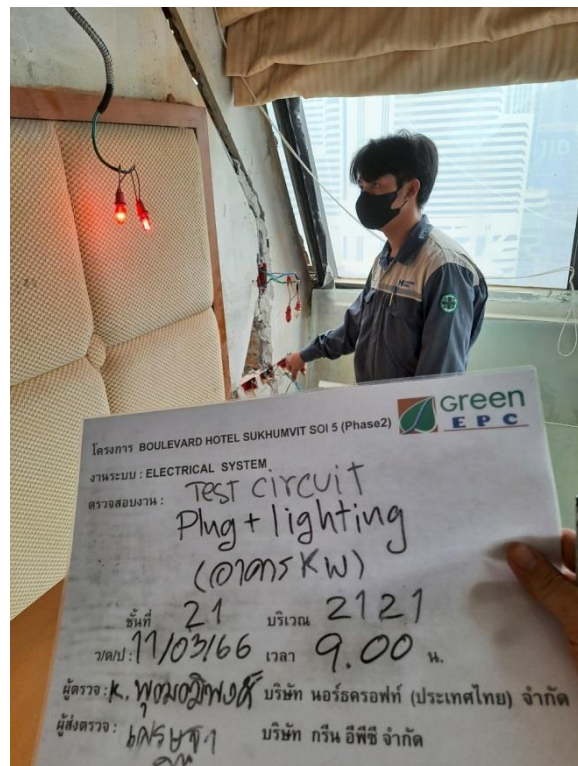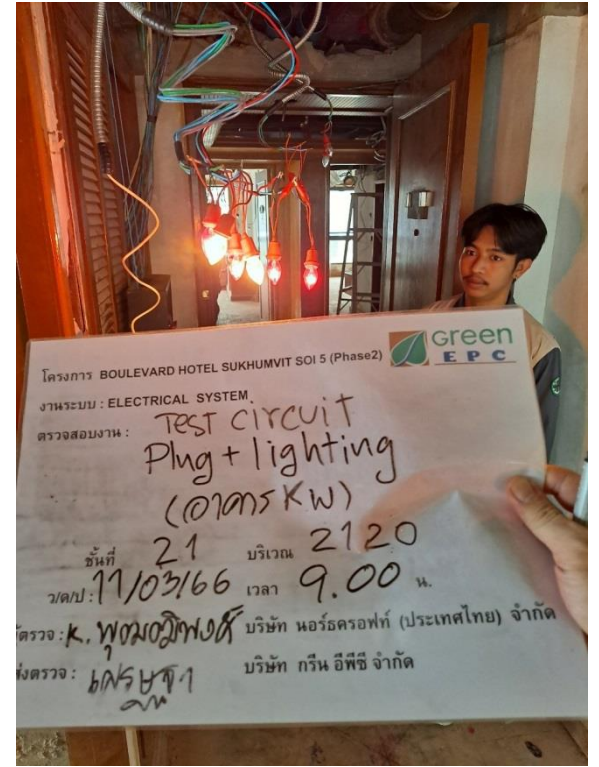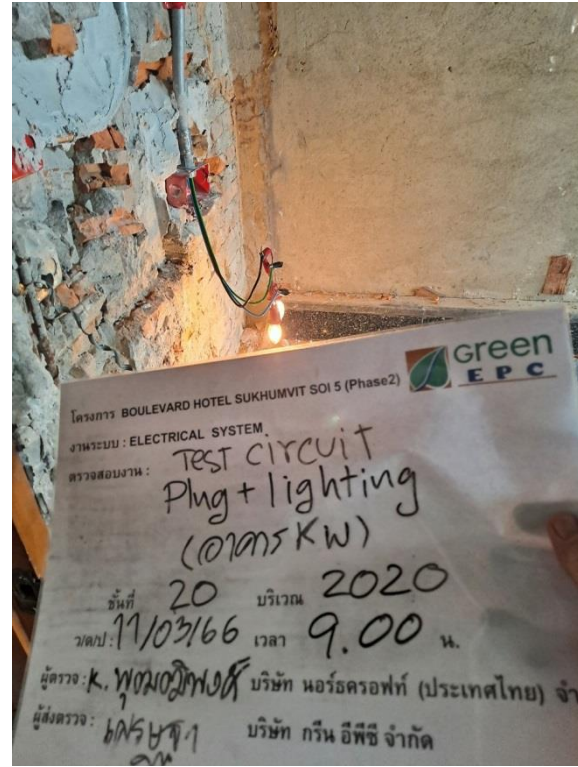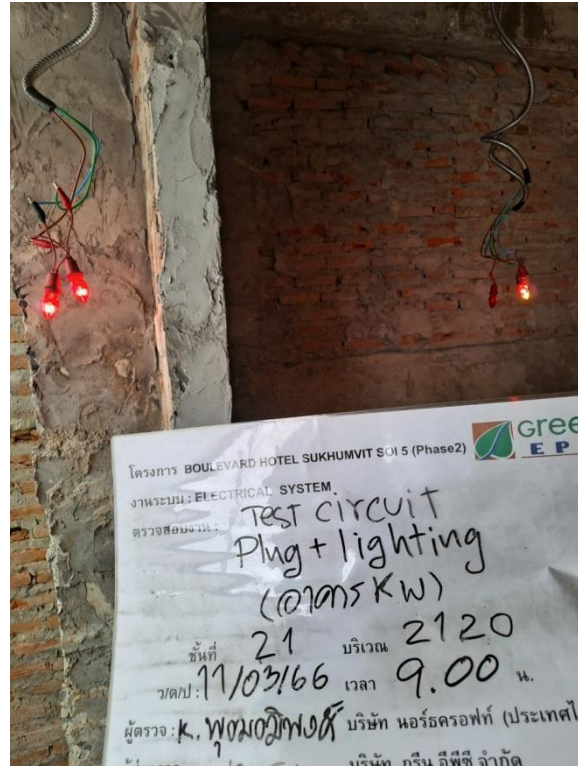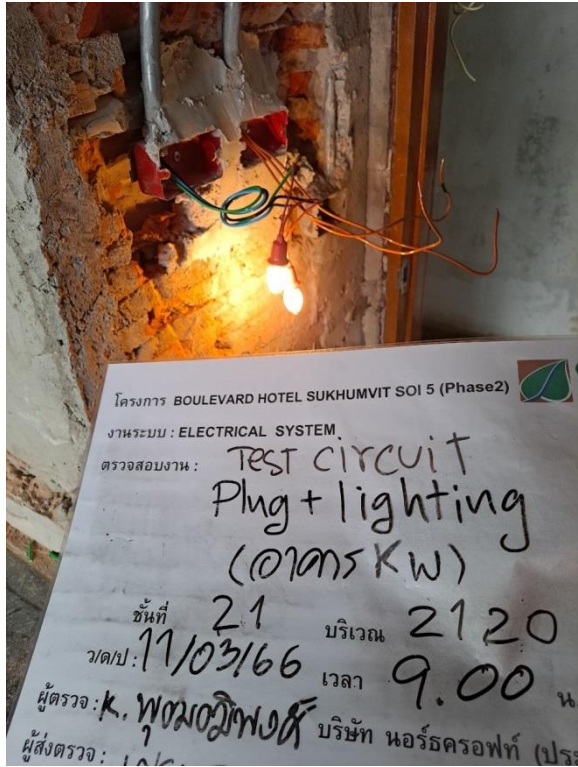









รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานทดสอบวงจร Lighting And Power Receptacle บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 23,24 (Type Deluxe A,B)

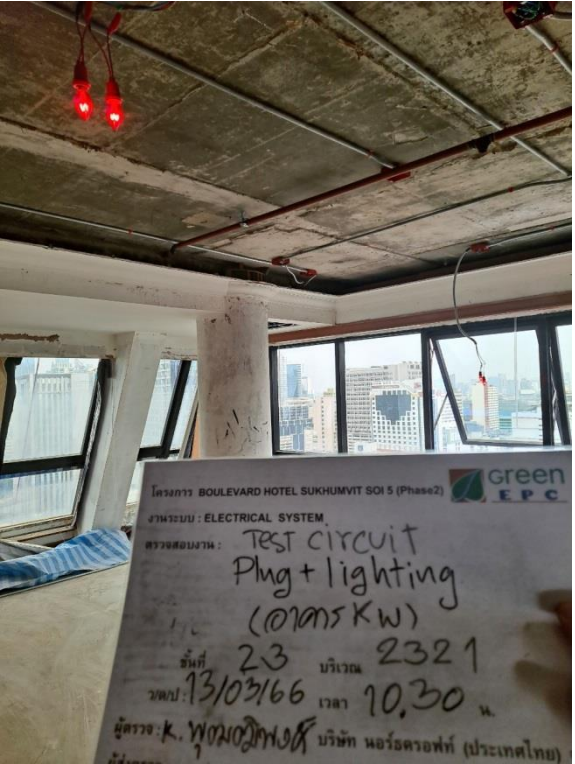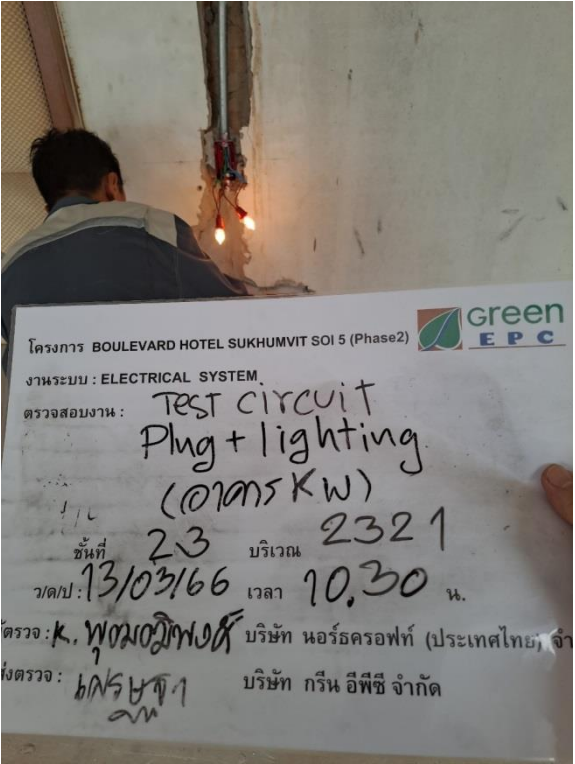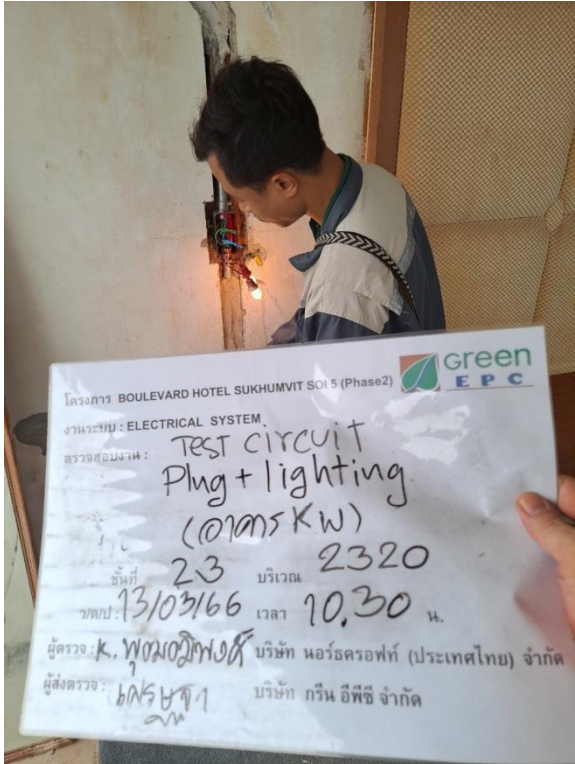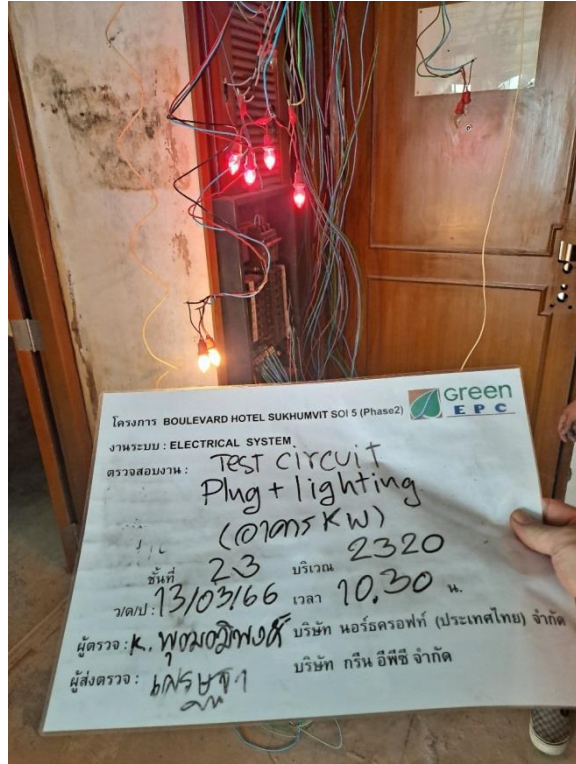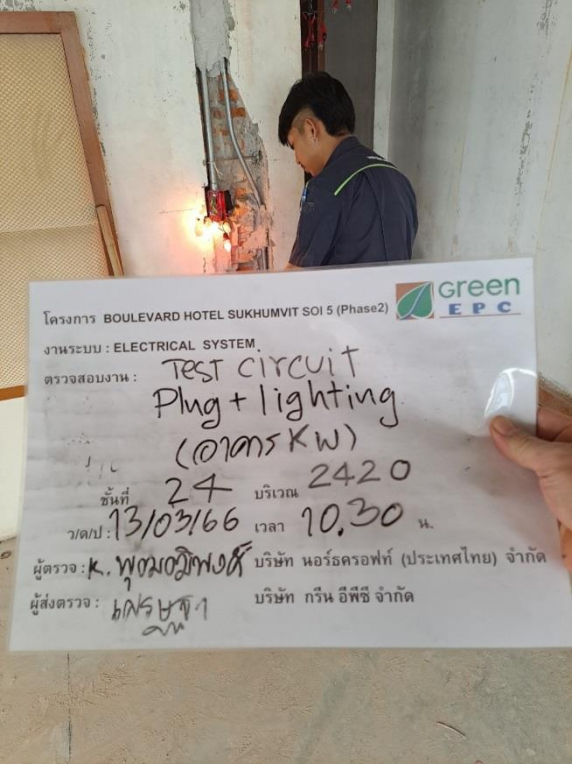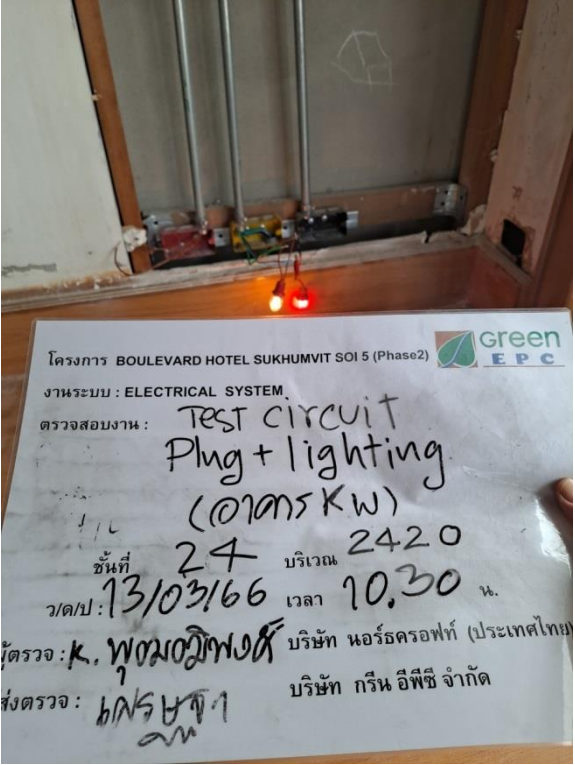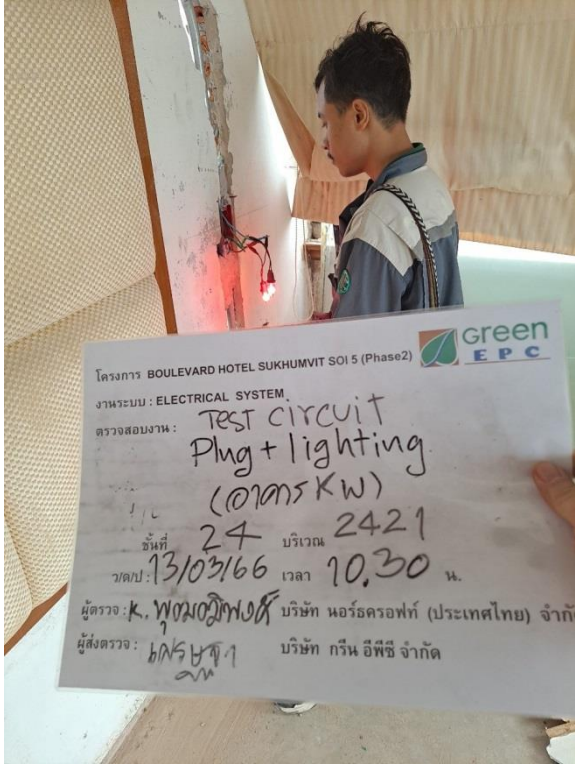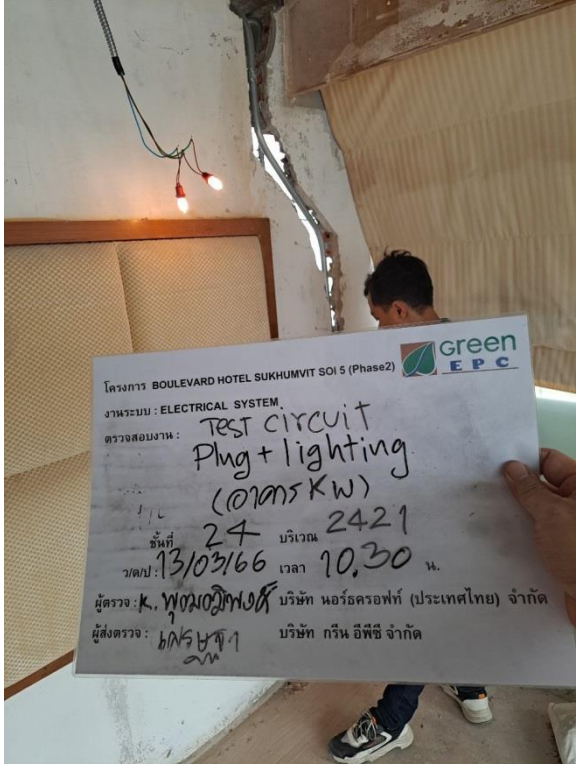

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานทดสอบวงจร Lighting And Power Receptacle บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21

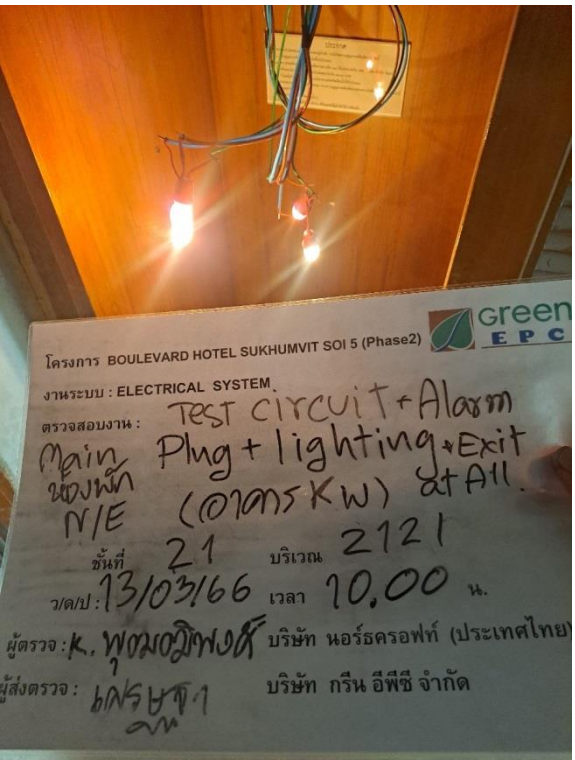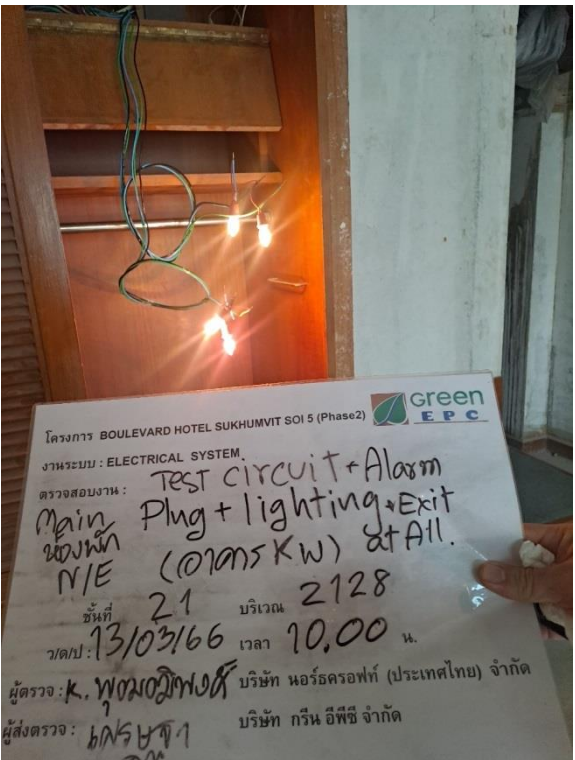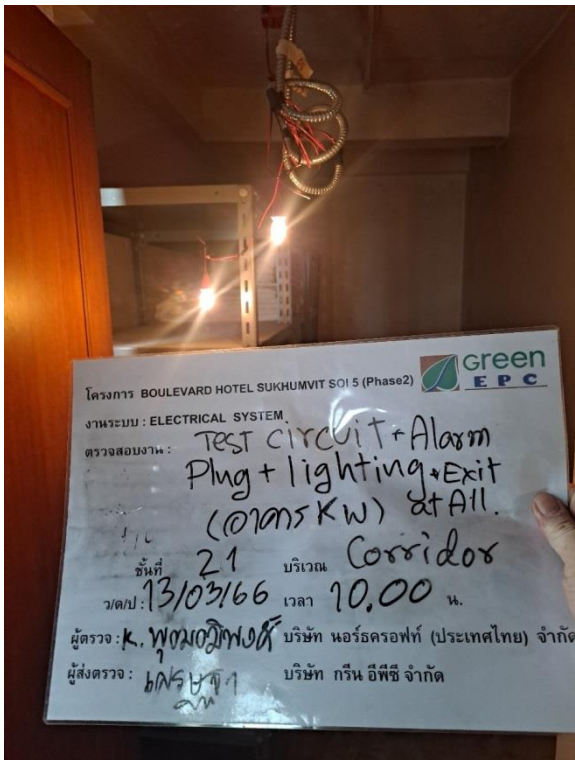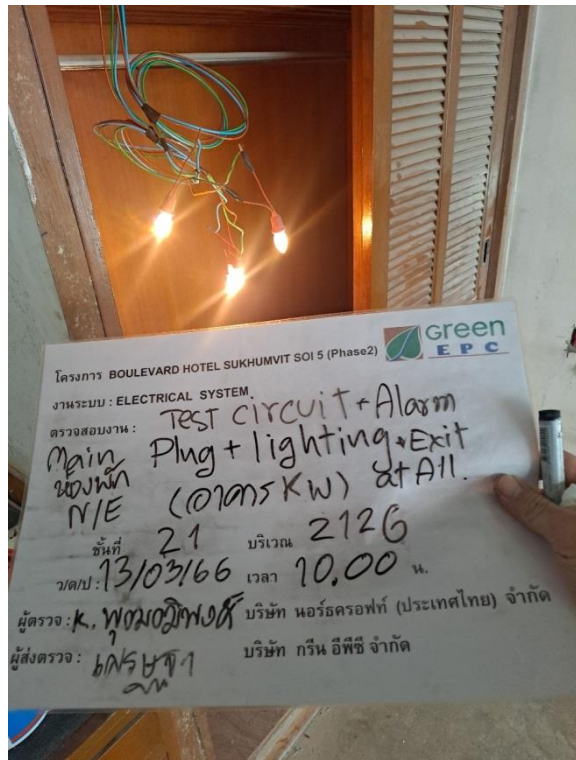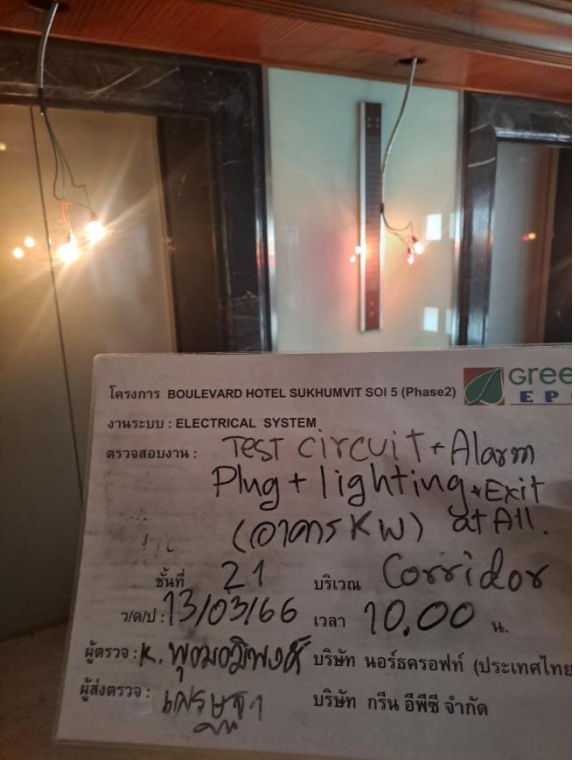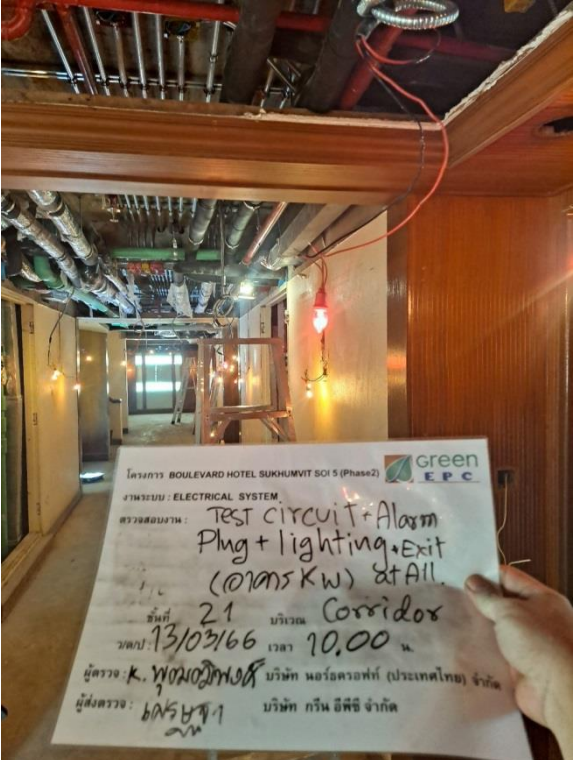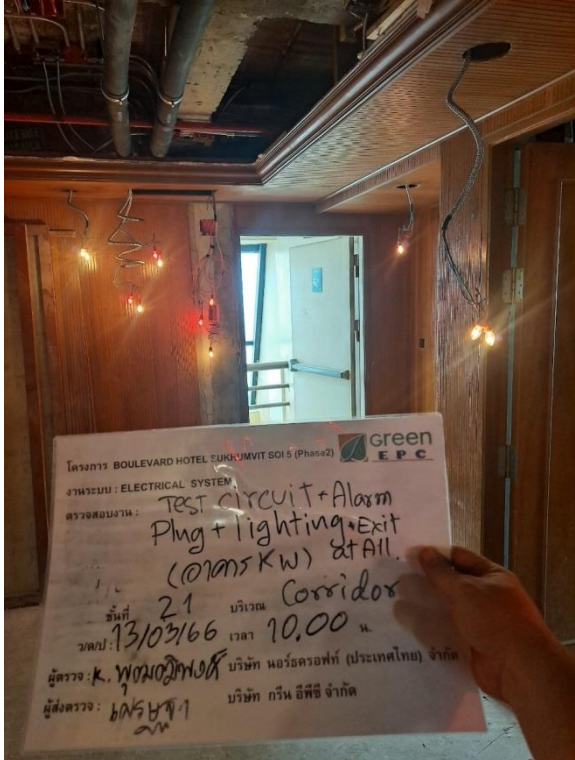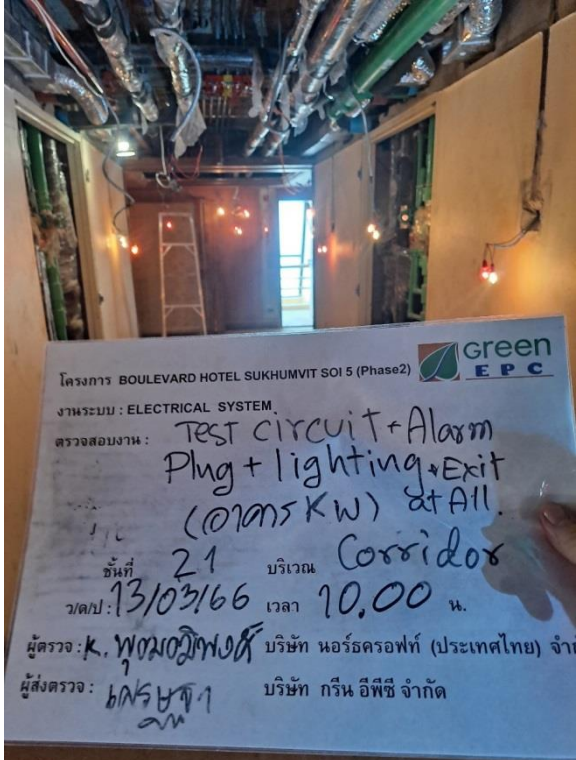









รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพักรับ อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 7



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานระยะ,ระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์หน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16-17

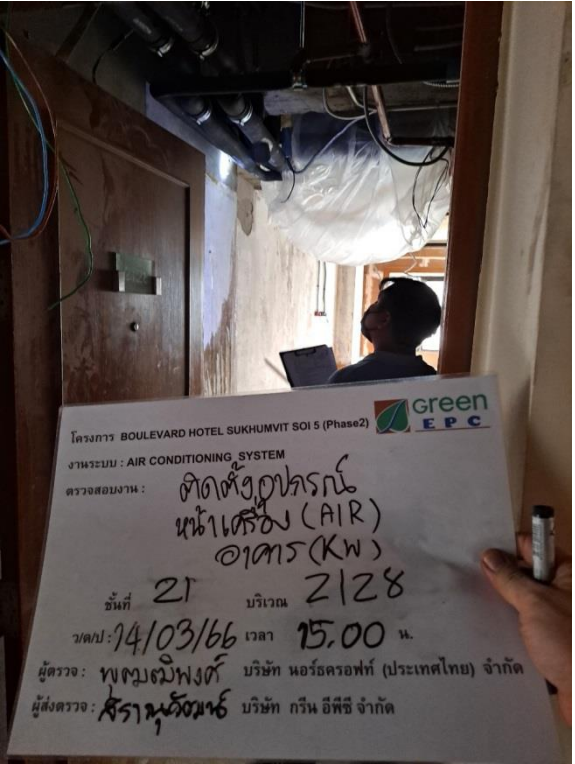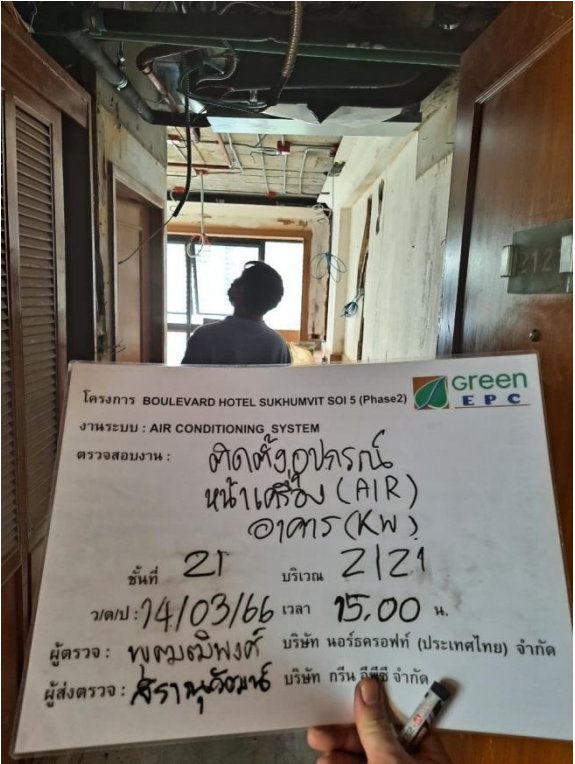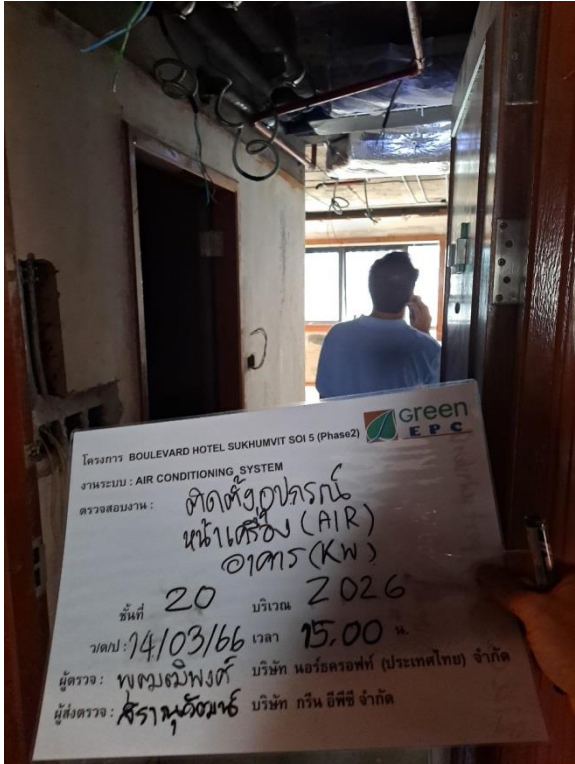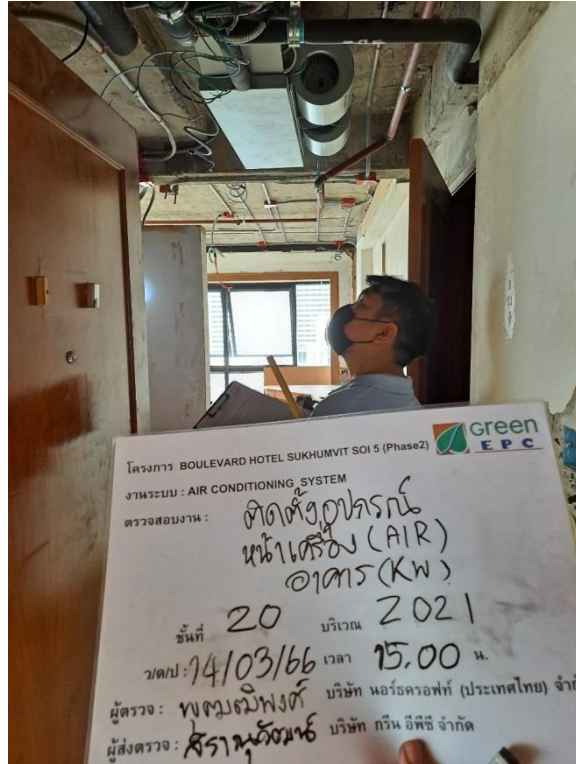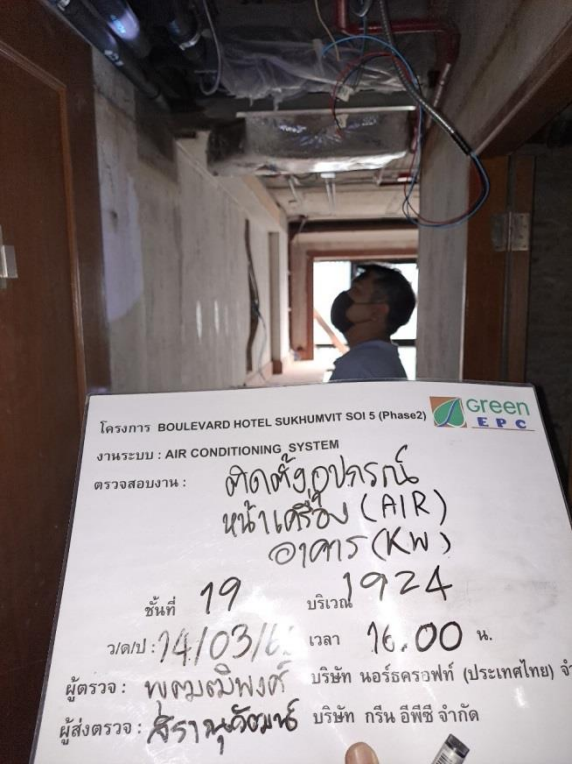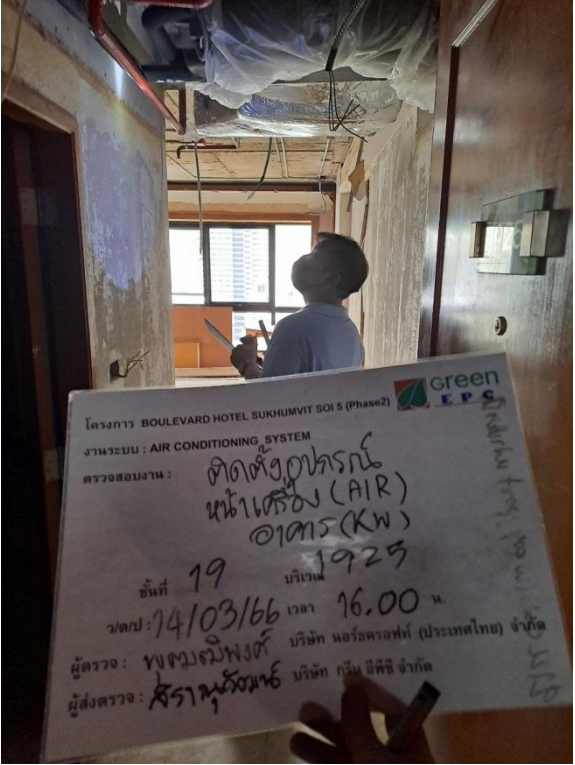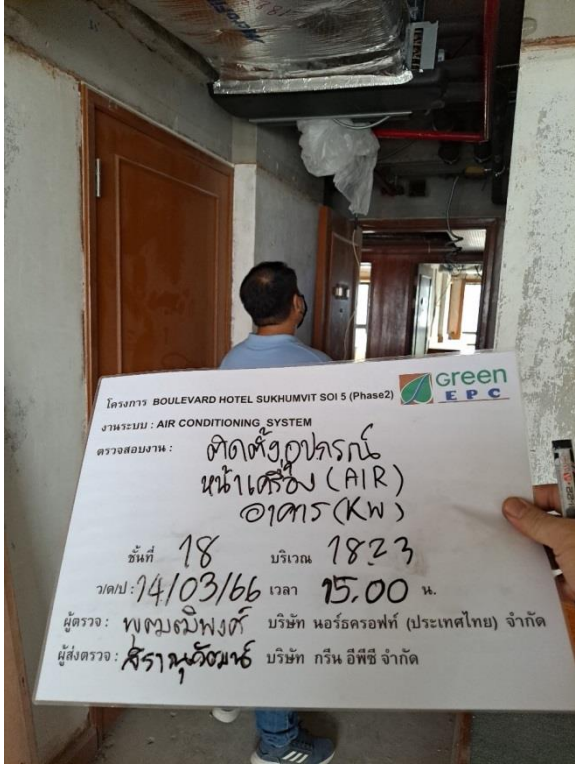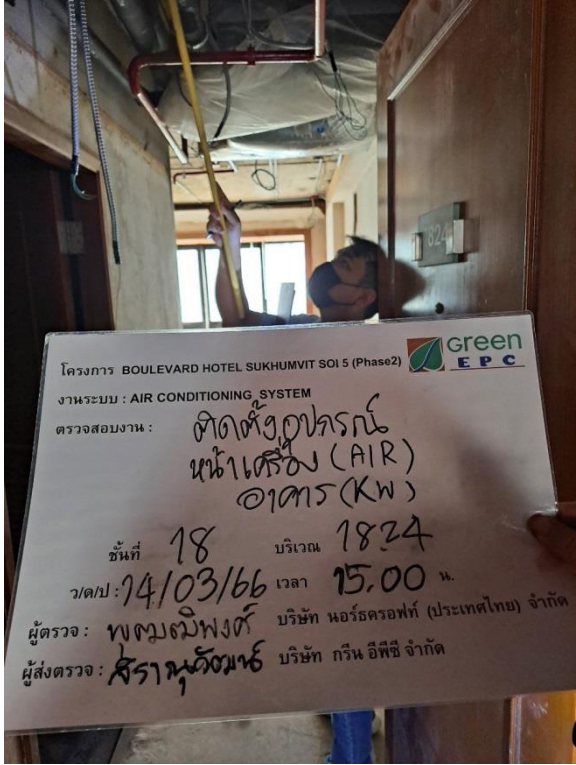


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 23-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





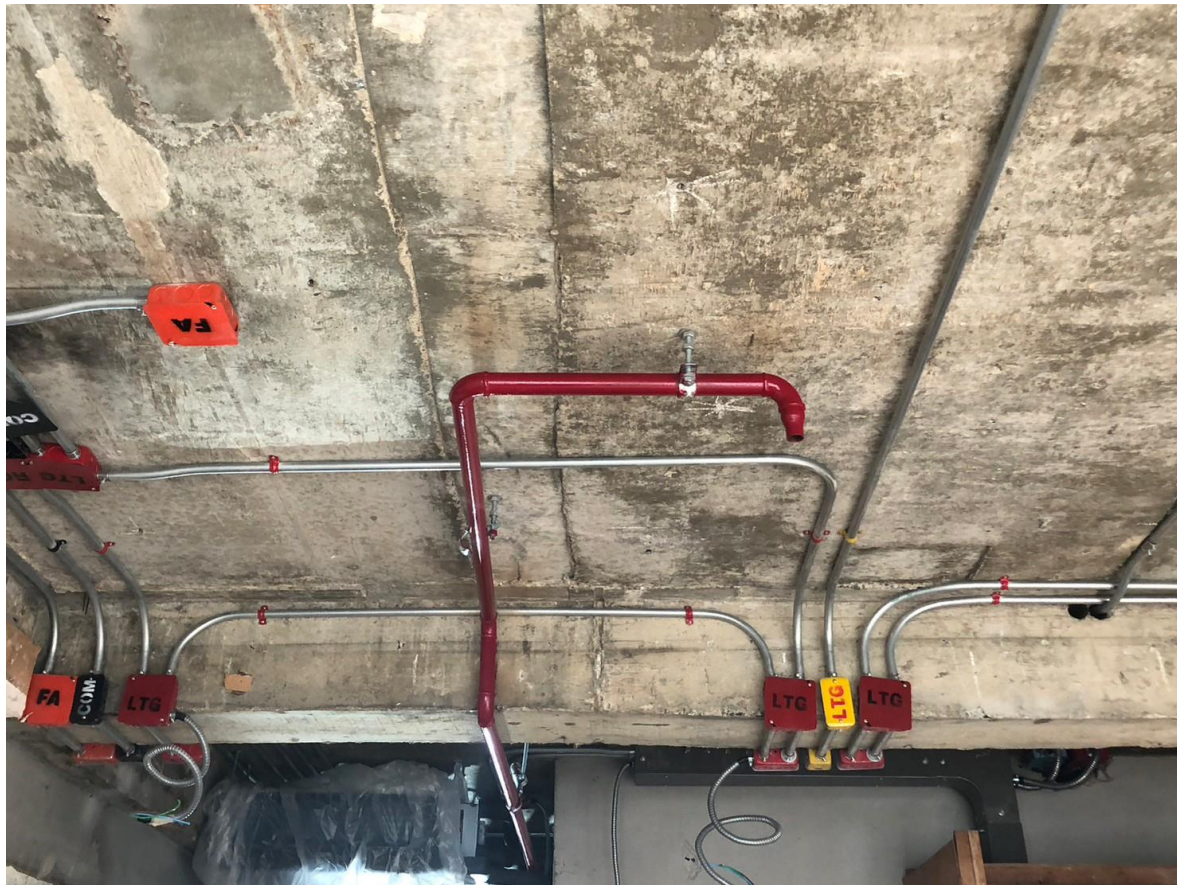


งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 23-25











รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานระยะ,ระดับ การติดตั้งท่อสปริงเกอร์ บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16-17

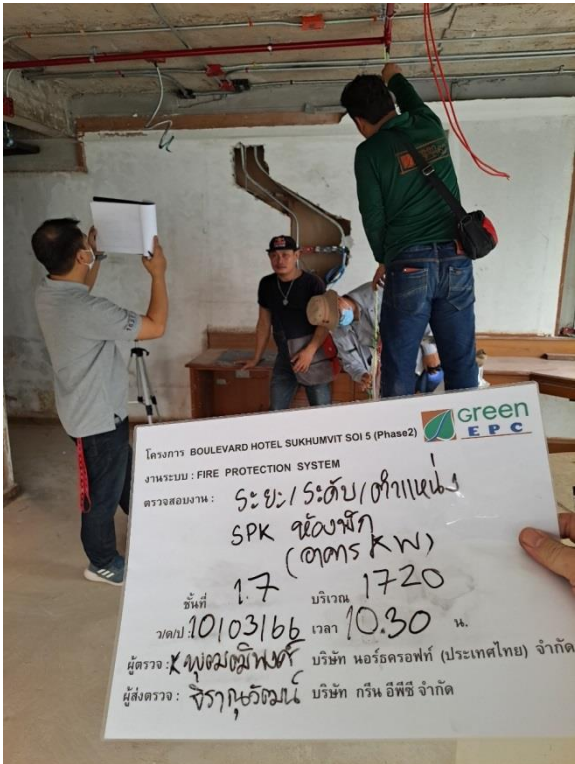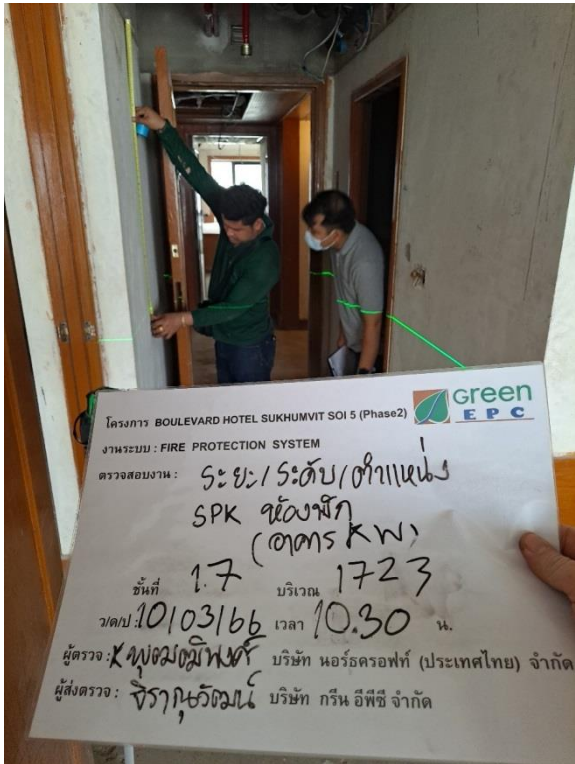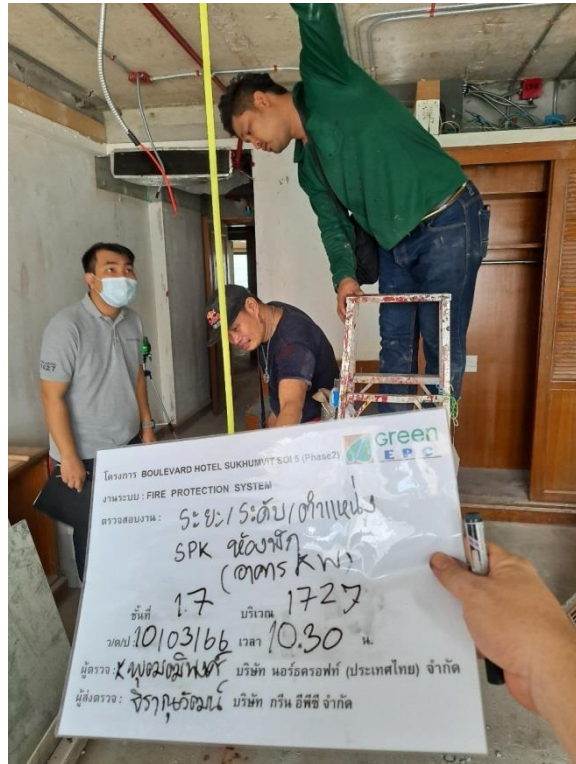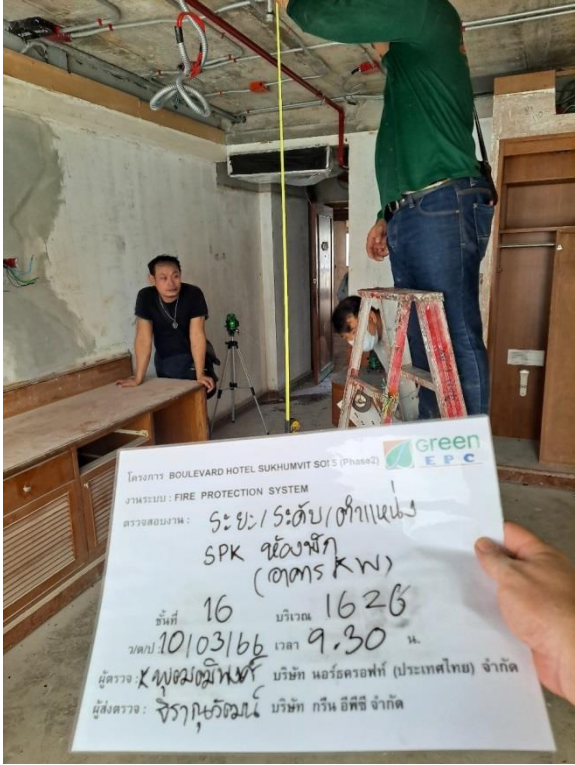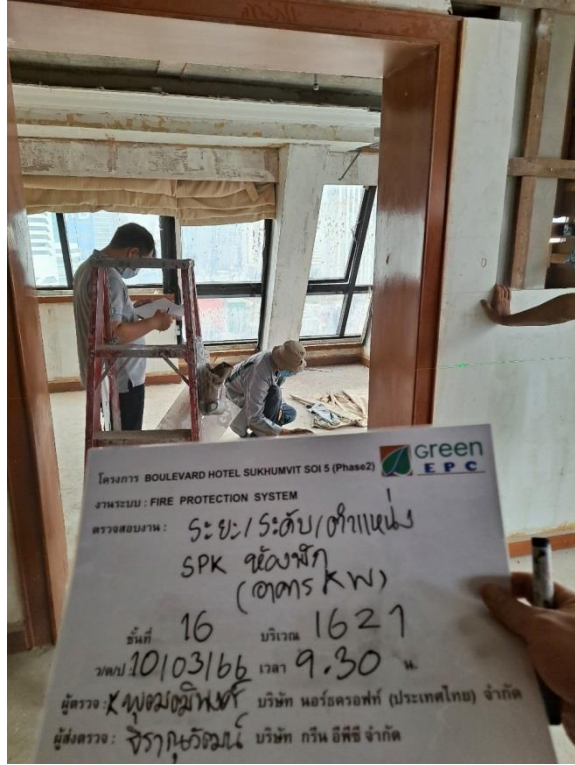









รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานระยะ,ระดับ การติดตั้งท่อ CW,HW บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18-21

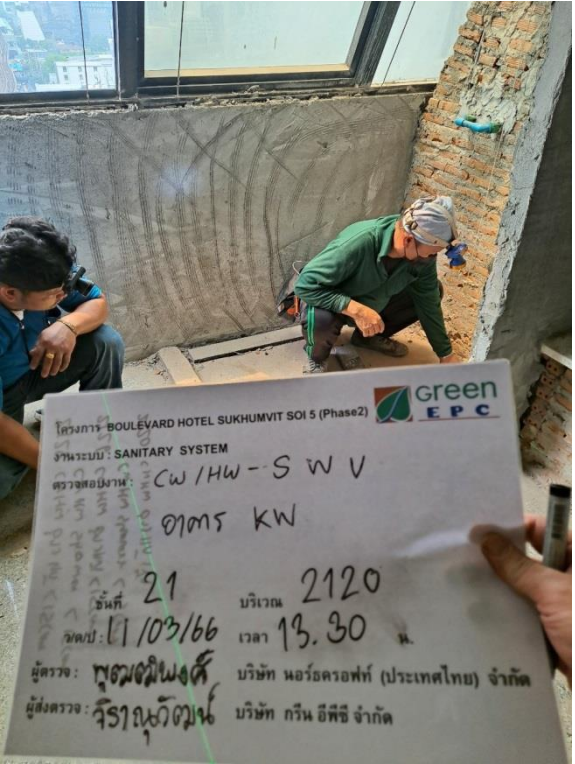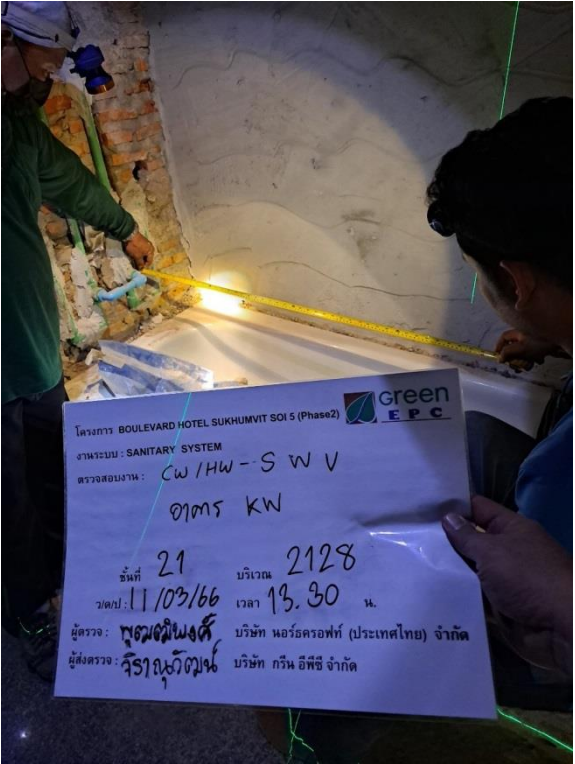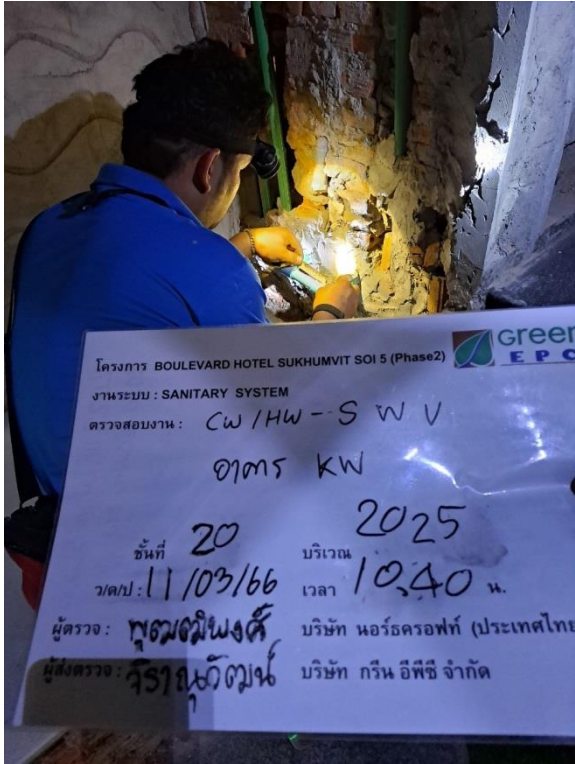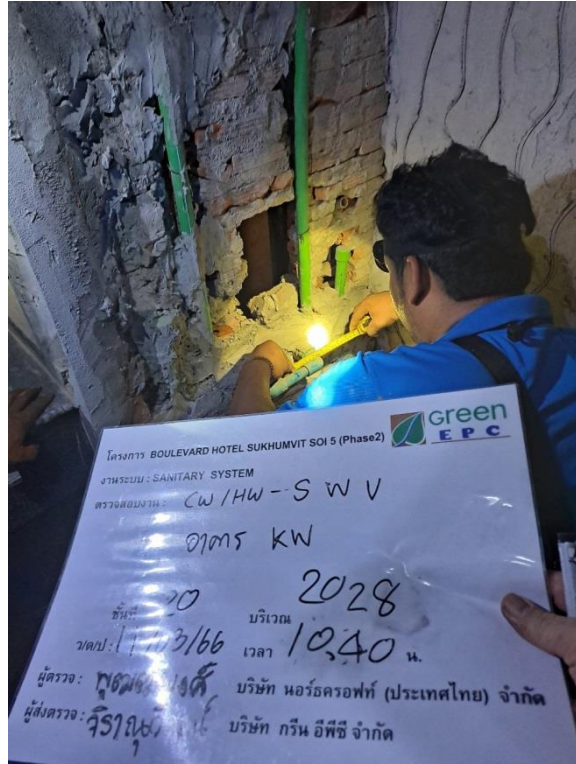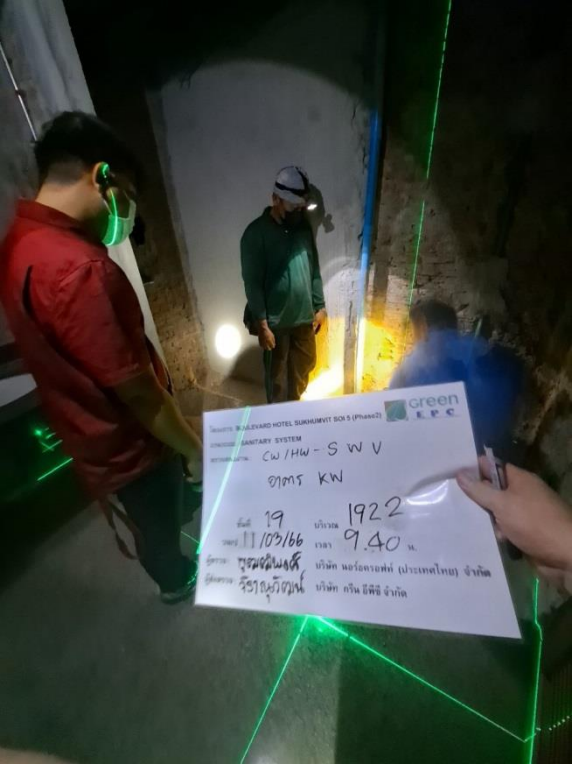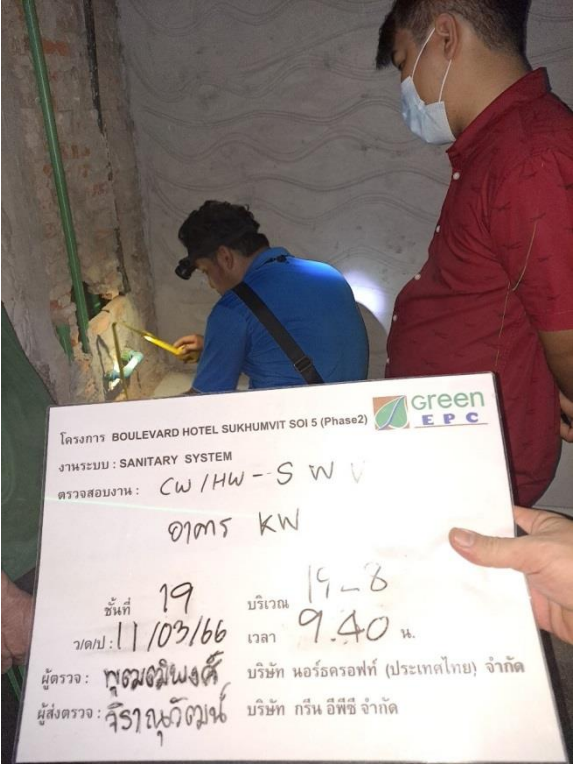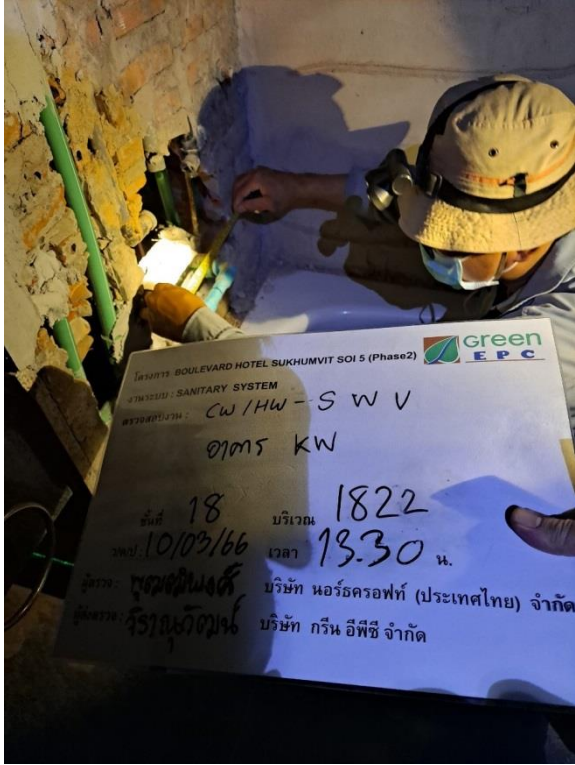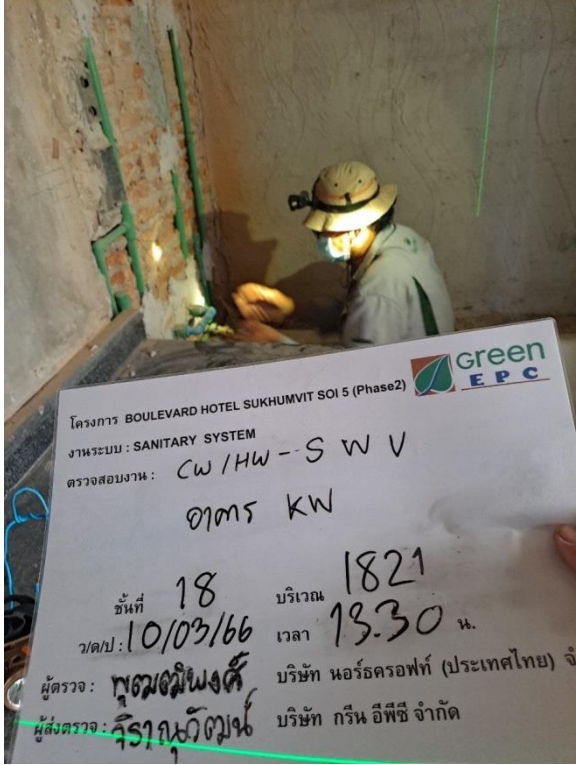

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานระยะ,ระดับ การติดตั้งท่อ CW,HW บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-25

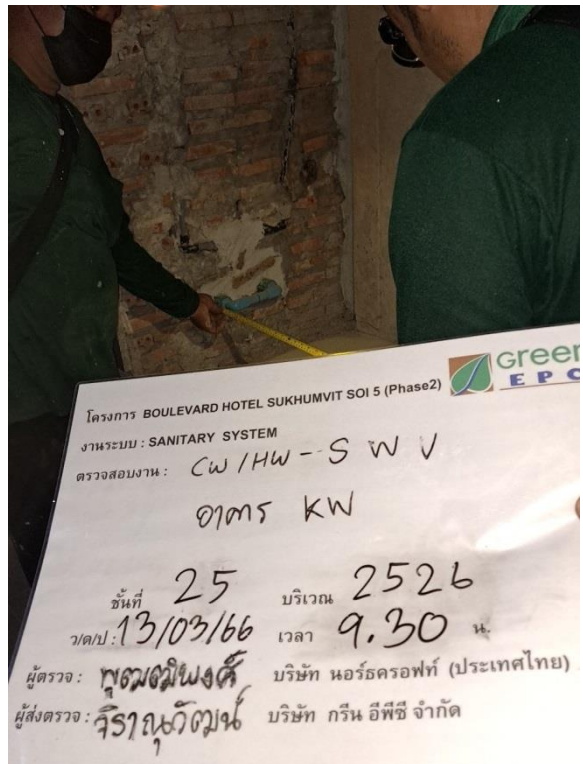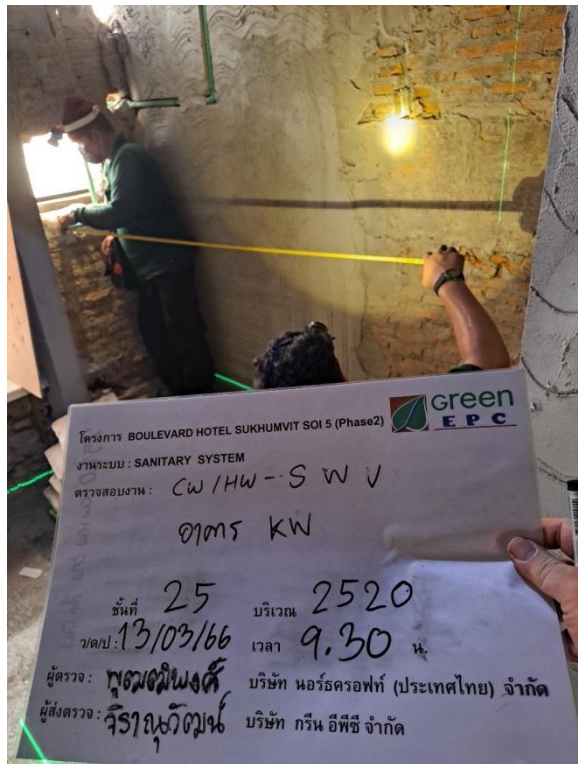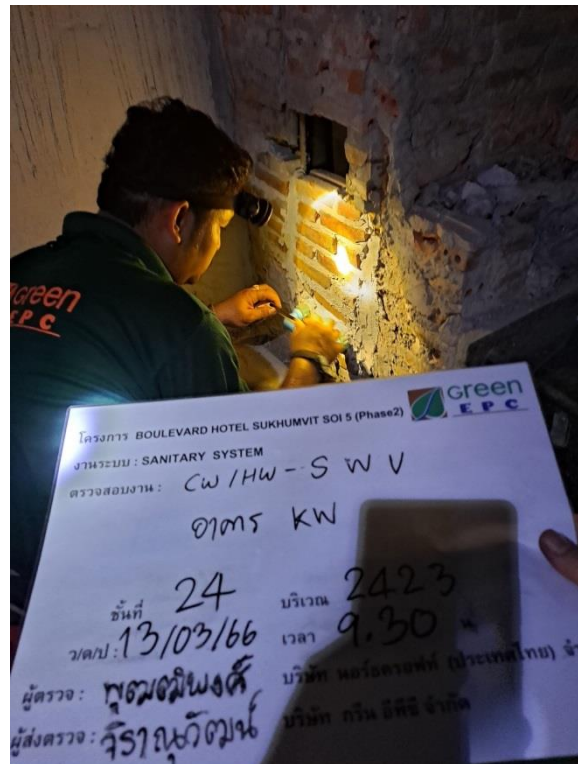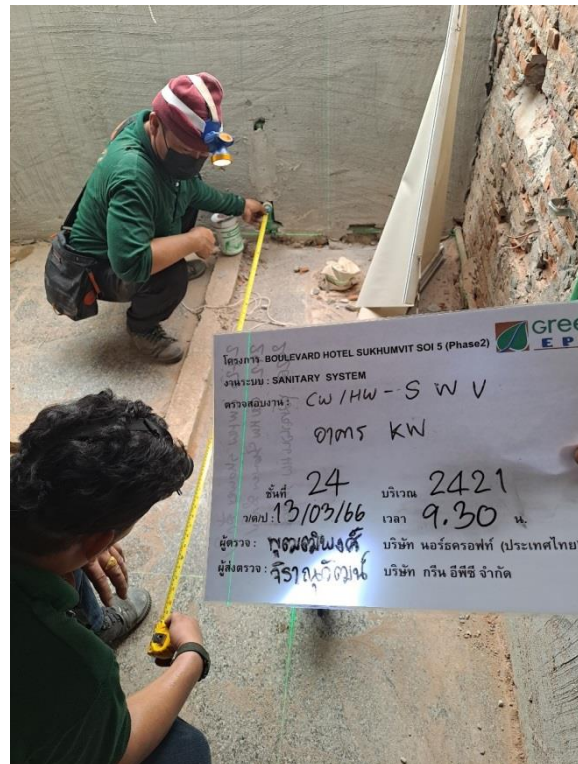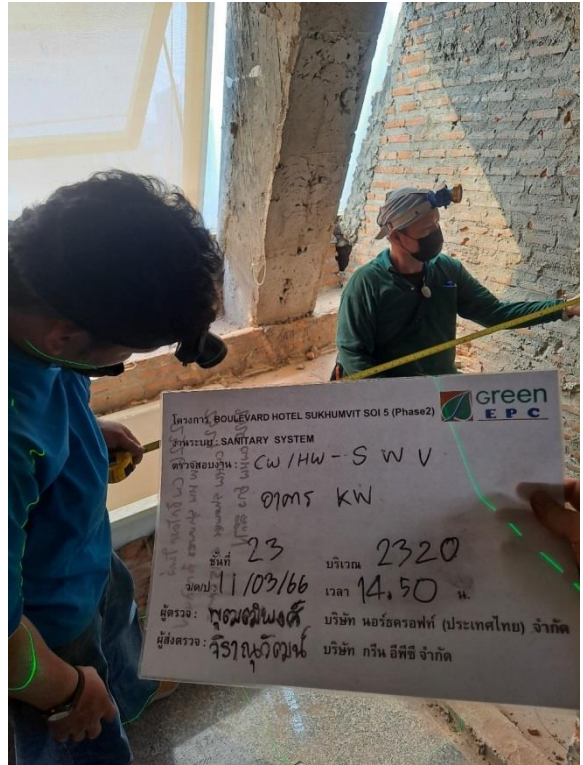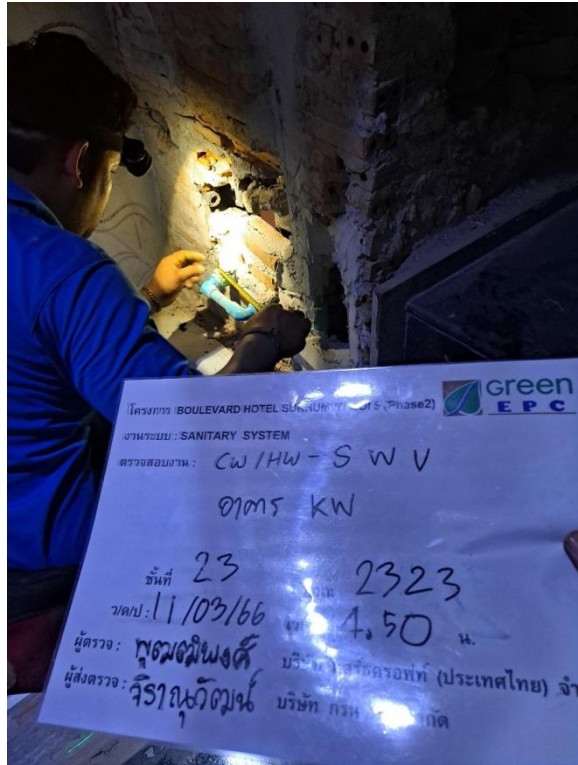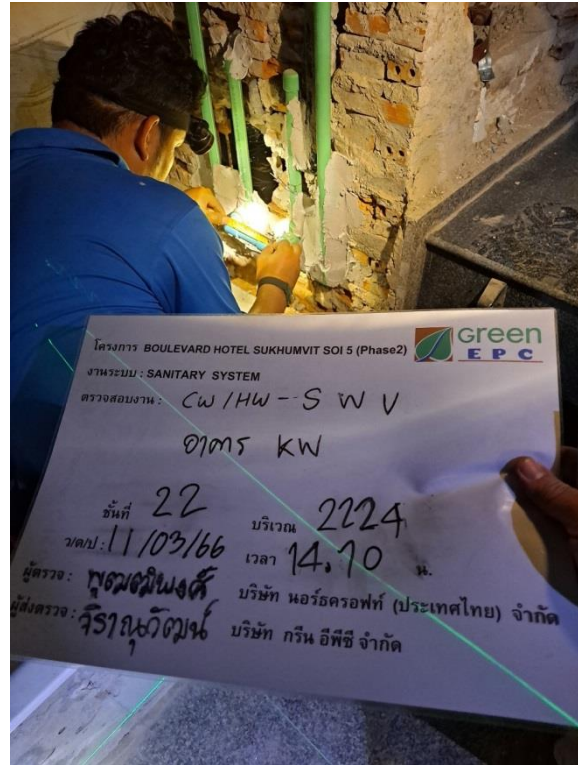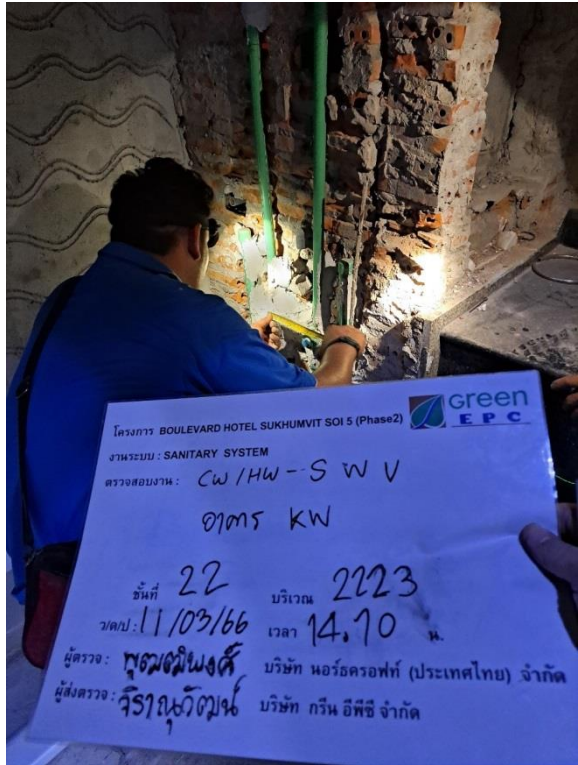

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer ภายในตู้เสื้อผ้าบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer ภายในตู้เสื้อผ้าบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 8

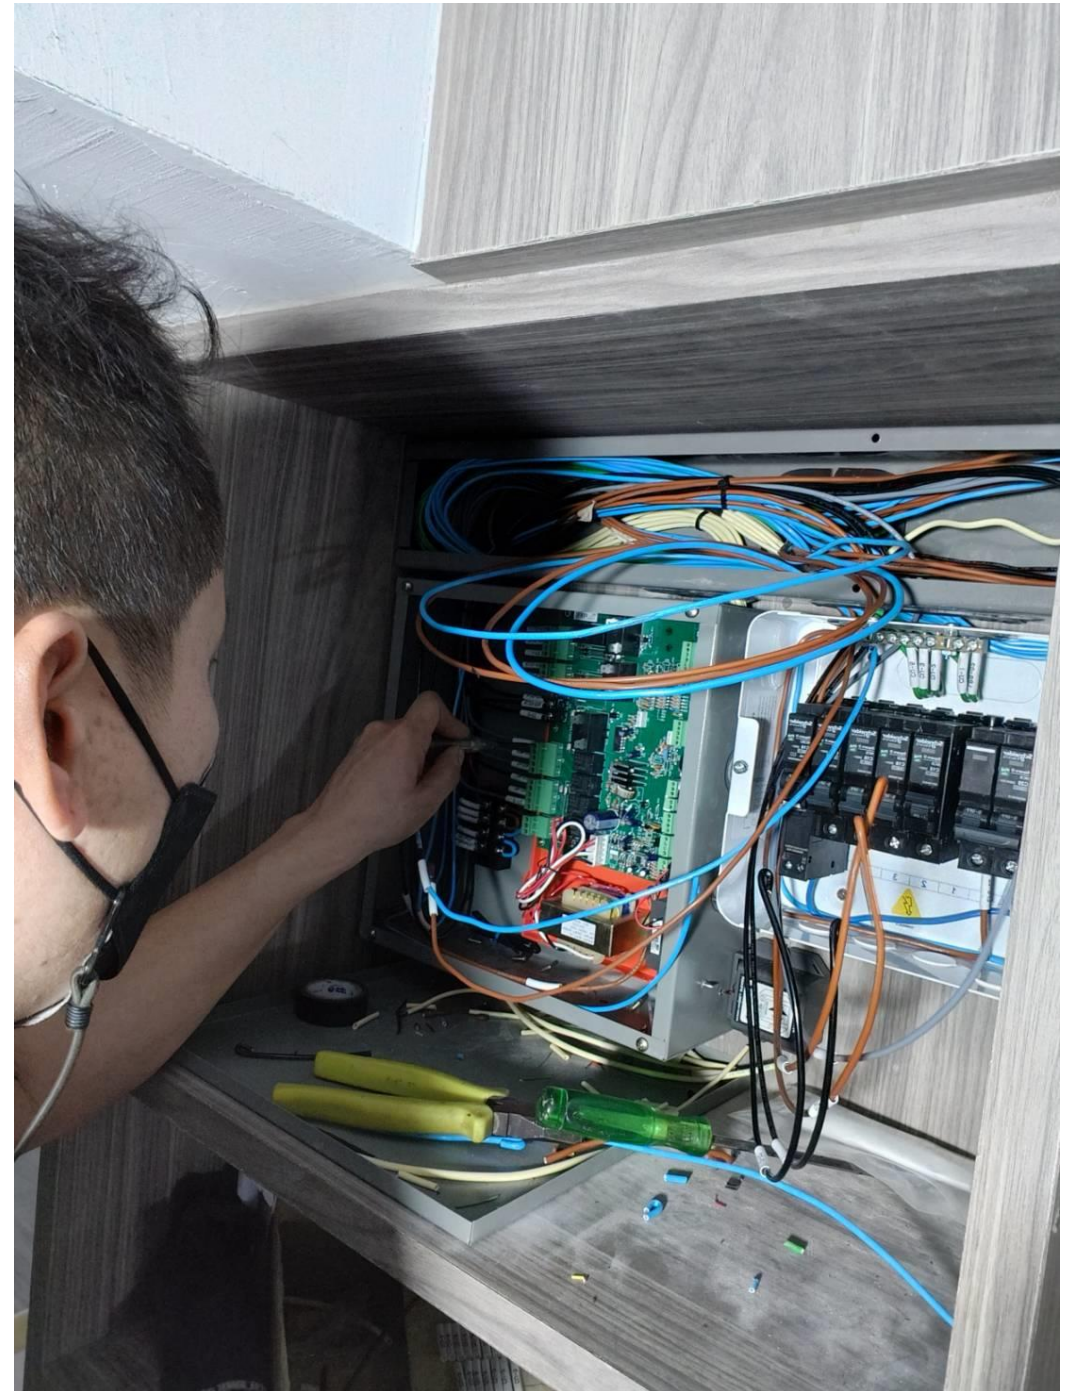


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer ภายในตู้เสื้อผ้าบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 8

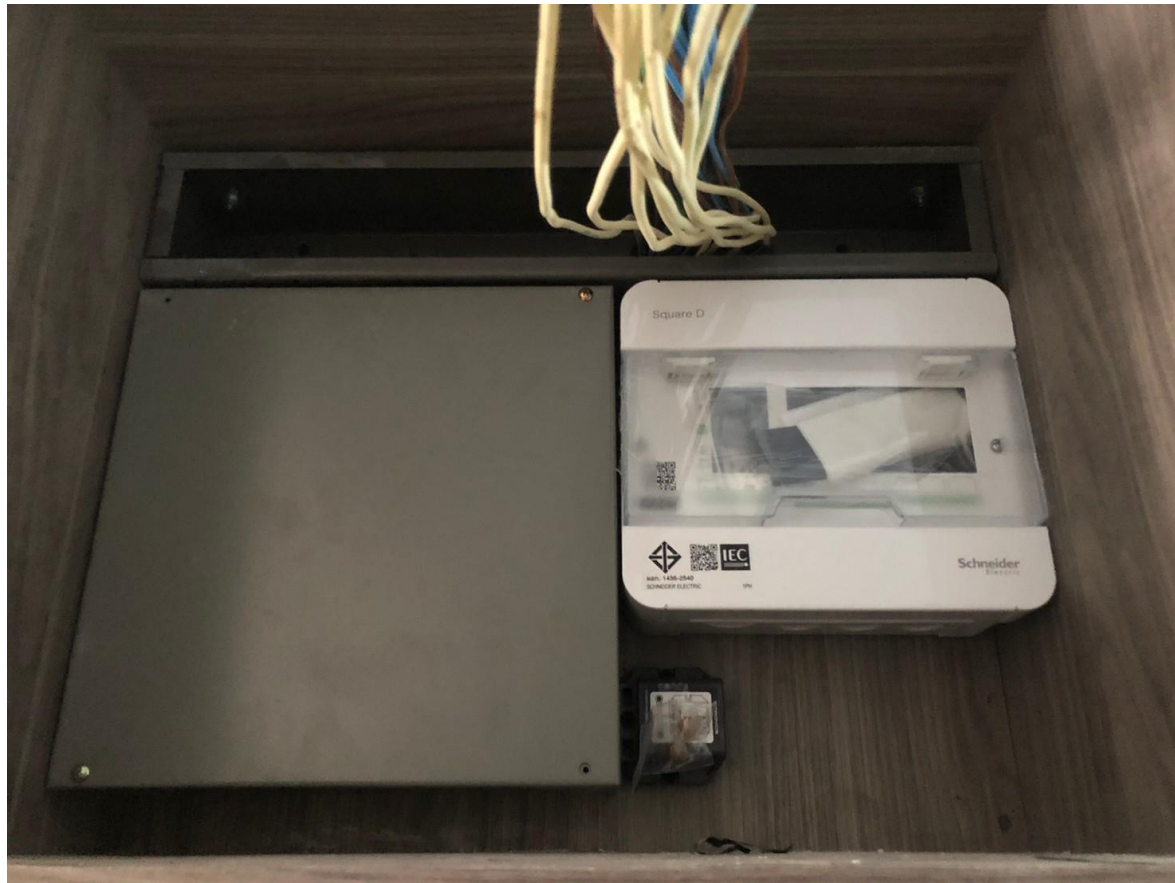

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์บริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงด์ ชั้น 9

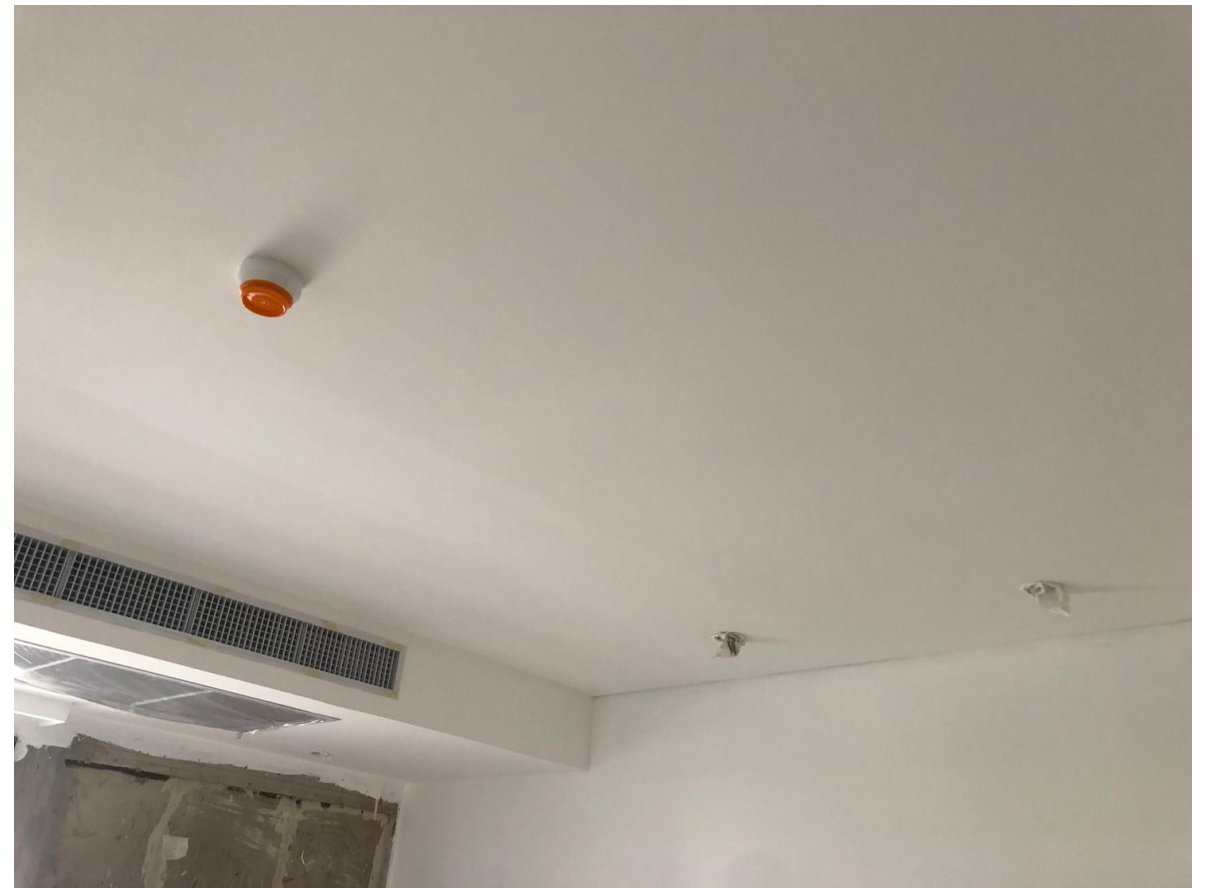

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟและอุปกรณ์บริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงด์ ชั้น 8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 8,9




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 8,9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

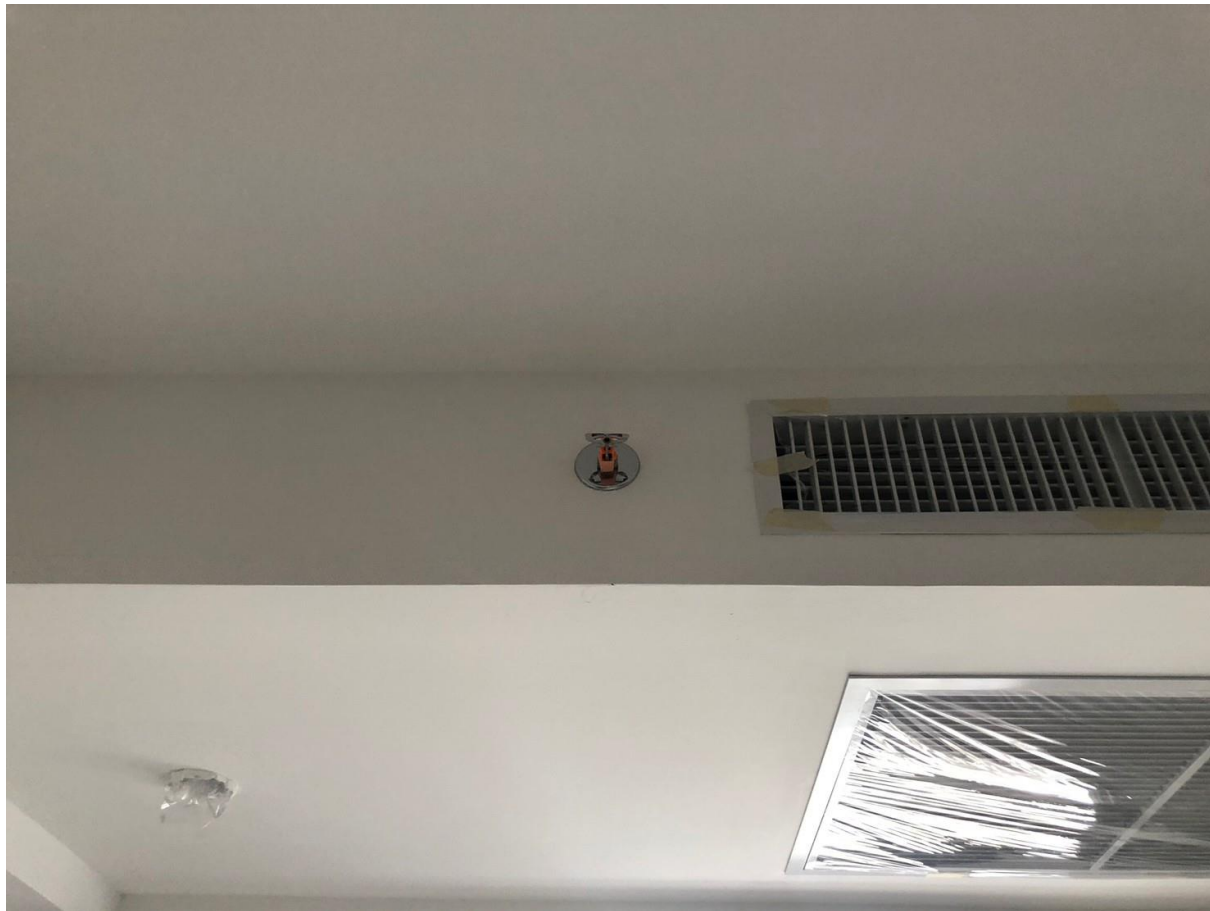


งานใส่หัวสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อระบายอากาศ บริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6

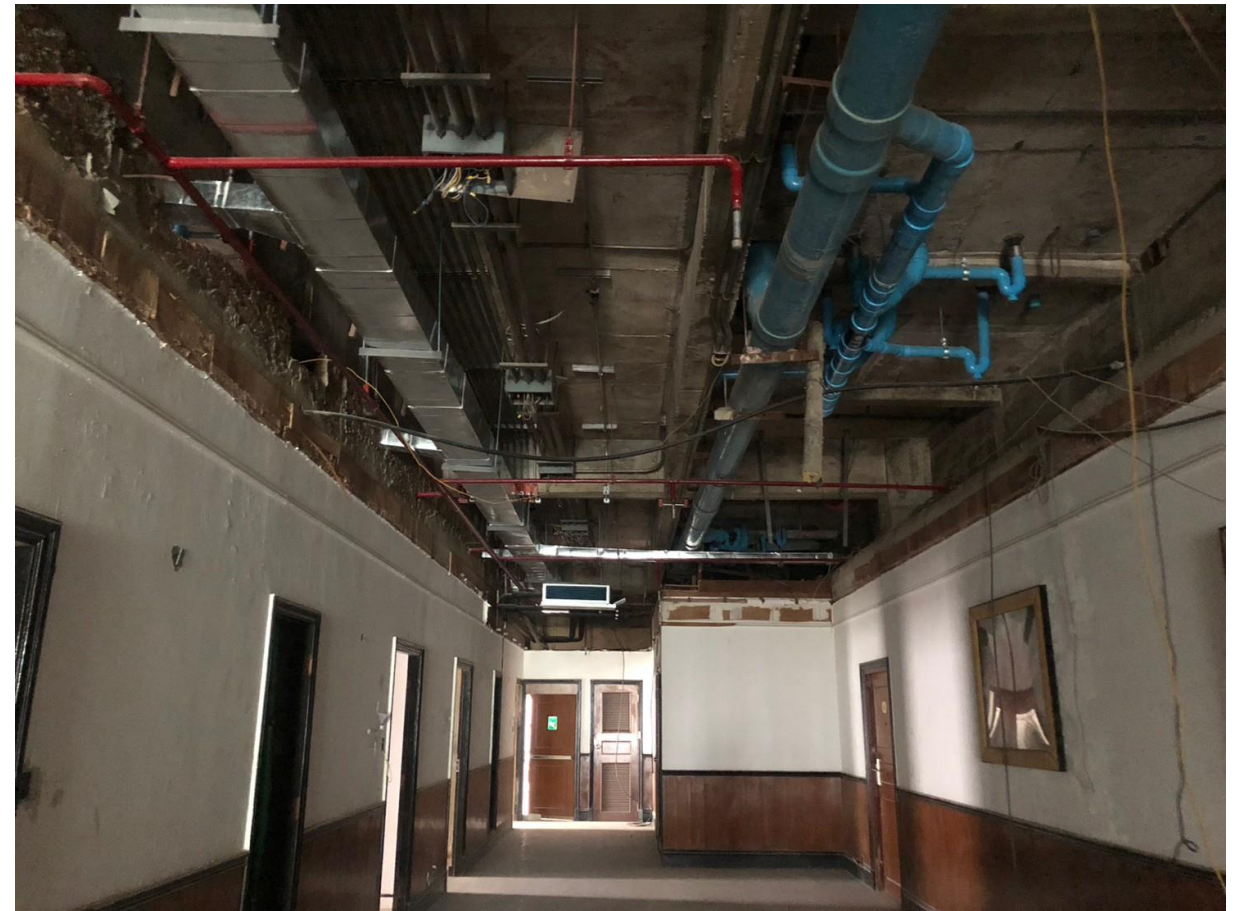


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อระบายอากาศ บริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

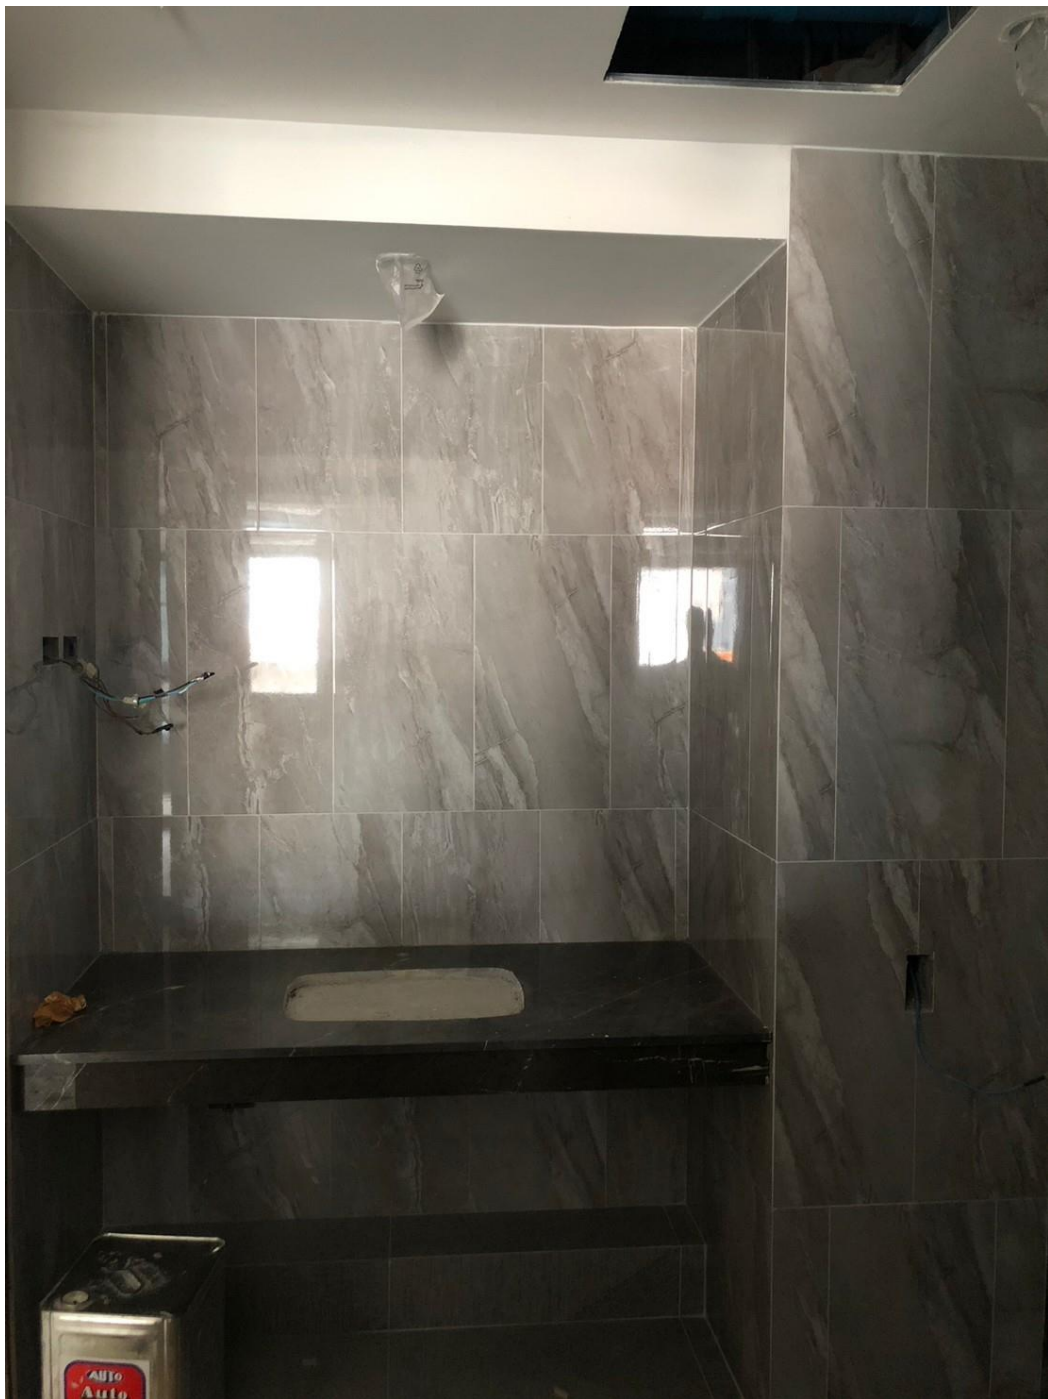


งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพัค อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

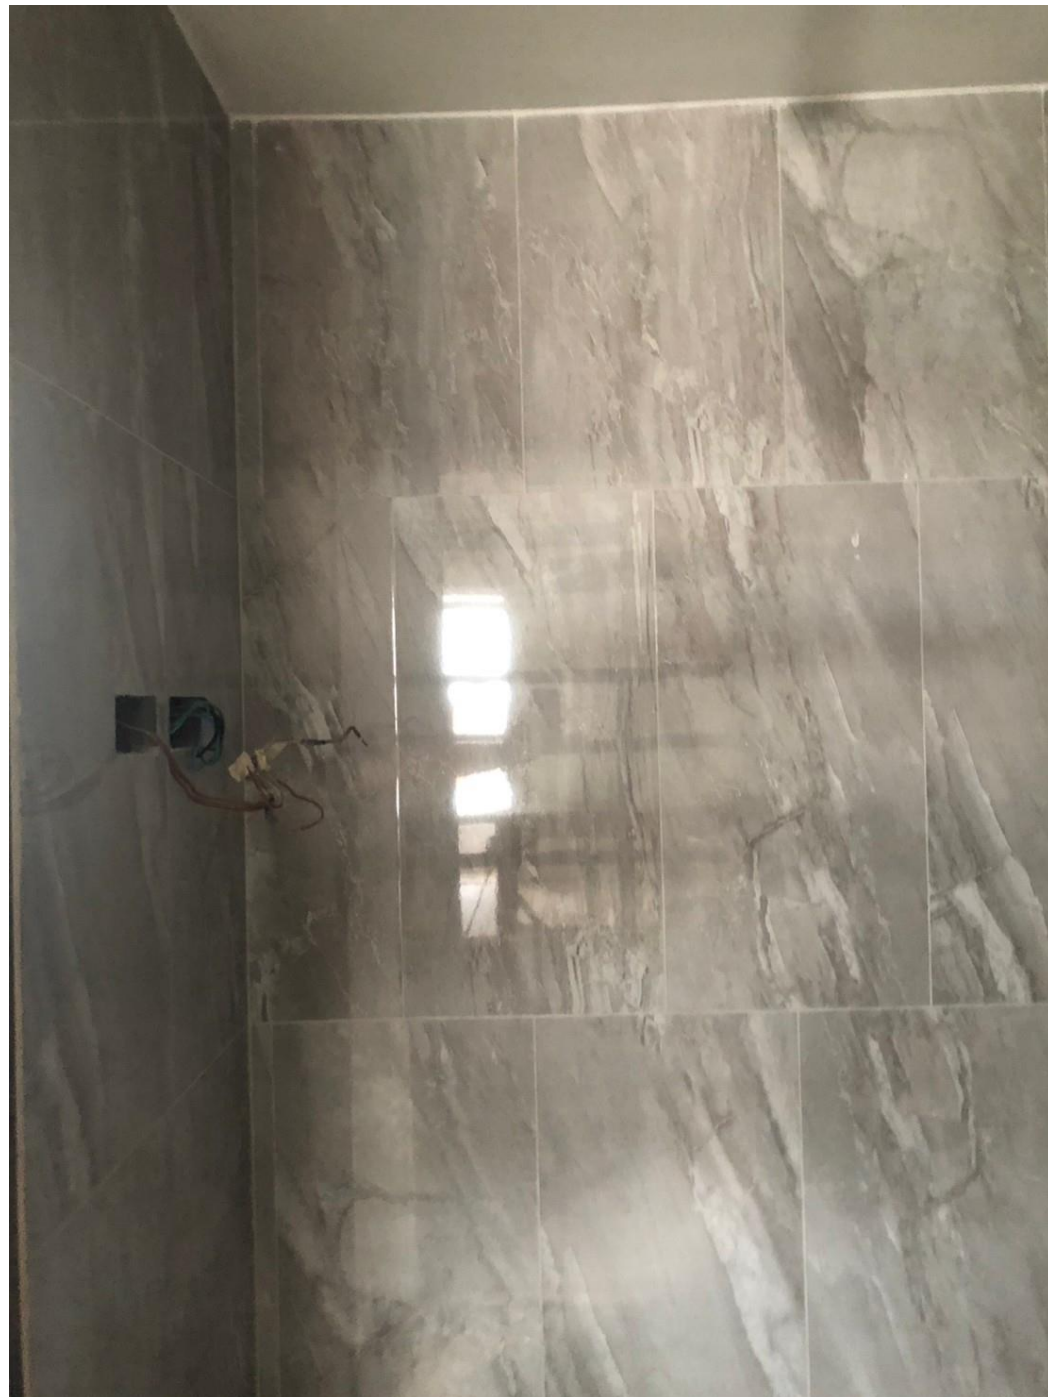

งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพักร อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-8

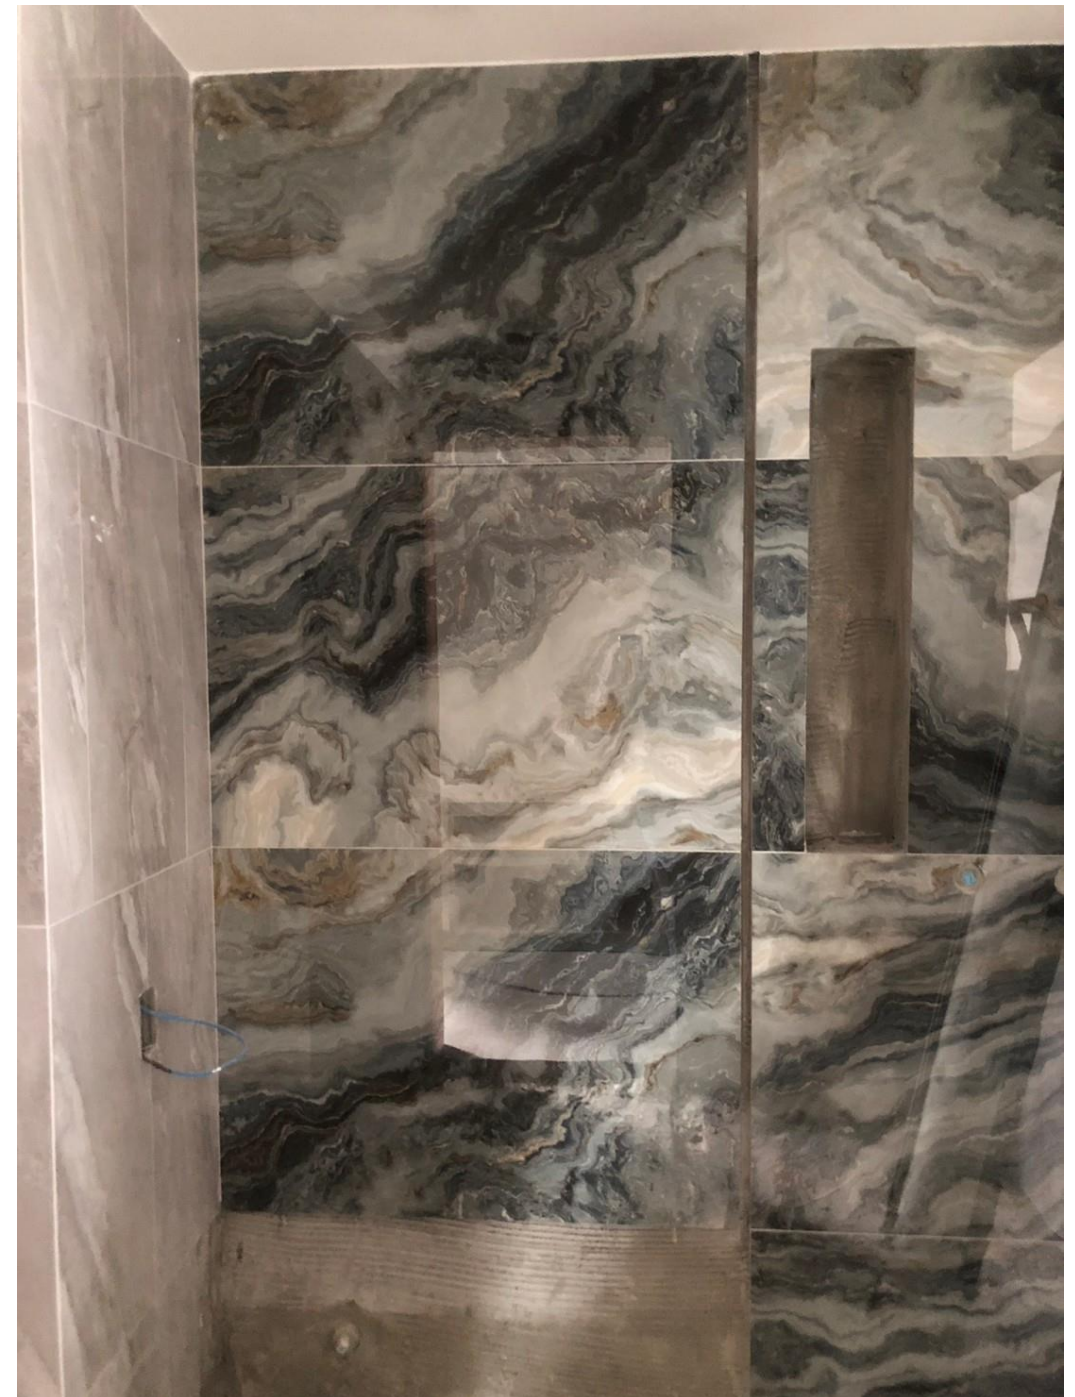

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา











งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพักร ออาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


ตรวจสอบงานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำ บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9

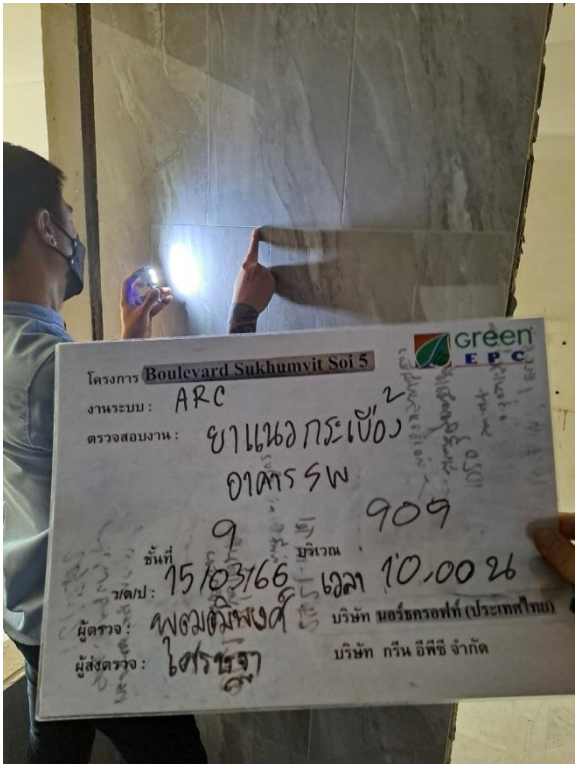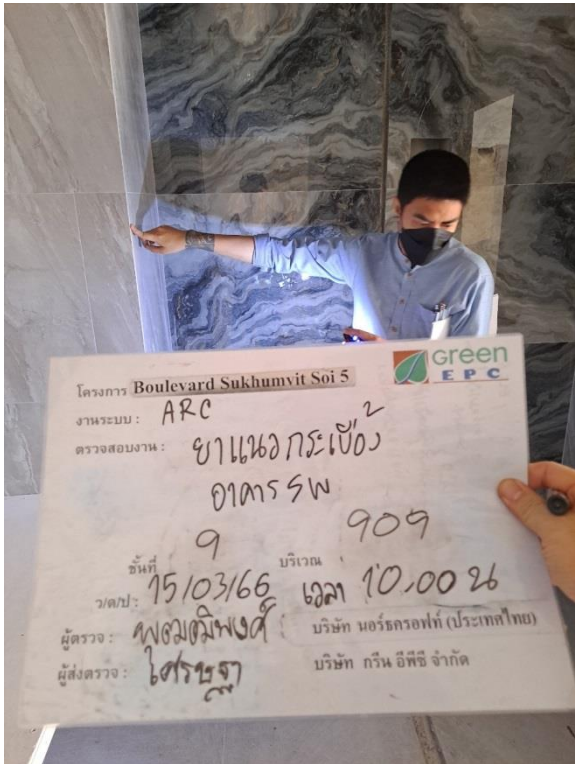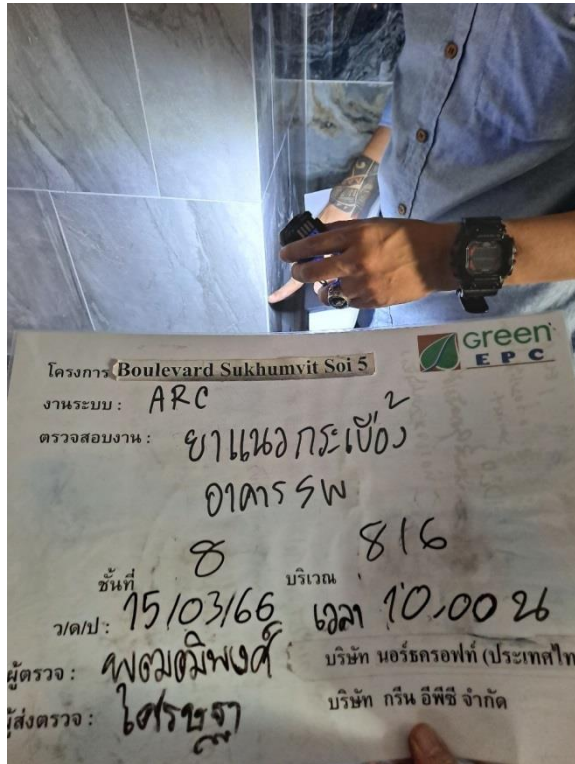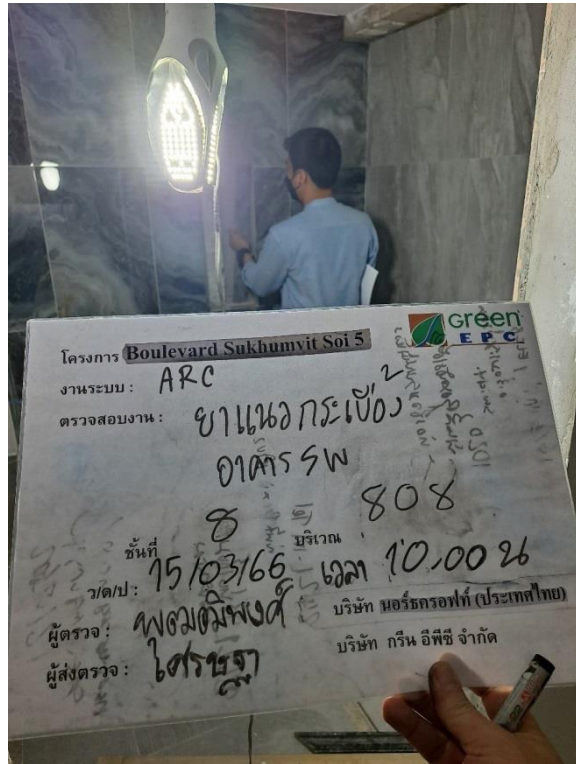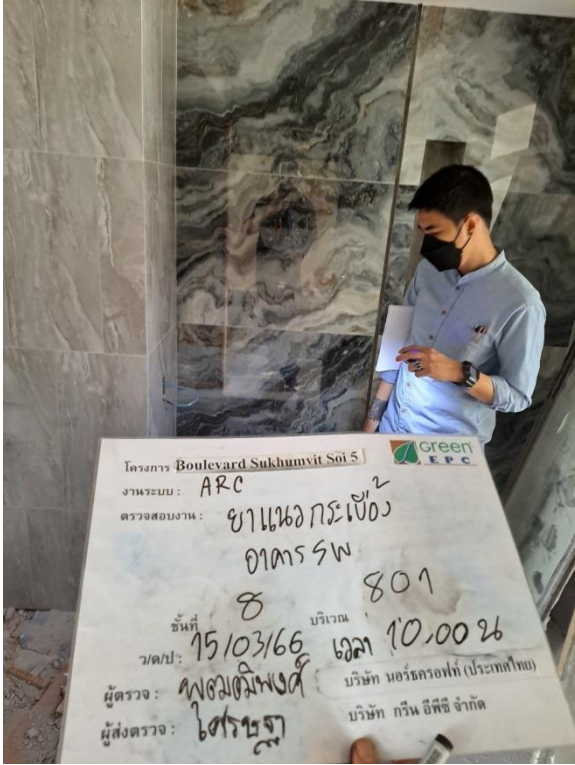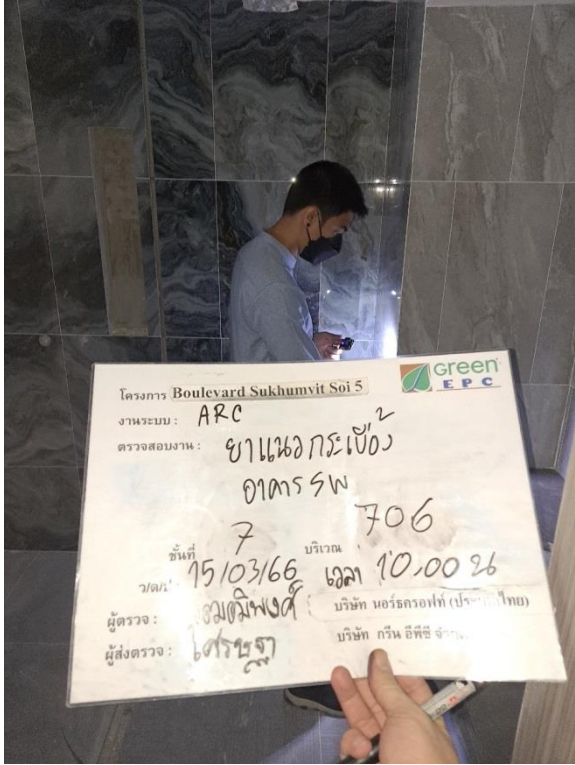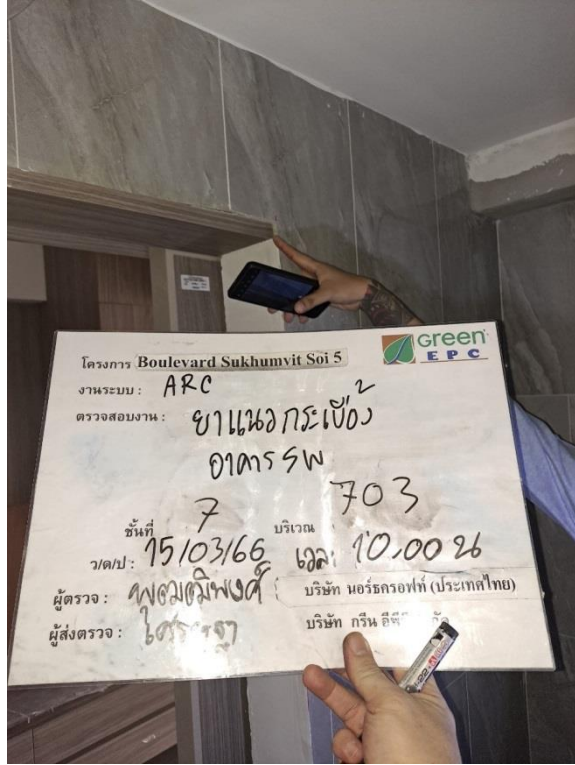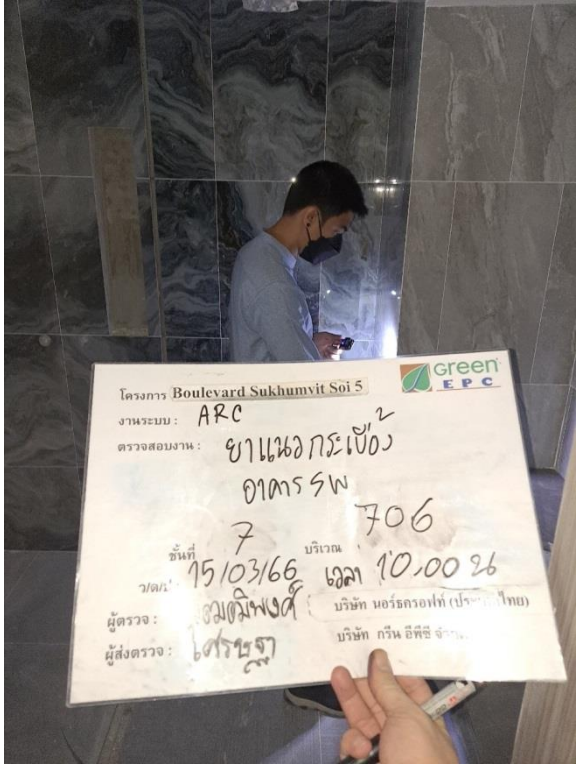

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งหินแกรนิตธรณีประตูห้องน้ำบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 7-8

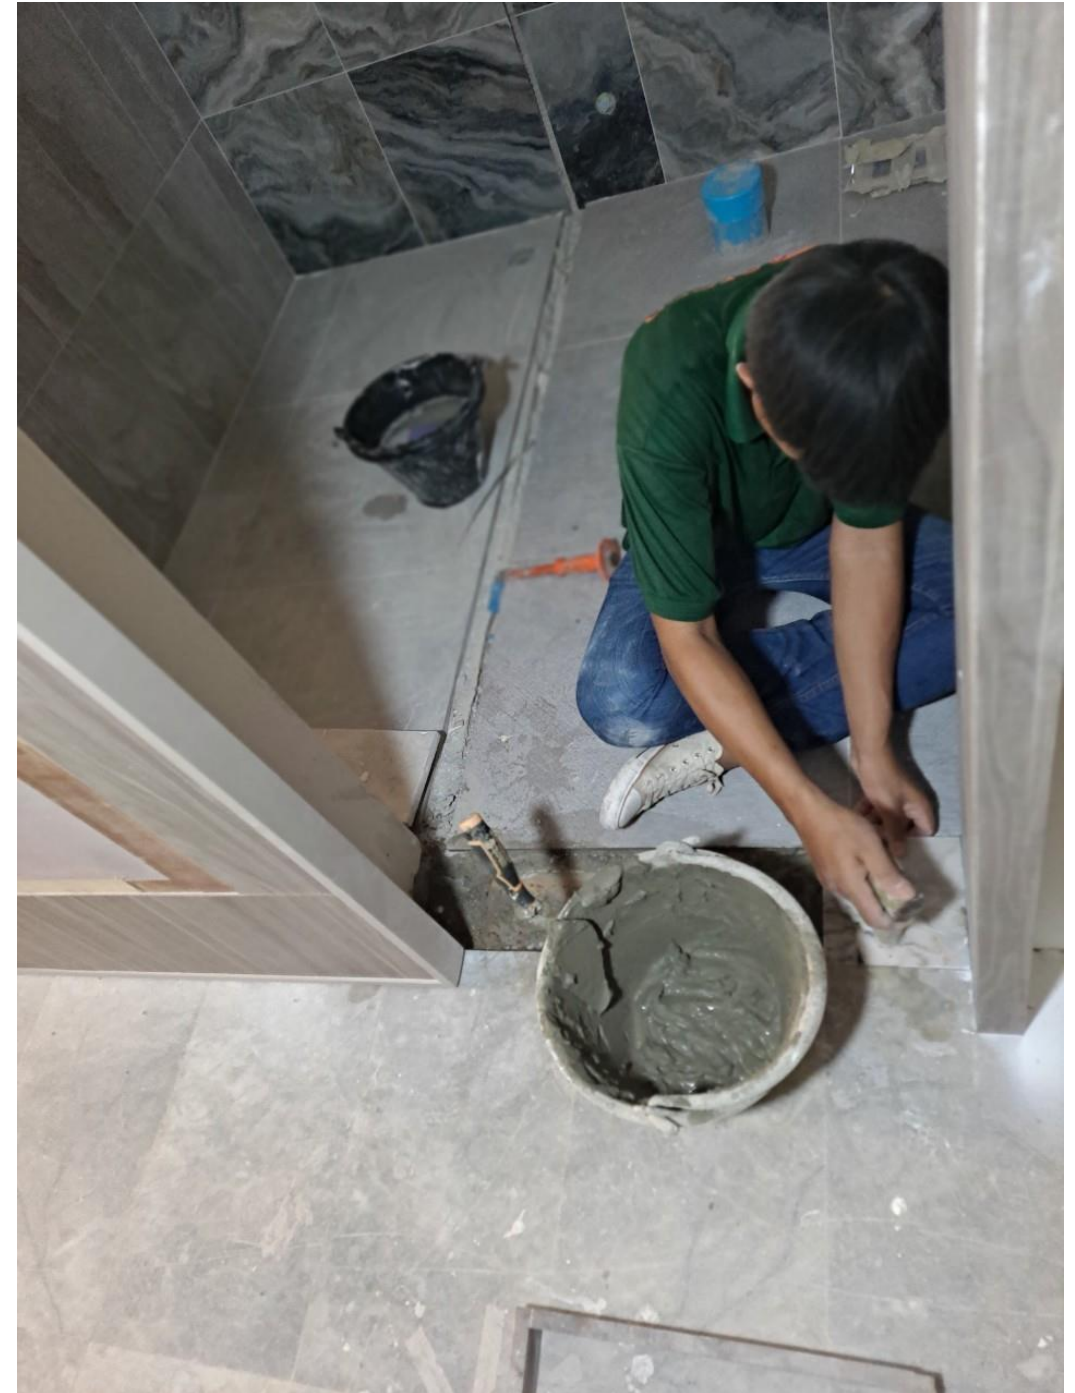

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งหินแกรนิตธรณีประตูห้องน้ำบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 7-8

