



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

18 May 2023

**แผนงาน 3 Week KRUNGTHEP WING**







**แผนงาน 3 Week SIAM WING**








**ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II**



- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %

6 FL.


7th FLOOR PLAN

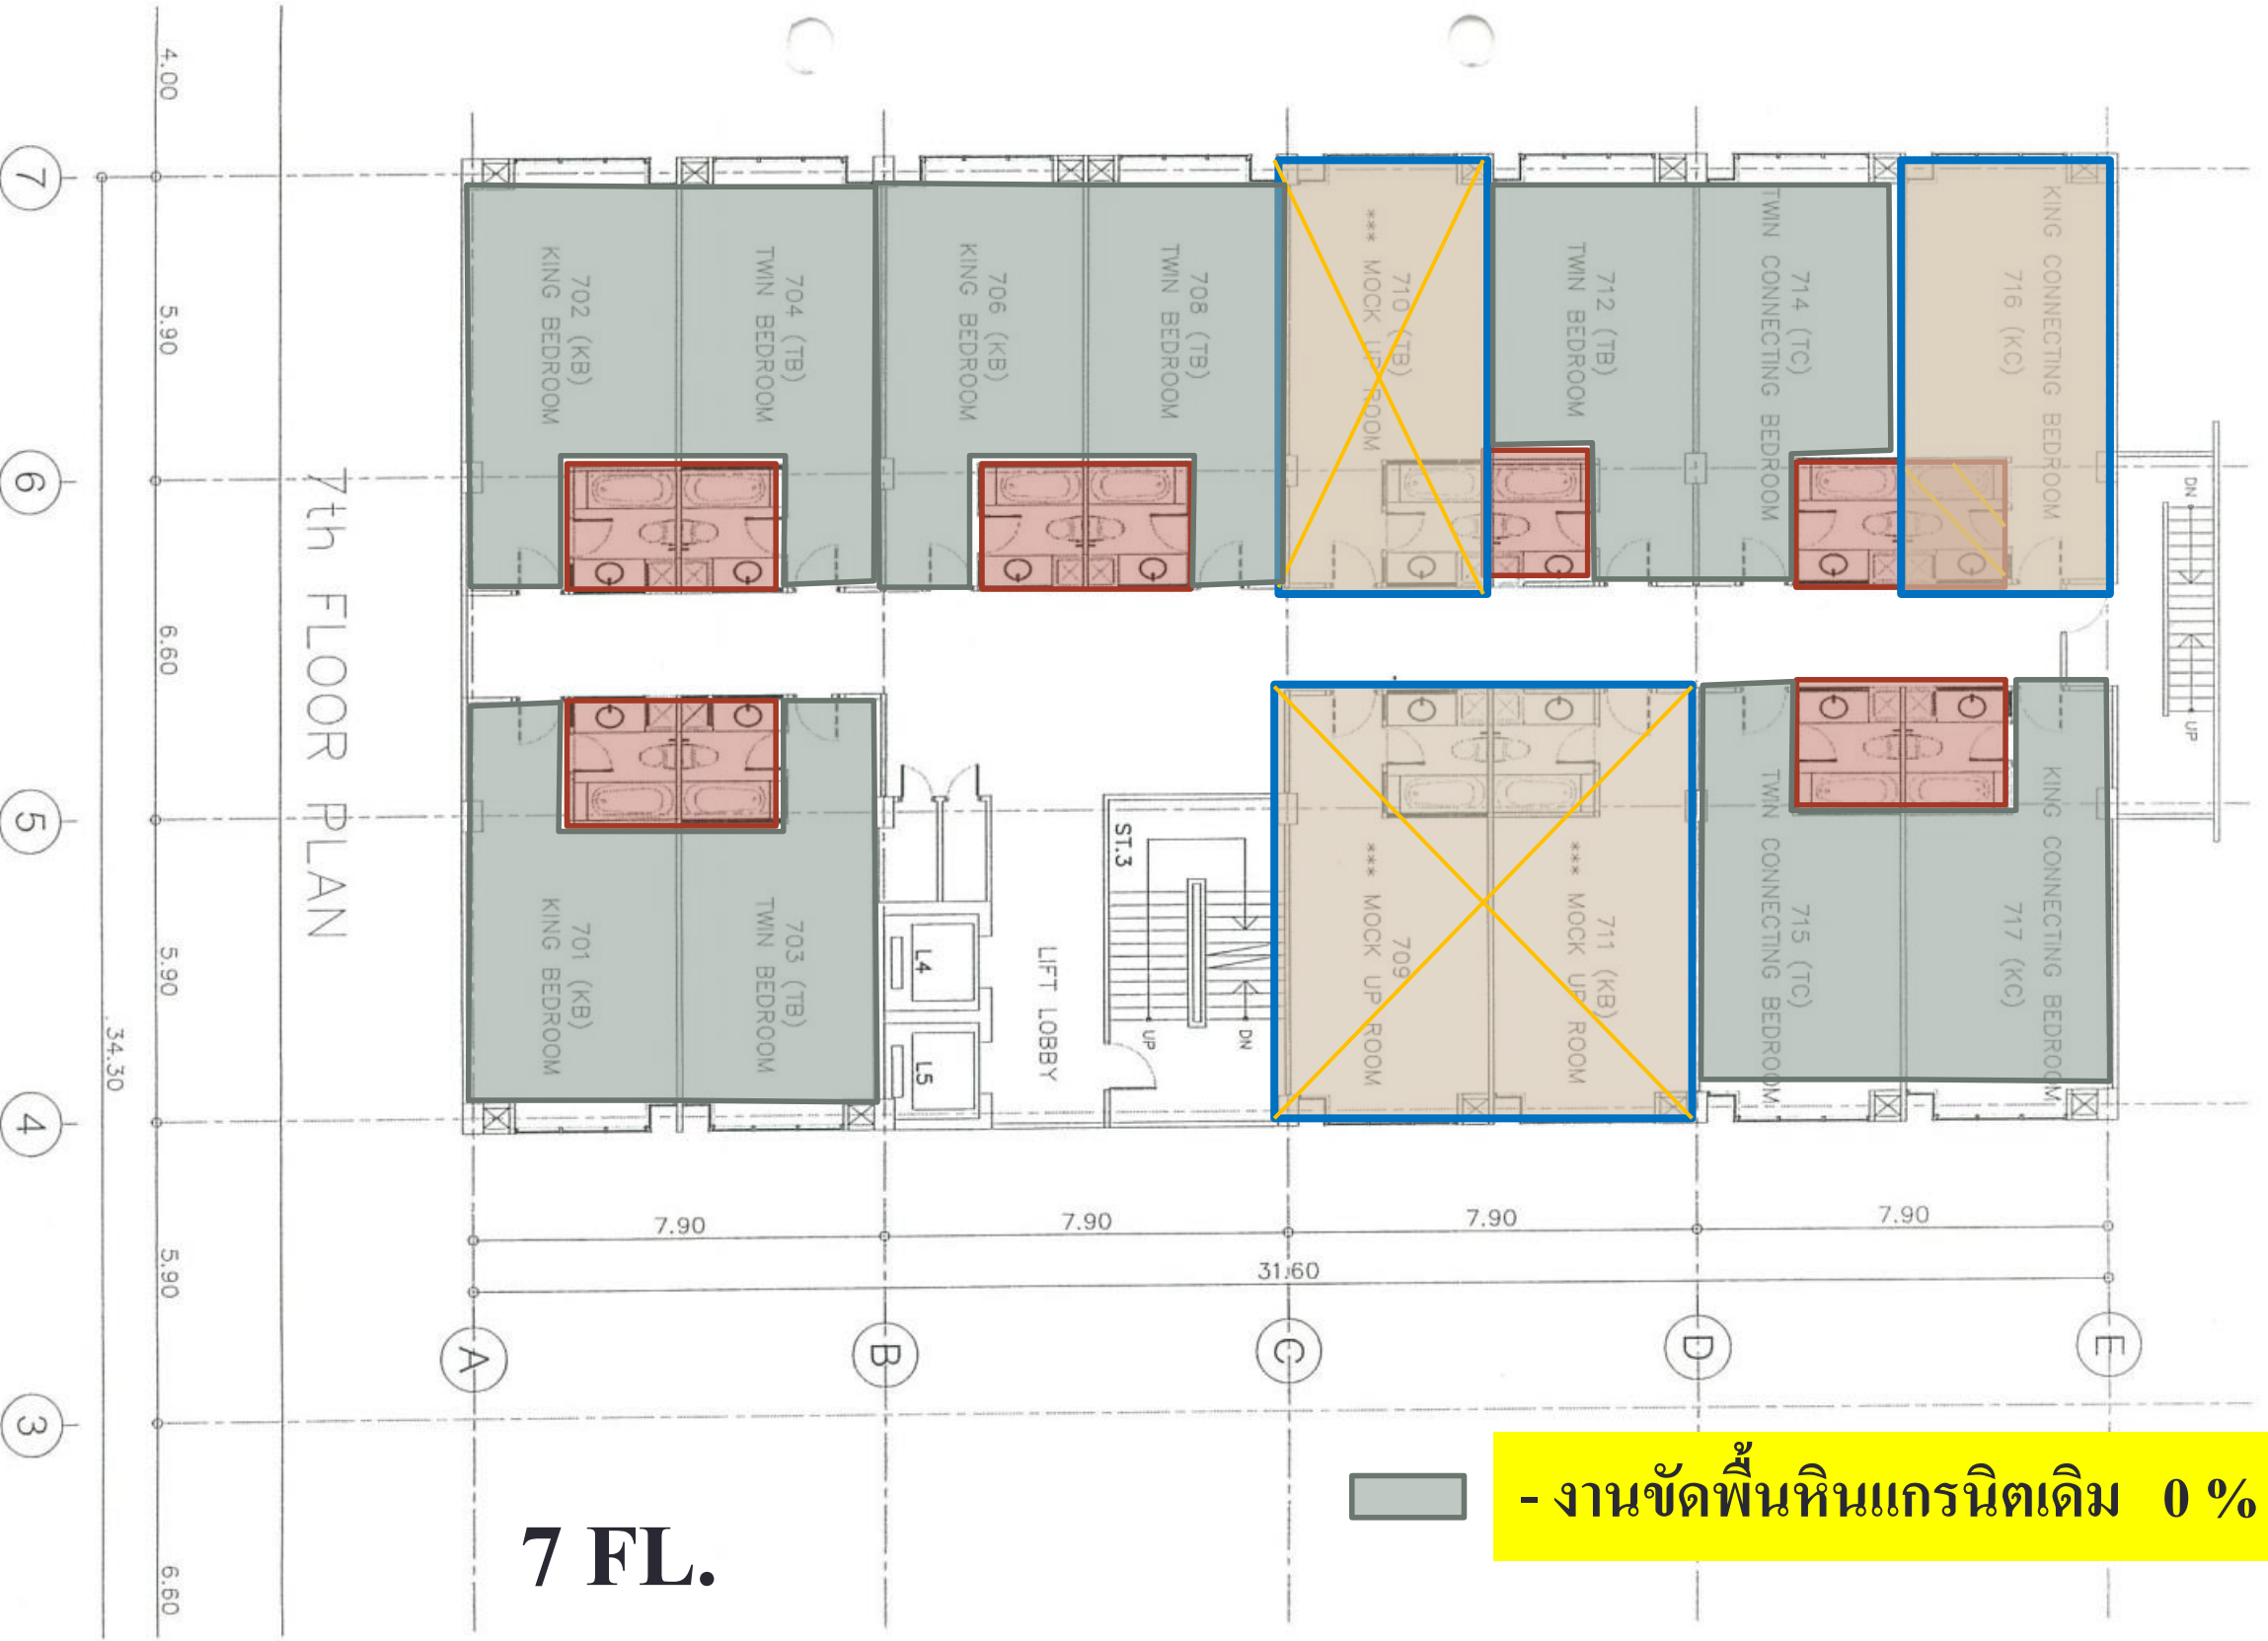

**7 FL.**




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %

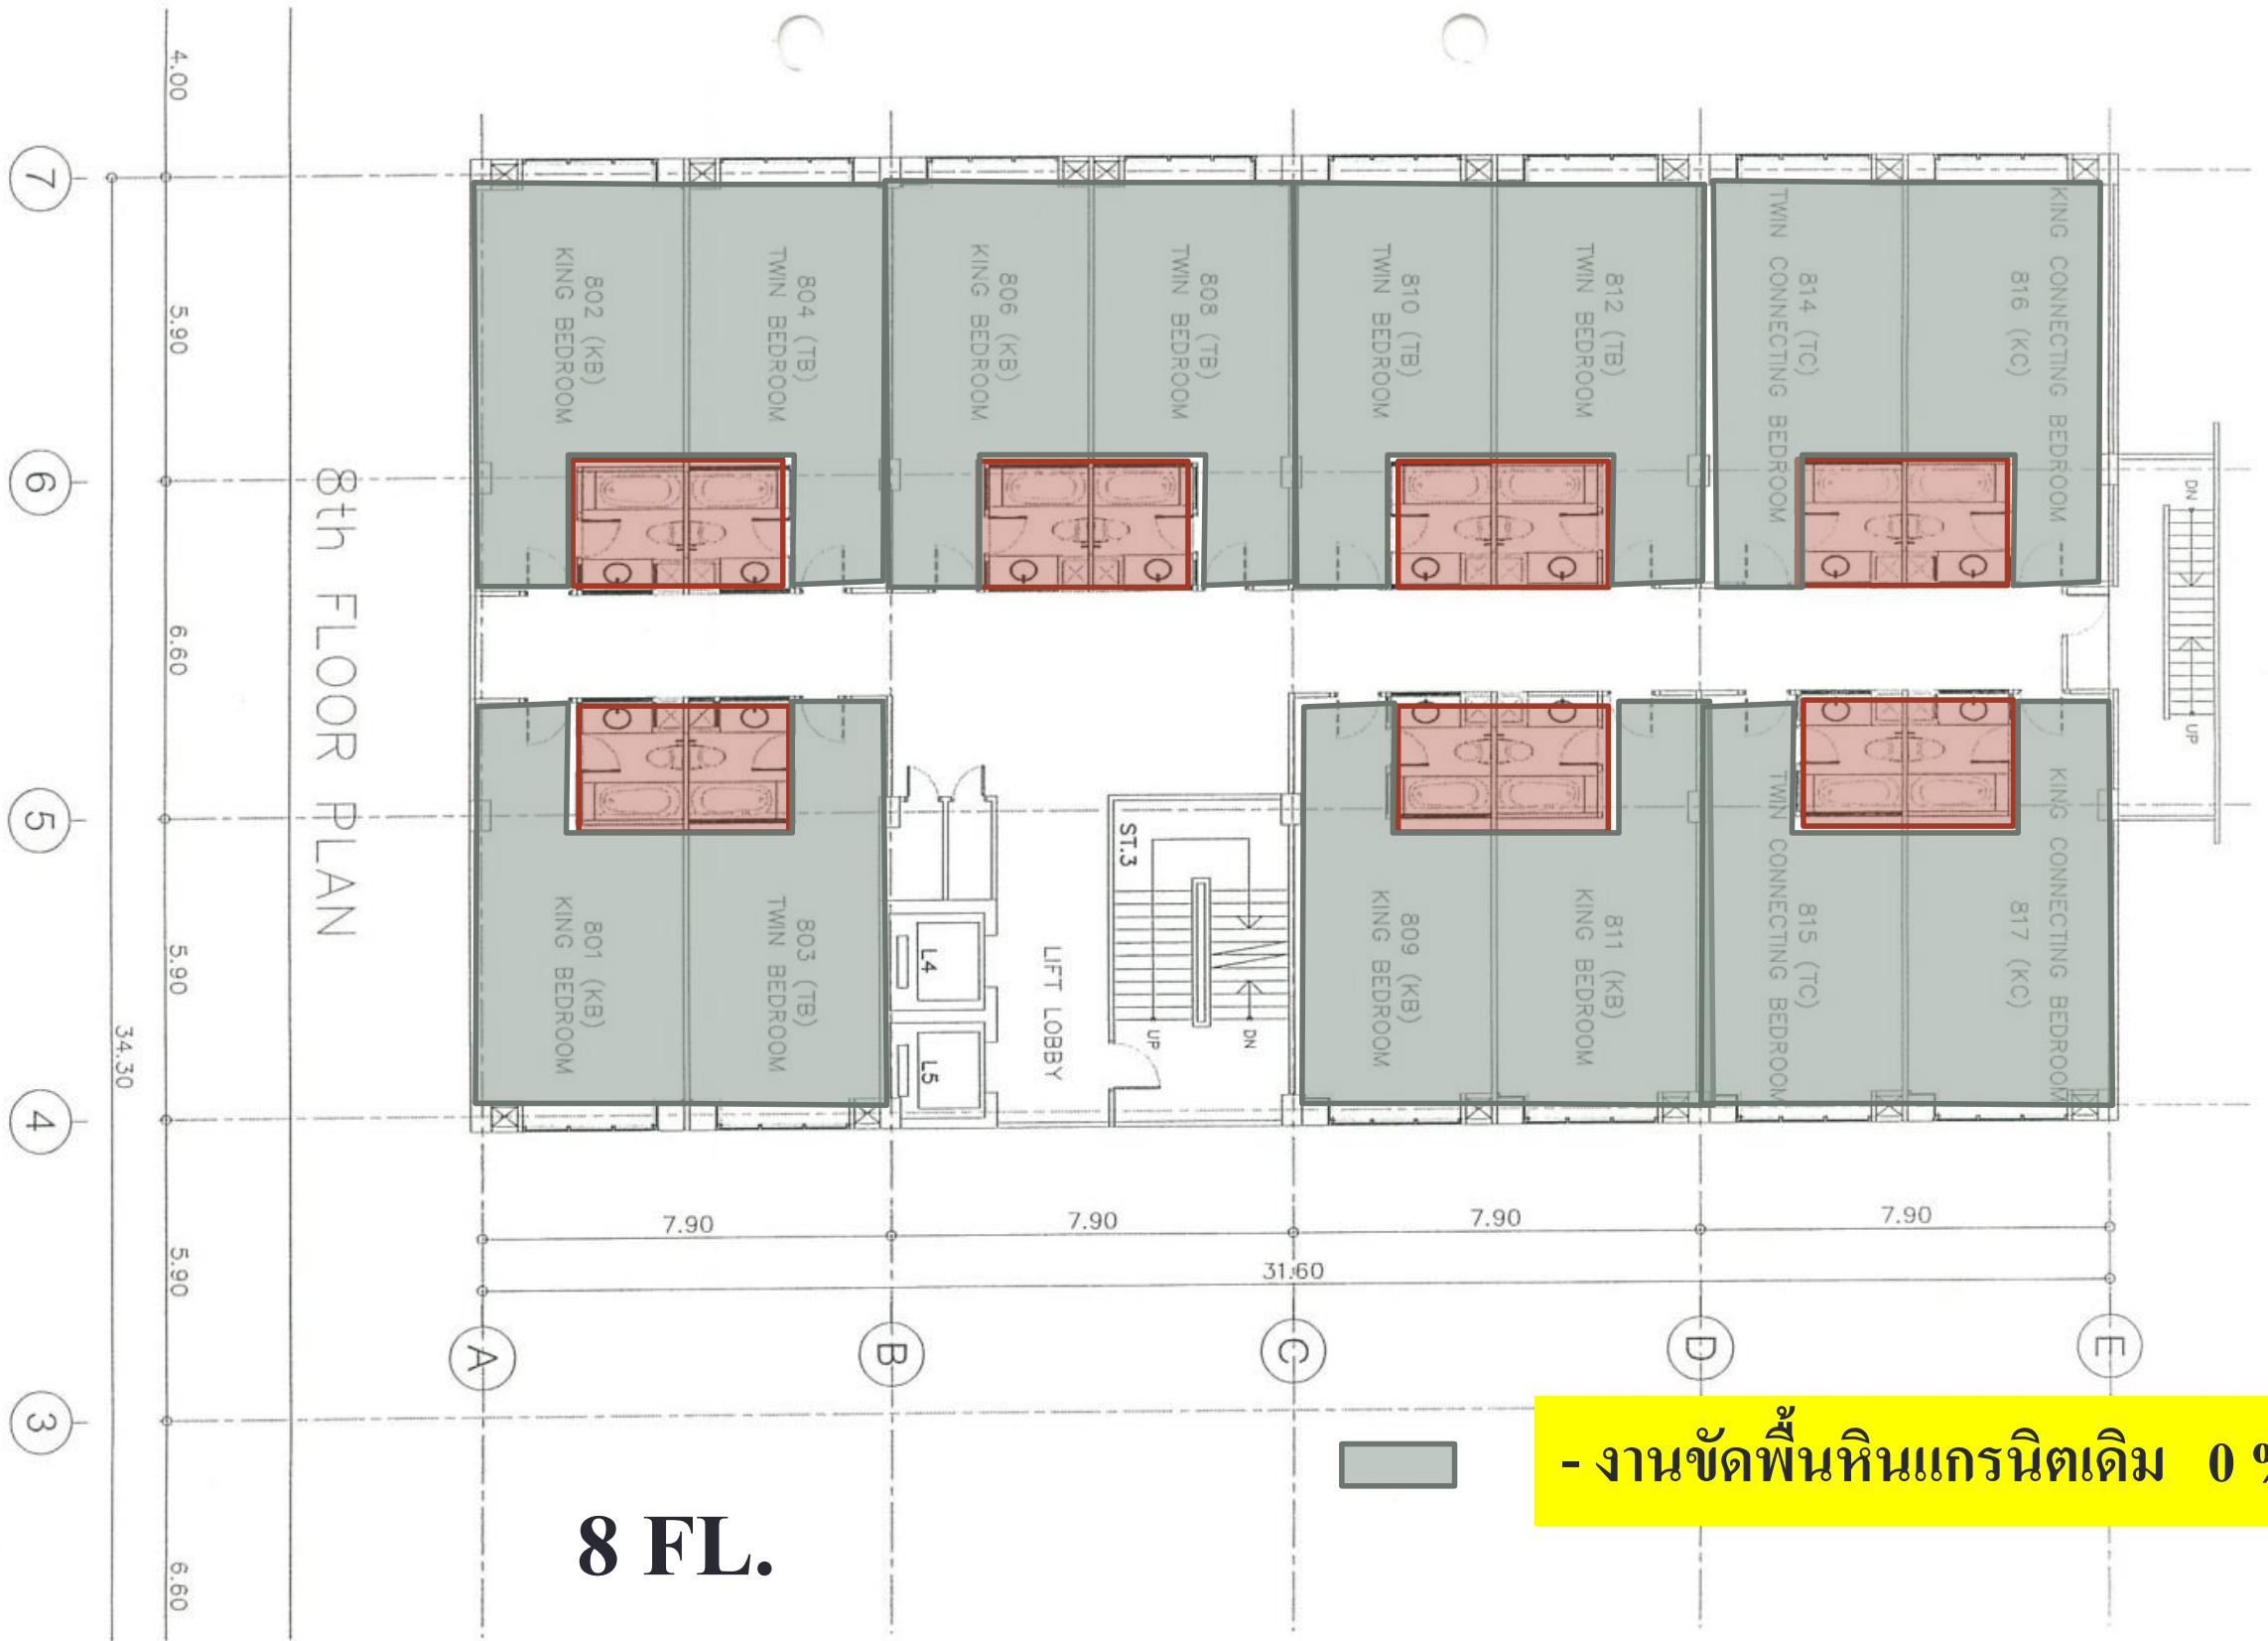

**8 FL.**

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %

SIAM WING 9th FLOOR PLAN

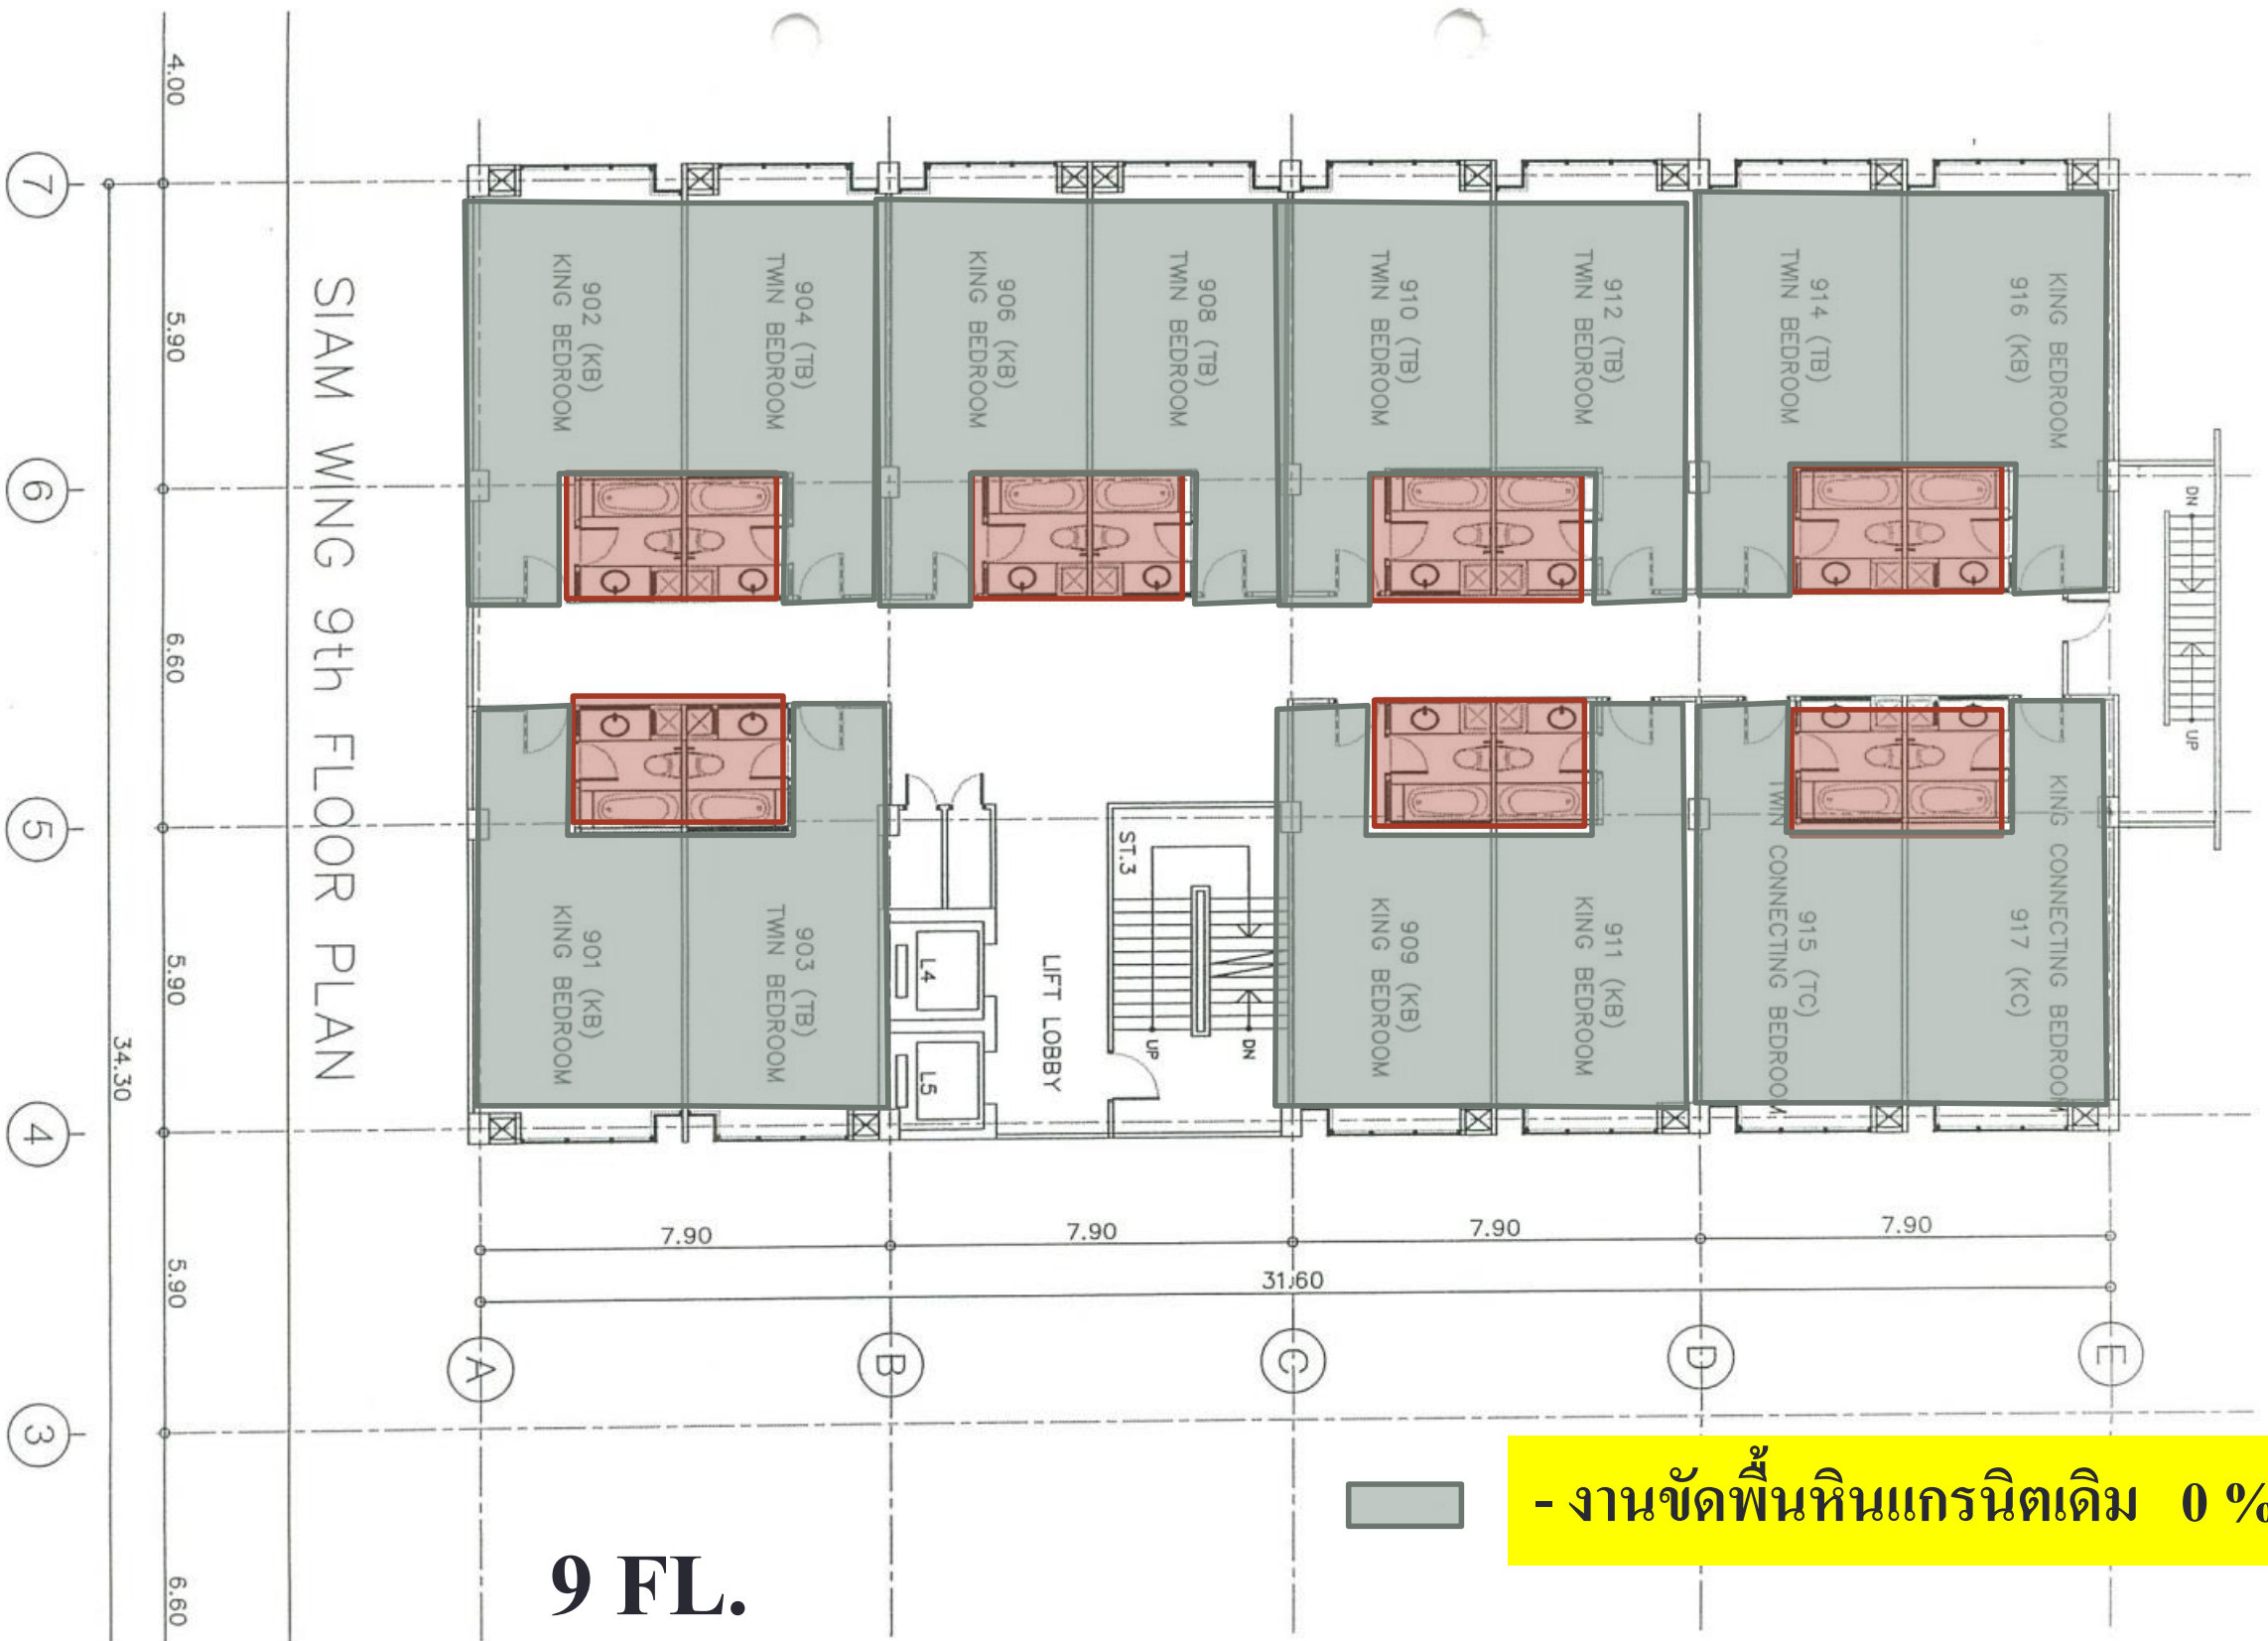


9 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %

10th FLOOR PLAN

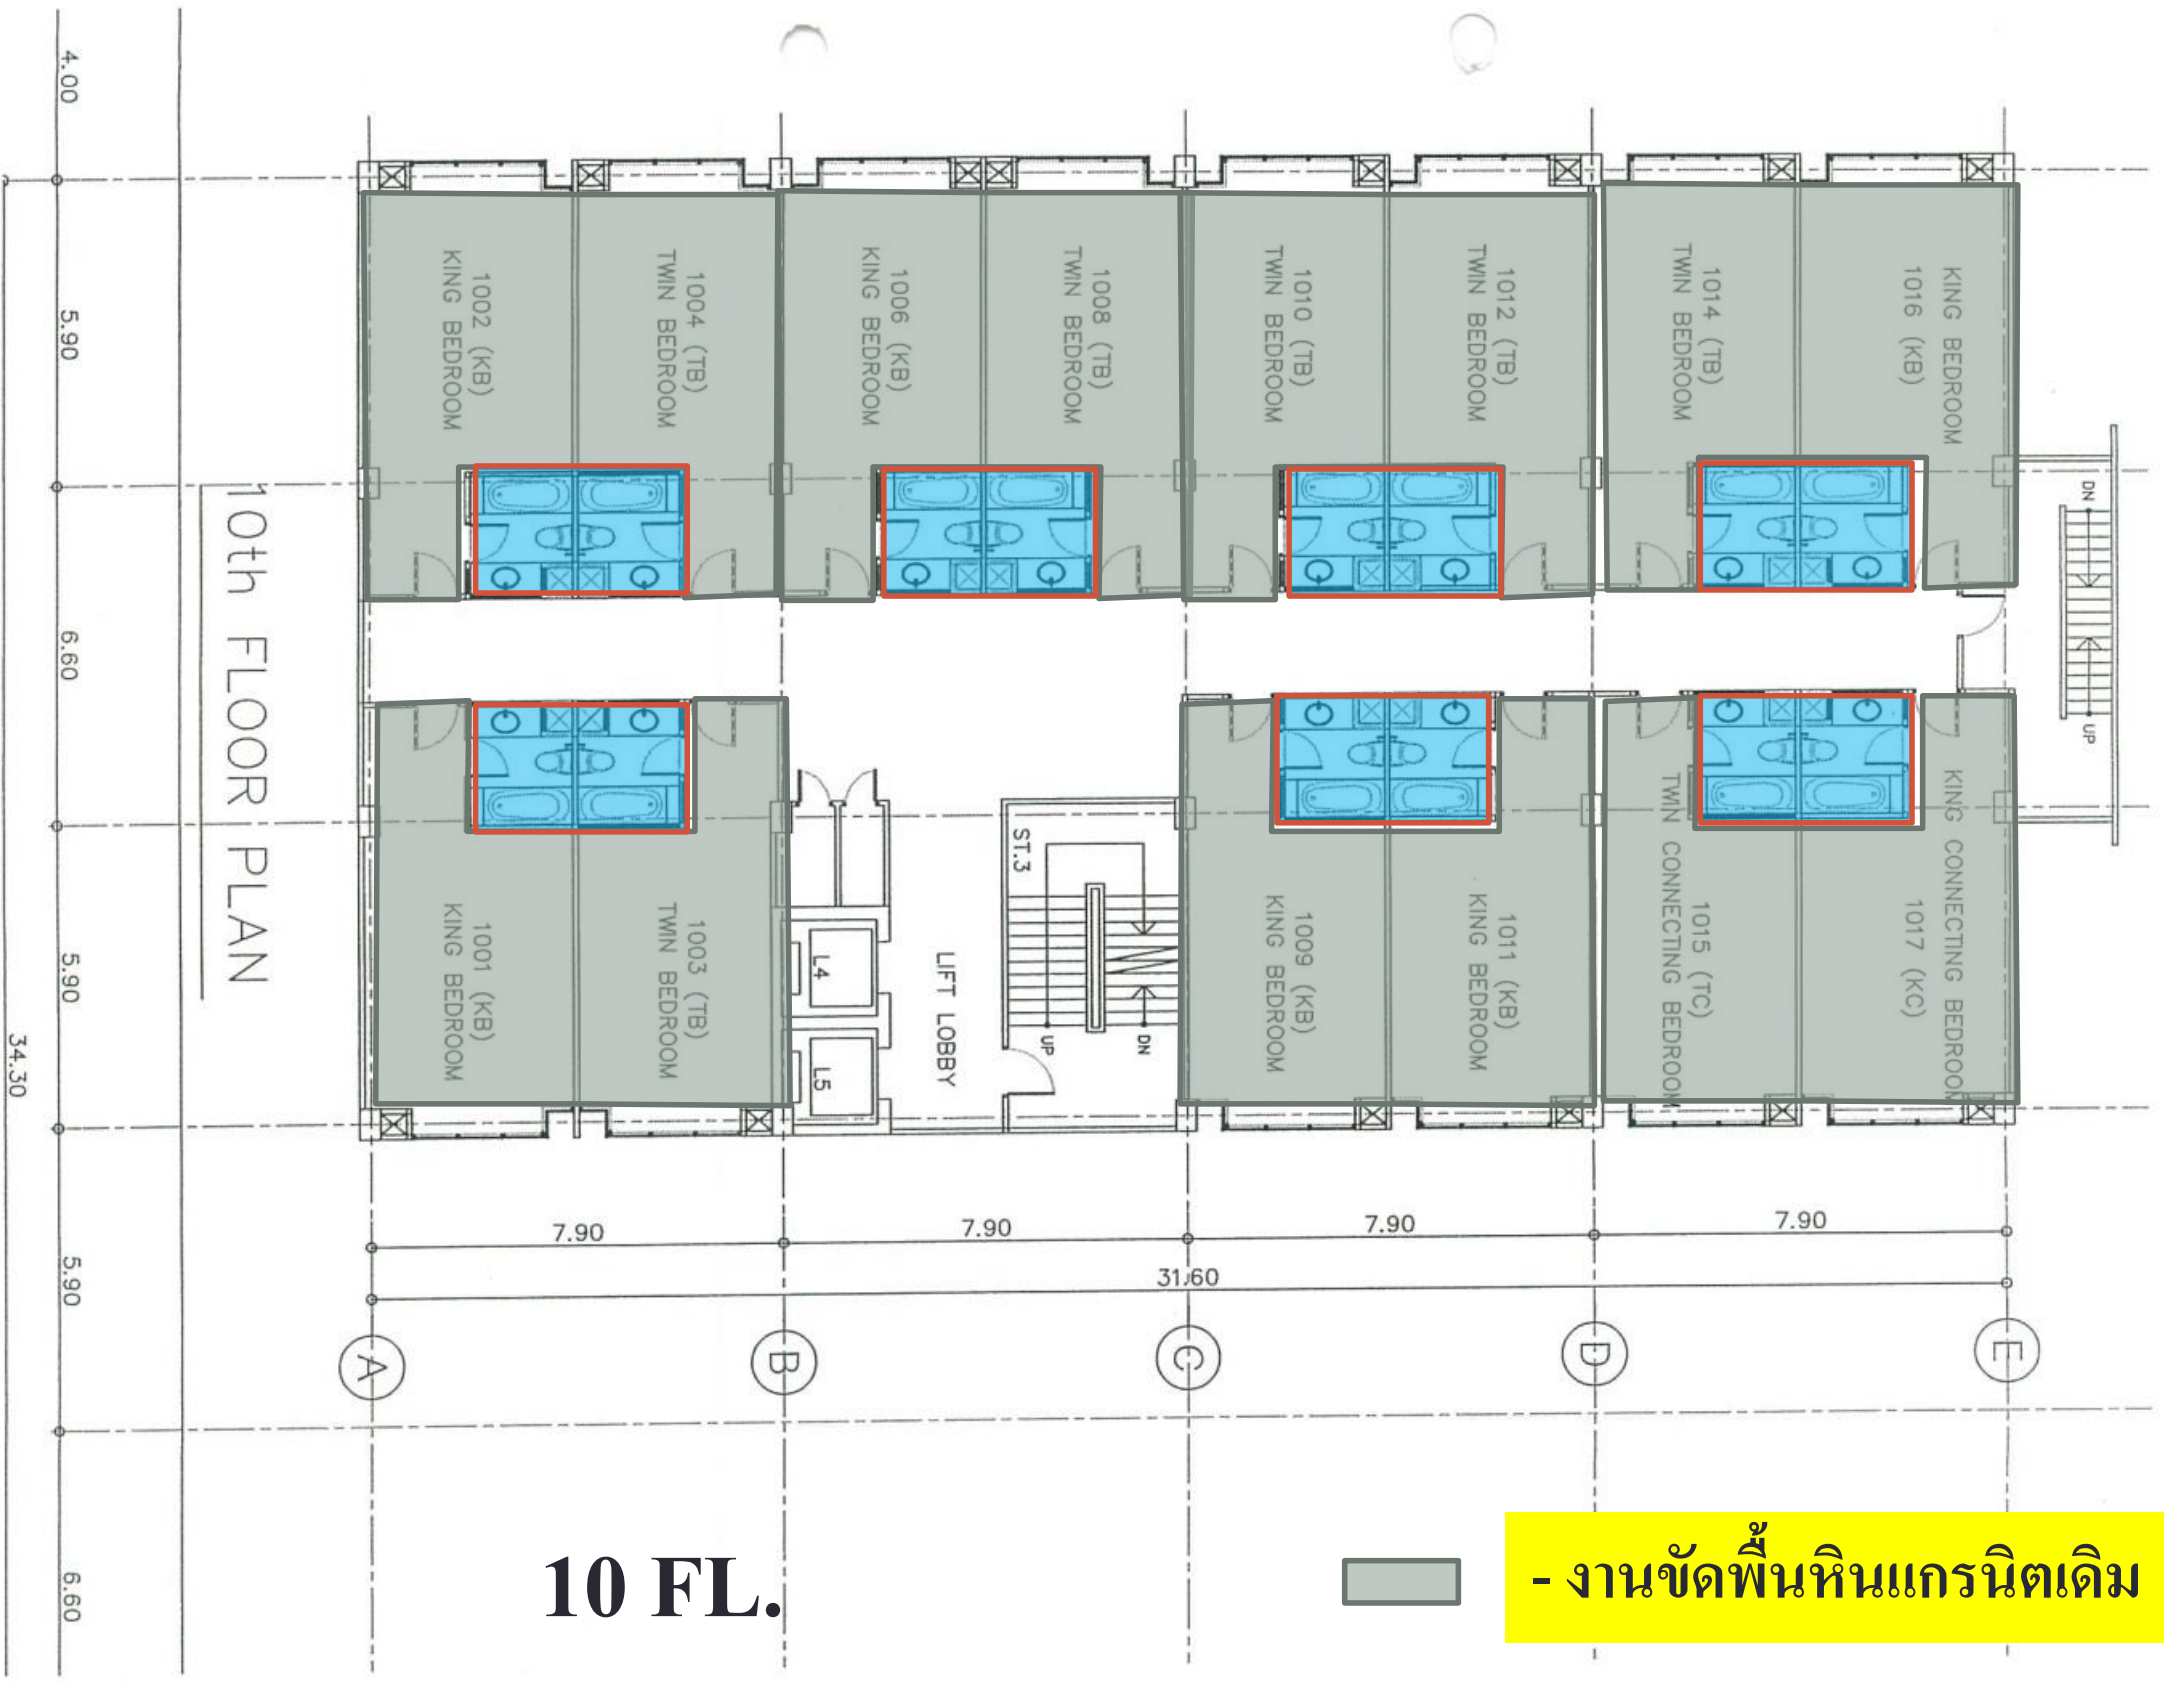

10 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %

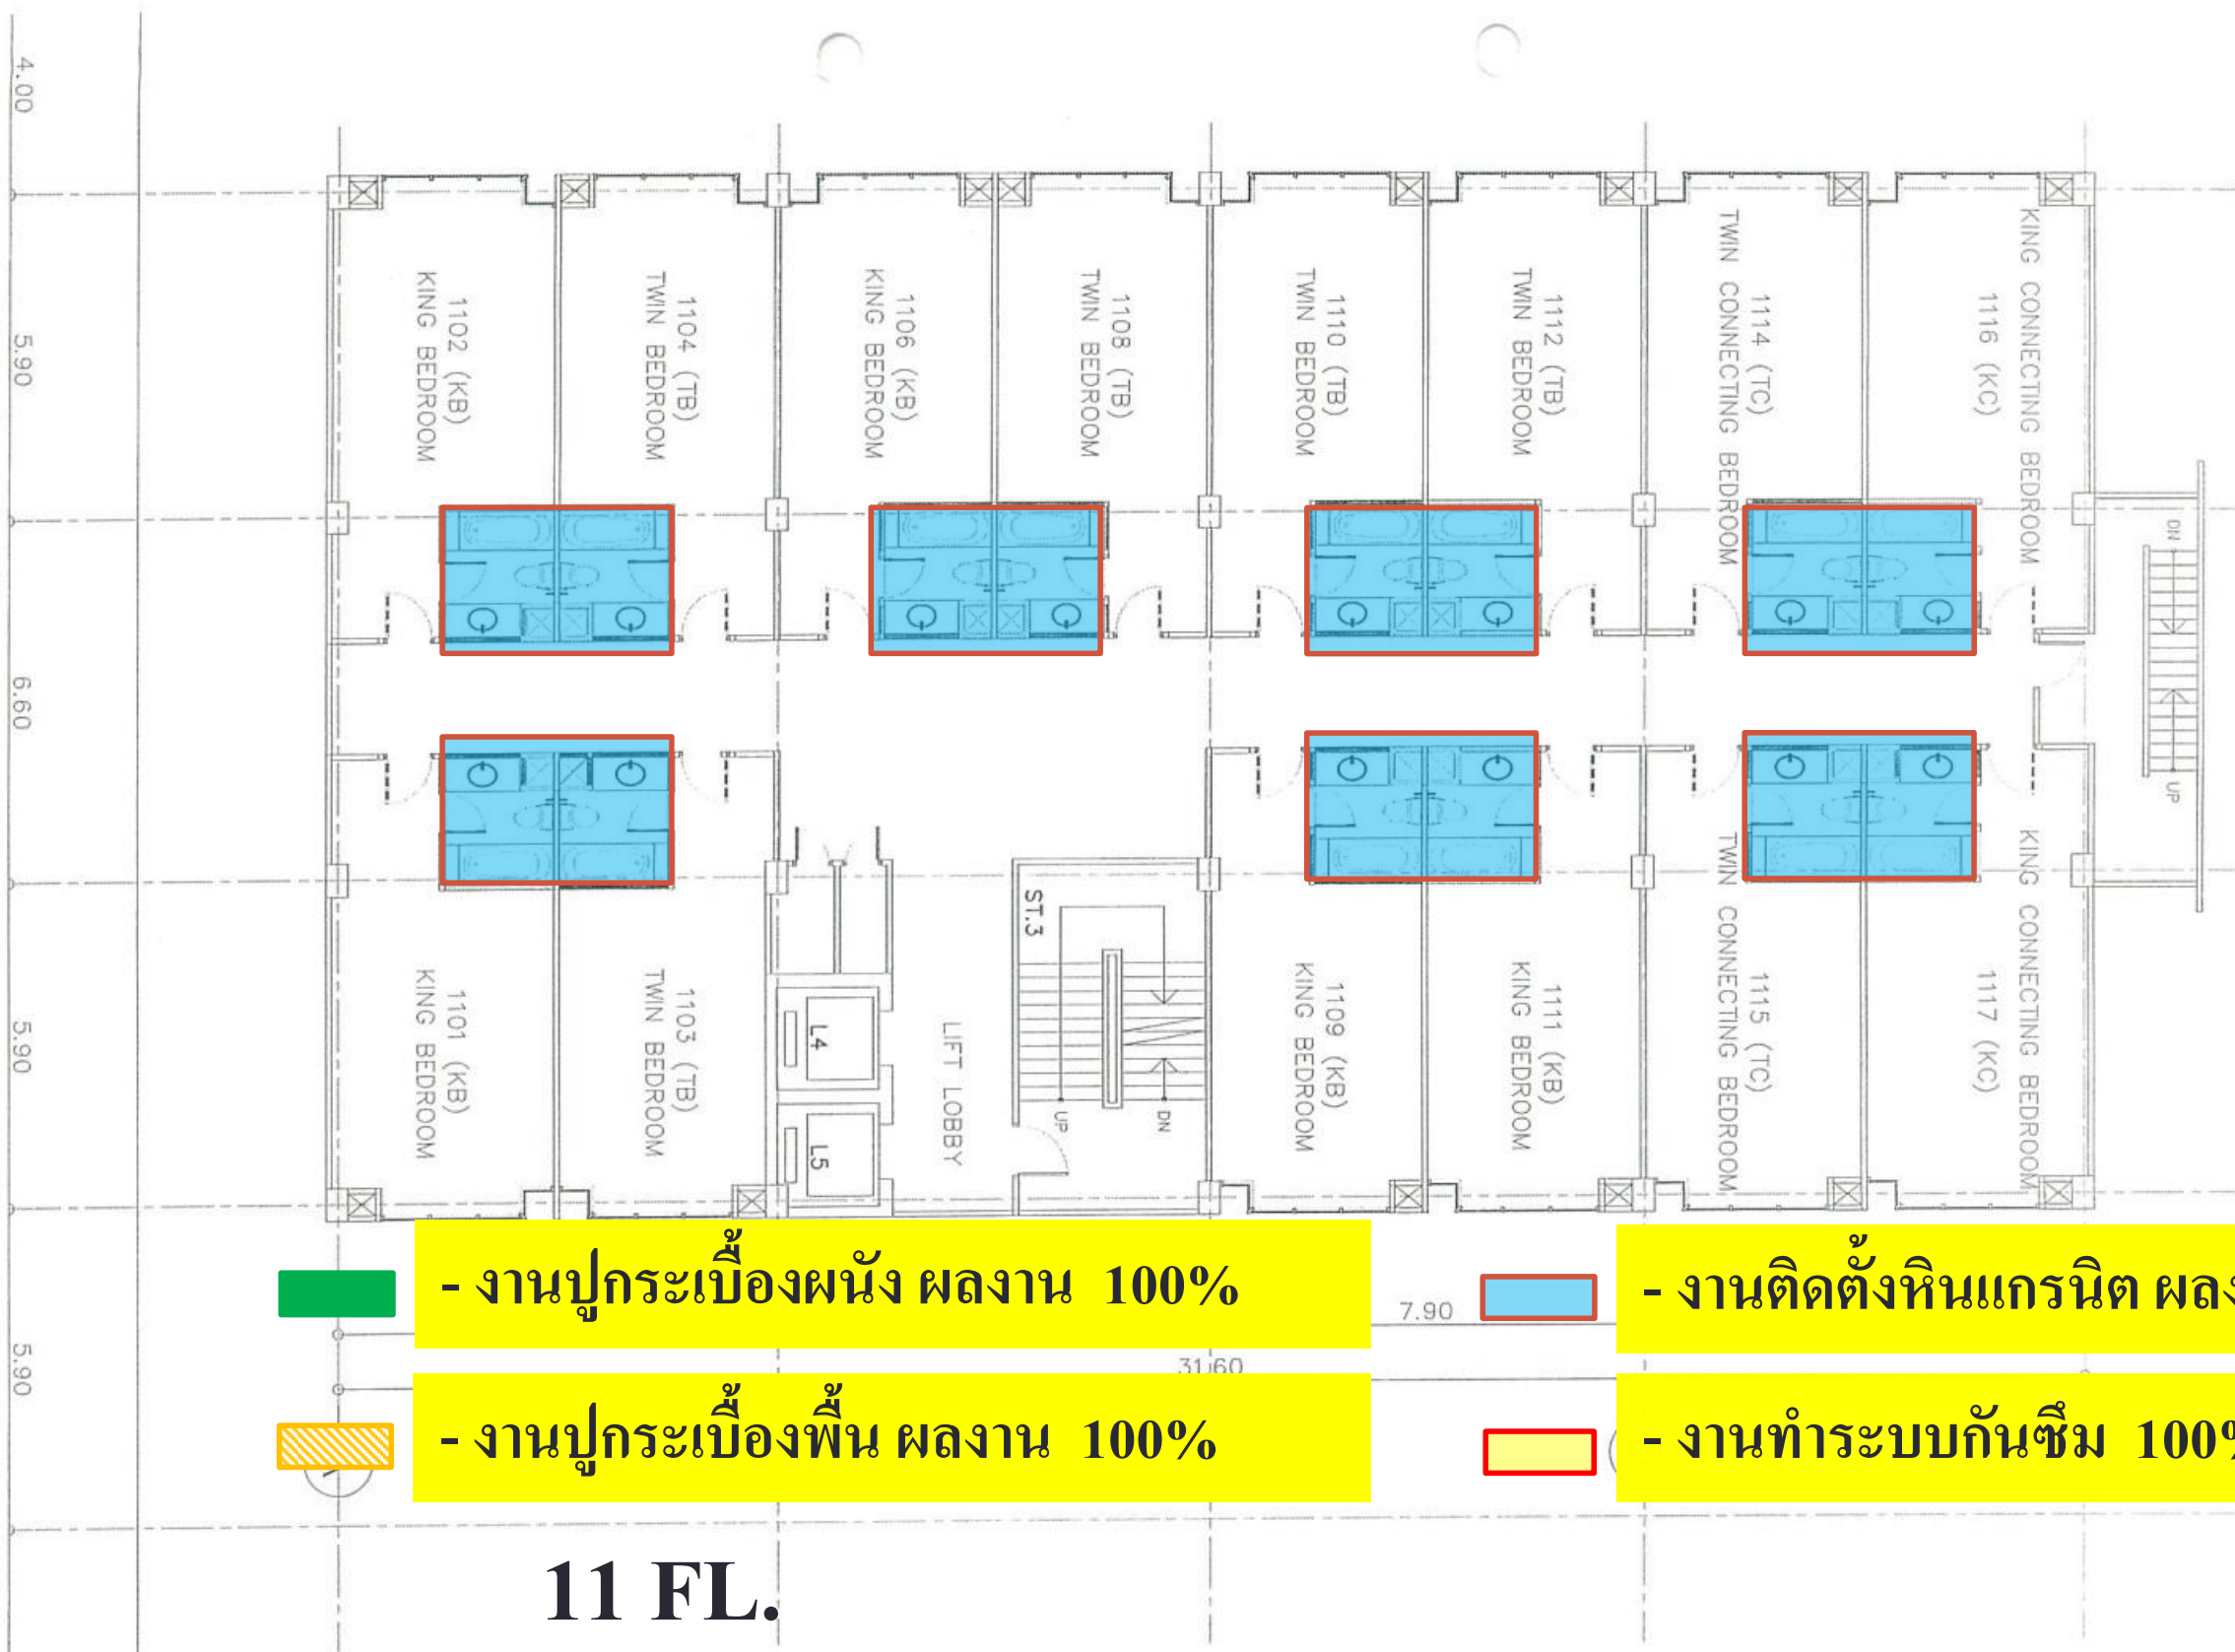

**- งานปูกระเบื้องผนัง ผลงาน 100%**

**- งานติดตั้งหินแกรนิต ผลงาน 100%**

**- งานปูกระเบื้องพื้น ผลงาน 100%**

**- งานทำระบบกันซึม 100%**

**11 FL.**




 - งานปูกระเบื้องผนัง ผลงาน 100 %

 - งานติดตั้งหินแกรนิต ผลงาน 100%

 - งานปูกระเบื้องพื้น ผลงาน 100%

**12 FL.**



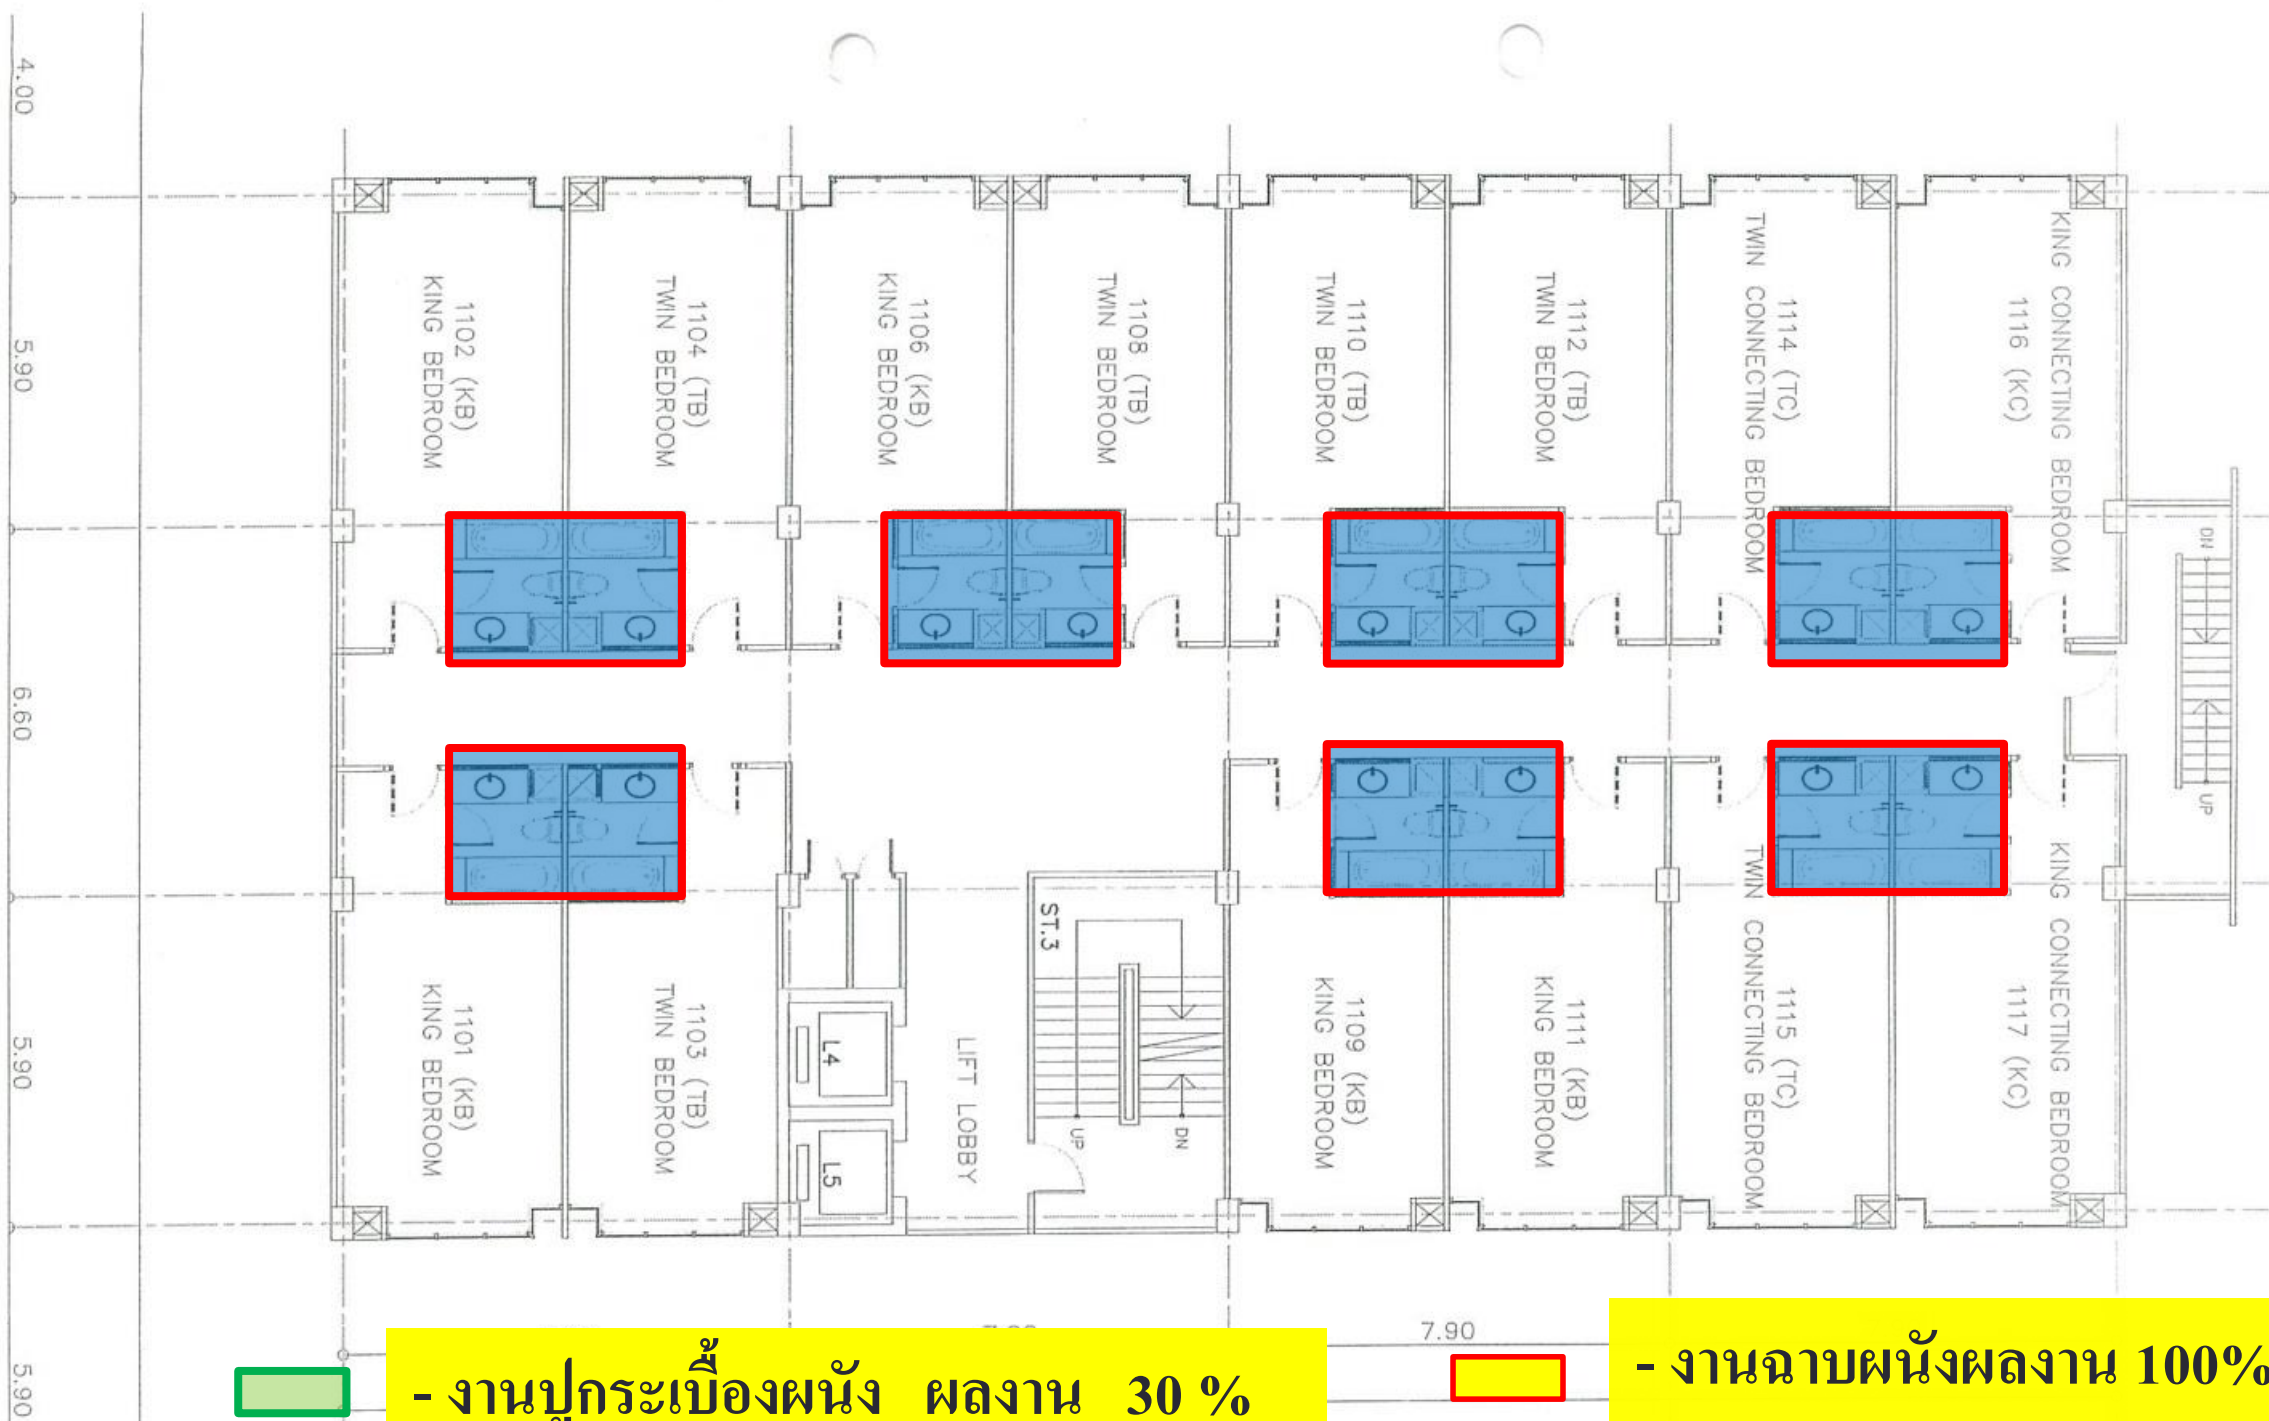


 - งานปูกระเบื้องผนัง ผลงาน 30 %

 - งานปูกระเบื้องพื้น ผลงาน 0%

 - งานฉาบผนังผลงาน 100%

 - งานทำระบบกันซึม 95%

**14 FL.**

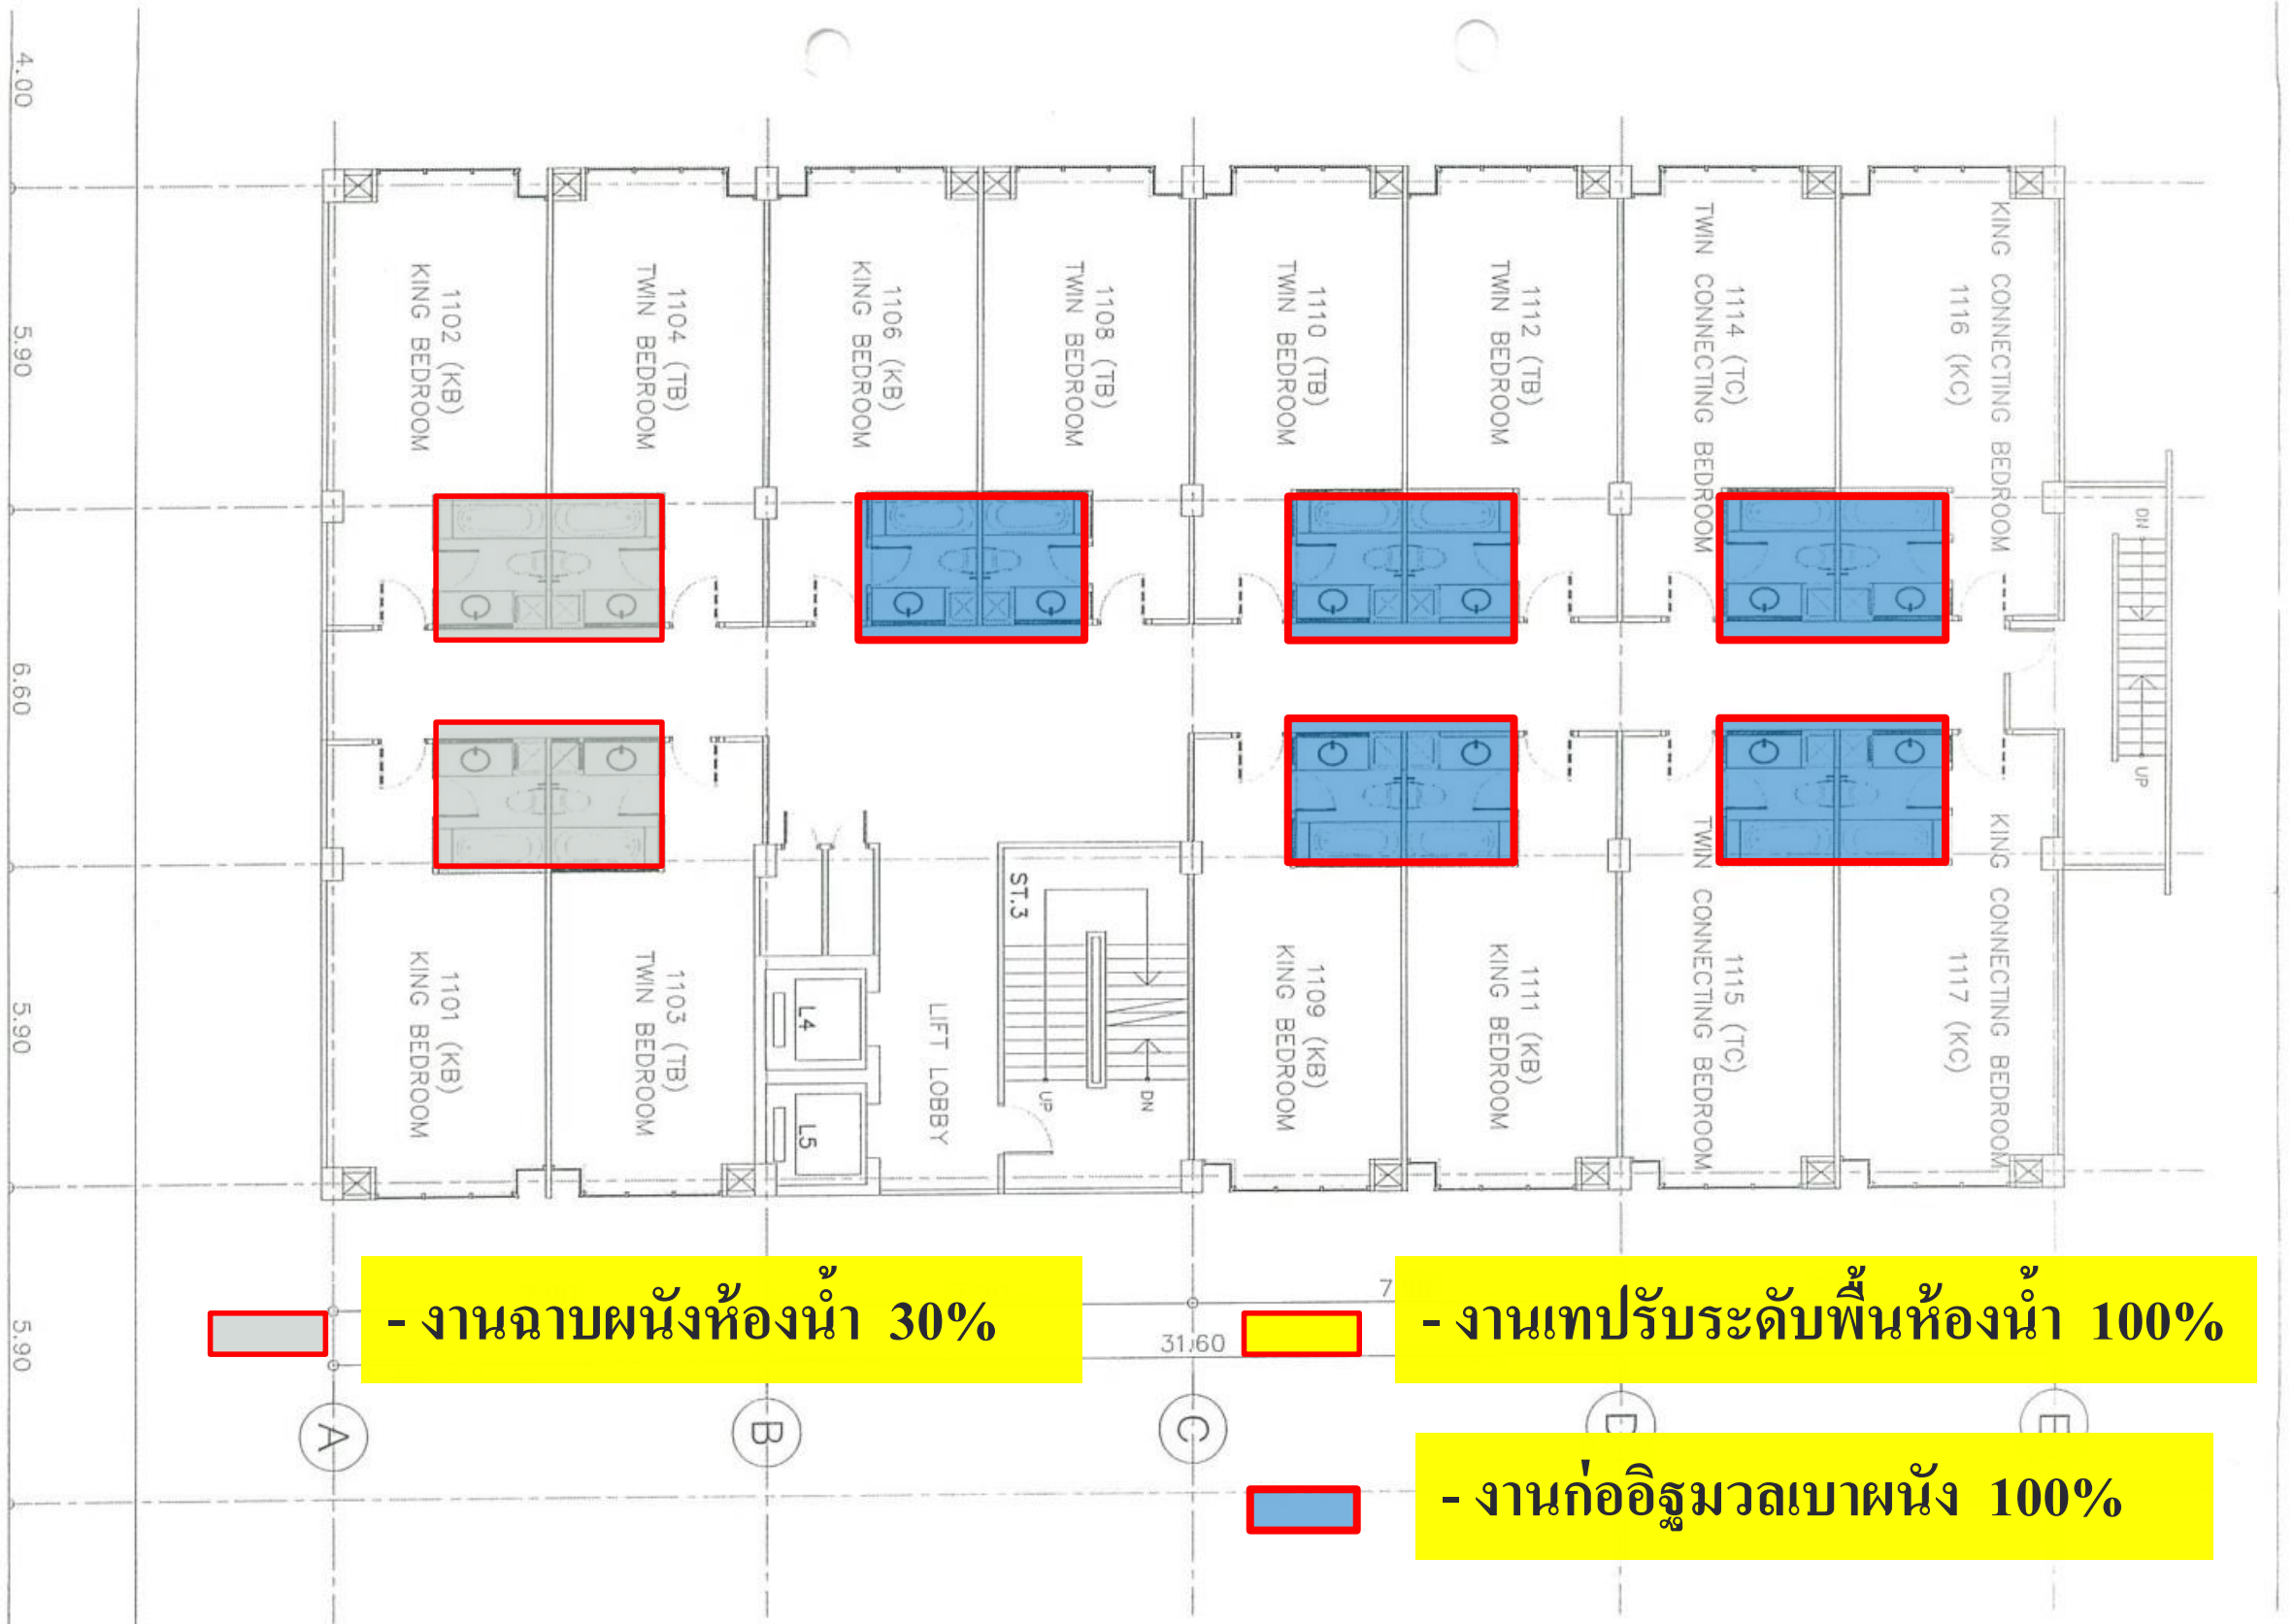

**15 FL.**

**ตรวจสอบงานกับทาง NTL**

# สถานะตรวจสอบงานกับทาง NTL

# อาคารกรุงเทพวิงค์

ชั้น	ภายในห้องพัก										ทางเดิน	
	ติดตั้ง Box ไฟ		ทดสอบวงจรไฟ		สปริงเกอร์		ติดตั้งแอร์+ อุปกรณ์	ทดสอบรอยรั่ว ท่อ CHS,CHR	ซ่อมแซมท่อ V,W	ท่อ CW,HW	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบรอย รั่วสปริงเกอร์
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2 (No.20,21)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2 (No.20,21)	ติดตั้งท่อ	ทดสอบรอยรั่ว						
7	8-Oct , 14 -Nov-65	20-Jan-66	19,25-Nov-65	21-Jan-66	28-Dec-65	15-Jan-66	28-Dec-65	21-Dec-65	19-Nov-65	15-Dec-65	19-Jan-66	15-Jan-66
8	9,14-Nov-65	23-Jan-65	25-Nov,1-Dec-65	23-Jan-66	28-Dec-65	12-Jan-66	28-Dec-65	23-Dec-65	25-Nov-65	2-Dec-65	16-Jan-66	12-Jan-66
9	4,14-Nov-65	28-Nov,8-Dec-65	9-Dec-65	8,12-Dec-65	28-Dec-65	26-Dec-65	28-Dec-65	23-Dec-65	22-Nov-65	28-Nov-65	16-Jan-66	26-Dec-65
10	11,15-Nov-65	6-Feb-66	2-Dec-65	14-Feb-66	4-Jan-66	15-Feb-66	7-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	7-Jan-66	14-Feb-66	15-Feb-66
11	12,15-Nov-65	6-Feb-66	30,26-Dec-65	14-Feb-66	4-Jan-66	15-Feb-66	11-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	26-Nov-65	27-Jan-66	15-Feb-66
12	21-Nov,12-Dec-65	2-Feb-66	21-Dec-65	2-Feb-66	4-Dec-66	15-Feb-66	11-Jan-66	12-Jan-66	7-Jan-66	21-Feb-66	13-Feb-66	15-Feb-66
14	14,25-Nov-65	23-Feb-66	22-Dec-65	2-Mar-66	7-Feb-66	6-Mar-66	7-Feb-66	3-Feb-66	25-Feb-66	25-Feb-66	9-Feb-66	6-Mar-66
15	16-Nov-65	23-Feb-66	30-Nov-65	2-Mar-66	10-Feb-66	6-Mar-66	22-Feb-66	3-Feb-66	1-Mar-66	1-Mar-66	27-Feb-66	6-Mar-66
16	24,29-Nov-65	17-Feb-66	21-Dec-65	22-Feb-66	10-Mar-66	7-Mar-66	24-Feb-66	4-Feb-66	4-Mar-66	4-Mar-66	27-Feb-66	7-Mar-66
17	13-Dec-65	23-Feb-66	23-Jan-66	2-Mar-66	10-Mar-66	7-Mar-66	24-Feb-66	31-Jan-66	9-Mar-66	9-Mar-66	27-Feb-66	7-Mar-66
18	13-Dec-65	23-Feb-66	11-Jan-66	7-Mar-66	5-Apr-66	28-Mar-66	14-Mar-66	2-Feb-66	10-Mar-66	10-Mar-66	25-Mar-66	28-Mar-66
19	23-Dec-65	23-Mar-66	29-Jan-65	24-Mar-66	7-Apr-66	28-Mar-66	14-Mar-66	4-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	8-Mar-66	28-Mar-66
20	23-Dec-65	7-Mar-66	6-Feb-66	11-Mar-66	7-Apr-66	10-Apr-66	14-Mar-66	20-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	8-Mar-66	10-Apr-66
21	23-Dec-65	7-Mar-66	6-Feb-66	11-Mar-66	18-Apr-66	13-Apr-66	14-Mar-66	26-Feb-66	11-Mar-66	11-Mar-66	13-Mar-66	13-Apr-66
22	25-Jan-66	26-Apr-66	16-Feb-66	27-Apr-66	21-Apr-66	20-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	11-Mar-66	11-Mar-66	4-Apr-66	20-Apr-66
23	25-Jan-66	7-Mar-66	16-Feb-66	13-Mar-66	24-Apr-66	23-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	11-Mar-66	11-Mar-66	10-Apr-66	23-Apr-66
24	31-Jan-65	7-Mar-66	14-Feb-66	13-Mar-66	24-Apr-66	15-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	13-Mar-66	13-Mar-66	10-Apr-66	15-Apr-66
25	9-Feb-66	11-May-66	14-Feb-66	11-May-66	24-Apr-66	17-Apr-66	23-Mar-66	15-Mar-66	13-Mar-66	13-Mar-66	18-Apr-66	17-Apr-66

สถานะตรวจสอบงานกับทาง NTL


อาคารสยามวิงค์

ชั้น	ภายในห้องพัก								ทางเดิน	
	ติดตั้ง Box ไฟ	ทดสอบวงจรไฟ	สปริงเกอร์		ติดตั้งแอร์+อุปกรณ์	ทดสอบรอยรั่วท่อ CHS,CHR	ท่อ CW,HW	ท่อ S,W,V	ระบบไฟฟ้า	ทดสอบรอยรั่วสปริงเกอร์
			ติดตั้งท่อ	ทดสอบรอยรั่ว						
6	09-Nov-65	09-Feb-66	15-Feb-66	07-Feb-66	30-Nov-65	23-Dec-65	03-Feb-66	03-Feb-66	04-April-66	07-Feb-66
7	26-Oct-65	15-Dec-65	23-Dec-65	13-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	02-Dec-65	15-Dec-65	16-Jan-66	13-Jan-66
8	26-Oct-65	16-Dec-65	28-Dec-65	19-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	28-Nov-65	15-Dec-65	15-Jan-66	19-Jan-66
9	08-Nov-65	13-Dec-65	28-Dec-65	19-Jan-66	30-Nov-65	13-Dec-65	28-Nov-65	15-Dec-65	15-Jan-66	19-Jan-66
10	09-Nov-65	21-Dec-65	14-Feb-66	03-Feb-66	07-Jan-66	07-Jan-66	23-Dec-65	23-Dec-65	14-Feb-66	03-Feb-66
11	13-Jan-66	14-Feb-66	14-Feb-66	03-Feb-66	11-Jan-66	11-Jan-66	27-Dec-65	26-Dec-65	07-Feb-66	03-Feb-66
12	24-Jan-66	03-Feb-66	14-Feb-66	03-Feb-66	21-Feb-66	17-Jan-66	26-Dec-65	26-Dec-65	03-Feb-66	03-Feb-66
14	18-Feb-66	25-Feb-66	09-Feb-66	03-Feb-66	21-Mar-66	09-Feb-66	03-Feb-66	03-Feb-66	22-Feb-66	03-Feb-66
15	18-Mar-66	8-Apr-66	14-Feb-66	07-Feb-66	21-Mar-66	09-Feb-66	04-Feb-66	04-Feb-66	04-May-66	07-Feb-66

**ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)**

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายไฟบริเวณห้องพัก (Suit Room)  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25

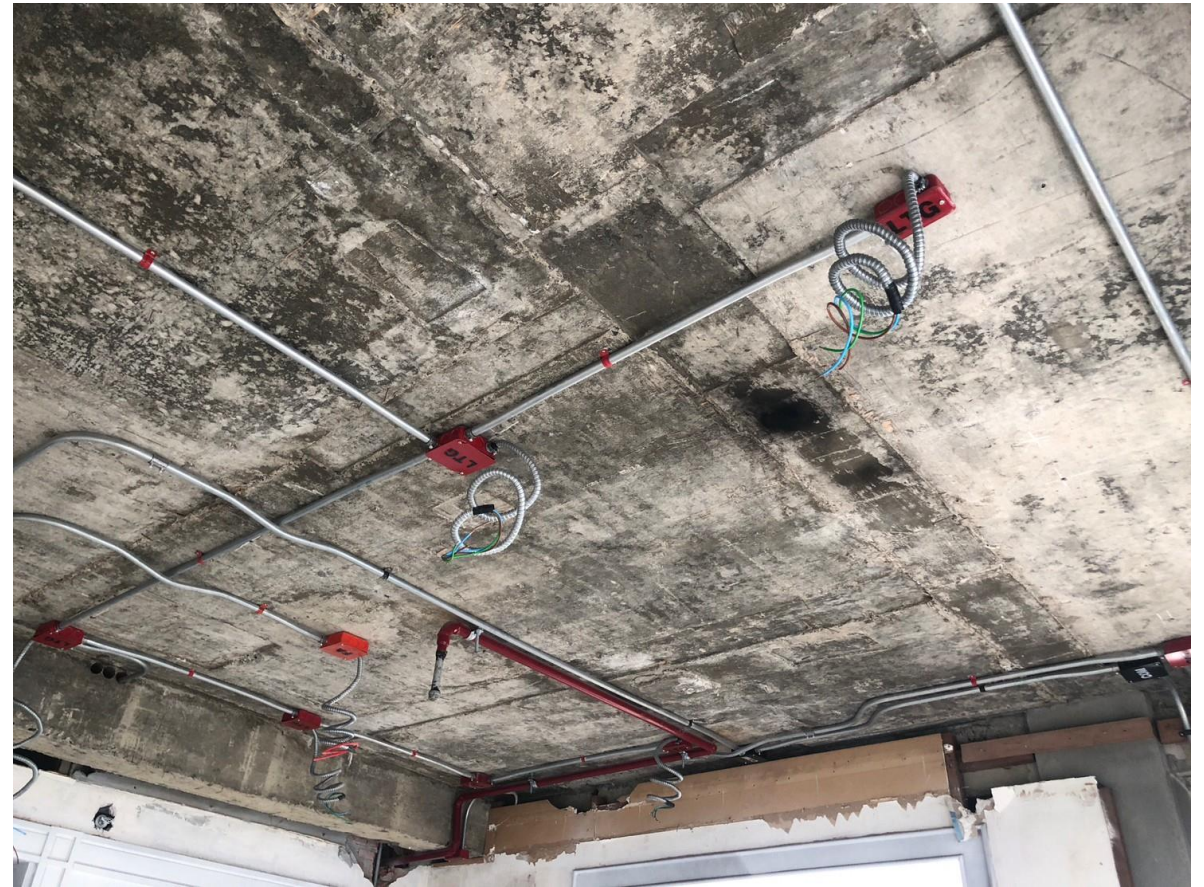

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา






งานร้อยสายไฟบริเวณห้องพัก (Suit Room)  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25






## รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

## ตรวจสอบงานทดสอบวงจรระบบ Lighting และ Power And Receptacle บริเวณห้องพัก (Suite Room) อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25

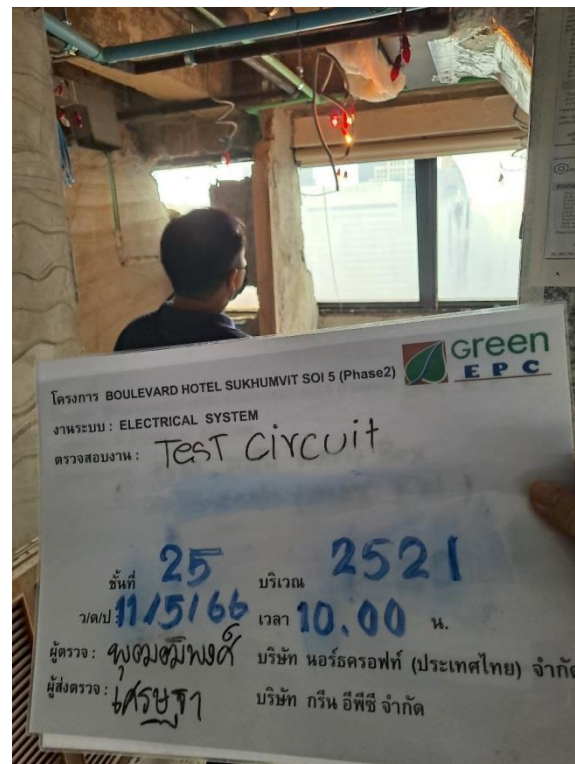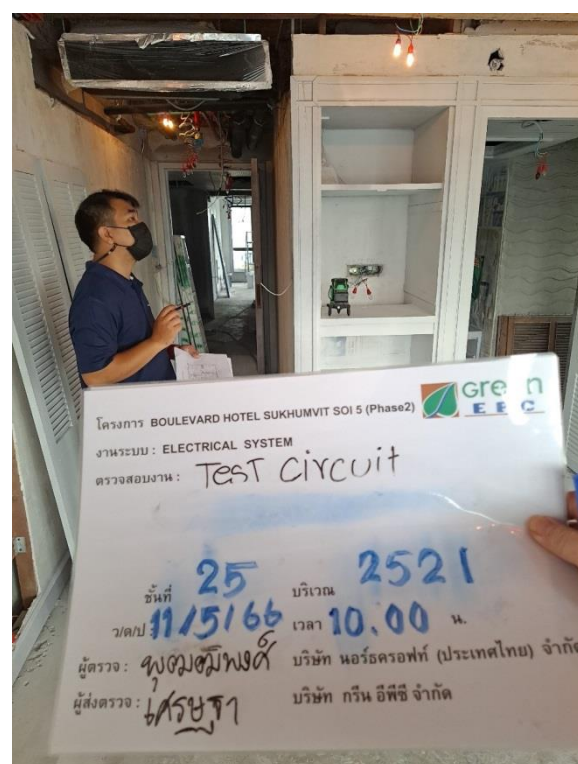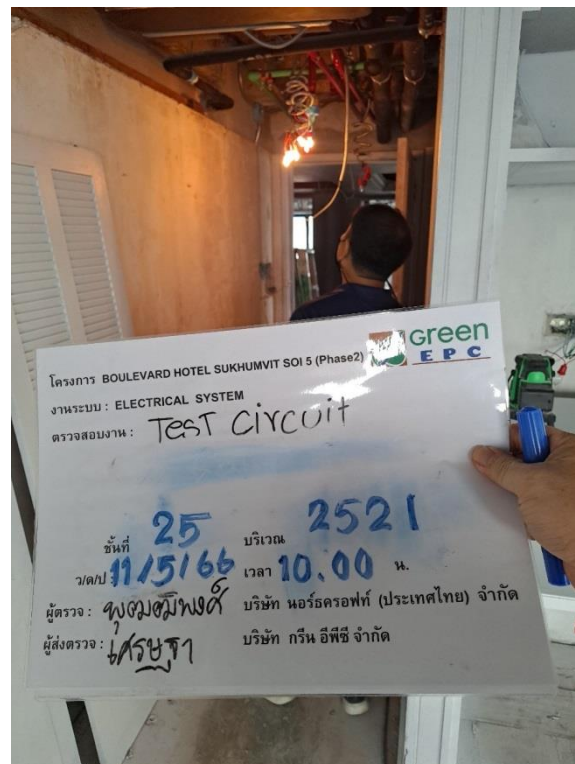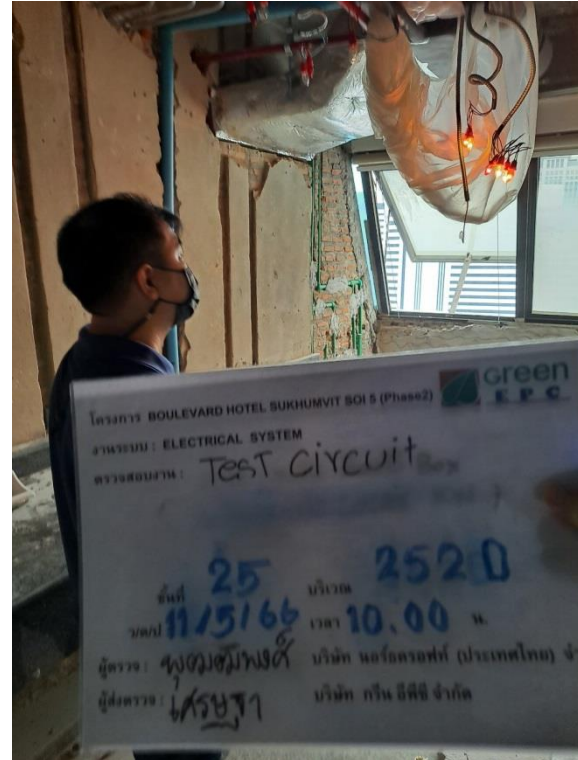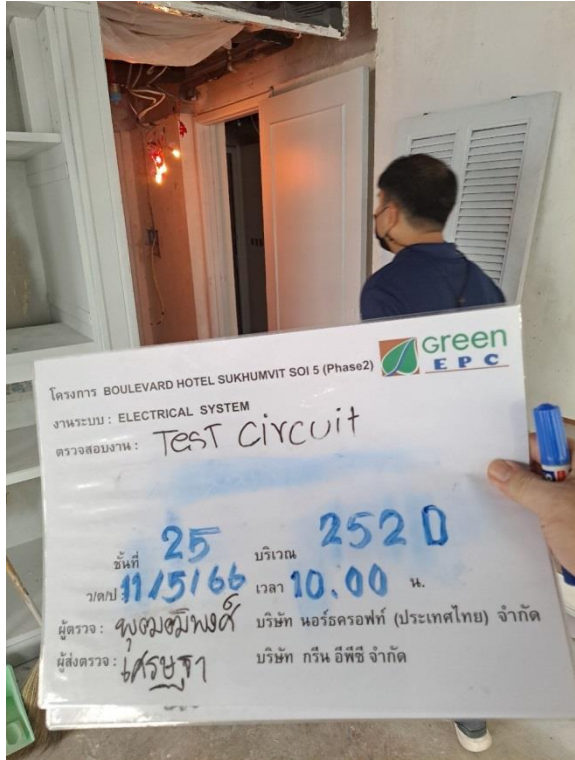

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสาย บริเวณห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-17

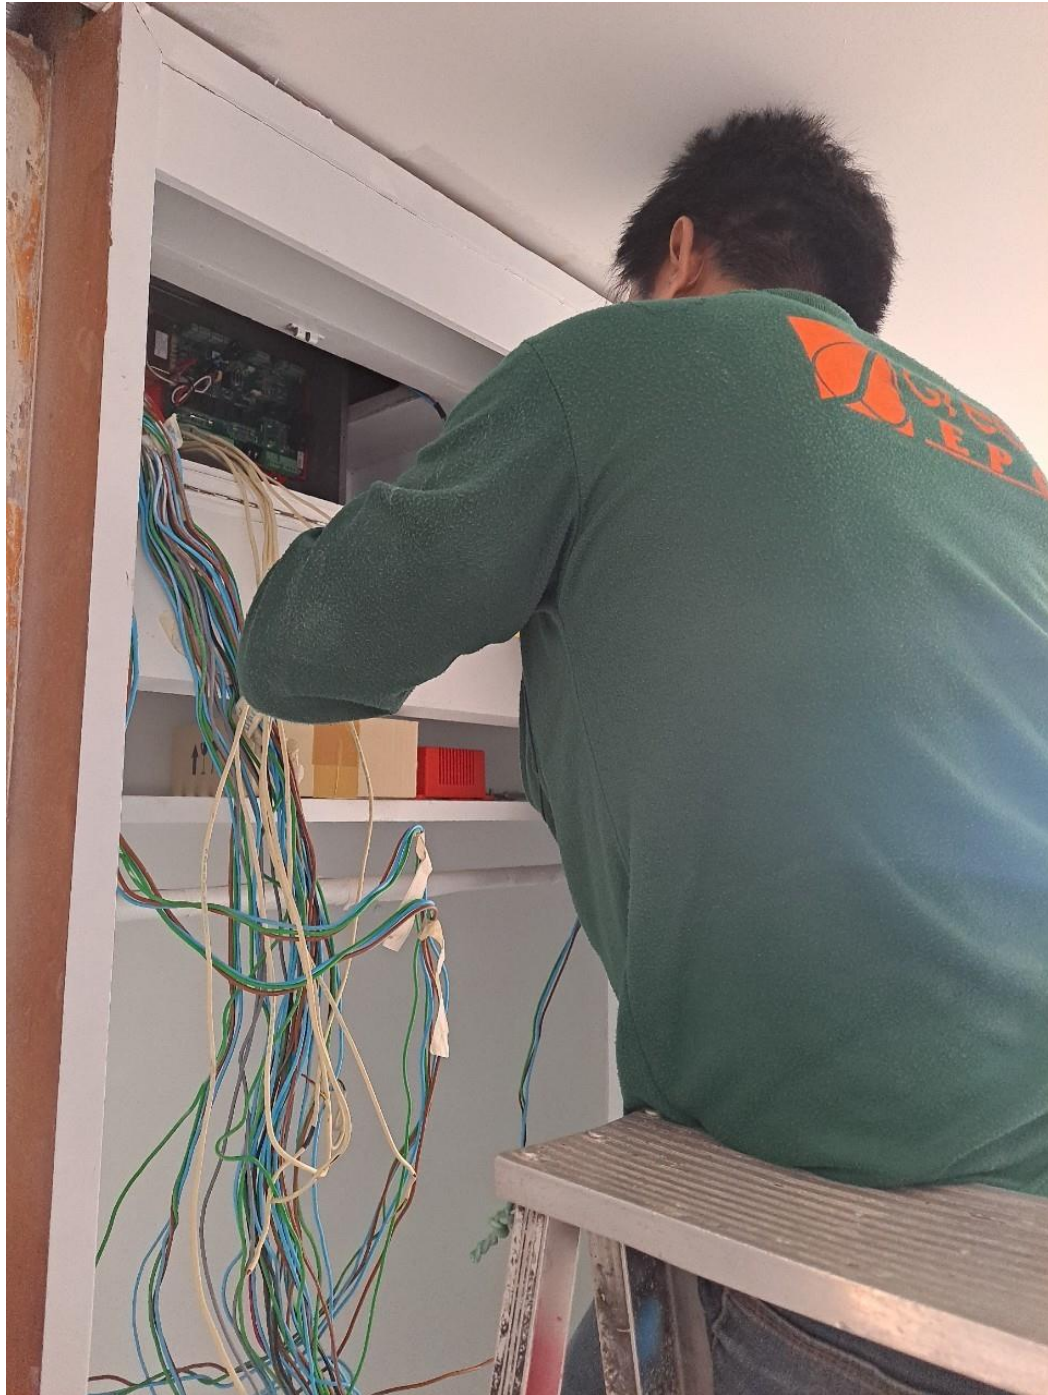

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสาย บริเวณห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-17



## รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสาย บริเวณห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-17




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสาย บริเวณห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-17




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งโคมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign  
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18

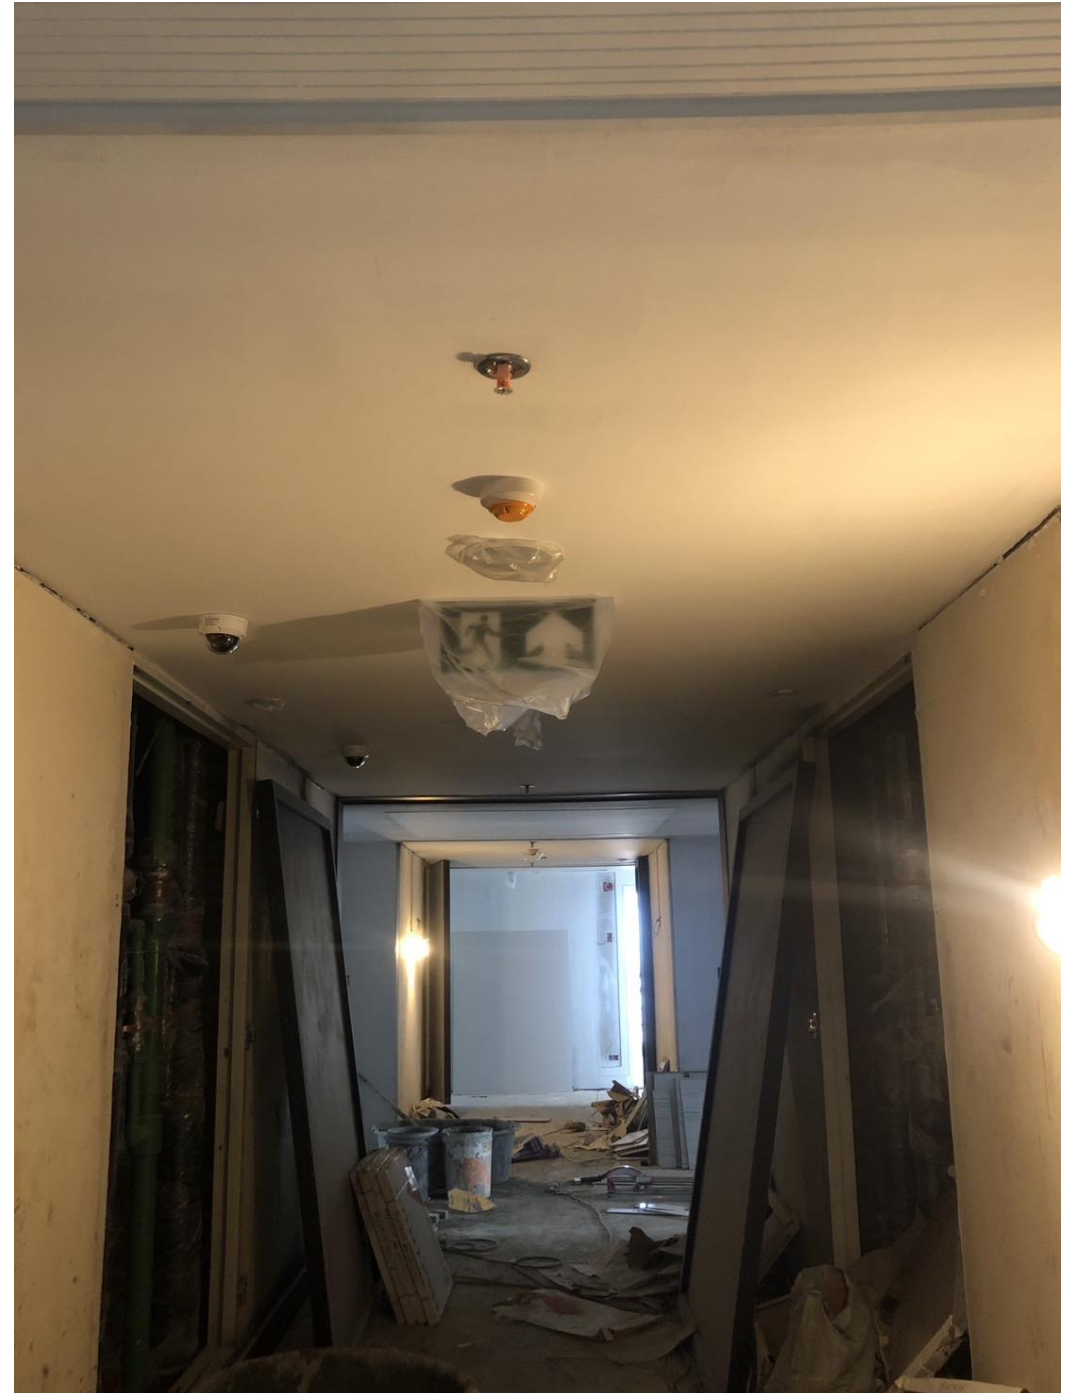

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign  
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18

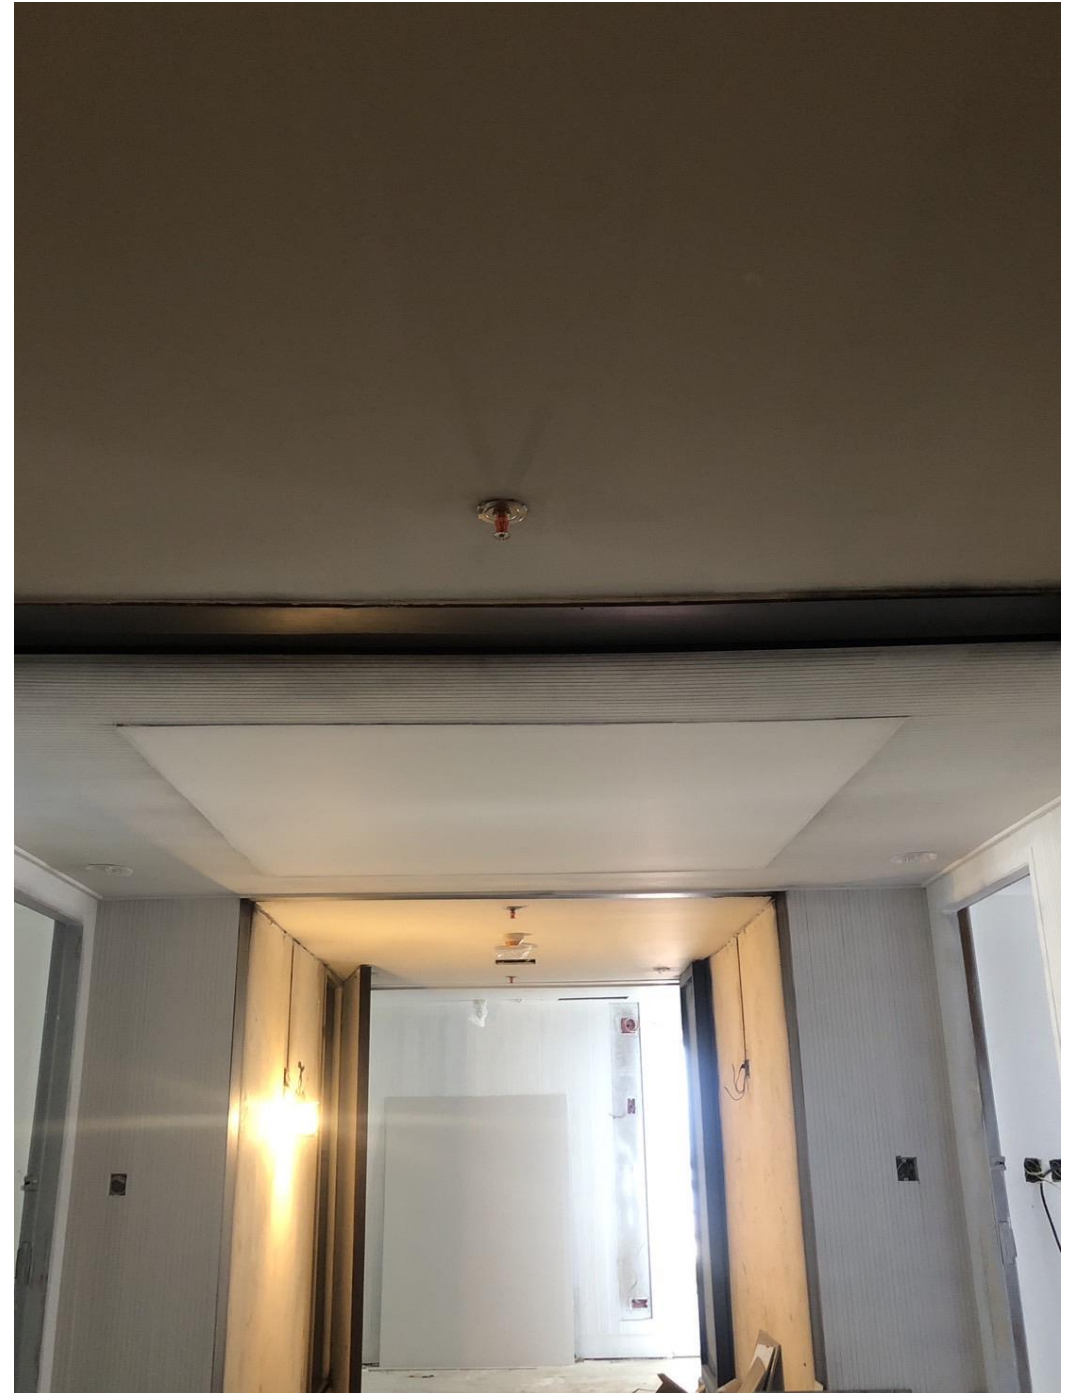

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Decorative Lights , Switch Plug  
บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Decorative Lights , Switch Plug  
บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-9



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug บริเวณห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-8



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงก์ ชั้น 18-20



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงก์ ชั้น 18-20




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18-20



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18-20

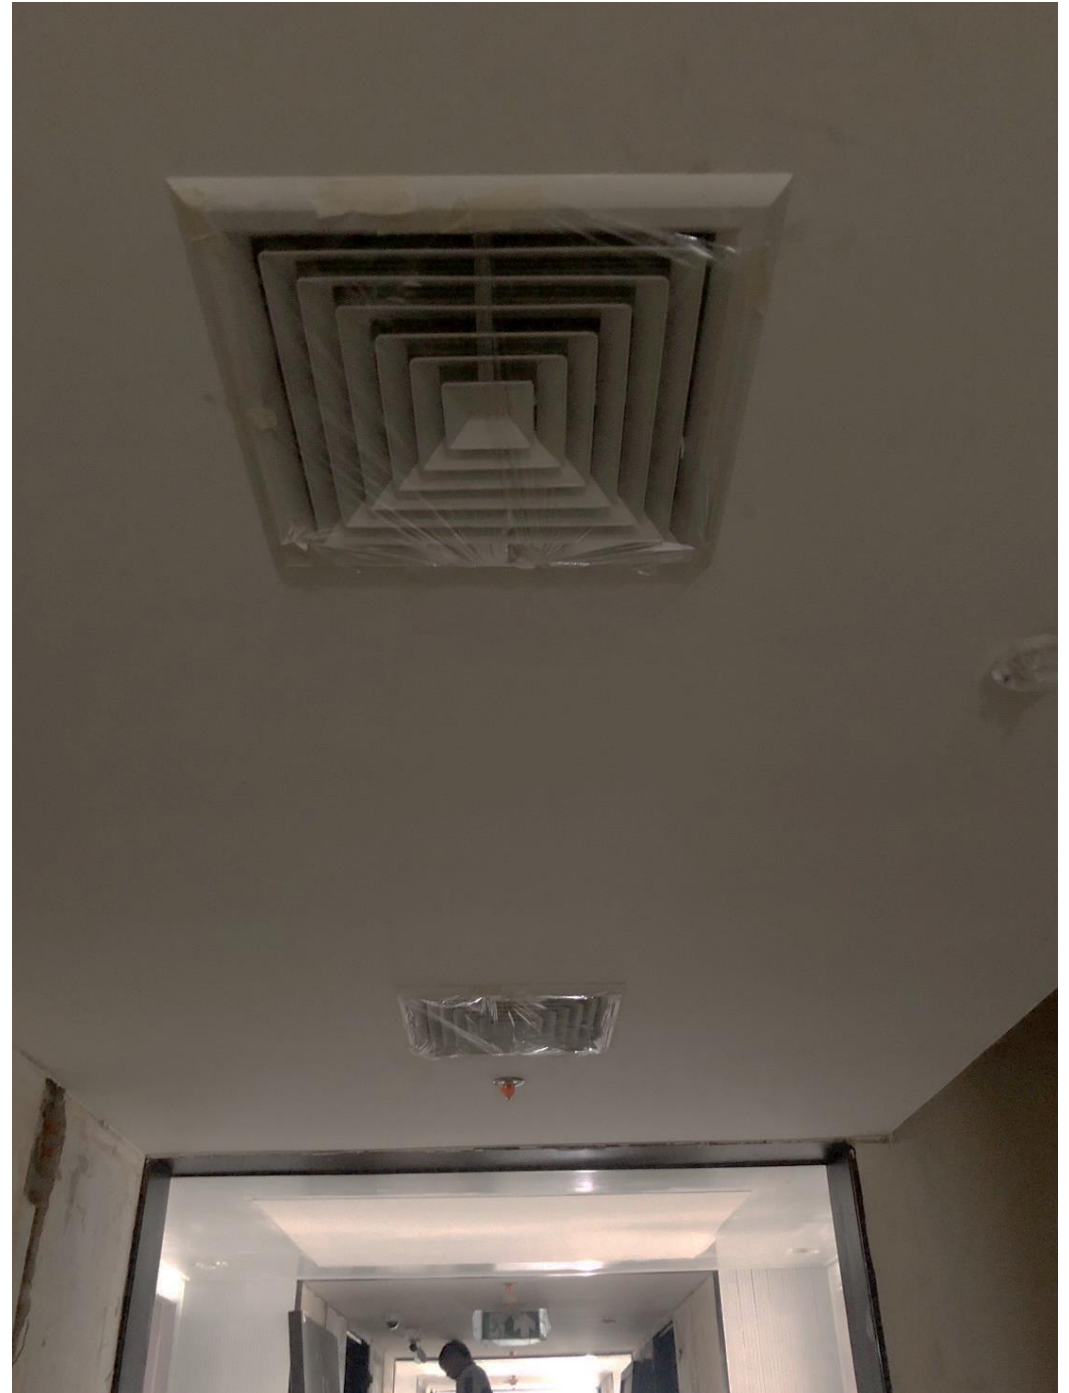

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



## รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

## งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสาย บริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 10



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสาย บริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 10

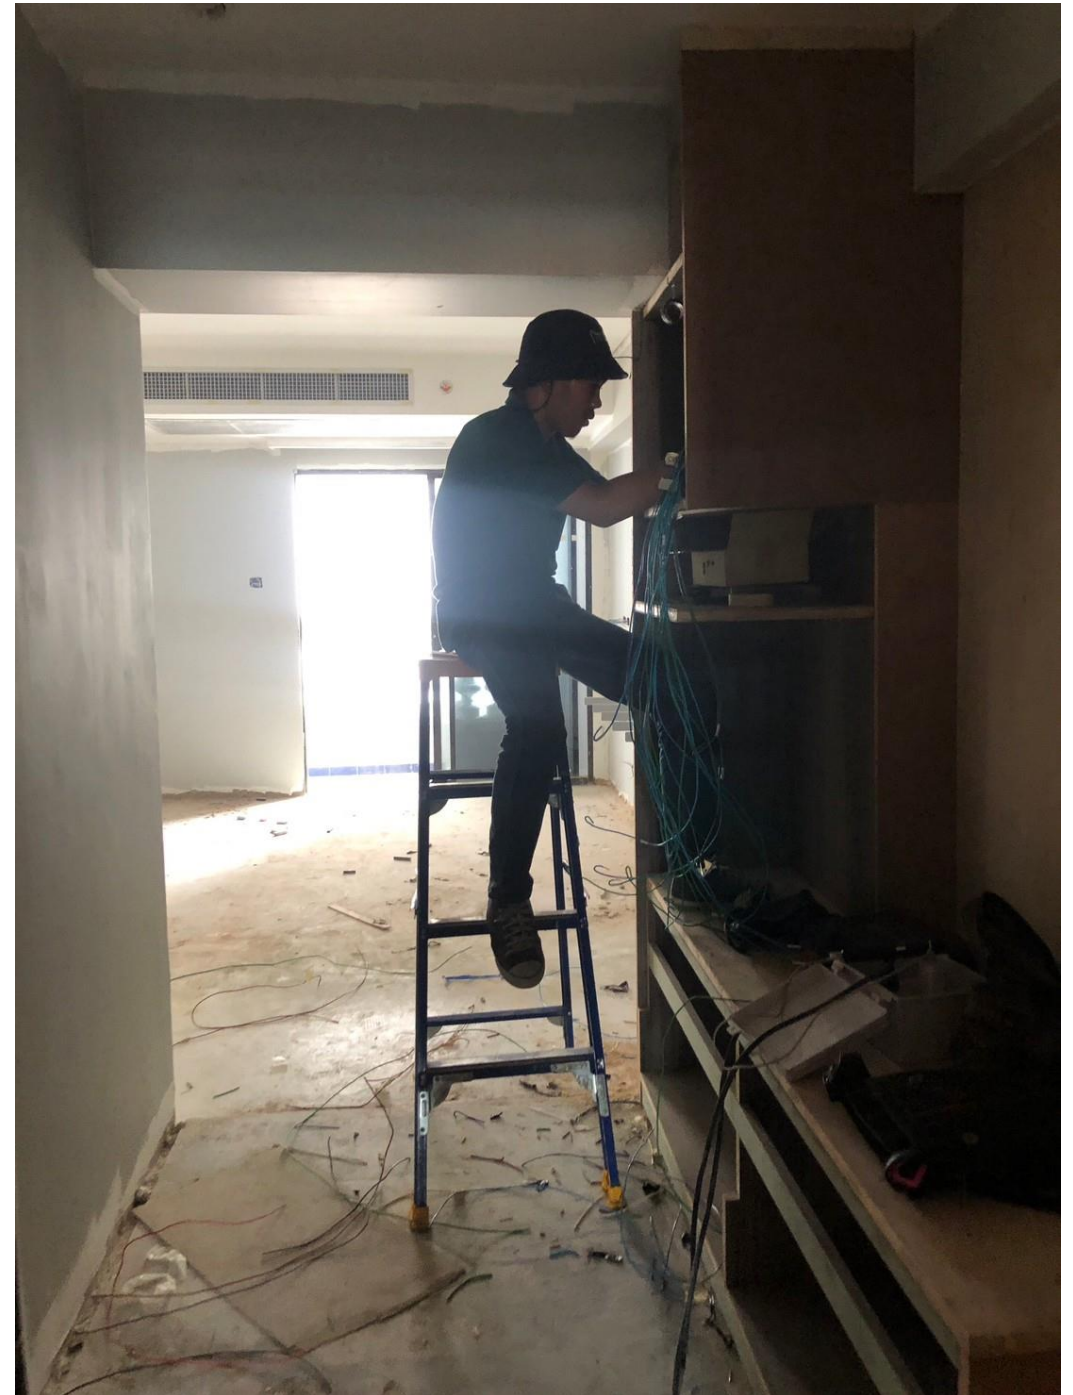

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งคอมไฟบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6,12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งคอมไฟบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6,12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6,12





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6,12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหัวสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6,12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหัวสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6,12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานปูกระเบื้องและหินธรรมชาติผนัง, พื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12,14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานปูกระเบื้องและหินธรรมชาติผนัง, พื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12,14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานปูกระเบื้องและหินธรรมชาติผนัง, พื้นห้องน้ำบริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12,14





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหินธรรมชาติกันระลอกบริเวณห้องน้ำของห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์  
ชั้น 12




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

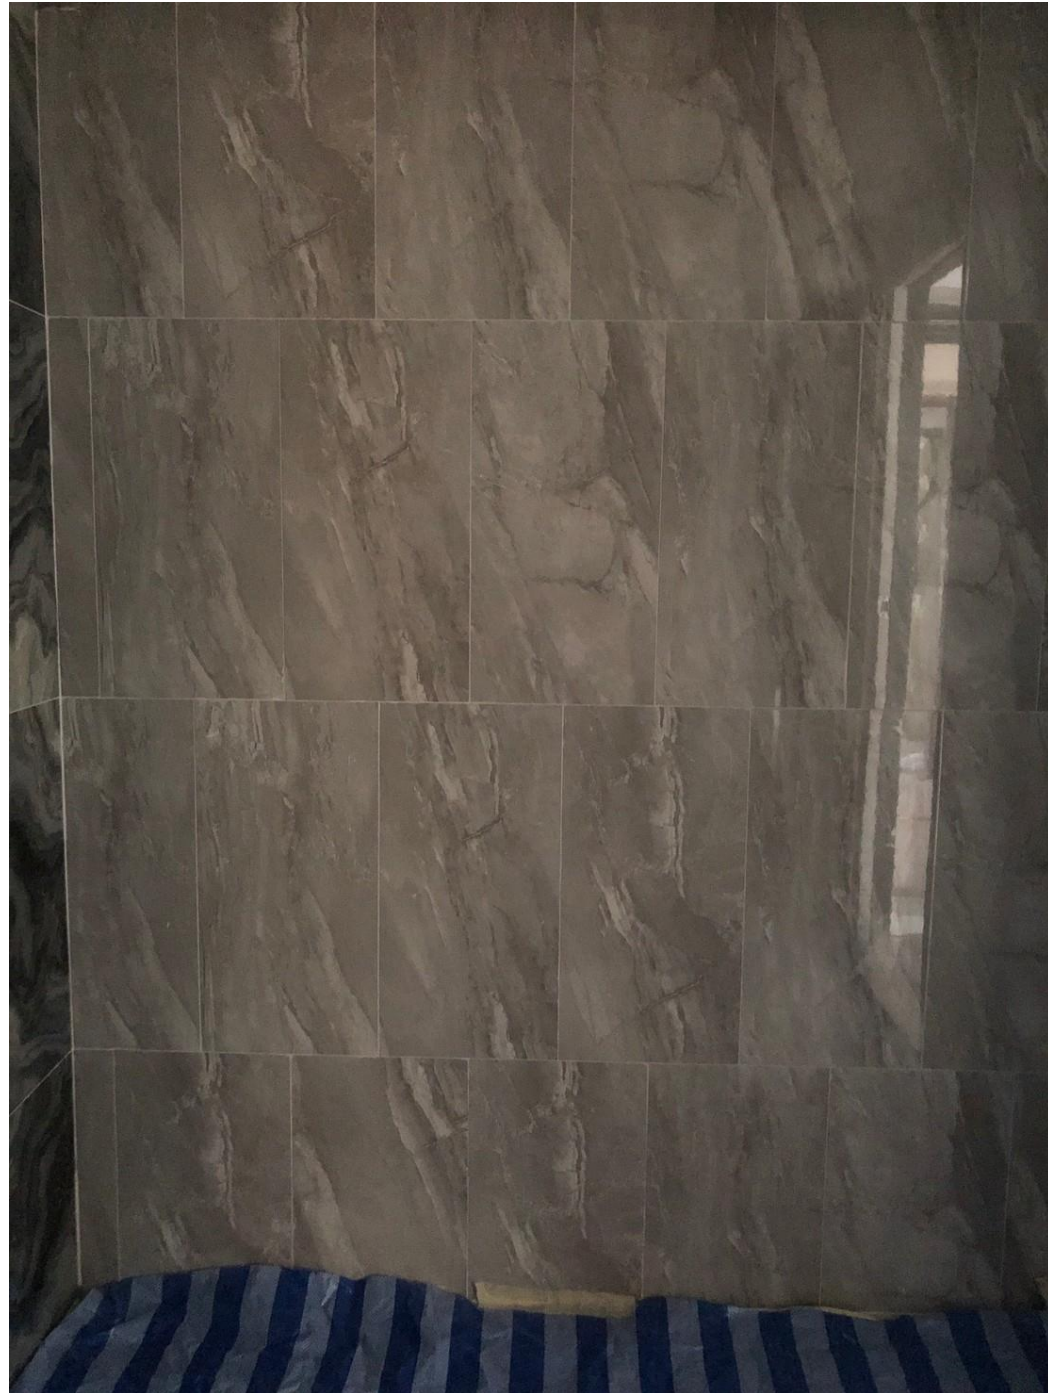


งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์  
ชั้น 12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

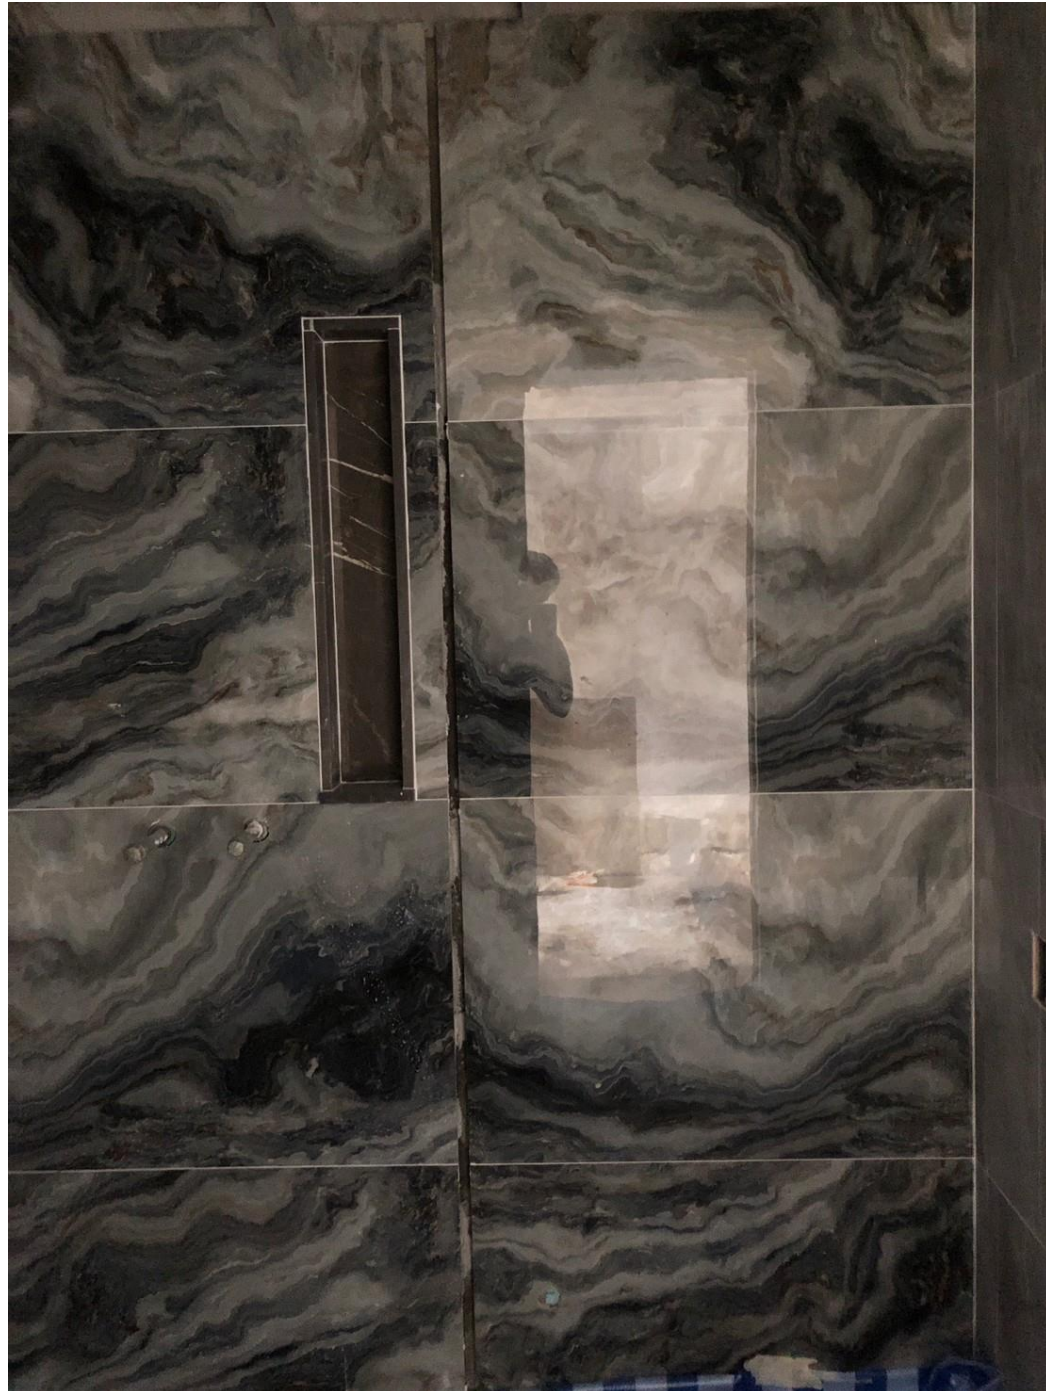


งานยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์  
ชั้น 12

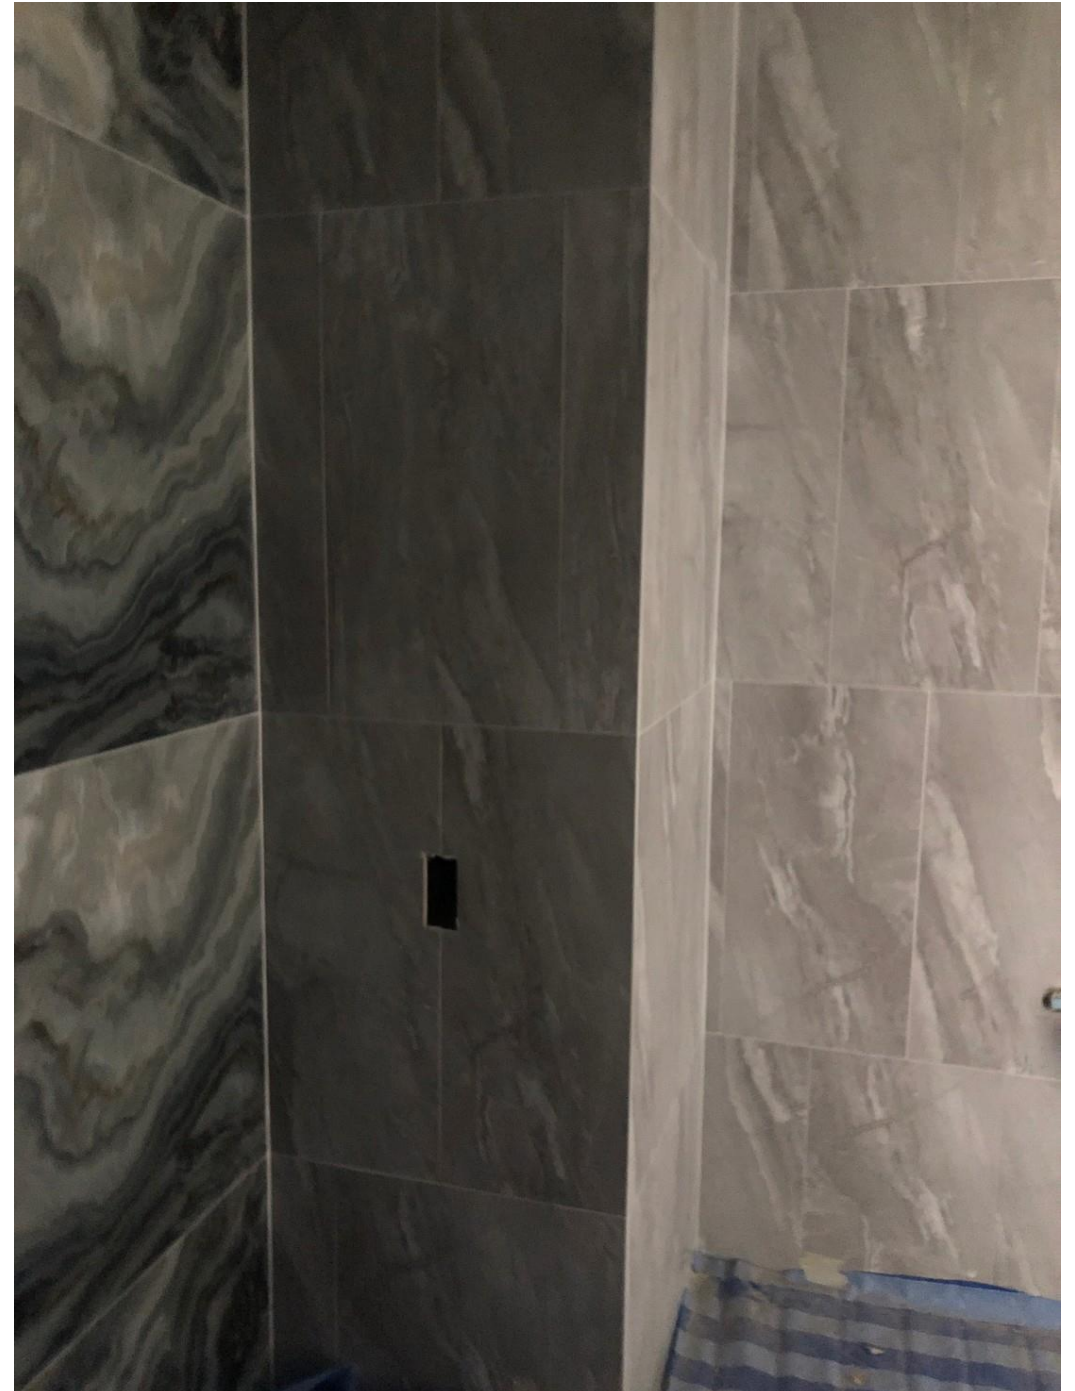

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานก่ออิฐมวลเบาผนังห้องน้ำบริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

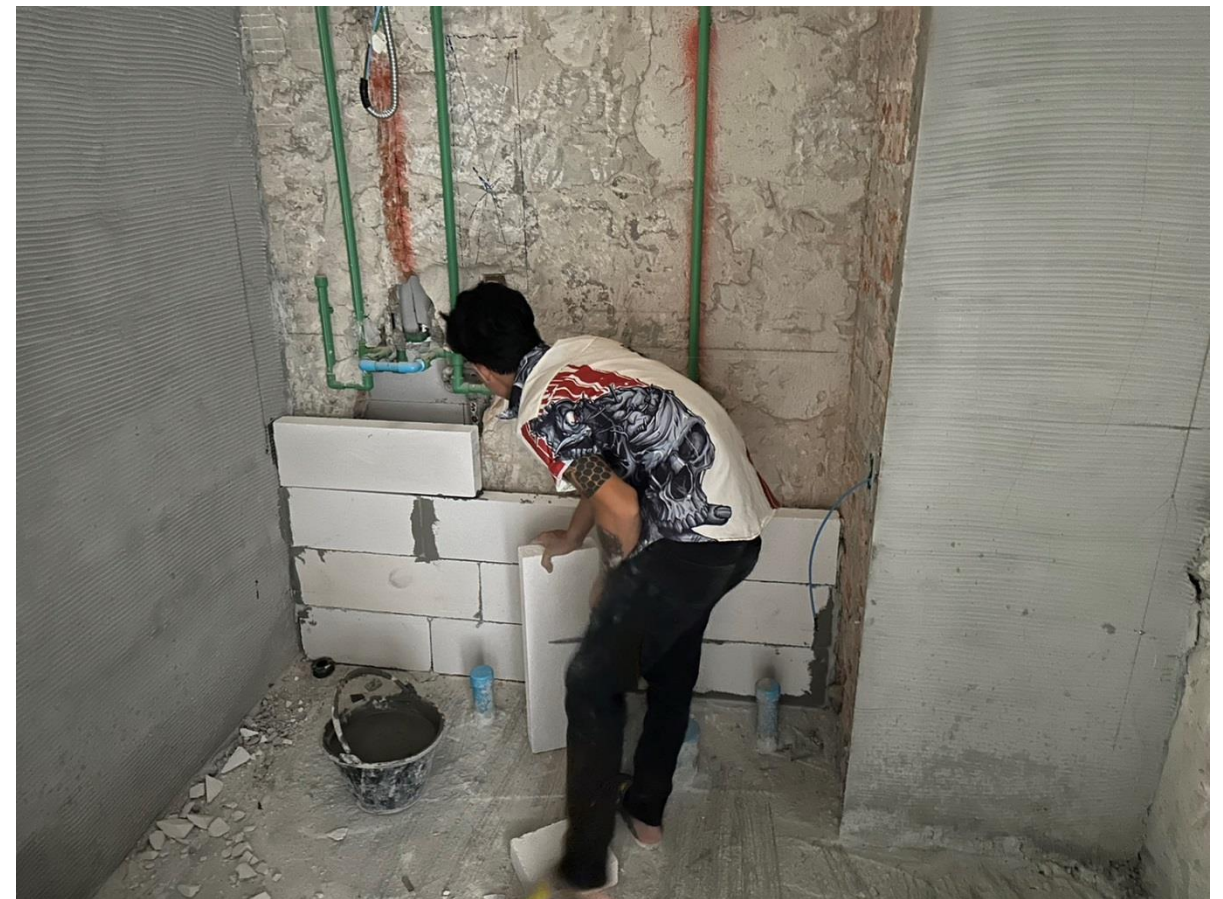

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานก่ออิฐมวลเบาผนังห้องน้ำบริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

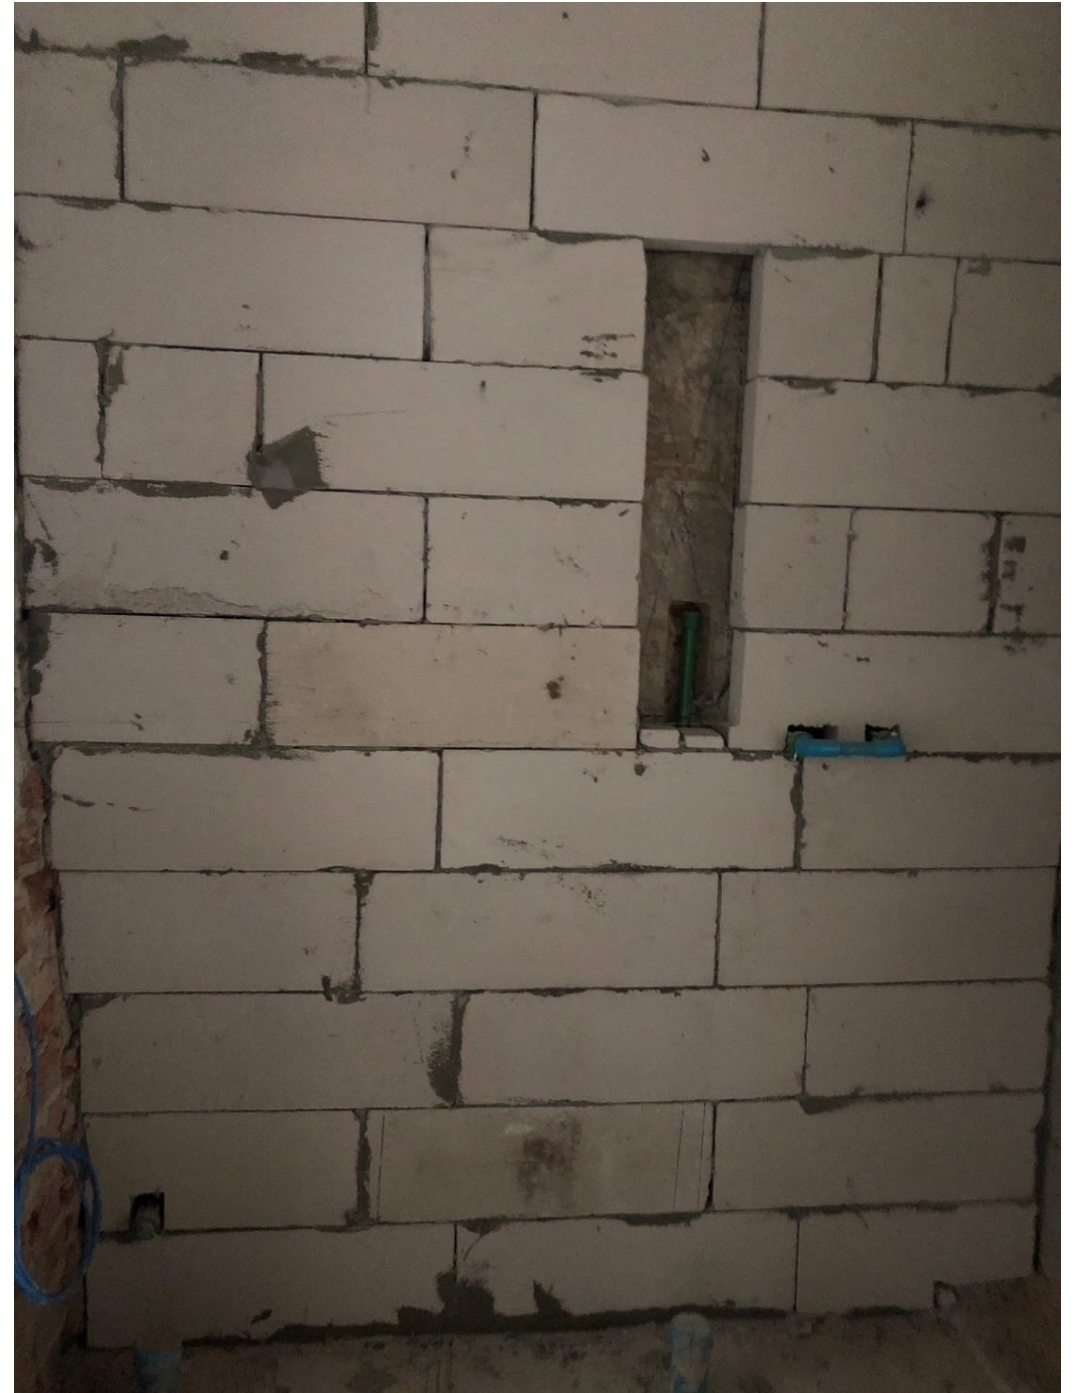

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานฉาบปูนผนังห้องน้ำบริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานฉาบปูนผนังห้องน้ำบริเวณห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

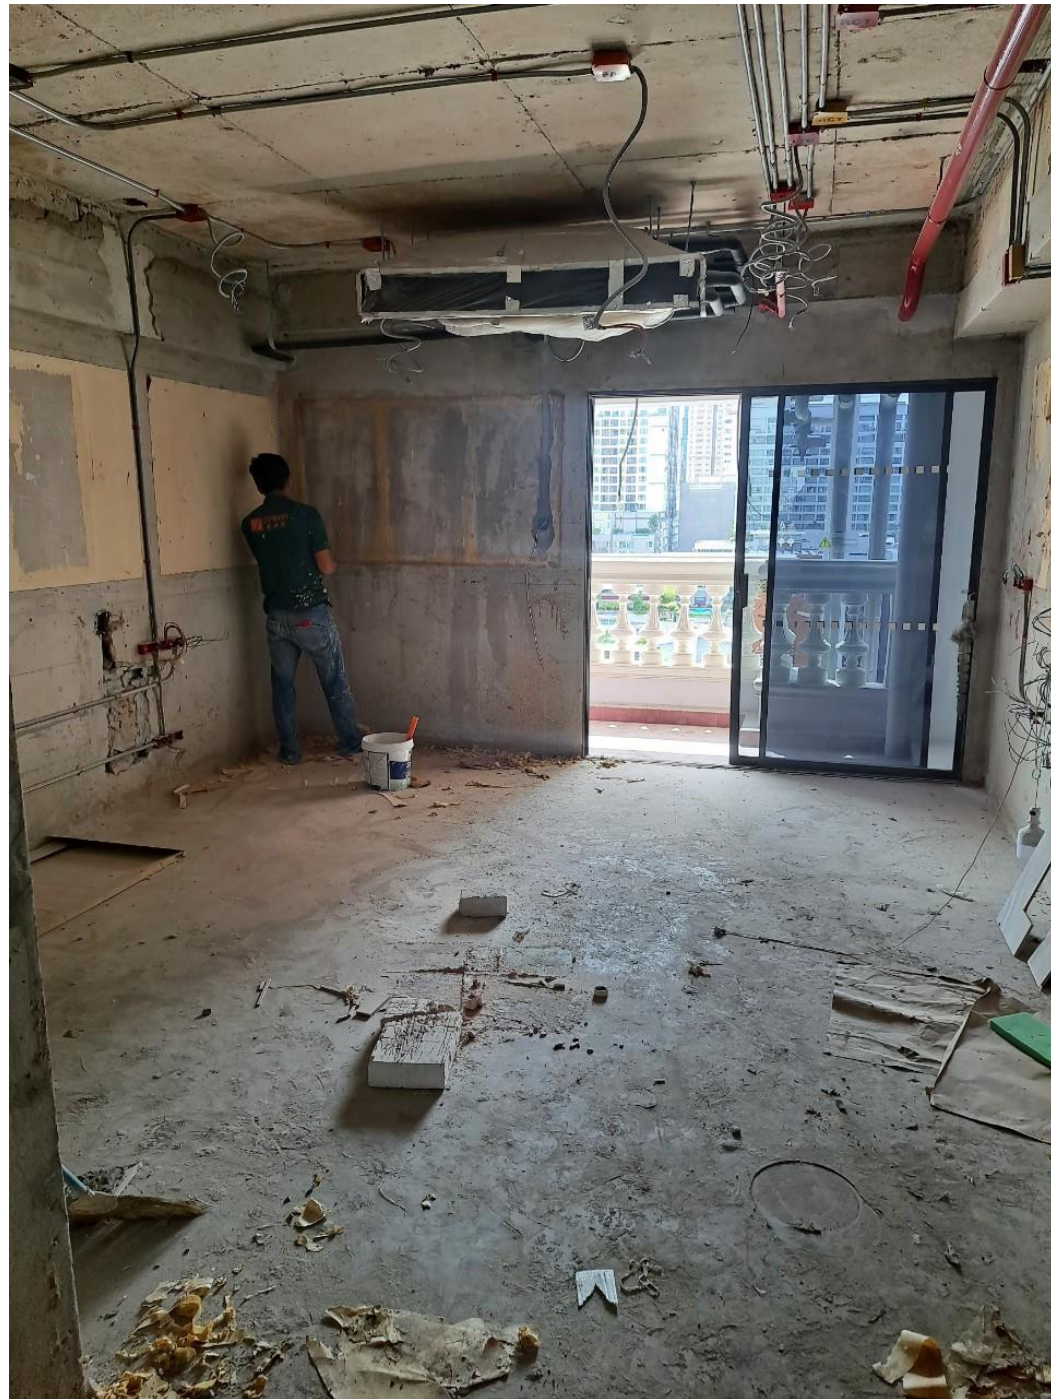


งานสกิมโค้ทผนังห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

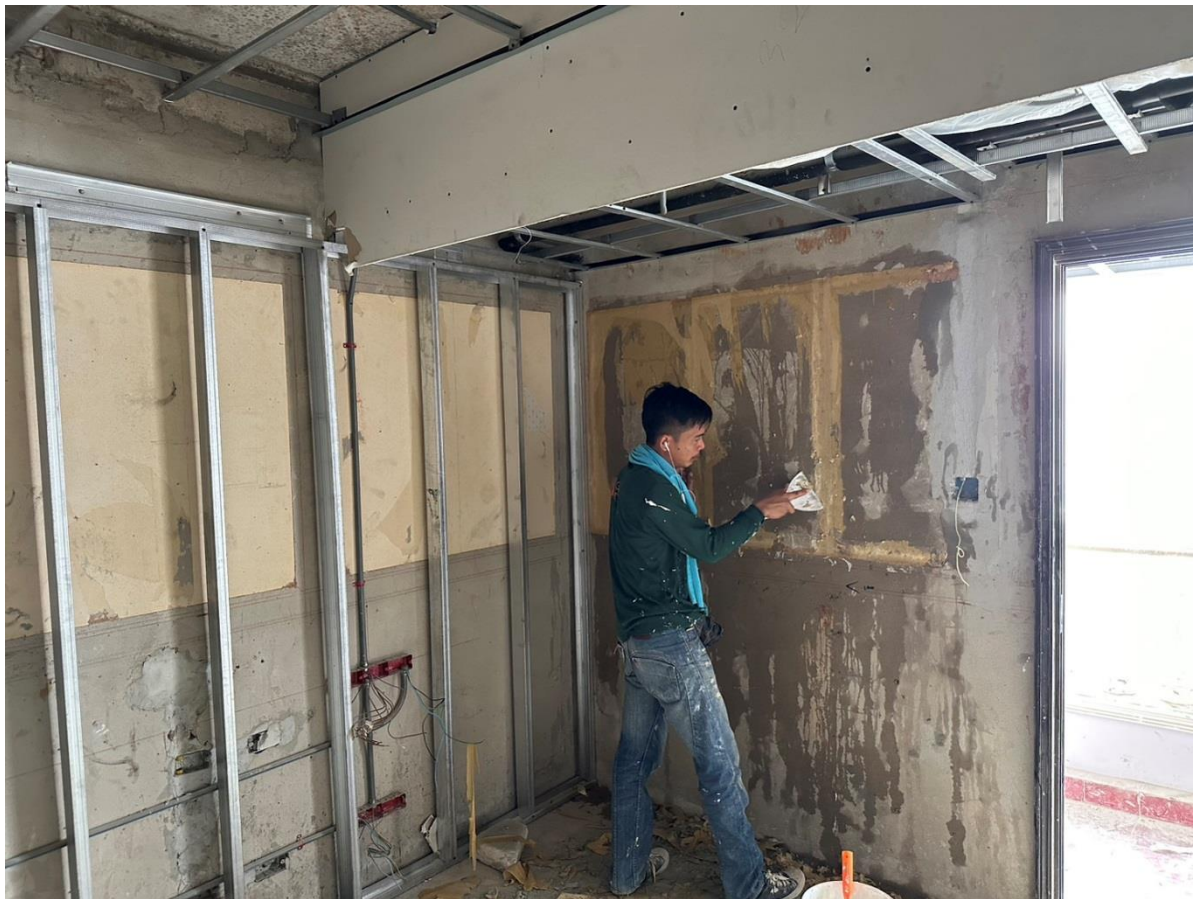

งานสกริมโค้ทผนังห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 14

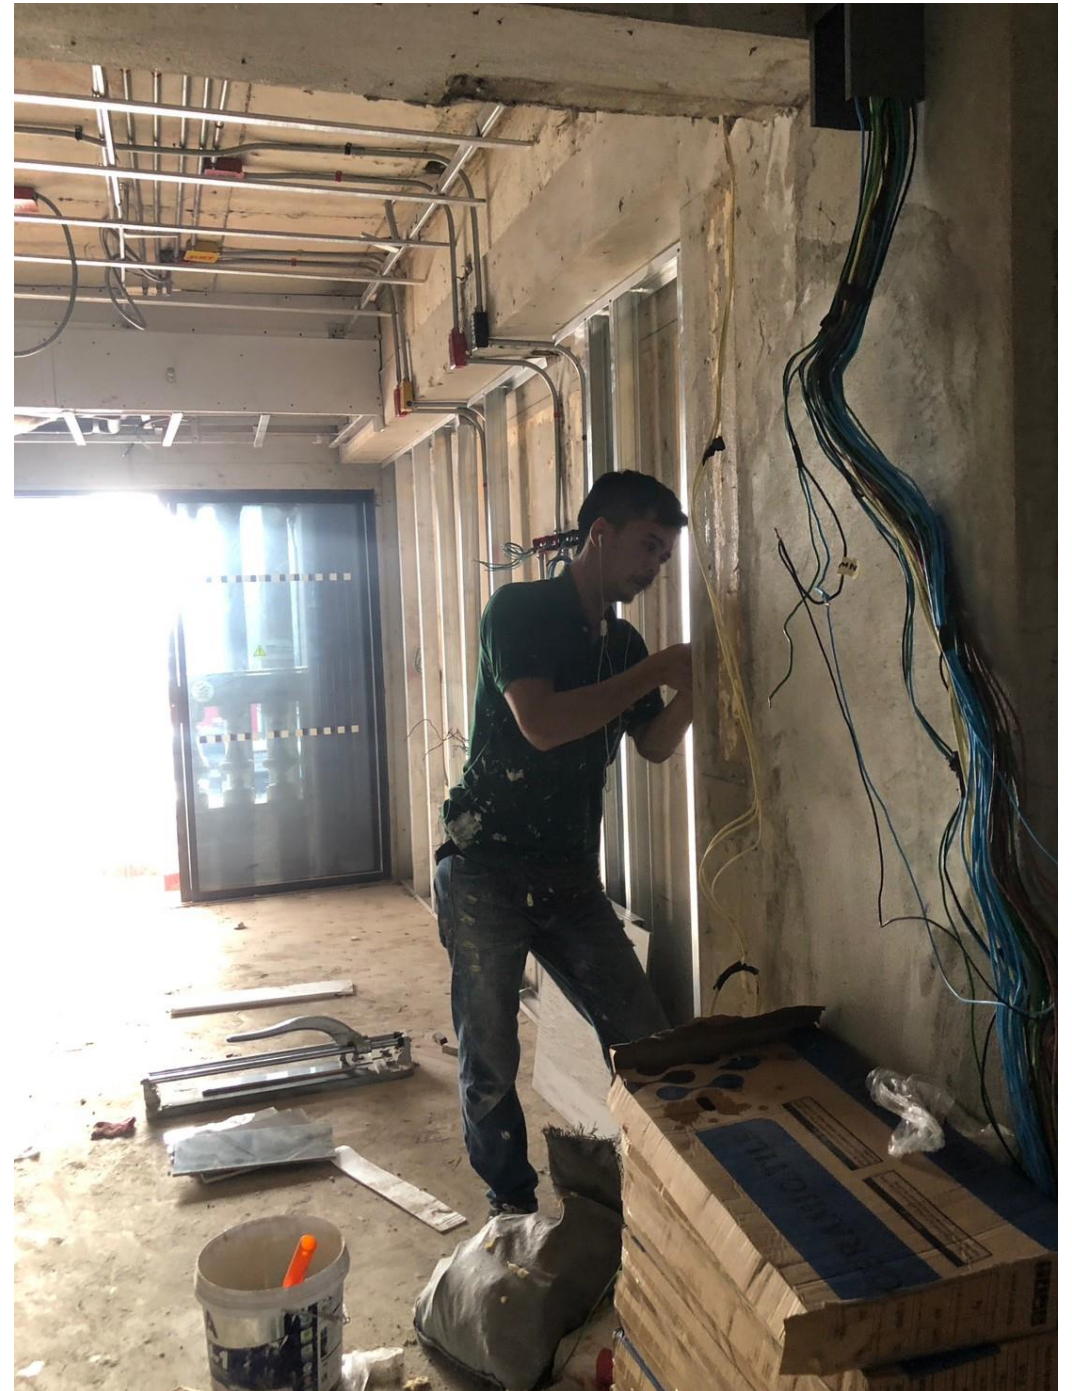

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



ตัวอย่างงานขัดหินบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



ตัวอย่างงานขัดหินบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



ตัวอย่างงานขัดหินบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



ตัวอย่างงานขัดหินบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7

