



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

02 February 2023

แผนงาน 3 Week KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week SIAM WING

สถานะแบบ Shop DWG ของงานระบบ

สถานะแบบ Shop DWG งานระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	Description	First Submit		
		Submitted	Returned	Result (code)
	ระบบป้องกันอัคคีภัย (Gate Room Phase 2)			
1	แบบ Fire Protection System For Krungthep Wing Deluxe Room Type A (Krungthep Wing)	9 Jan 66	30 Jan 66	AAN
2	แบบ Fire Protection System For Krungthep Wing Deluxe Room Type B (Krungthep Wing)	28 Jan 66		
3	แบบ Fire Protection System 6 Floor Plan (Corridor Area) (Siam Wing)	31 Jan 66		
	งานระบบไฟฟ้า (Gate Room Phase 2)			
1	แบบ Communication System 7th-15th Floor Plan (Corridor Area) (Siam Wing)	13 Jan 66	30-Jan-66	AAP
2	แบบ CCTV & Public Address 7th-15th Plan (Corridor Area) (Siam Wing)	13 Jan 66	30-Jan-66	AAN
3	แบบ Branch Feeder Electrical Routing 7th-15th Floor Plan (Corridor Area) (Siam Wing)	19 Jan 66	30-Jan-66	AAN
4	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 8th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	14 Jan 66		
5	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 9th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	17 Jan 66		
6	Power And Receptacle System 9th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	17 Jan 66	30 Jan 66	APP
7	Power And Receptacle System 8th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	17 Jan 66	30 Jan 66	APP
8	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 7th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	19 Jan 66		
9	CCTV & Public Address 7th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	18 Jan 66	30 Jan 66	APP
10	CCTV & Public Address 8th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	18 Jan 66	30 Jan 66	APP

สถานะแบบ Shop DWG งานระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	Description	First Submit		
		Submitted	Returned	Result (code)
	<u>งานระบบไฟฟ้า (Gate Room Phase 2)</u>			
11	CCTV & Public Address 9th,10th,11th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	18 Jan 66	30 Jan 66	APP
12	Elevation 1,3,6,7 (No.820,821) For Krungthep Wing (Gate Room Phase 2) (Krungthep Wing)	20 Jan 66	23 Jan 66	APP
13	Elevation 1,3,6,7 (No.720,721) For Krungthep Wing (Gate Room Phase 2) (Krungthep Wing)	20 Jan 66	23 Jan 66	APP
14	Lighting, Exit Sign And Emergency Light 10th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	23 Jan 66	30 Jan 66	AAN
15	Power And Receptacle System 10th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	23 Jan 66		
16	Branch Feeder Electrical Routing 9th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	24 Jan 66	30 Jan 66	APP
17	Branch Feeder Electrical Routing 10th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	24 Jan 66	30 Jan 66	APP
18	Communication System 9th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	24 Jan 66	30 Jan 66	APP
19	Communication System 10th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	24 Jan 66	30 Jan 66	APP
20	Fire Alarm System 9th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	26 Jan 66		
21	Fire Alarm System 10th Floor Plan (Corridor Area) (Krungthep Wing)	26 Jan 66		

หมายเหตุ

APP = Approved

DAN = Disapproved as noted

AAN = Approved as noted

Clarified = Clarified

สถานะแบบ Shop DWG งานระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	Description	First Submit		
		Submitted	Returned	Result (code)
	<u>งานระบบปรับอากาศ (Gate Room Phase 2)</u>			
1	แบบ Air Condition & Ventilation Work Floor Plan For Krungthep Wing Deluxe Room (Krungthep Wing)	13 Jan 66	24 Jan 66	AAN

หมายเหตุ

APP = Approved

DAN = Disapproved as noted


AAN = Approved as noted

Clarified = Clarified

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟบริเวณห้องพัก (No.1220,1221) อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12

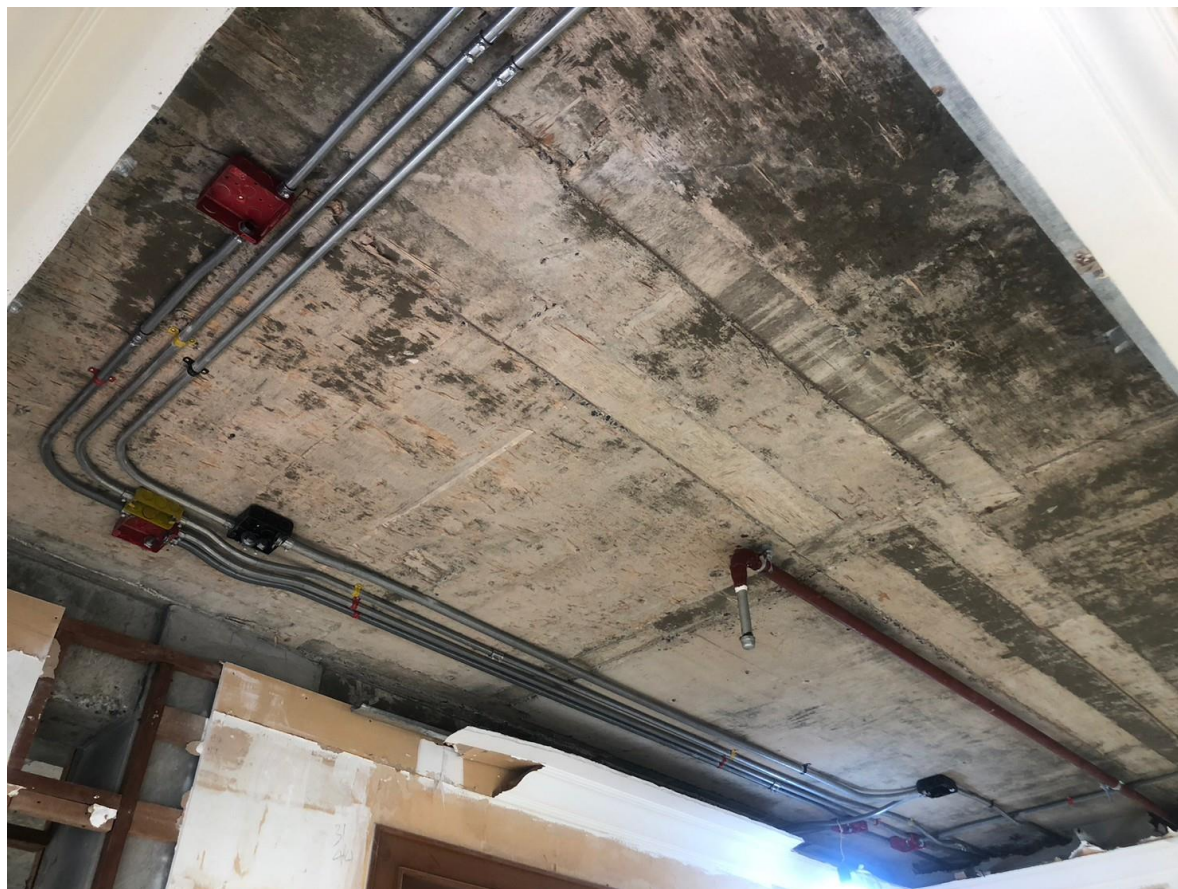

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานร้อยสายไฟบริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 24,21



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานร้อยสายไฟบริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21,24











รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน พร้อมทดสอบวงจรระบบไฟฟ้า
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 11










รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานทดสอบวงจรระบบไฟฟ้าบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 11

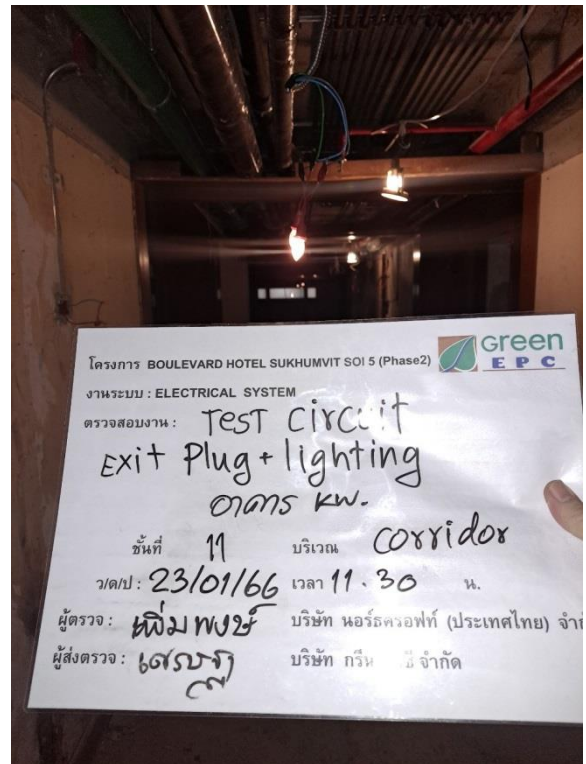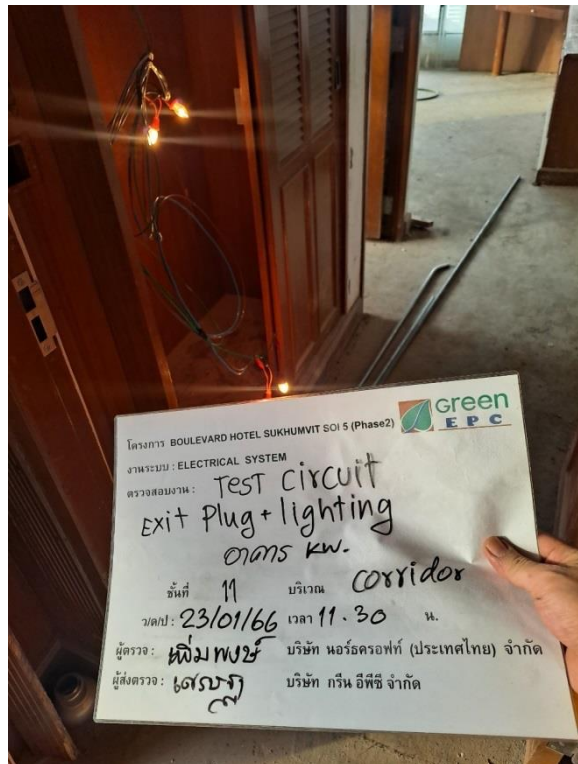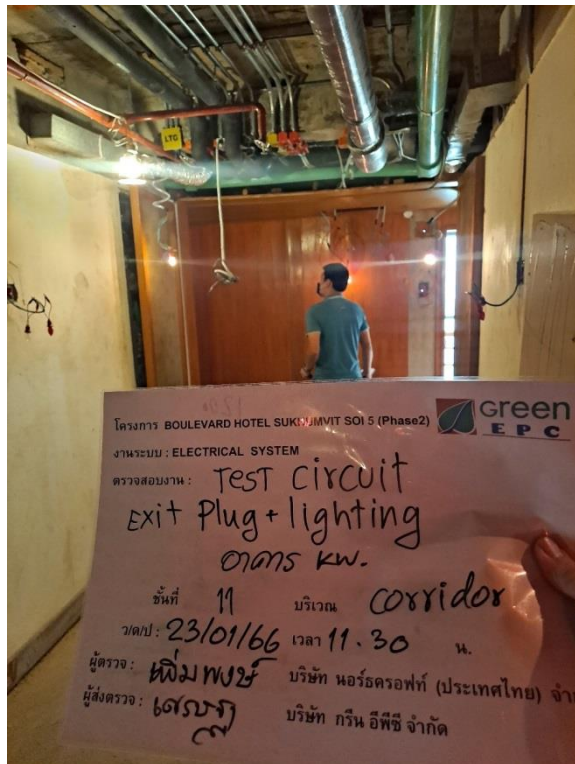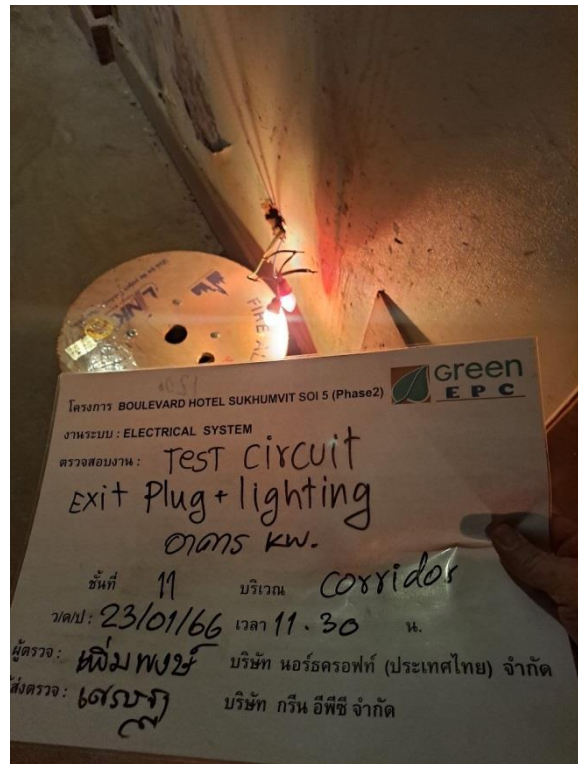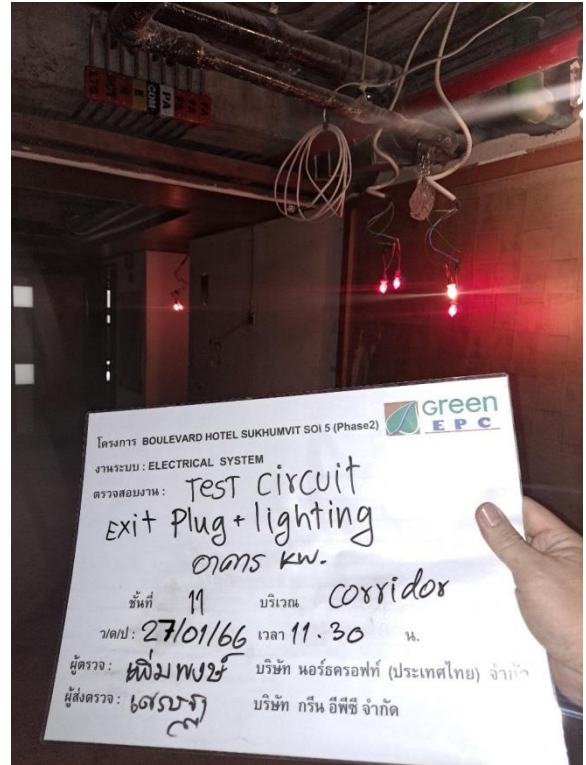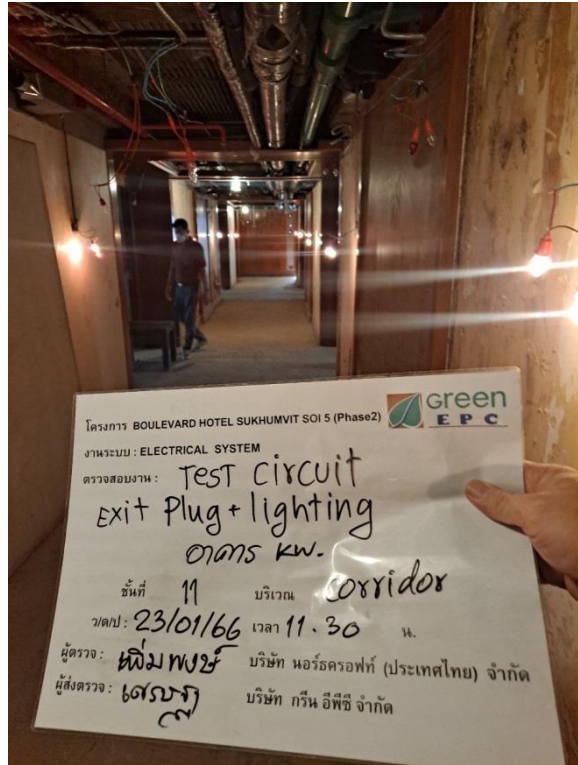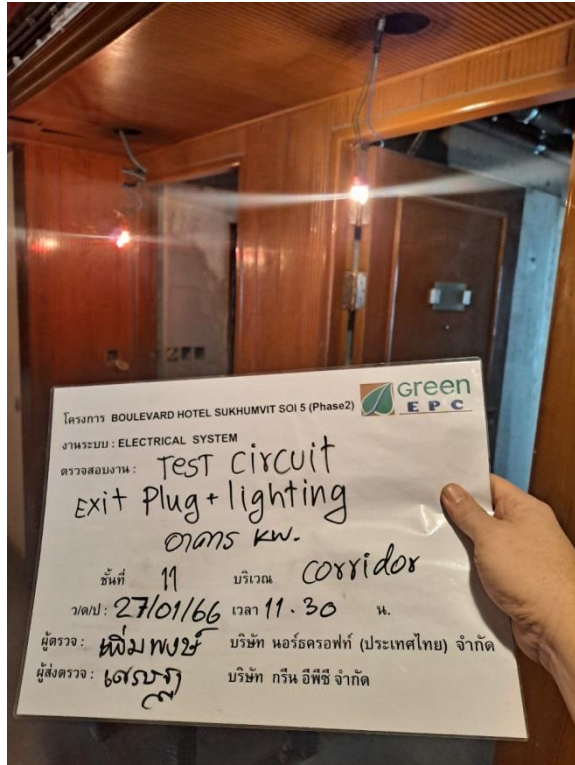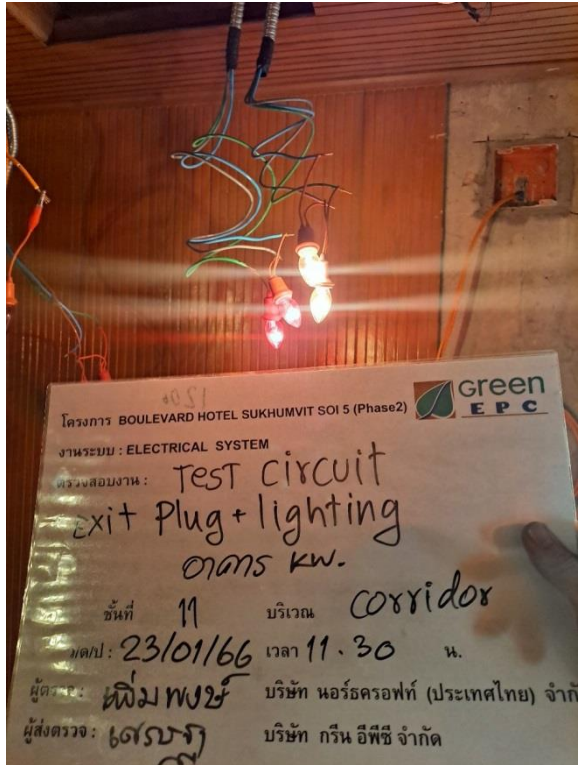









รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานทดสอบวงจรระบบ Lighting และ Power And Receptacle บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19

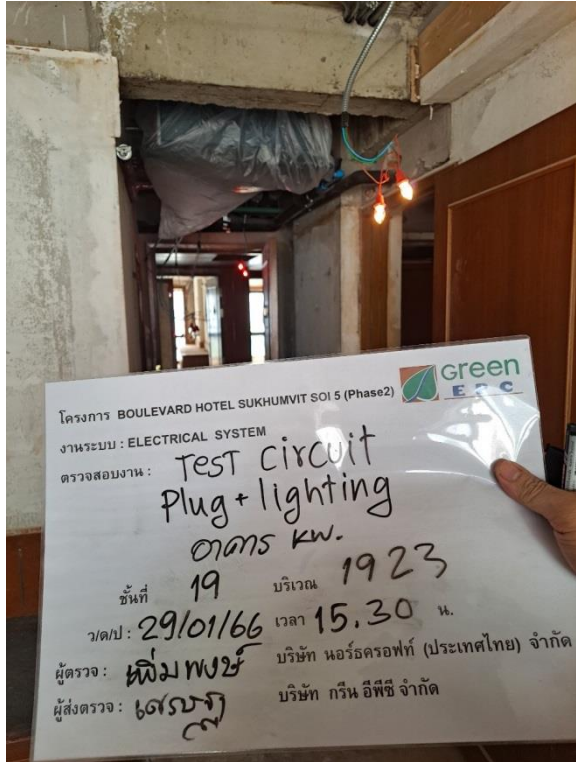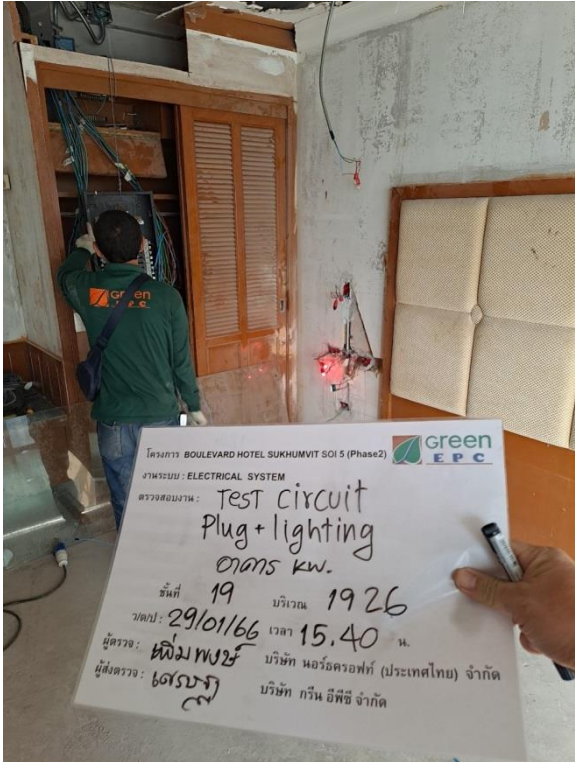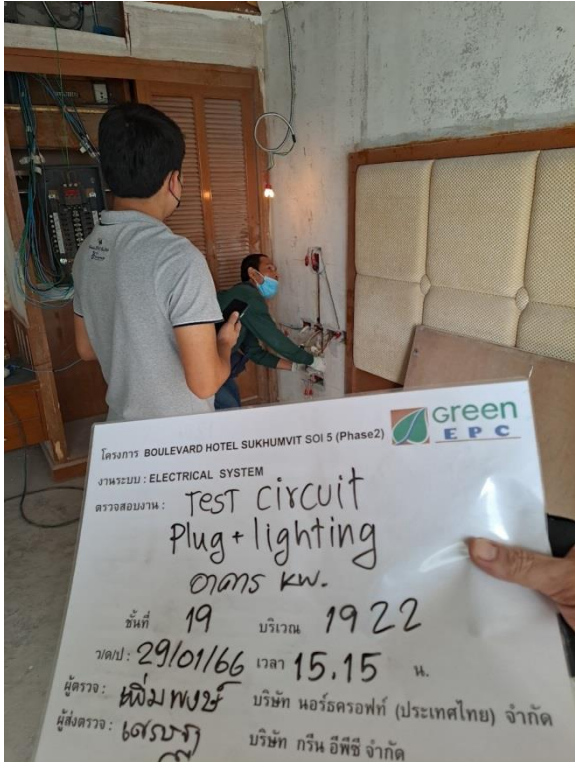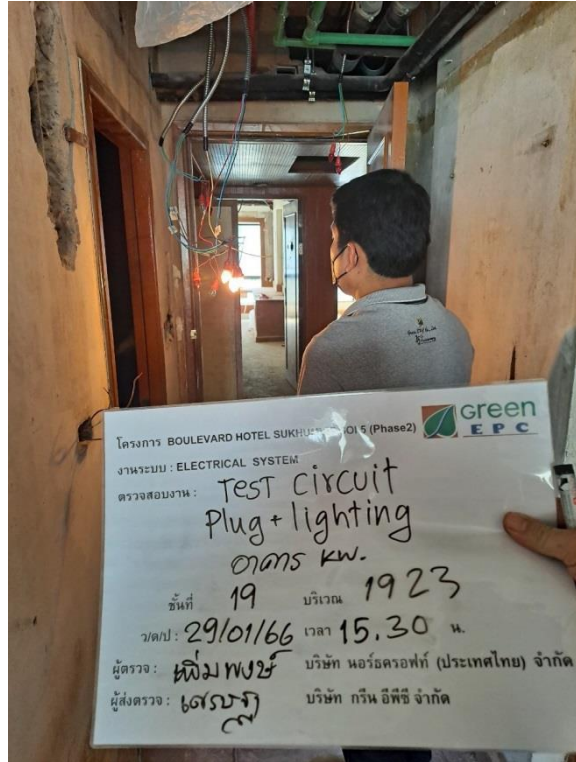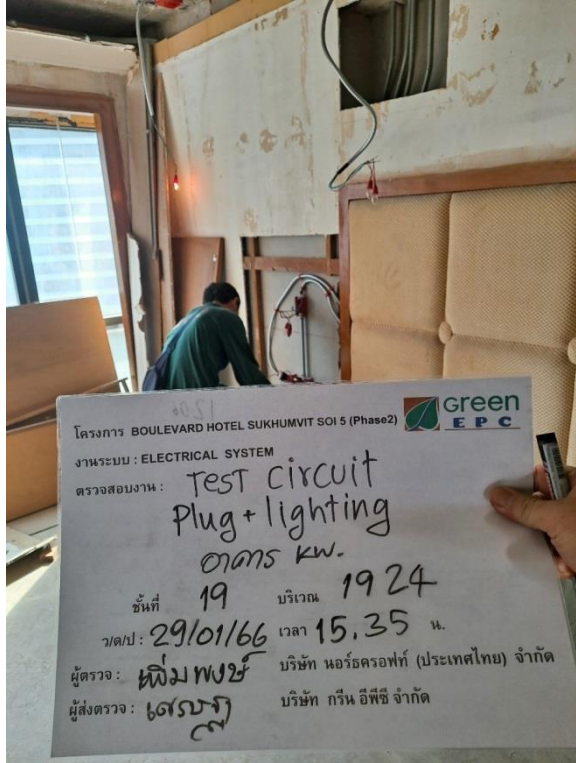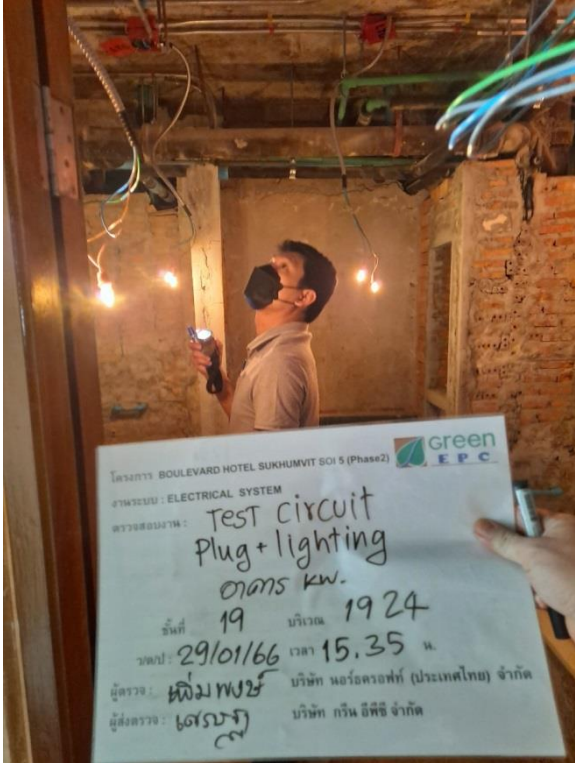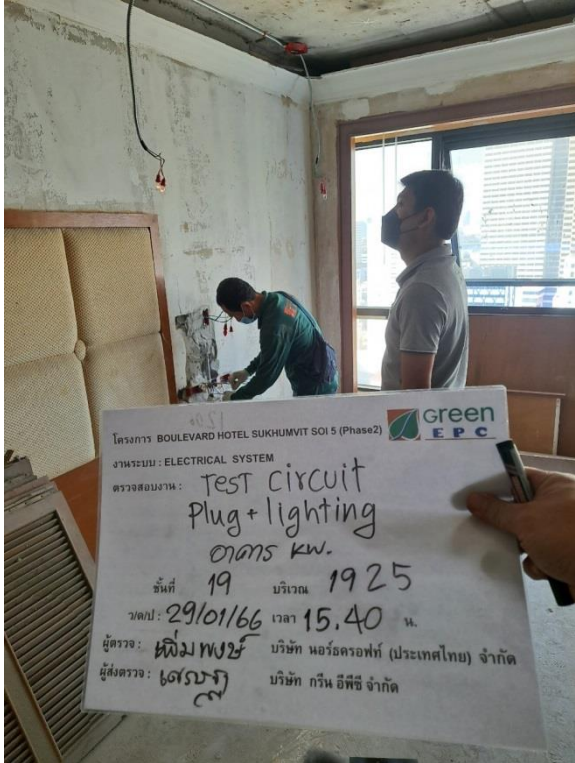

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานติดตั้งตำแหน่ง,ระยะ,ระดับ Box บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 24

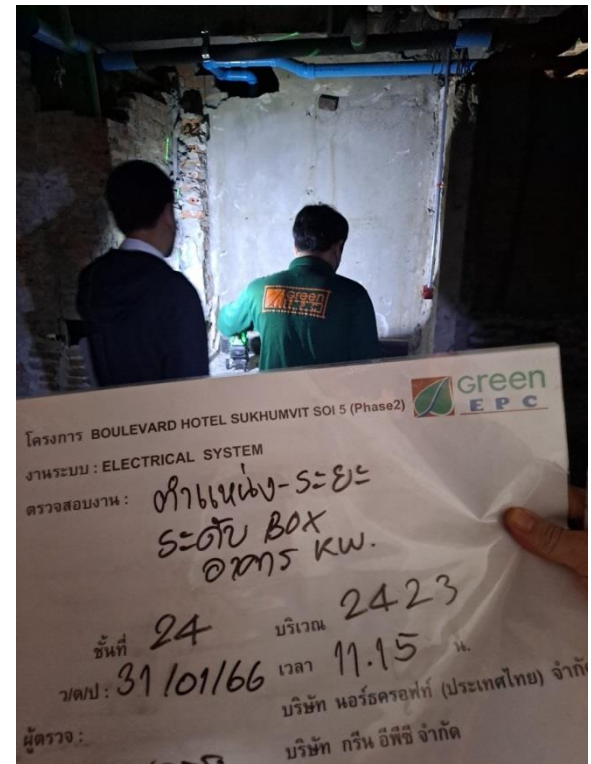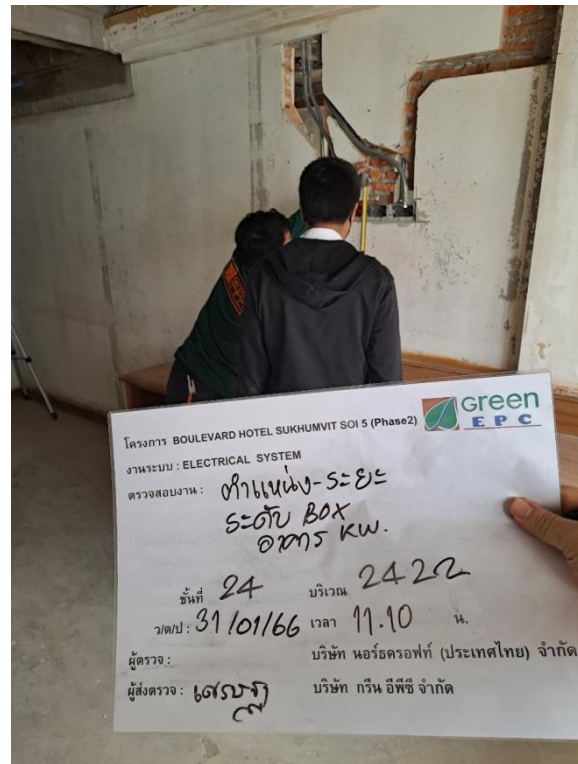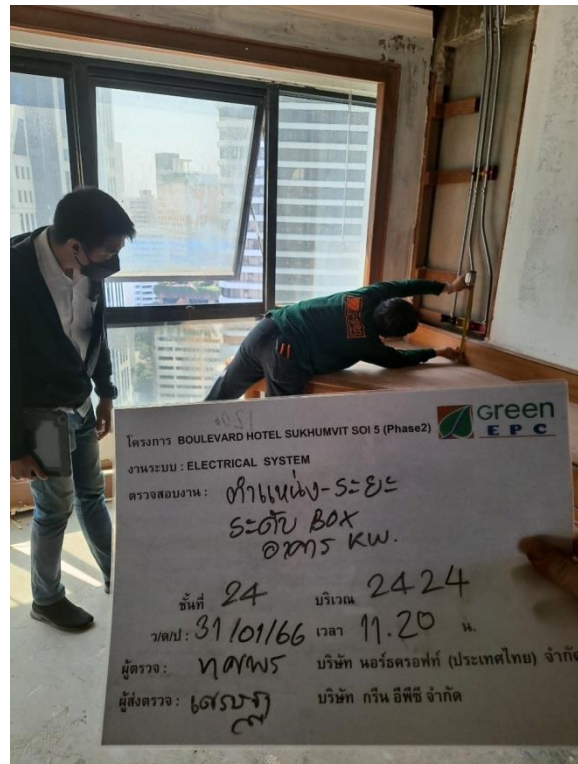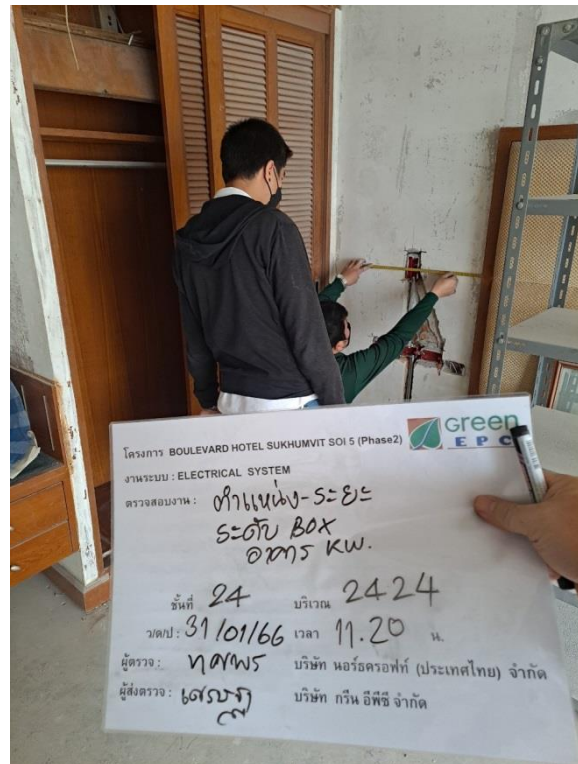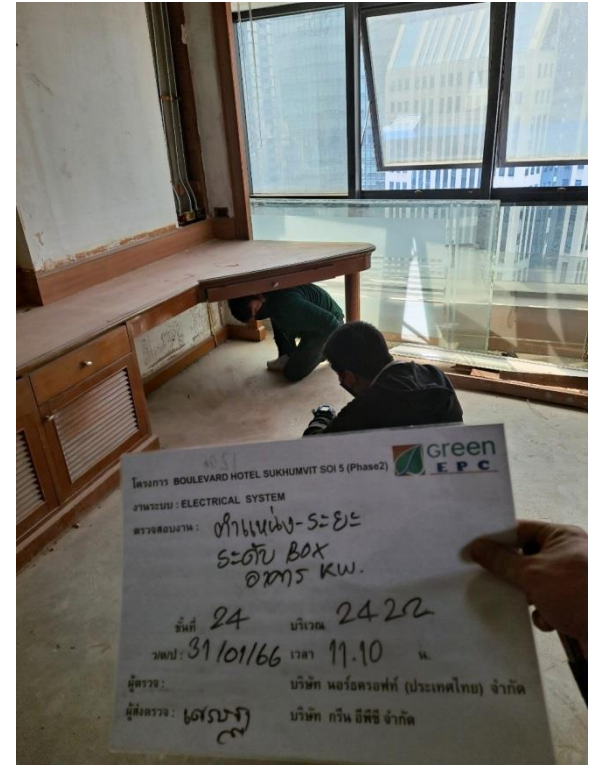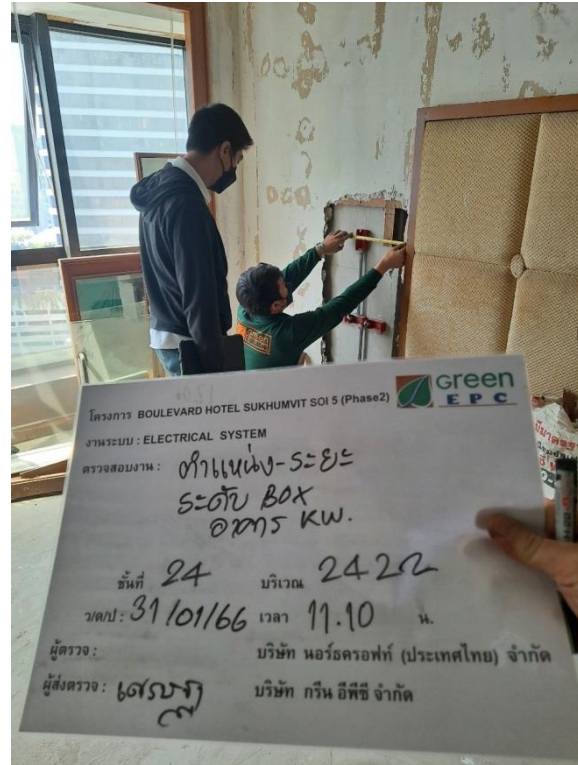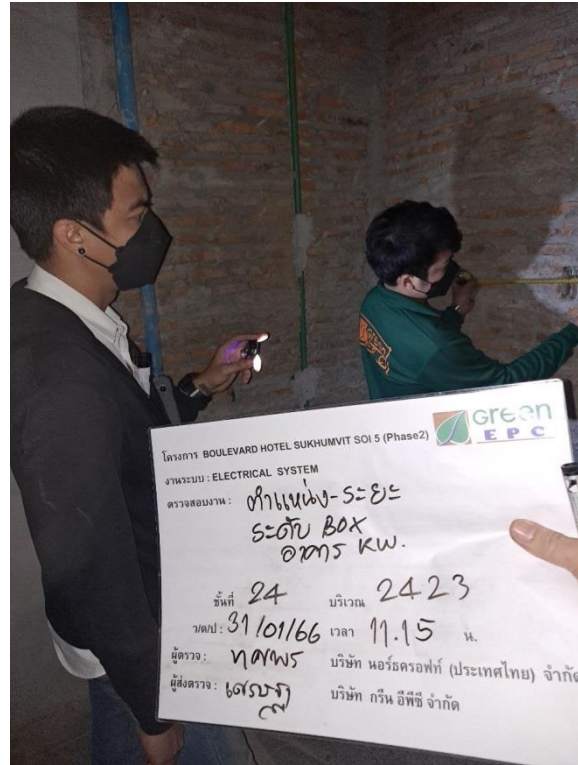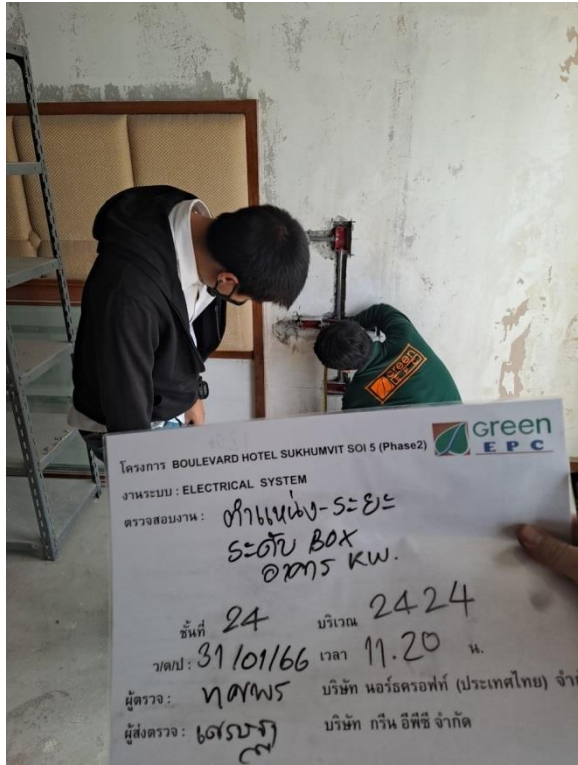

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งดักน้ำเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งดักน้ำเข้าหน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งดักน้ำเข้าหน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์หน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 14-18



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์หน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 14-18




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์หน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 14-18



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งท่อส่งแอร์บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14,15

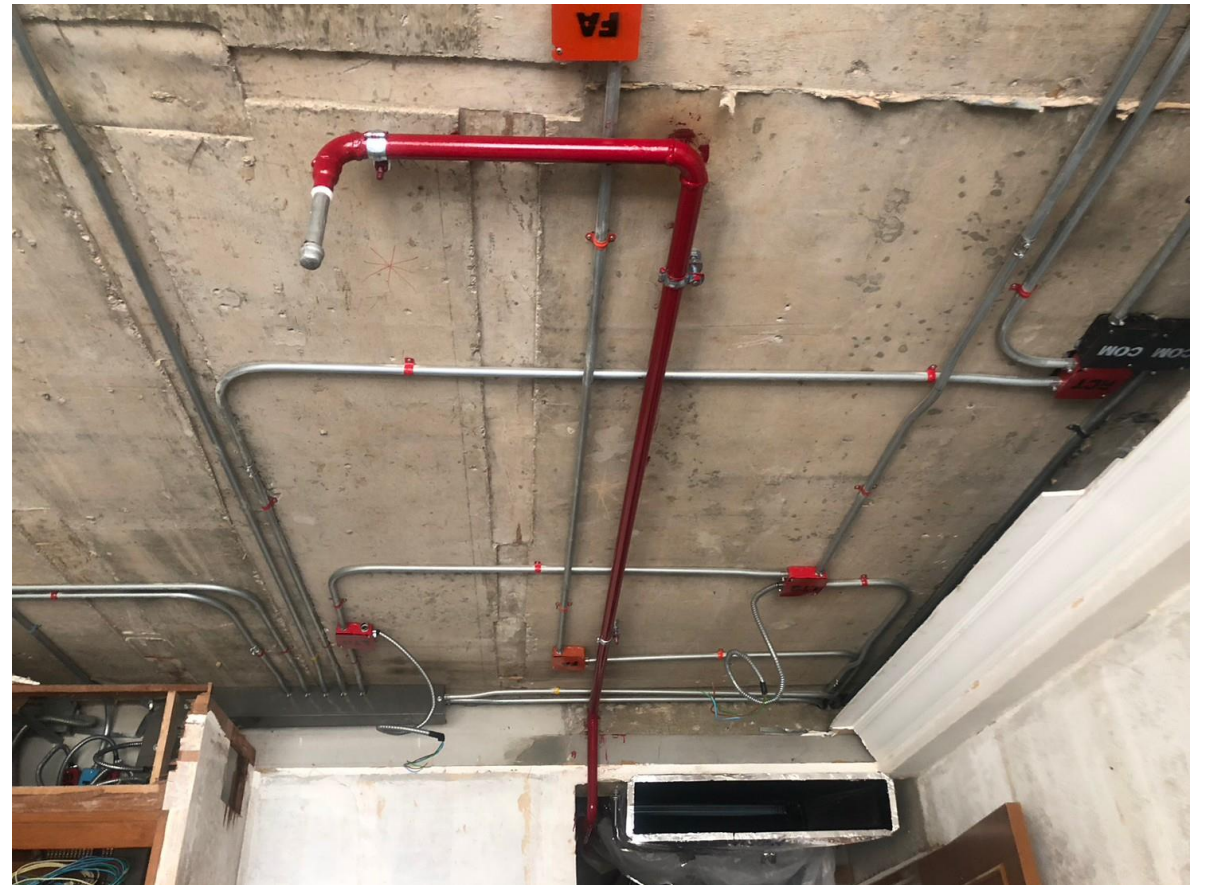

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งท่อส่งแก๊สบริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14,15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





งานติดตั้งท่อไฟบริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11

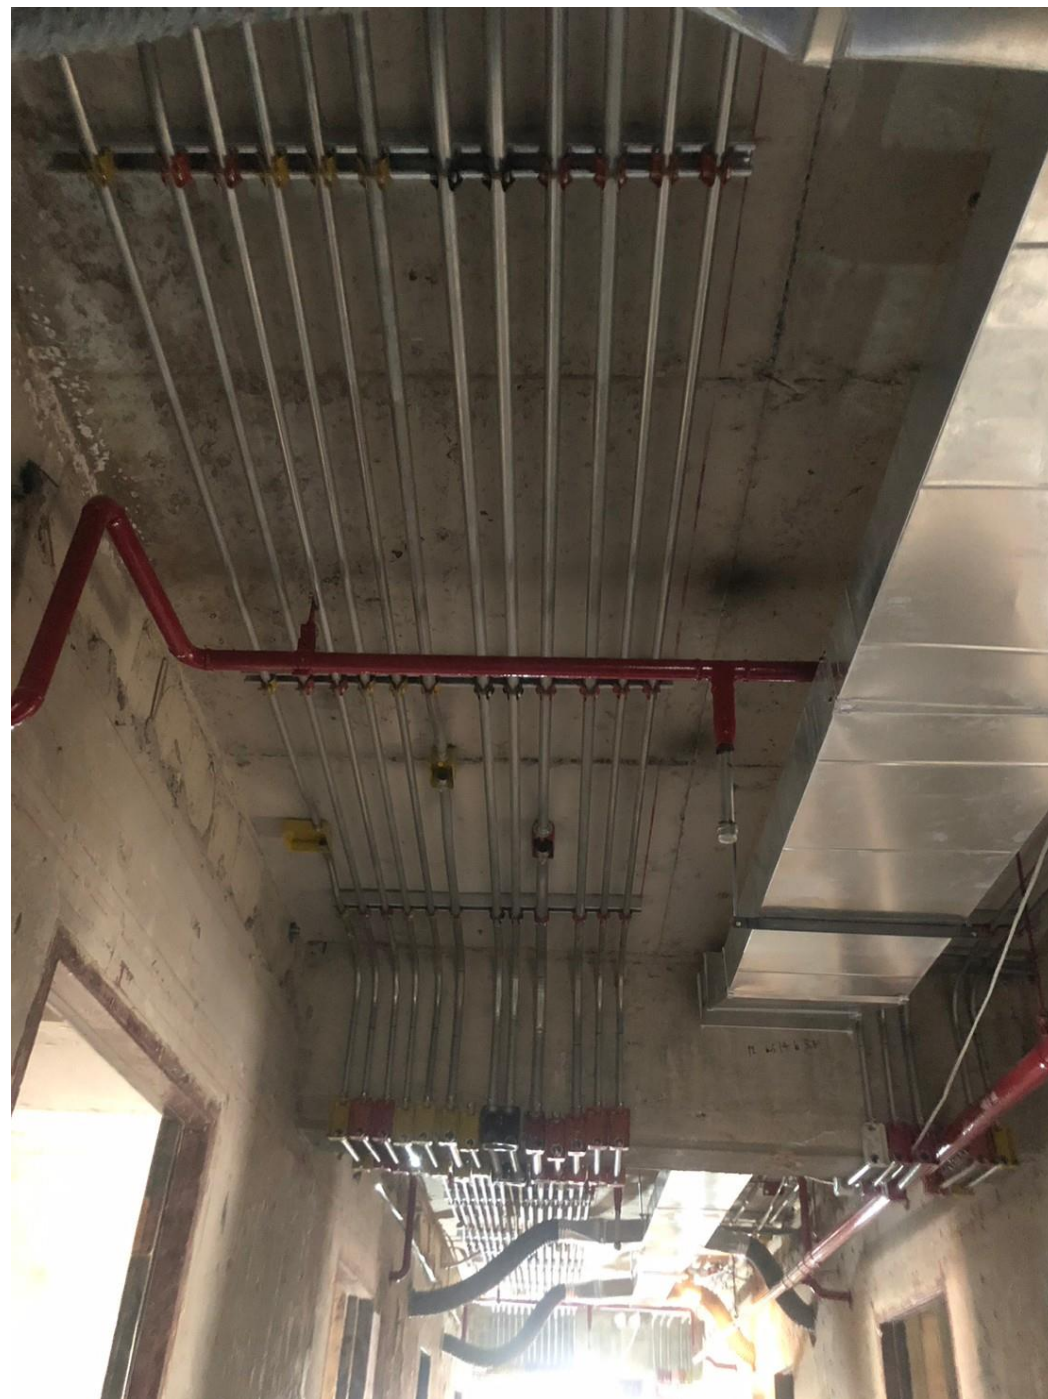







รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายไฟบริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12

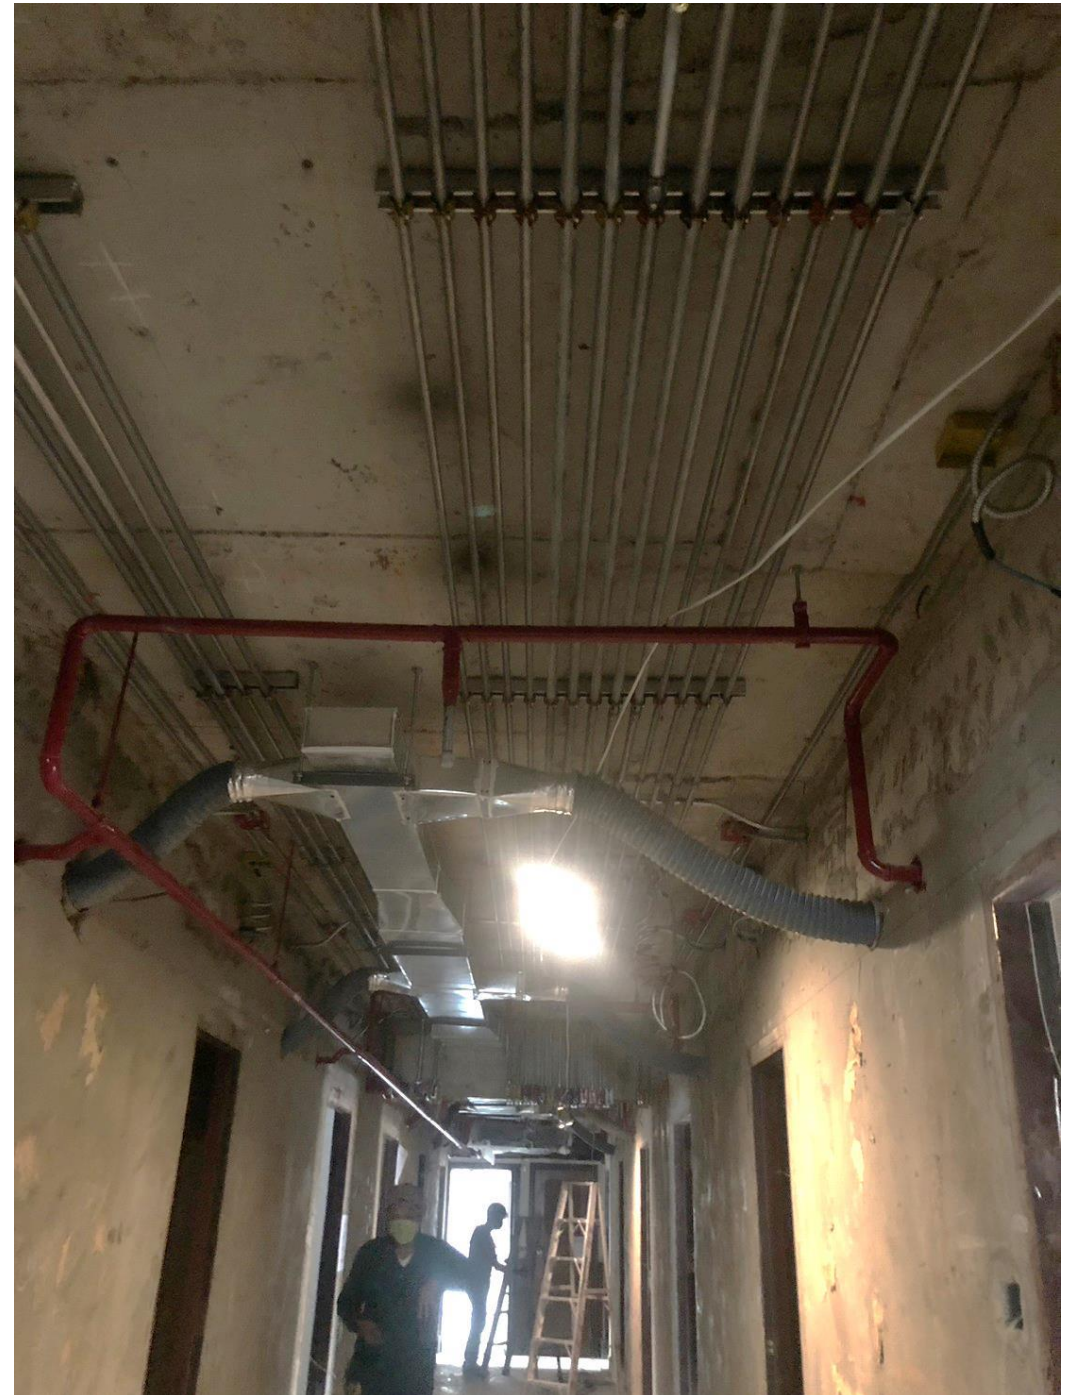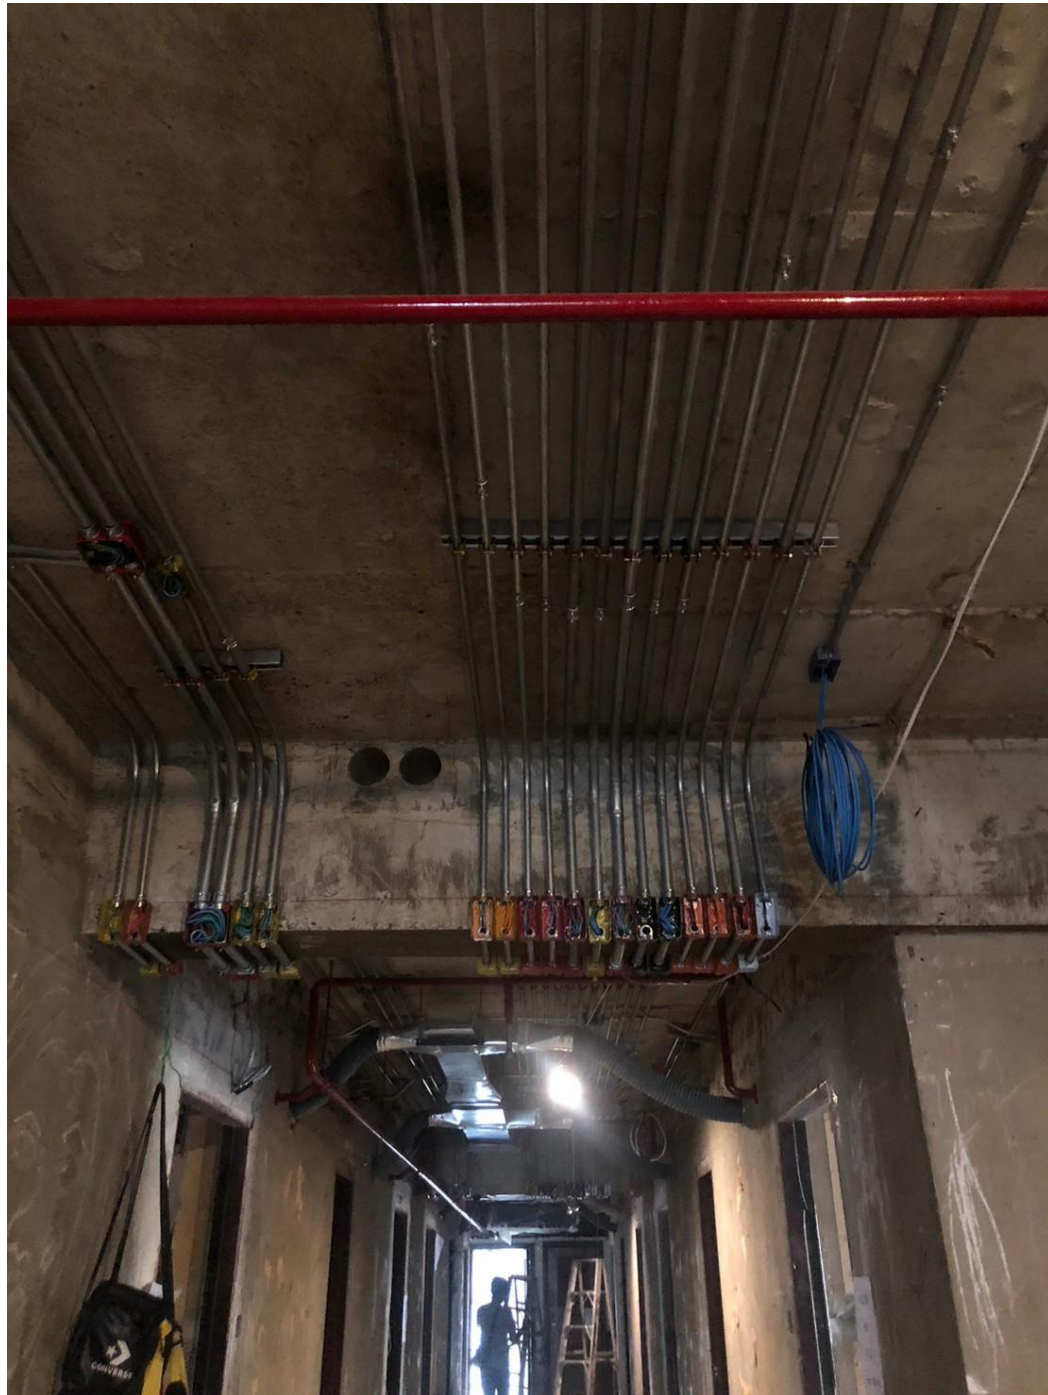








รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานทดสอบวงจรระบบ Lighting และ Power And Receptacle บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11

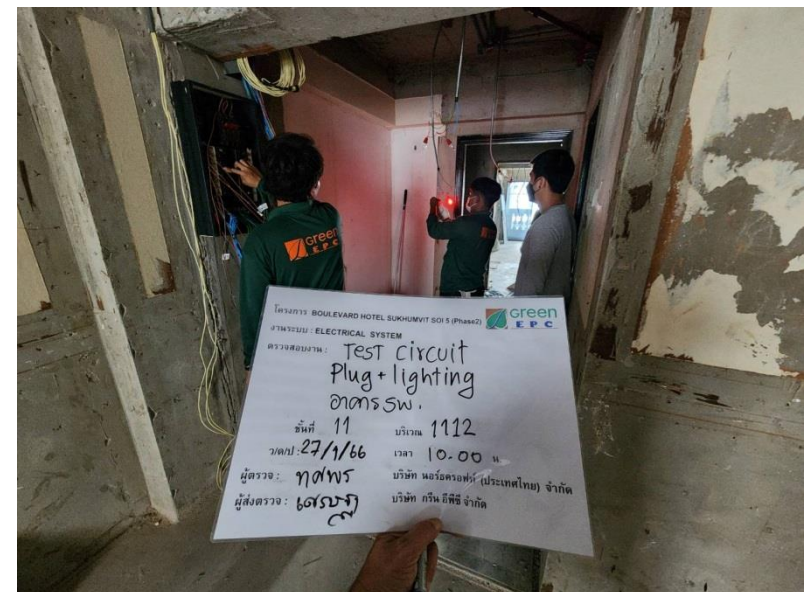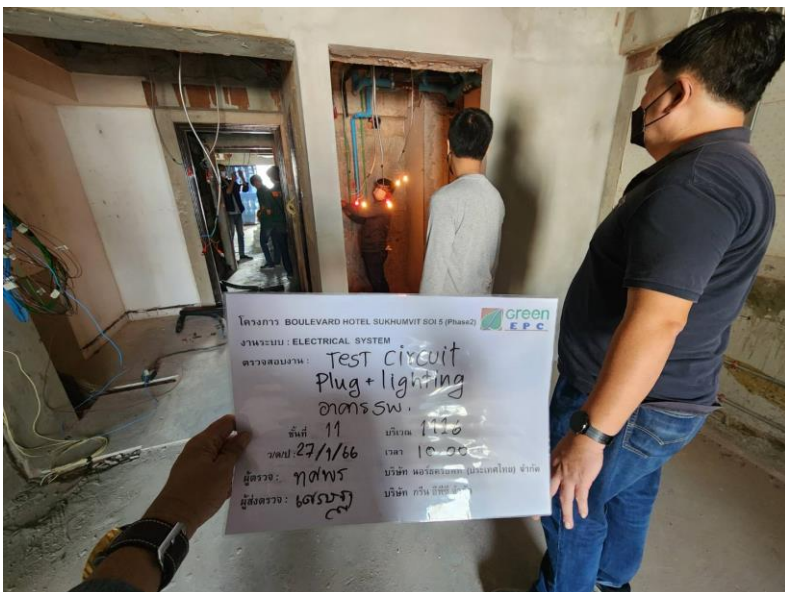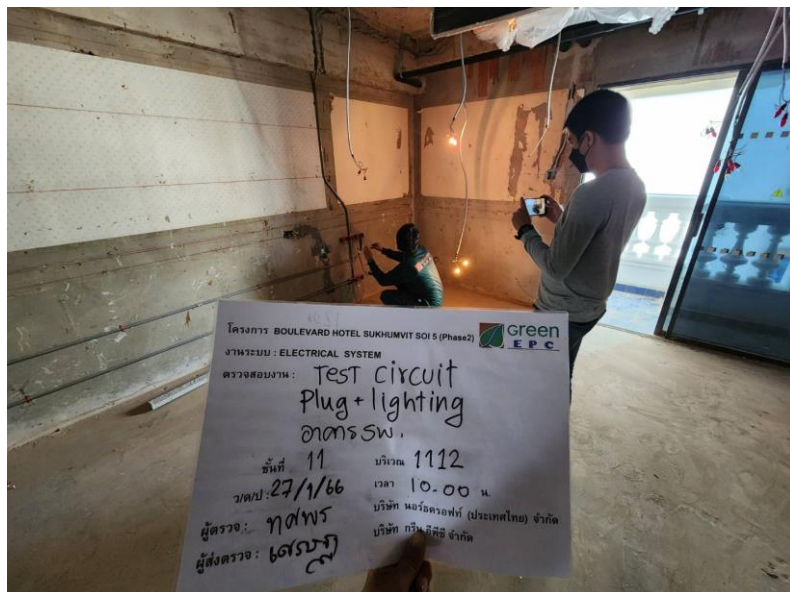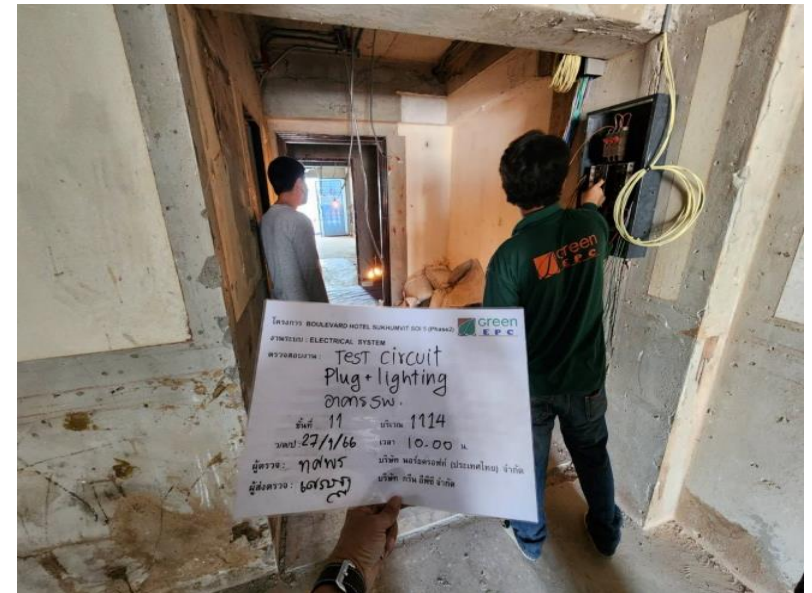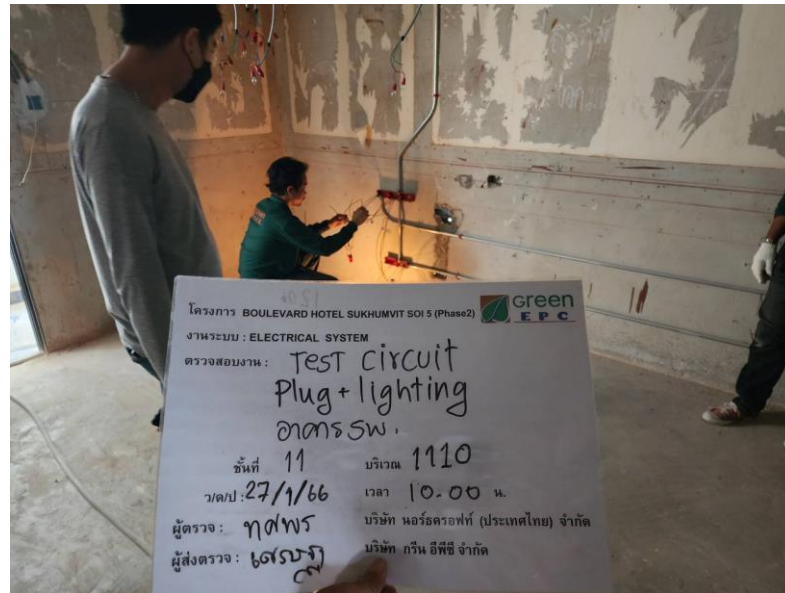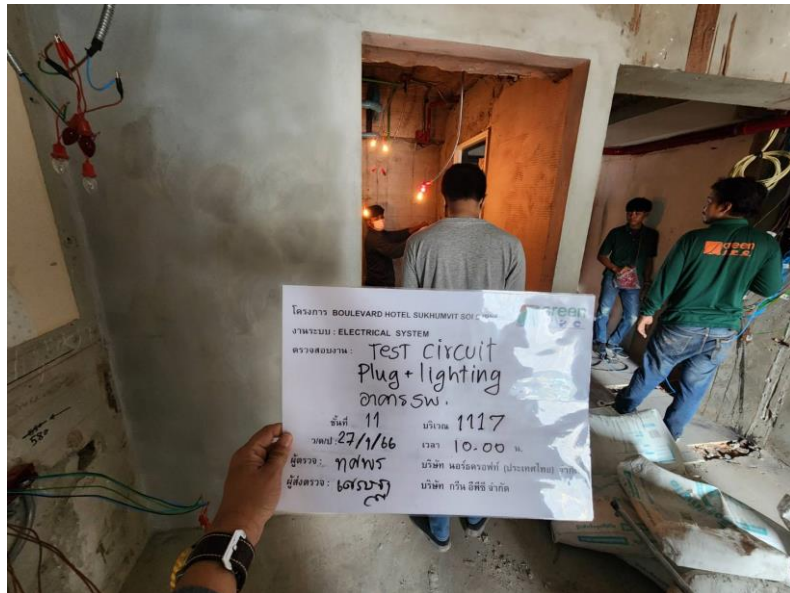

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบงานทดสอบวงจรระบบ Lighting และ Power And Receptacle บริเวณห้องพัก อาคาร สยามวิงค์ ชั้น 12

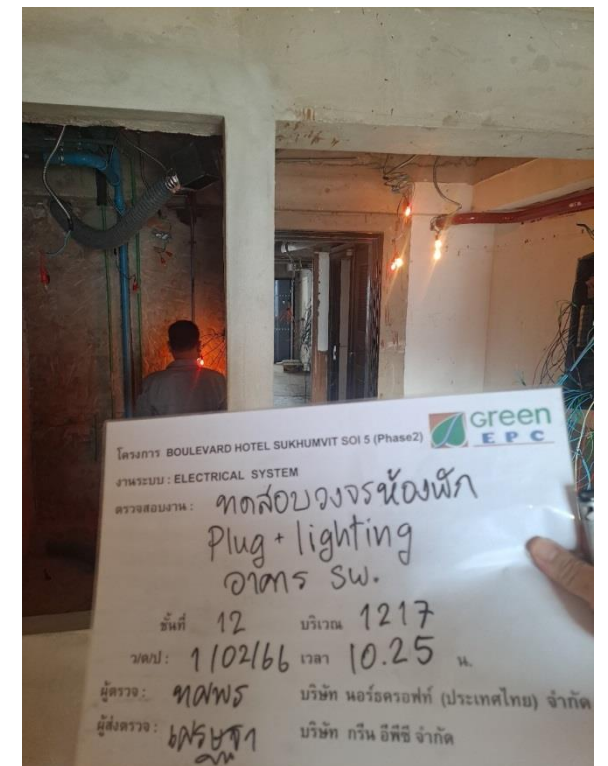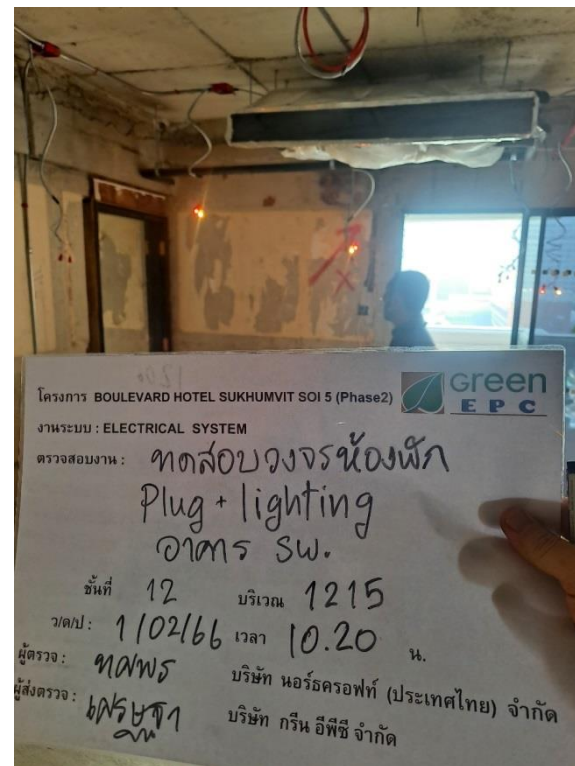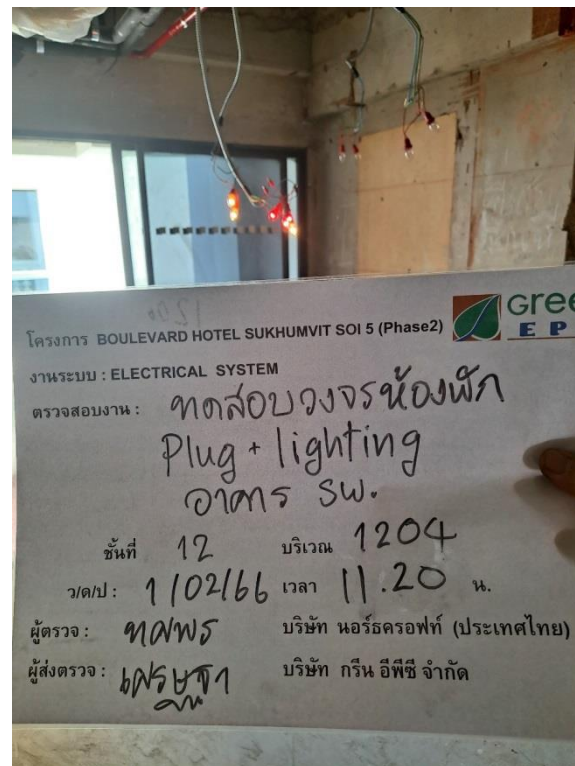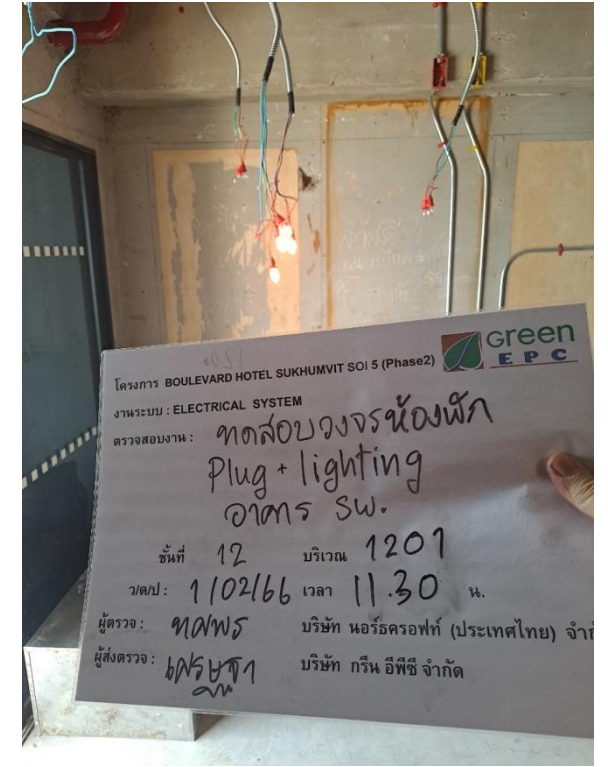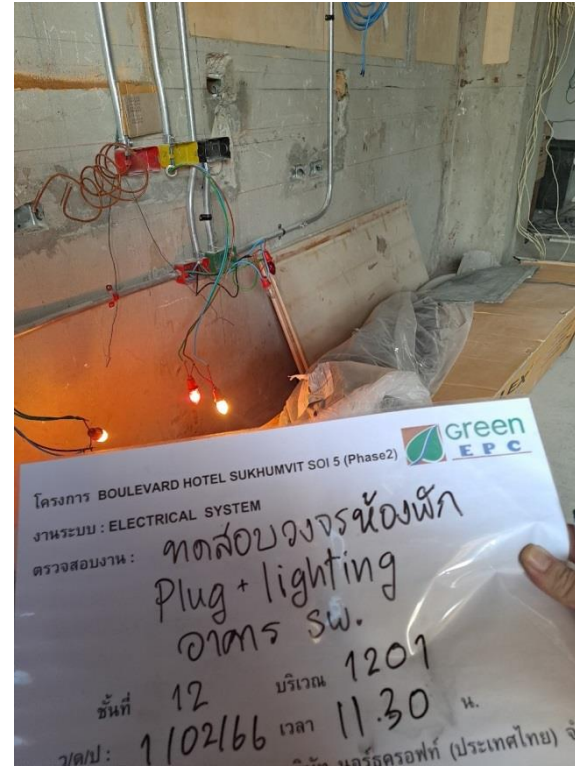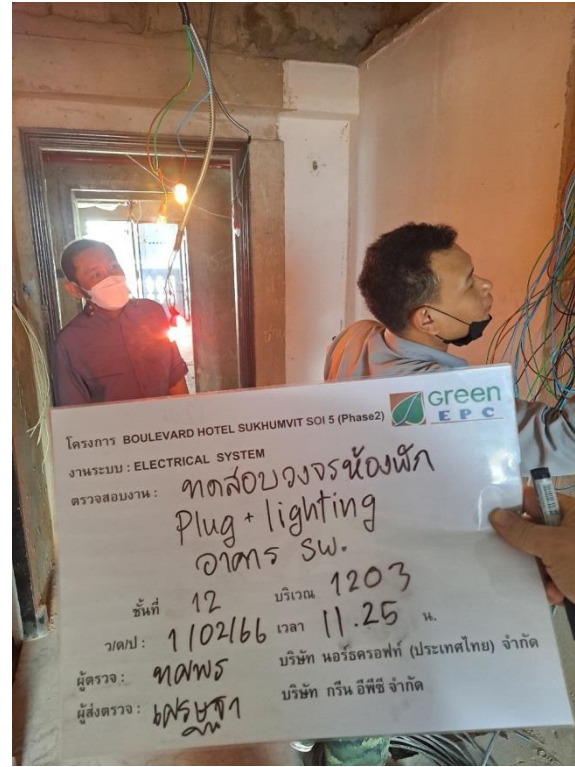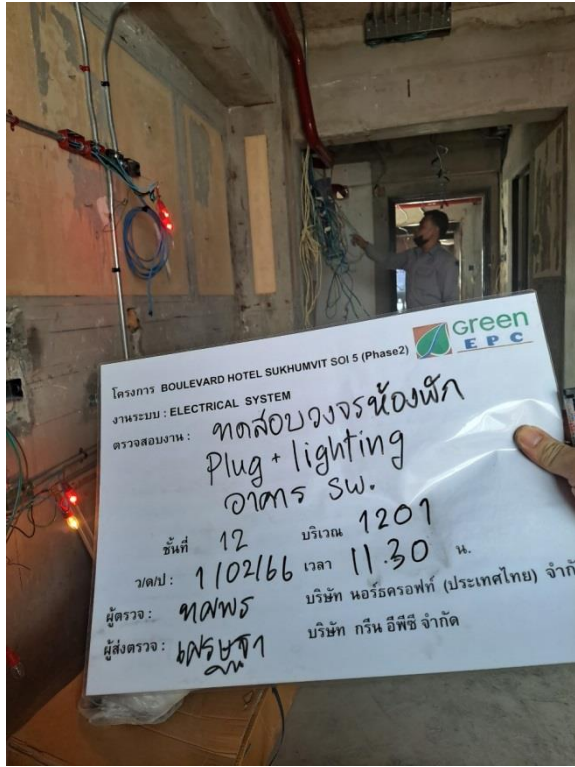

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์เข้าหน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์เข้าหน้าเครื่อง FCU บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อระบายอากาศ บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 10-12

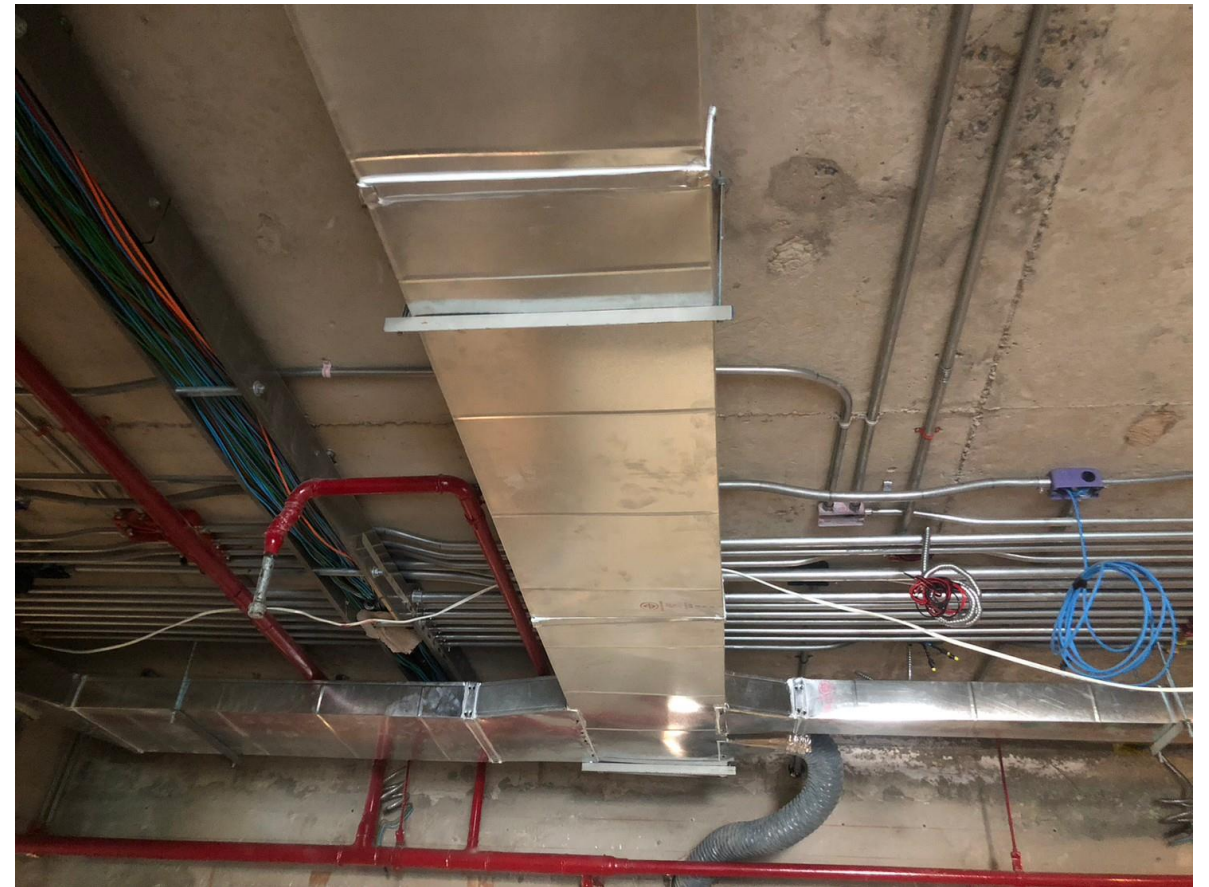

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อระบายอากาศ บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 10-12

