



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

20 JULY 2023

แผนงาน KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบ พื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารกรุงเทพ					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 10	29 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 3 ก.ค. 66
1.2	ชั้น 11	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 3 ก.ค. 66
1.3	ชั้น 12	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 6 ก.ค. 66
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 14	3 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 6 ก.ค. 66
2.2	ชั้น 15	7 ก.ค. 66	8 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 11 ก.ค. 66
2.3	ชั้น 16	10 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	70%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 12 ก.ค. 66
						รองาน Wall Paper Corridos
2.4	ชั้น 17	11 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	70%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 15 ก.ค. 67
						รองาน Wall Paper Corridos

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบ พื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
3	(Phase 4)					
3.1	ชั้น 18	12 ก.ค. 66	13 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	50%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos รองานทาสีผนัง และทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำ
3.2	ชั้น 19	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos รองานทาสีผนัง และทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำ
3.3	ชั้น 20	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos รองานทาสีผนัง และทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำ
3.4	ชั้น 21	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos รองานทาสีผนัง และทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำ
4	(Phase 5)					
4.1	ชั้น 22	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	0%	
4.2	ชั้น 23	25 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	0%	
4.3	ชั้น 24	26 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	
4.4	ชั้น 25	28 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	1 ส.ค. 66	0%	


แผนงาน SIAM WING

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบ พื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารสยาม					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 6	10 ก.ค. 66	9 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	100%	
1.2	ชั้น 10	14 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	70%	รองาน Wall Paper Corridos
1.3	ชั้น 11	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	50%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos
						รองานทาสีผนัง / รองานเคาน์เตอร์อ่าง
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 12	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	0%	
2.2	ชั้น 14	26 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	0%	
2.3	ชั้น 15	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	


ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II

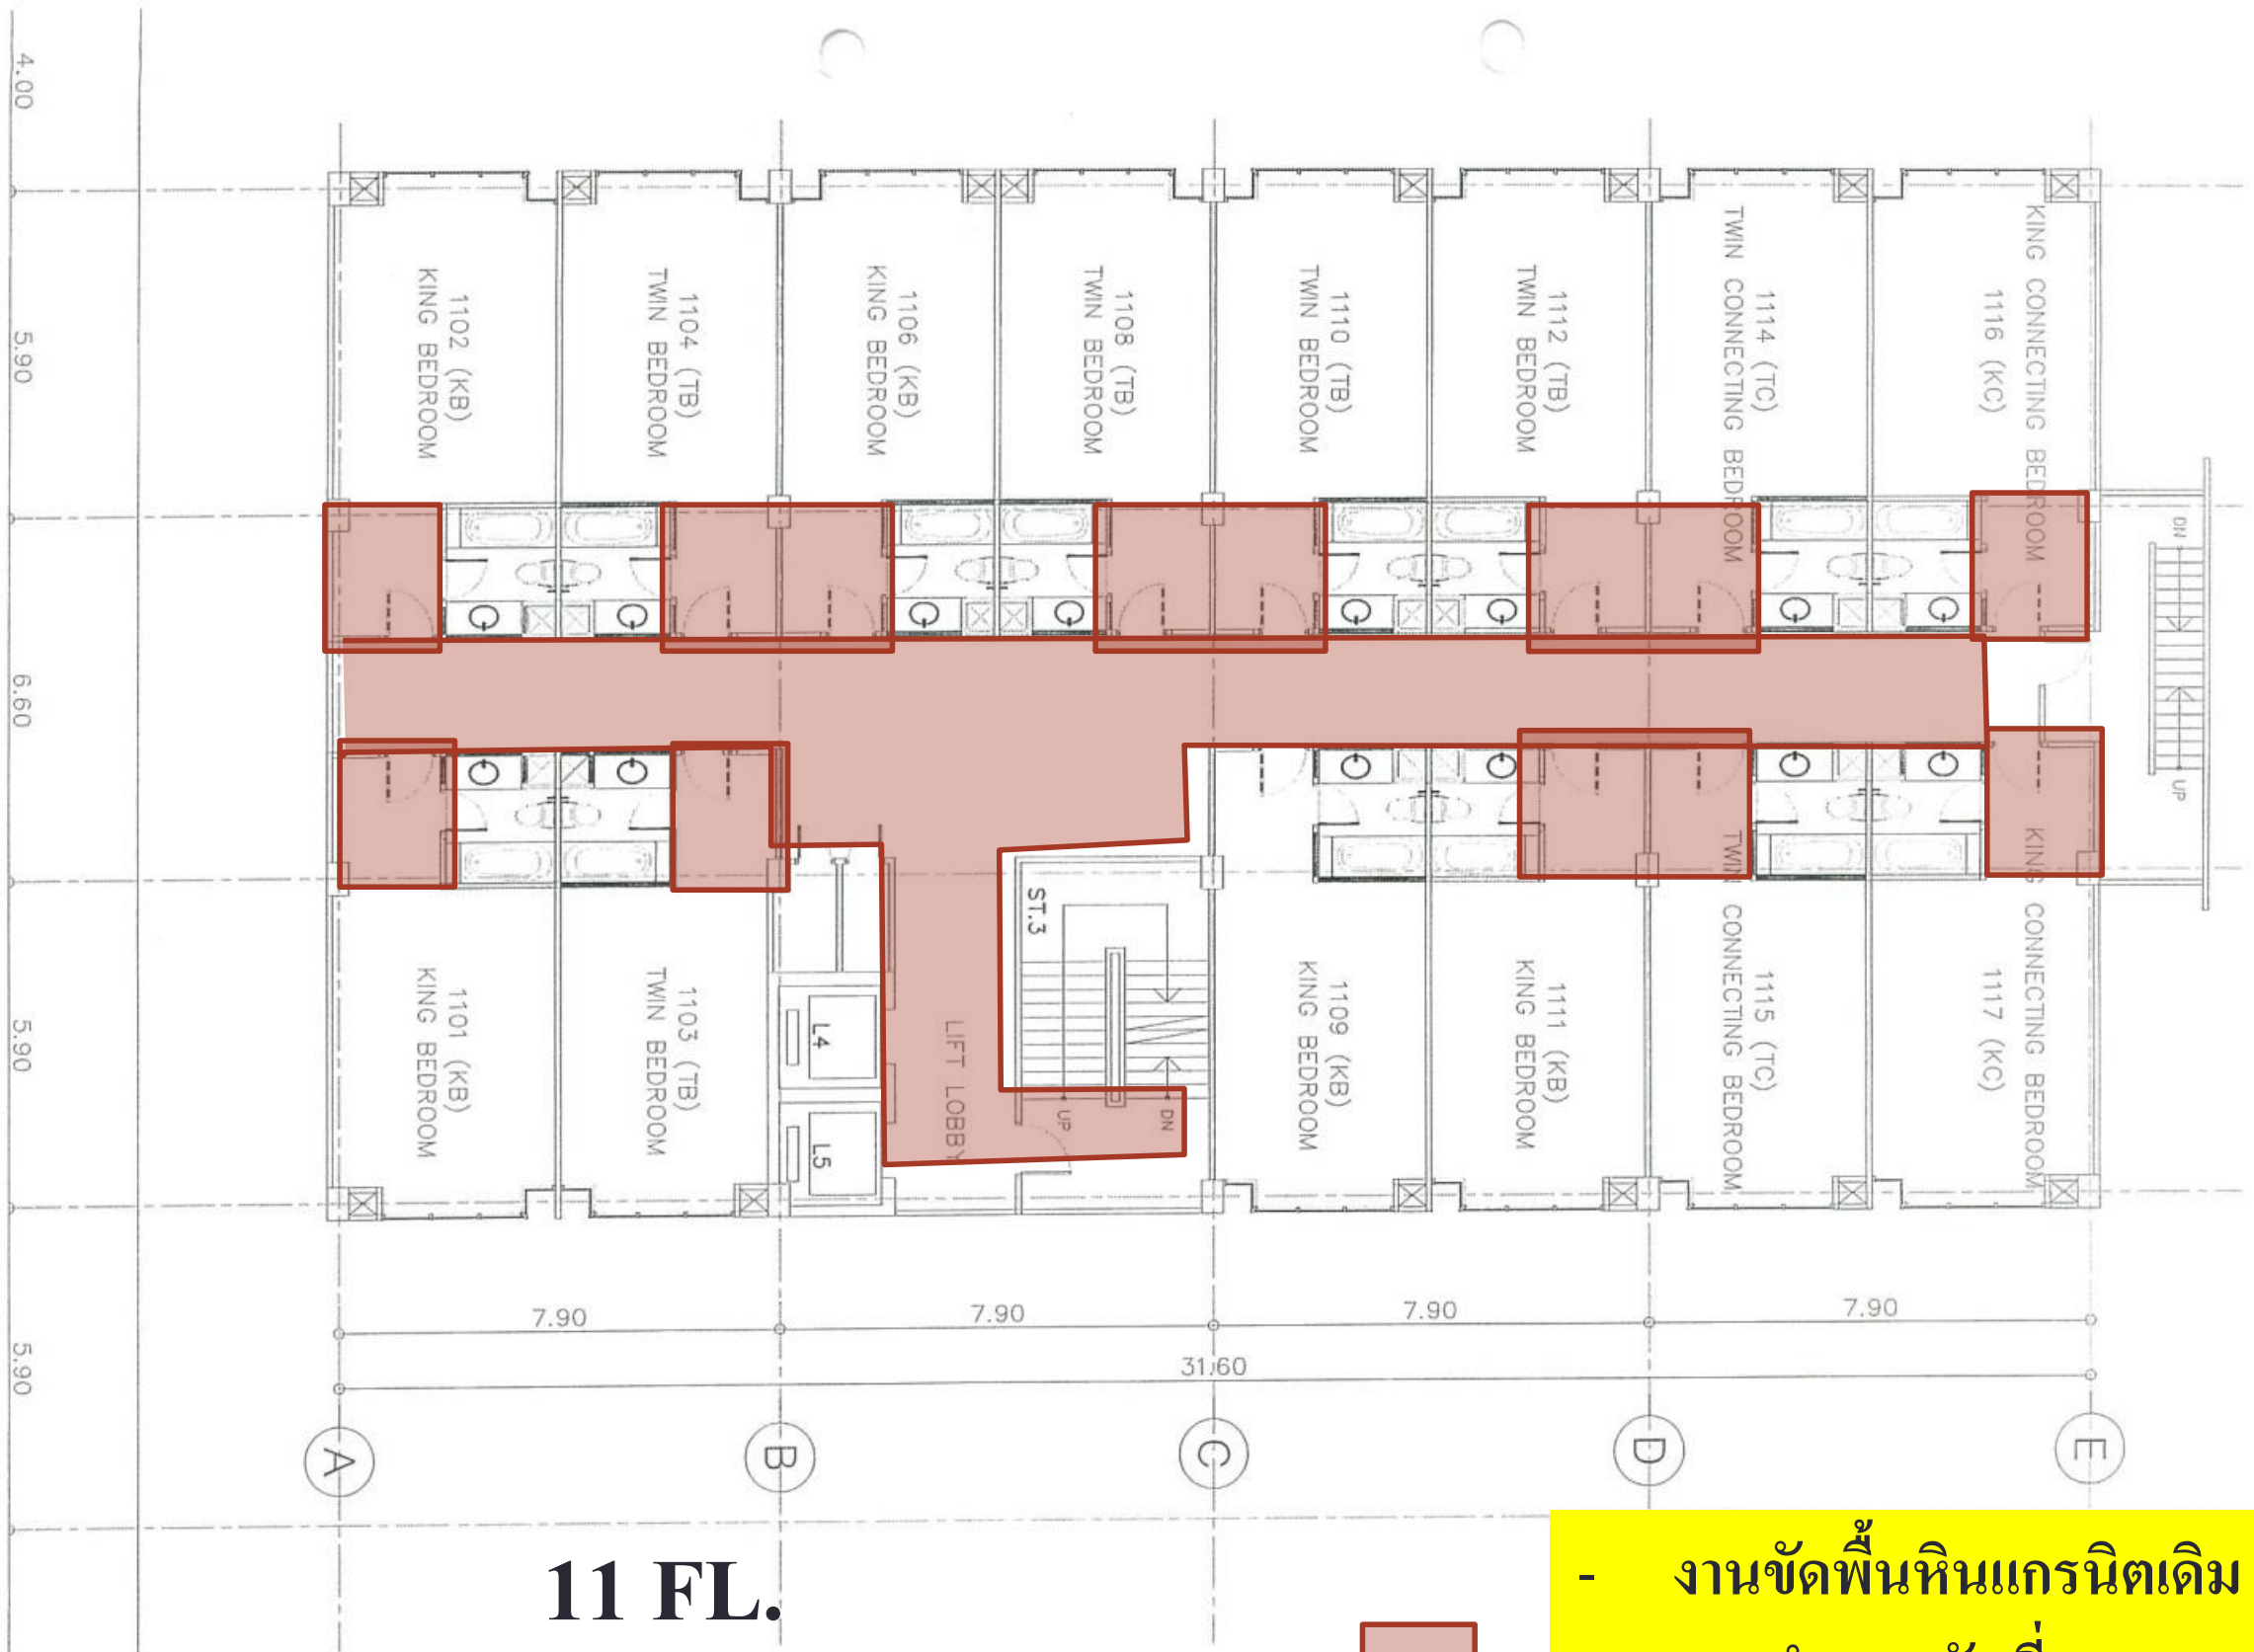

11 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- แผนงานกำหนดวันที่ 15/07/66

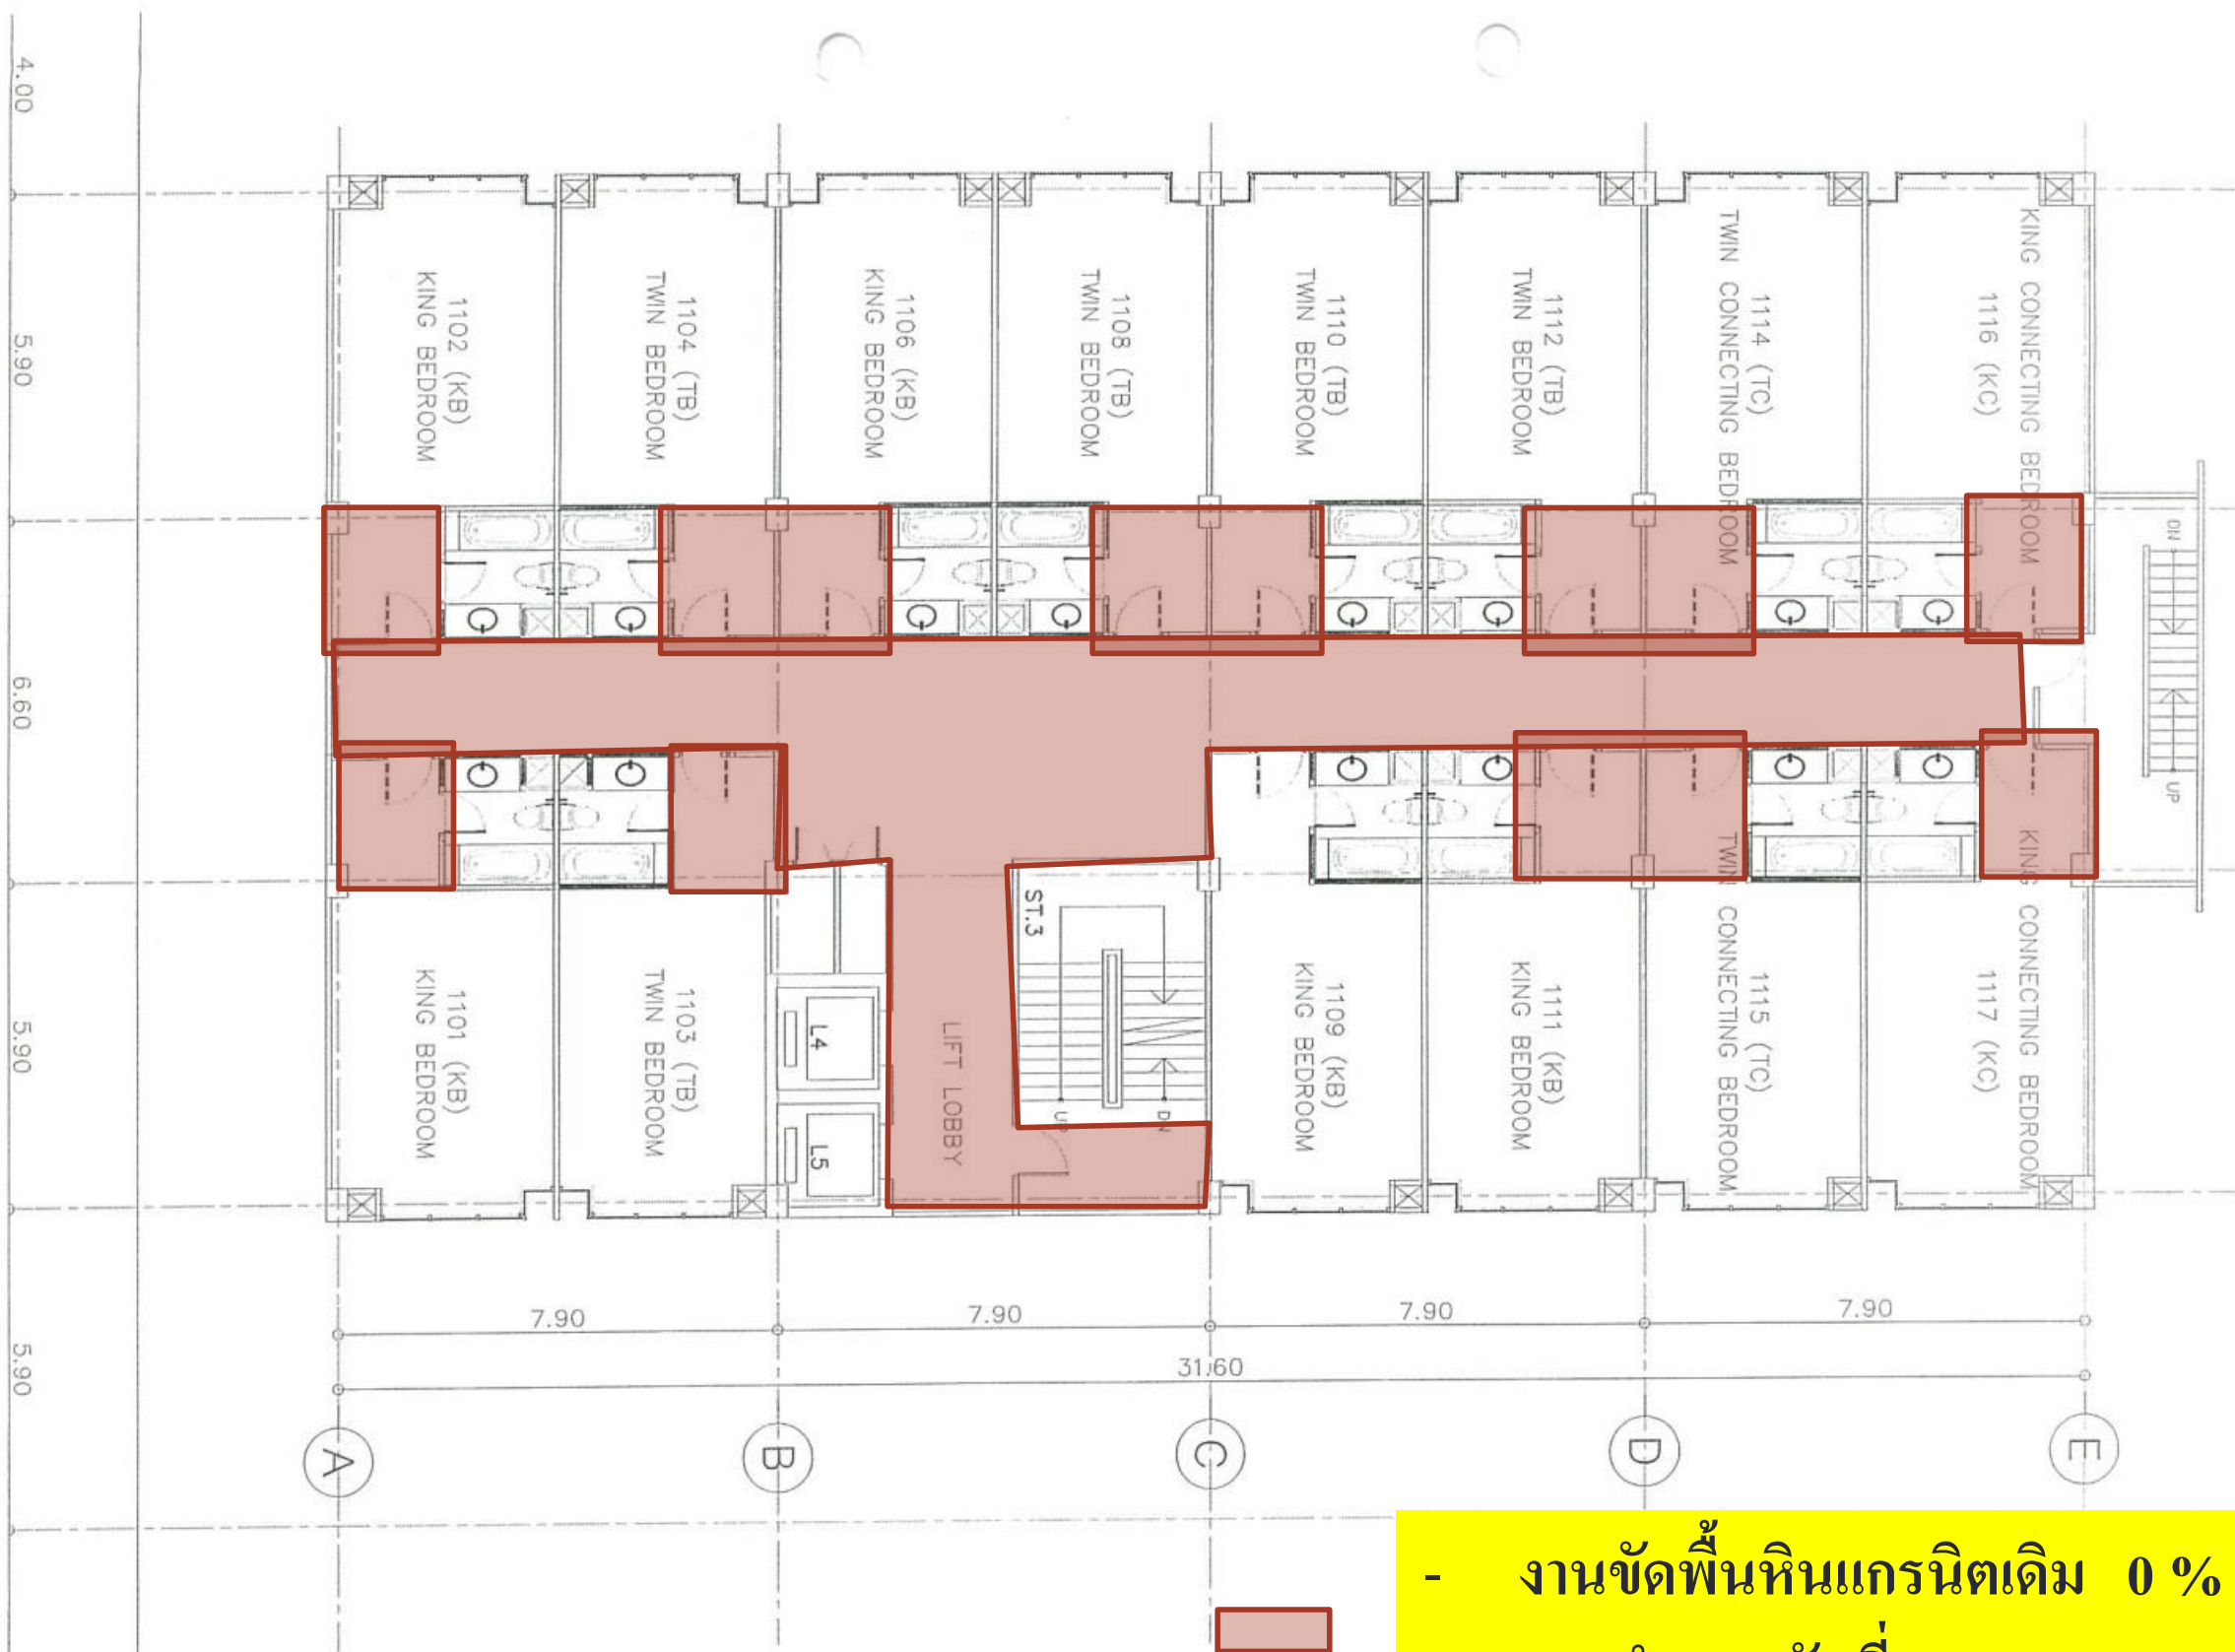

12 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 แผนงานกำหนดวันที่ 20/07/66

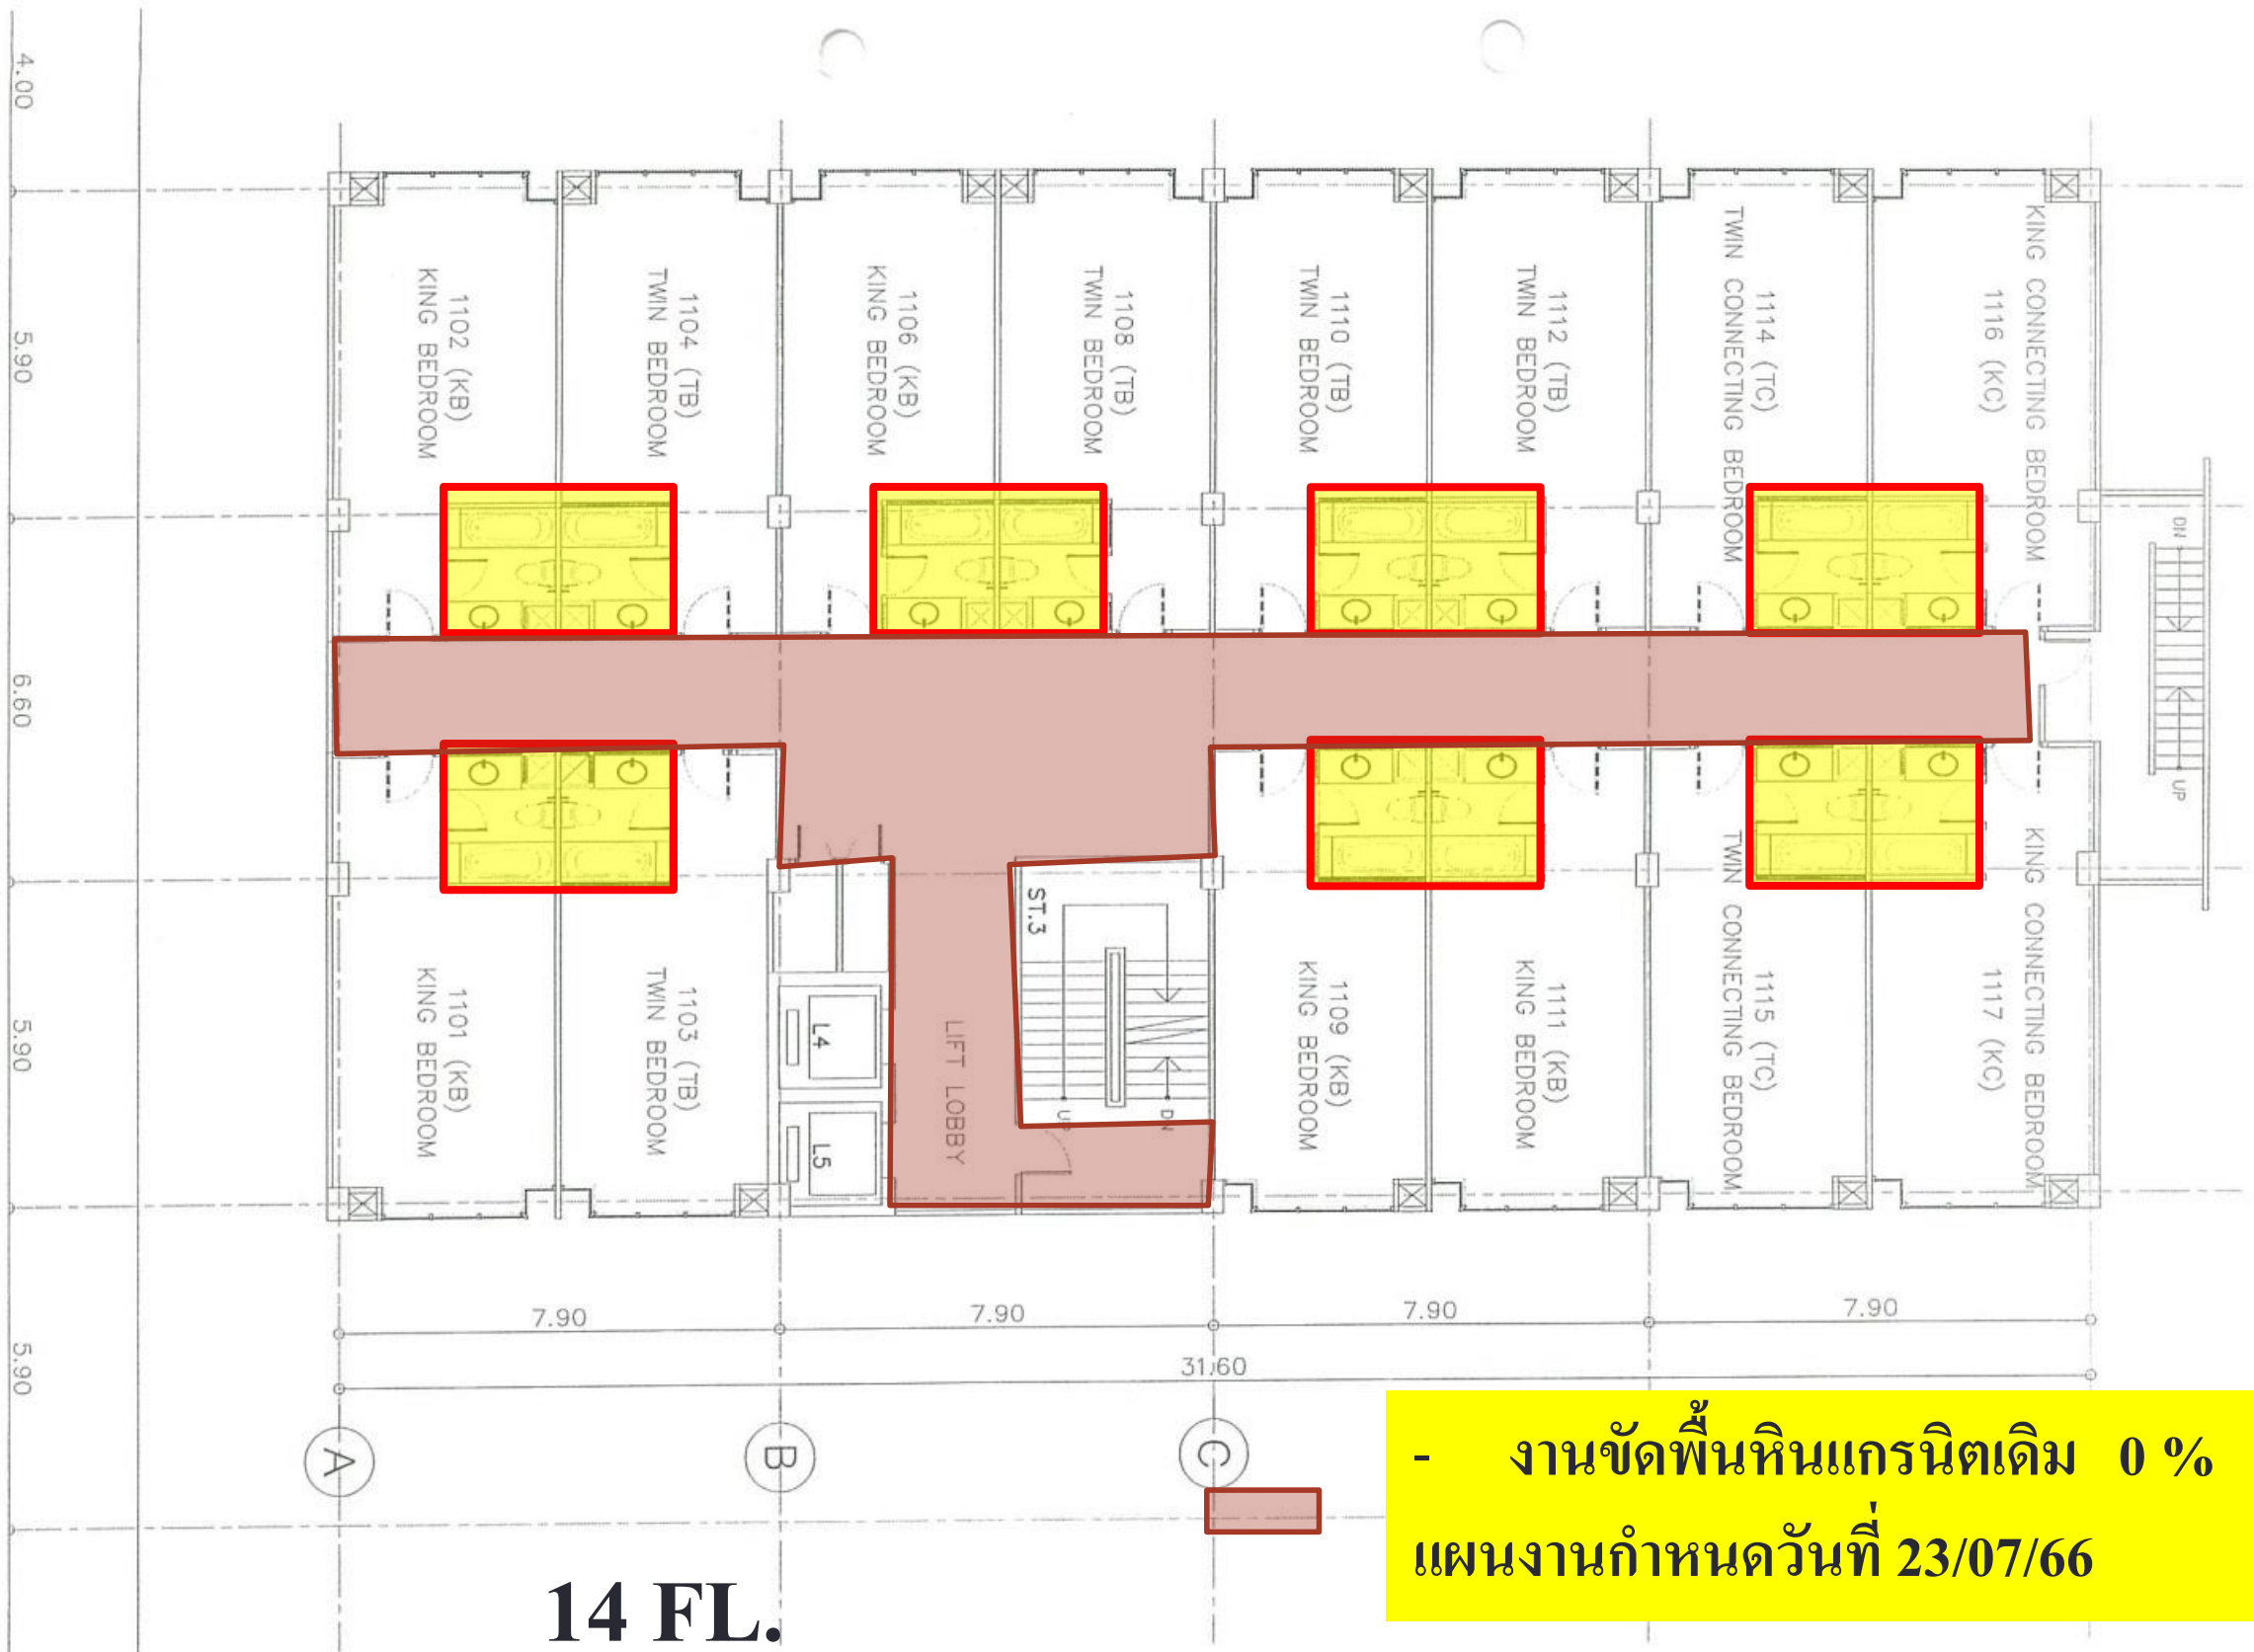

14 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- แผนงานกำหนดวันที่ 23/07/66



15 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 26/07/66

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU + Consumer บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 23



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU + Consumer บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 23




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug, และโคมไฟหัวเตียงภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16-17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug, และคอมไฟหัวเตียงภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16-17

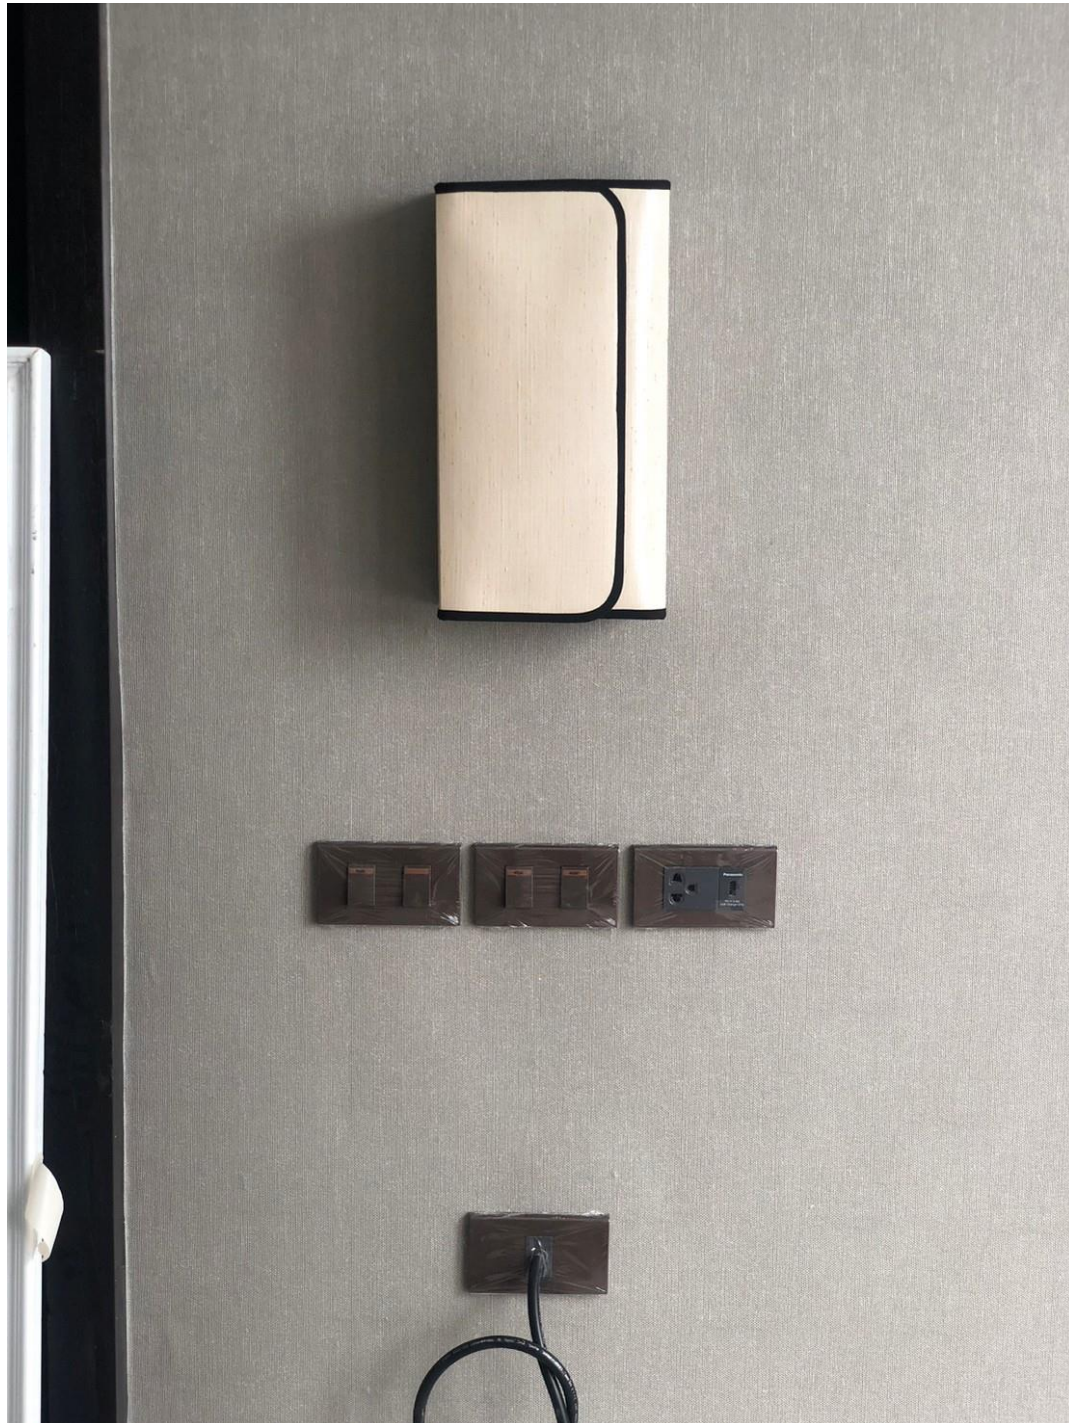

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15

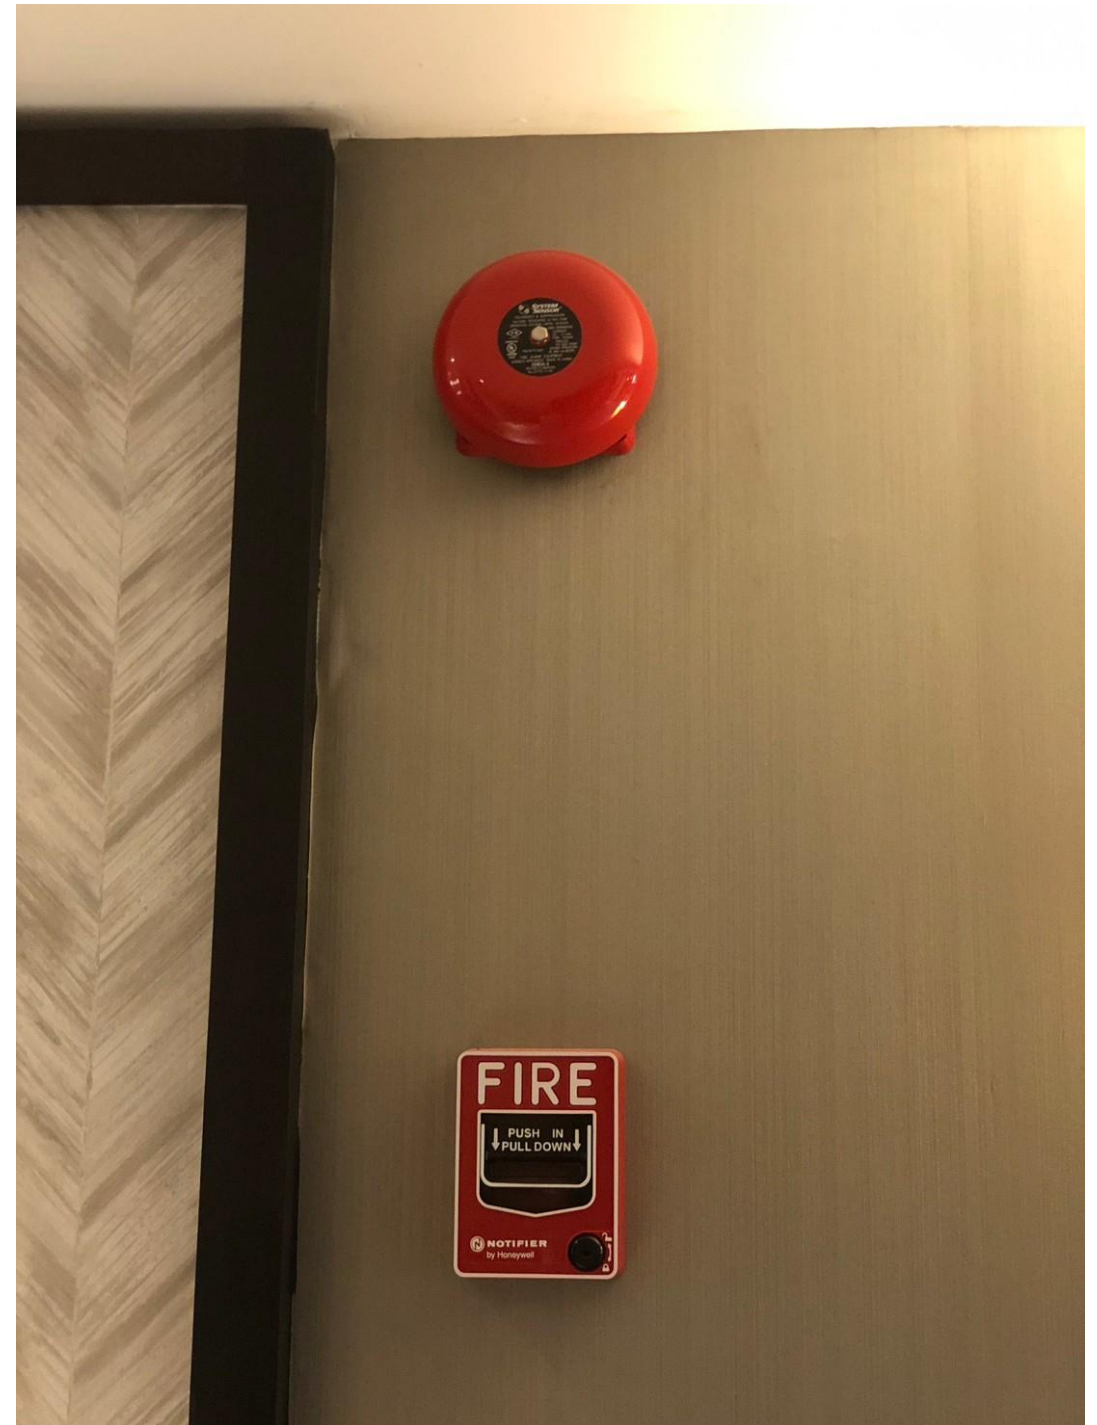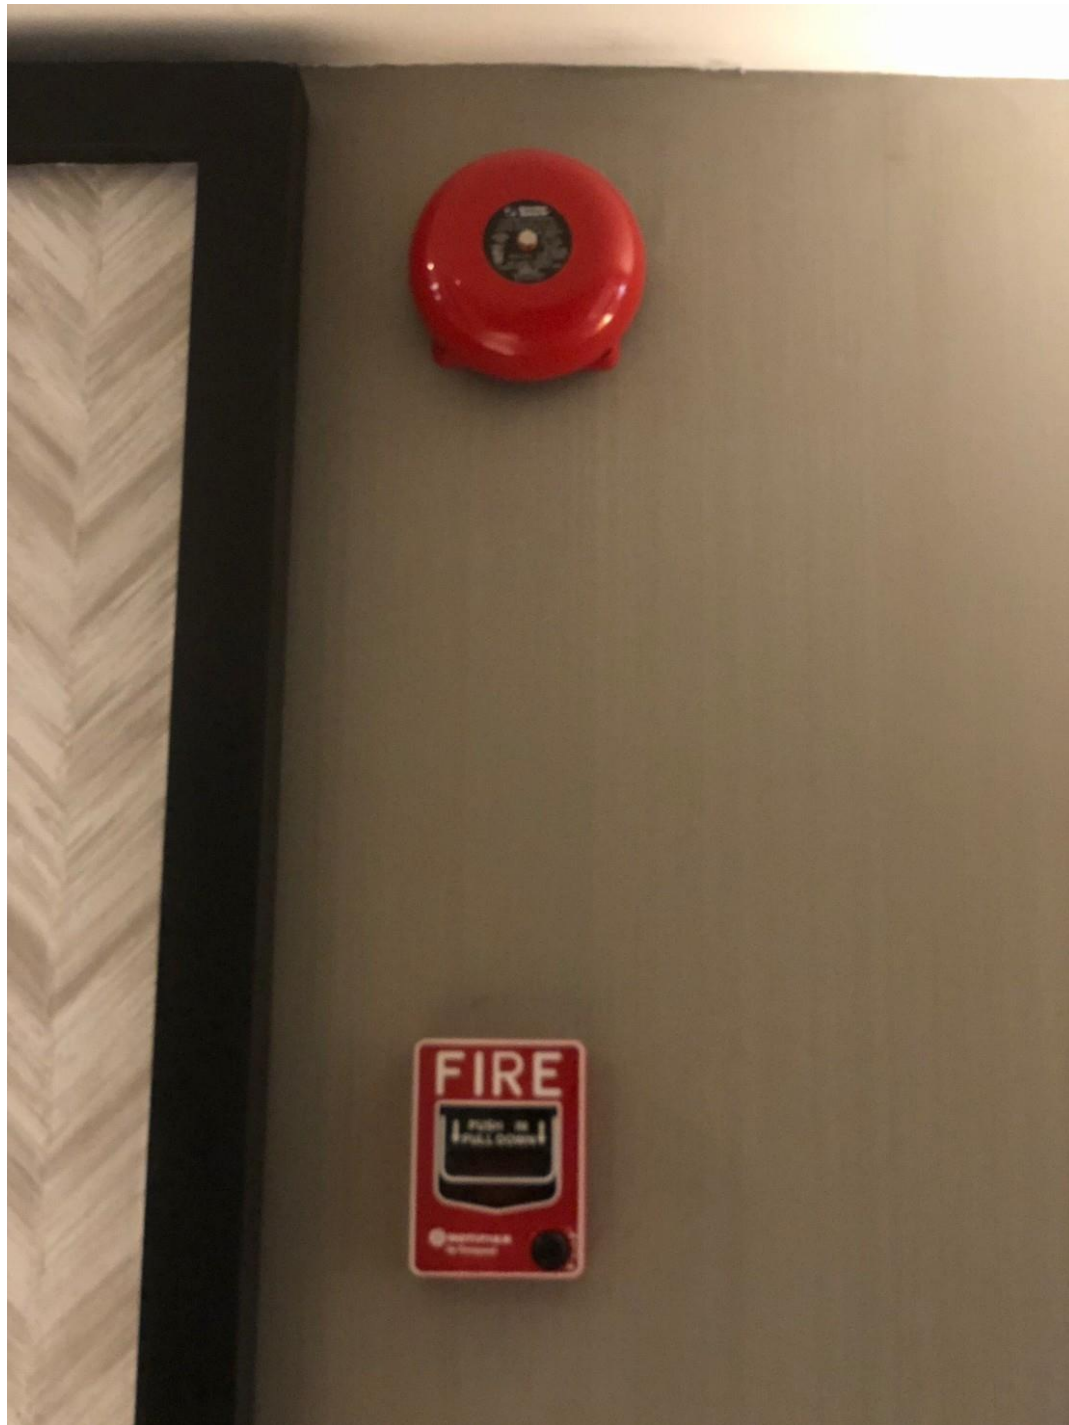

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเติมน้ำยาระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้นดาดฟ้า

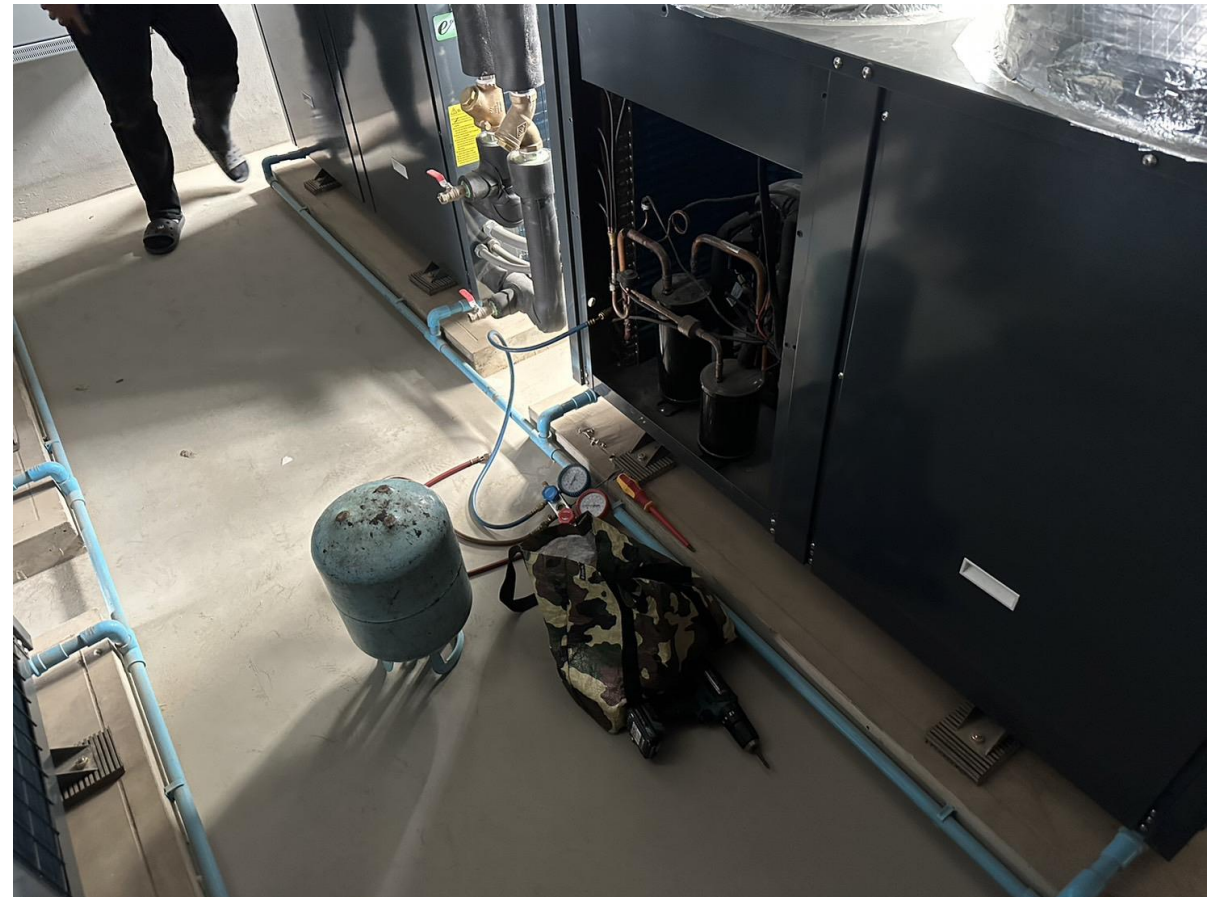

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเติมน้ำยาระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานทดสอบระบบ Fire Alarm ทั้งอาคารกรุงเทพและอาคารสยาม



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานทดสอบระบบ Fire Alarm ทั้งอาคารกรุงเทพและอาคารสยาม



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสายบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU และตู้ Consumer พร้อมเข้าสายบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งโคมไฟบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟบริเวณห้องพัก
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟและลำโพงบริเวณ Corridor
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

