



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

21 Sep 2023

**แผนงาน KRUNGTHEP WING**

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบ พื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
3	(Phase 4)					
3.1	ชั้น 18	12 ก.ค. 66	13 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 22 ก.ค. 66
3.2	ชั้น 19	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 25 ก.ค. 66
3.3	ชั้น 20	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 27 ก.ค. 66
3.4	ชั้น 21	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 11 ส.ค. 66
4	(Phase 5)					
4.1	ชั้น 22	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66		95%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.2	ชั้น 23	25 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66		95%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.3	ชั้น 24	26 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66		95%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.4	ชั้น 25	28 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66		95%	รองาน Wall Paper Bed Room

**แผนงาน SIAM WING**

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์




แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารสยาม					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 6	10 ก.ค. 66	9 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	100%	
1.2	ชั้น 10	14 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	100%	
1.3	ชั้น 11	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	100%	
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 12	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	100%	
2.2	ชั้น 14	26 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	95%	รองาน Wall Paper Corridos
2.3	ชั้น 15	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	90%	รองาน Wall Paper Corridos

**ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)**

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก  
อาคารกรุงเทพวิงค์

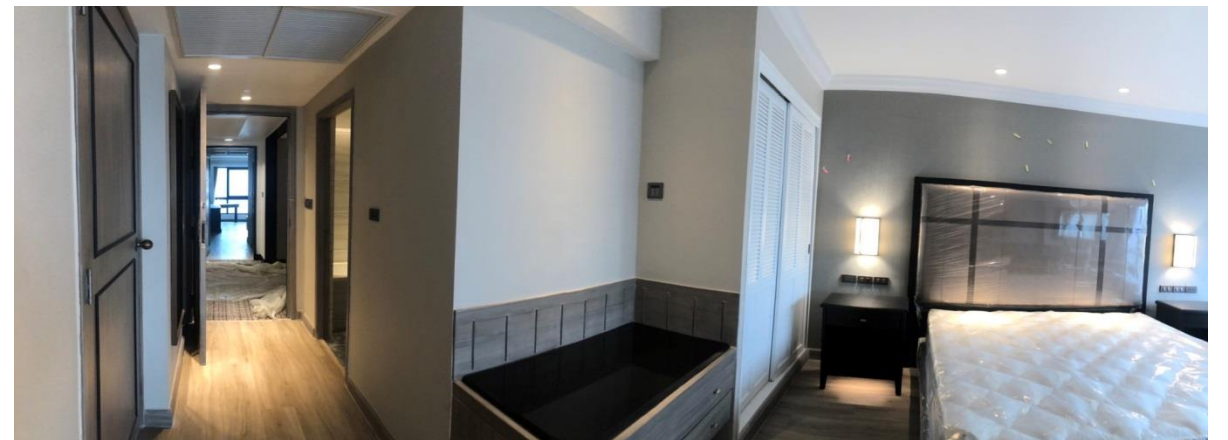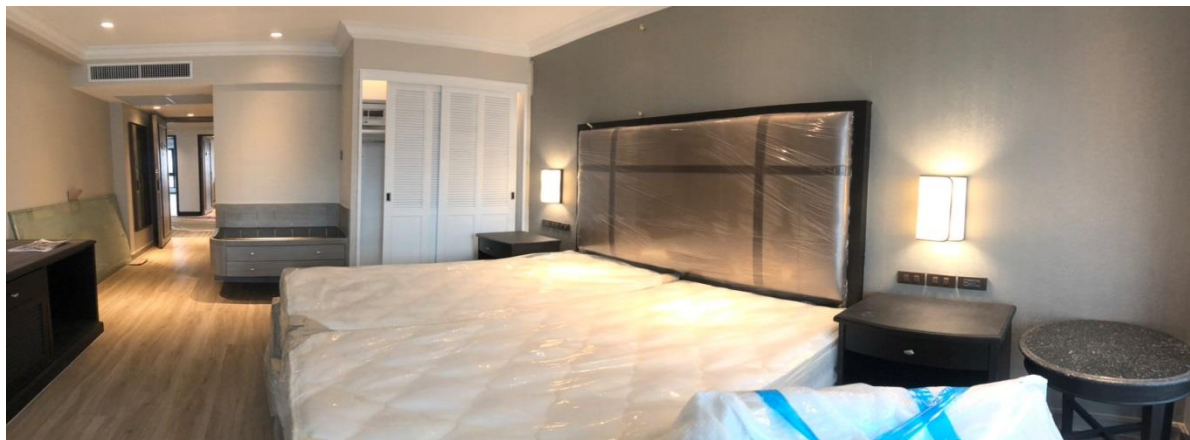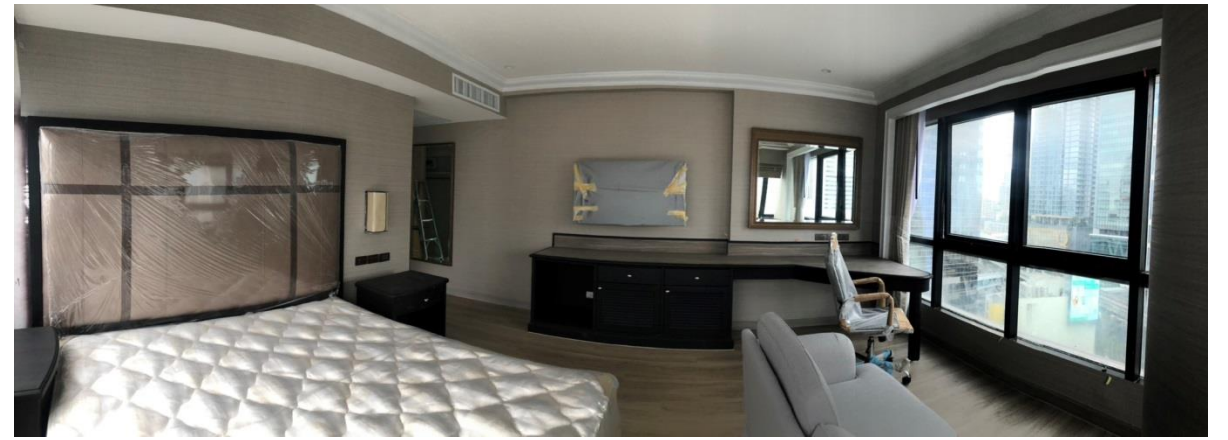

## รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




## งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่งบริเวณ Corridor  
ชั้น 24-25 อาคารกรุงเทพวิงค์

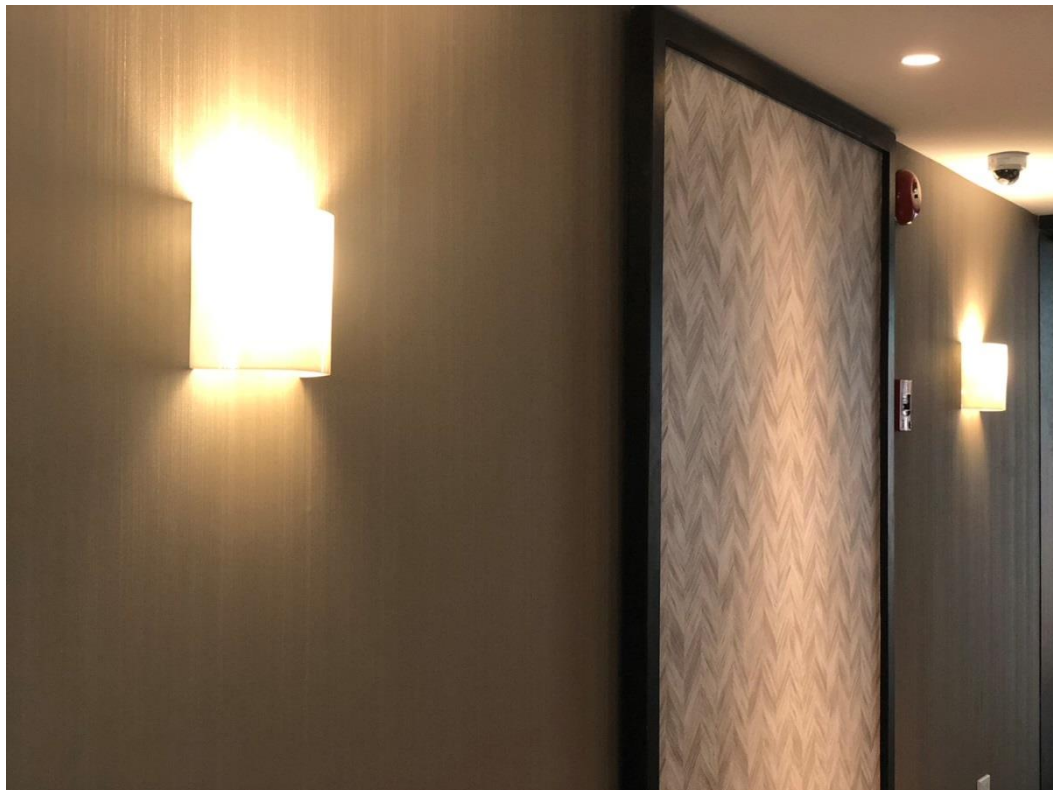

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่งบริเวณ Corridor  
ชั้น 24-25 อาคารกรุงเทพวิงค์



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณห้องเครื่อง Heat Pump  
ชั้นดาดฟ้า อาคารกรุงเทพวิงค์

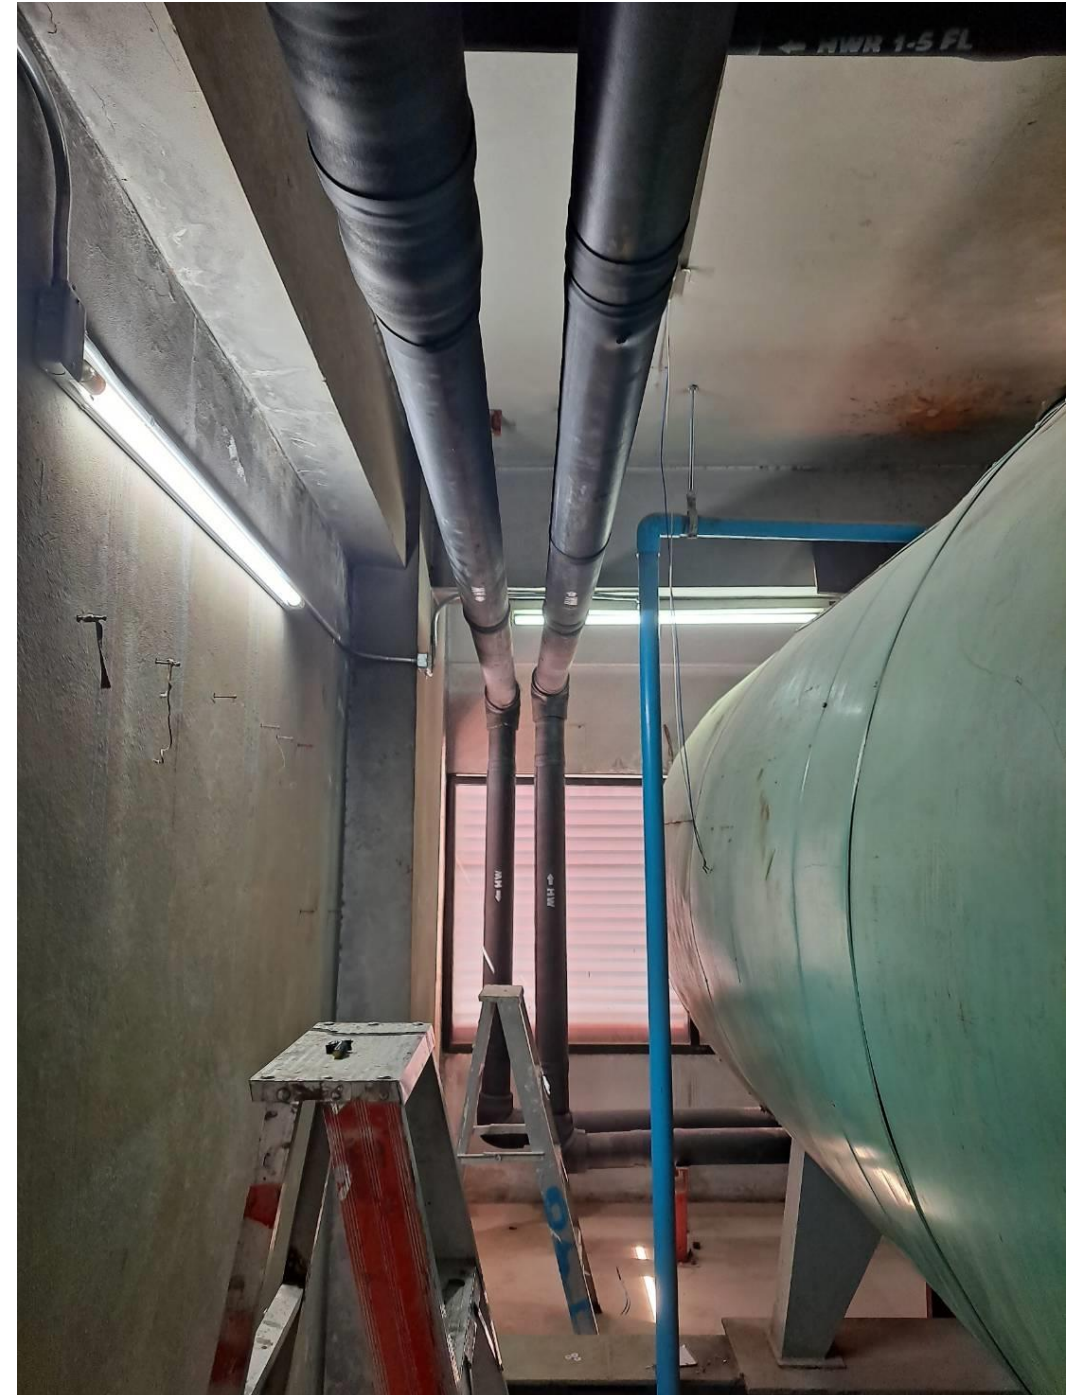

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณห้องเครื่อง Heat Pump  
ชั้นดาดฟ้า อาคารกรุงเทพวิงค์




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

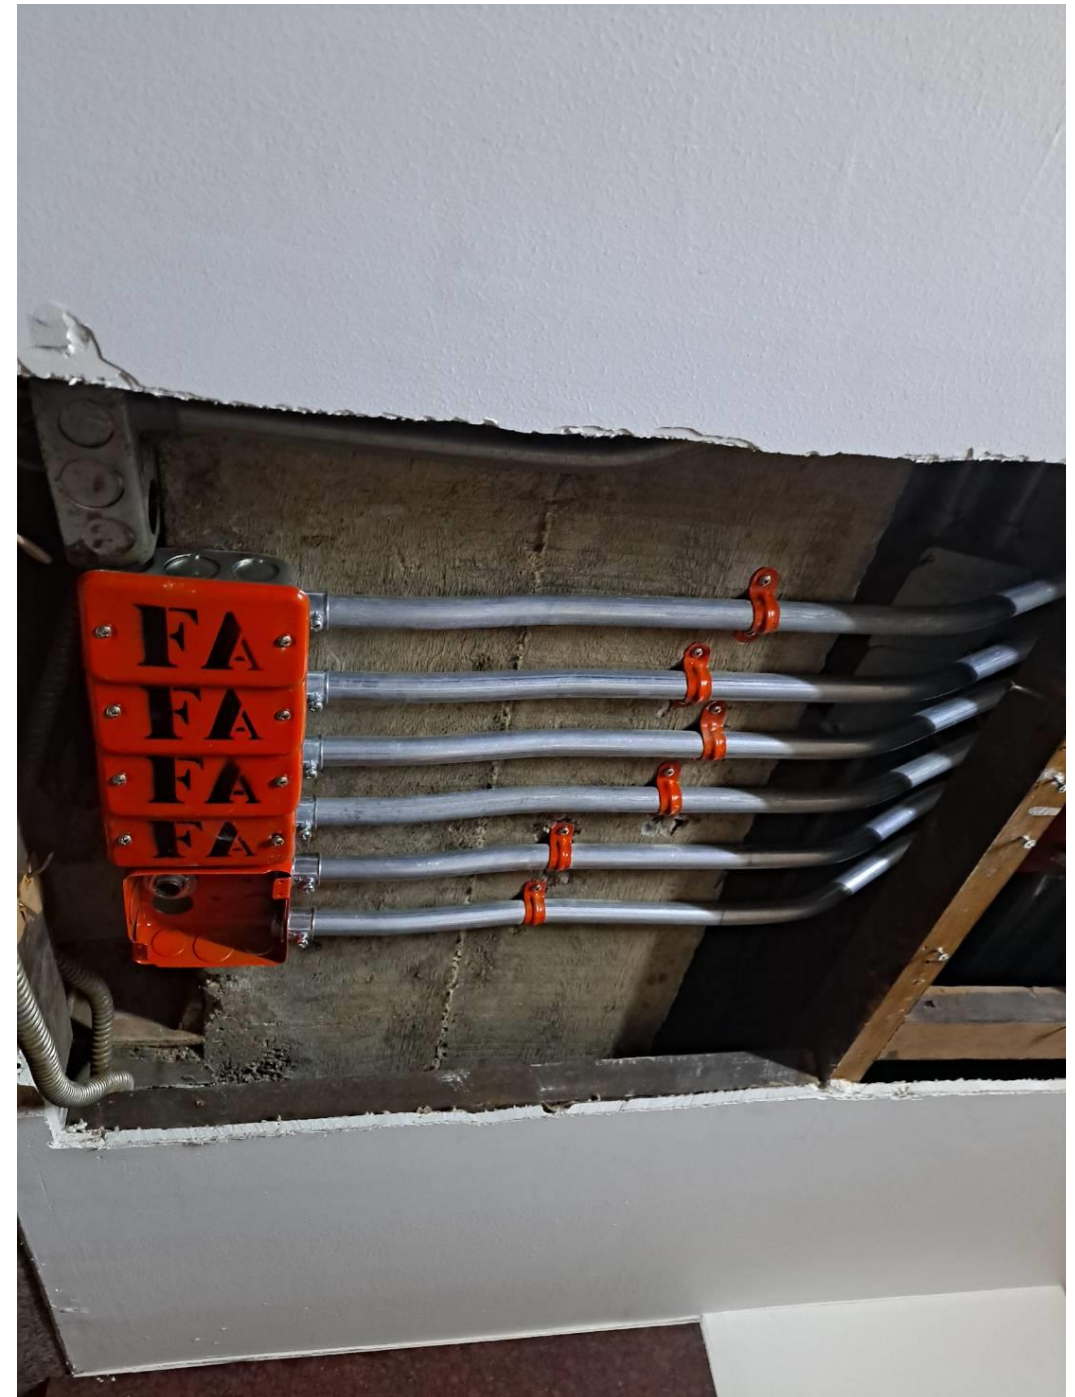

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก  
อาคารสยามวิงค์



## รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


## งานระบบประกอบอาคารภายในห้องพัก อาคารสยามวิงค์






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor  
อาคารสยามวิงค์

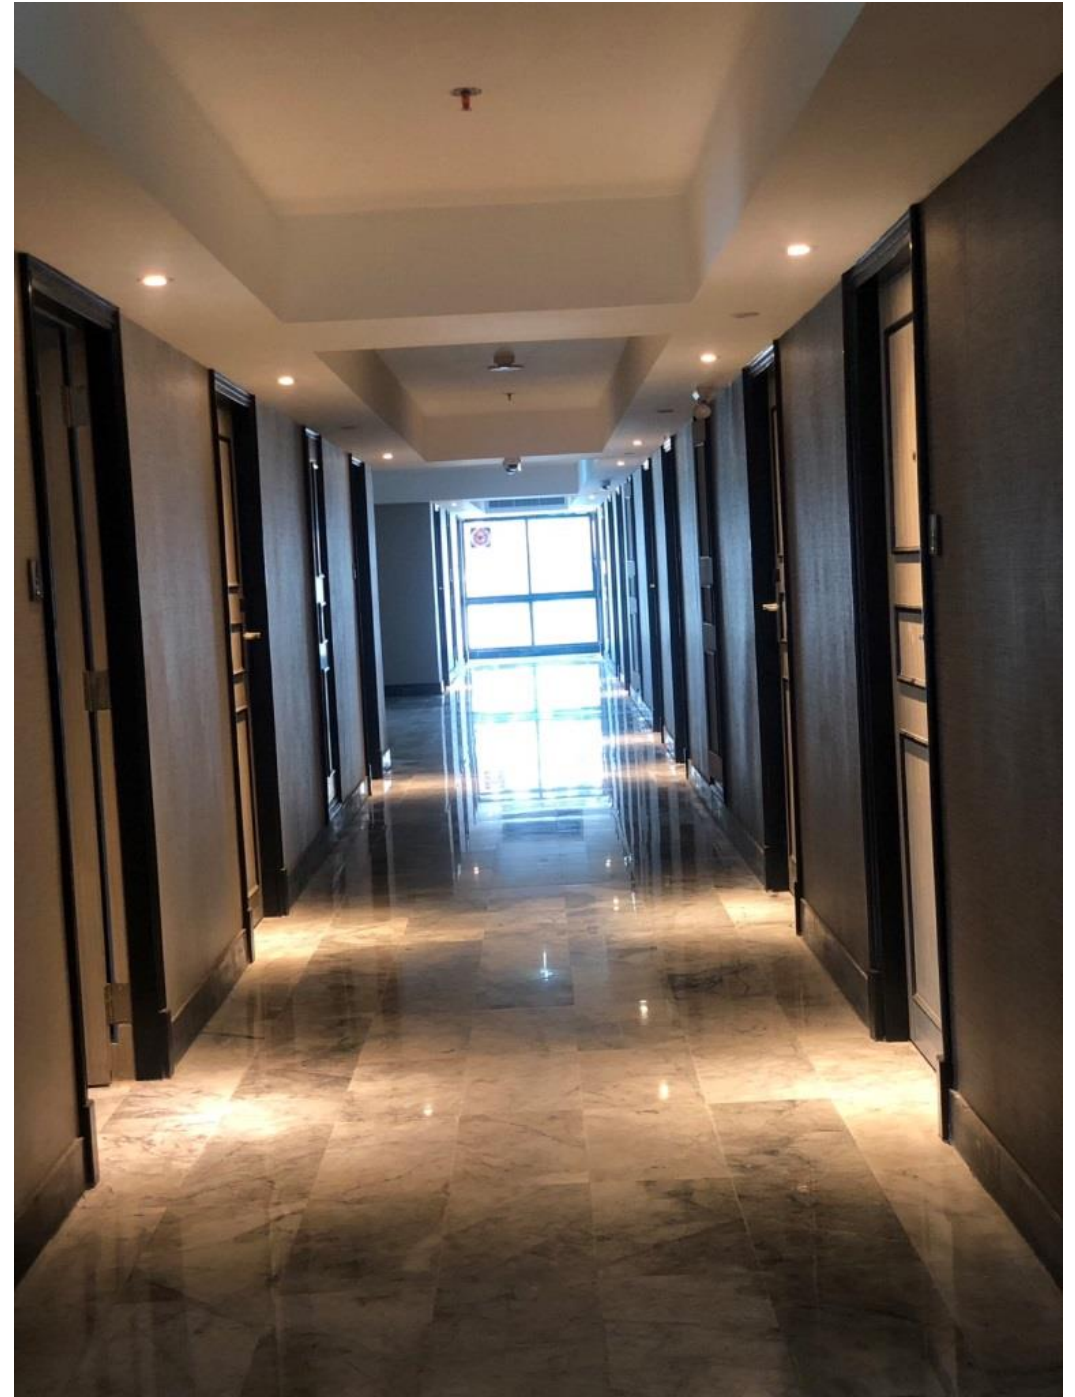


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor  
อาคารสยามวิงค์

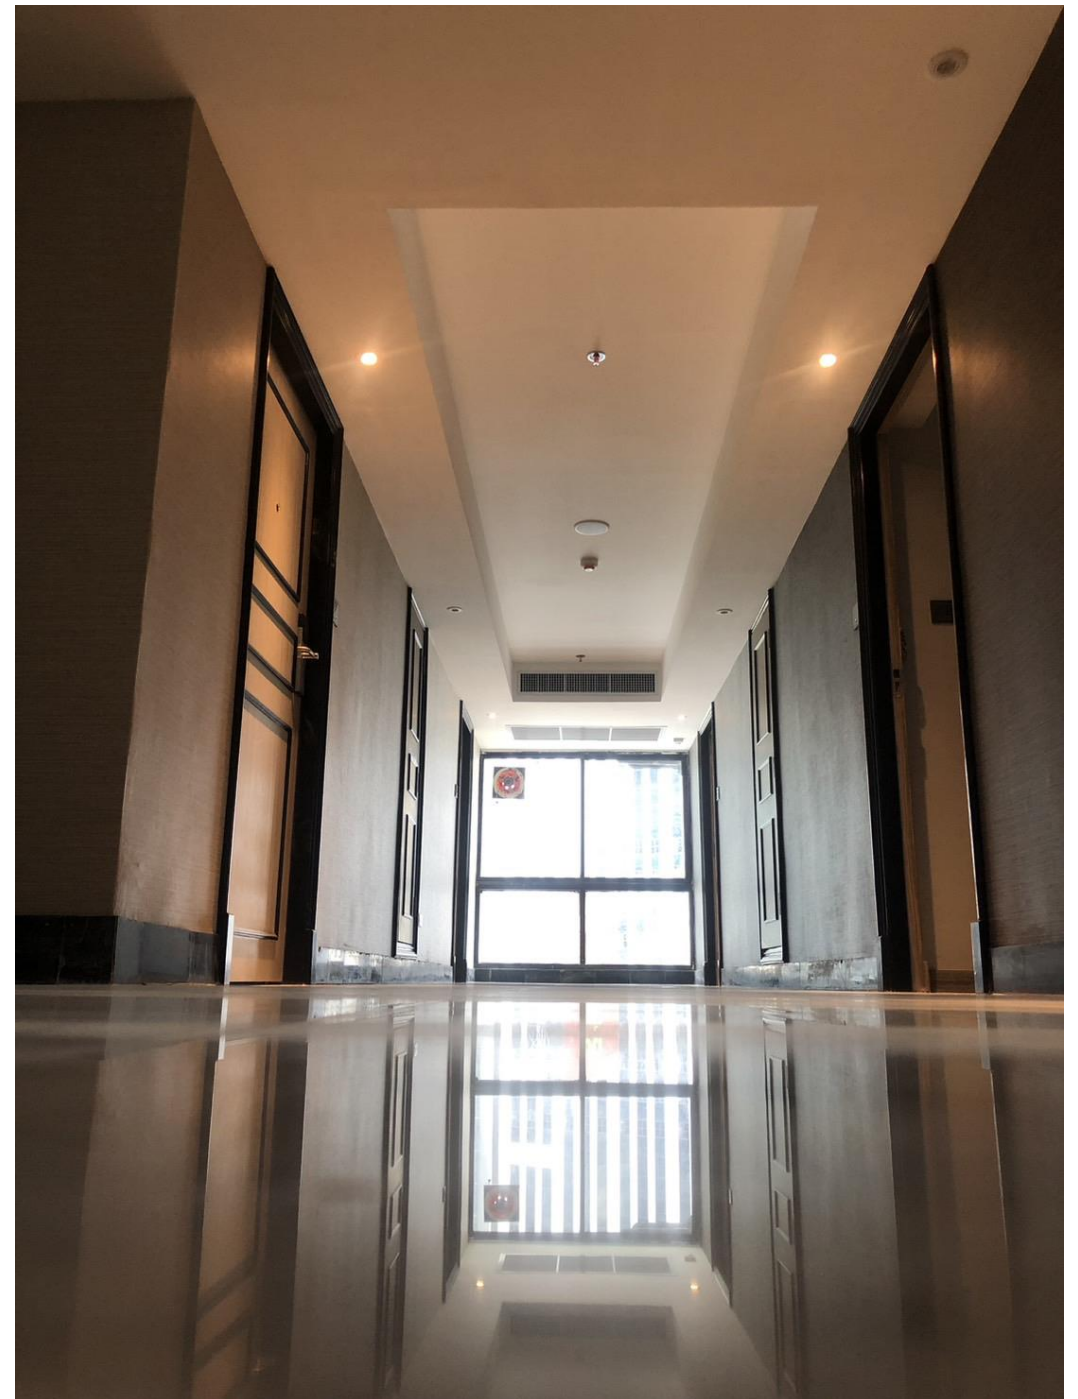

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

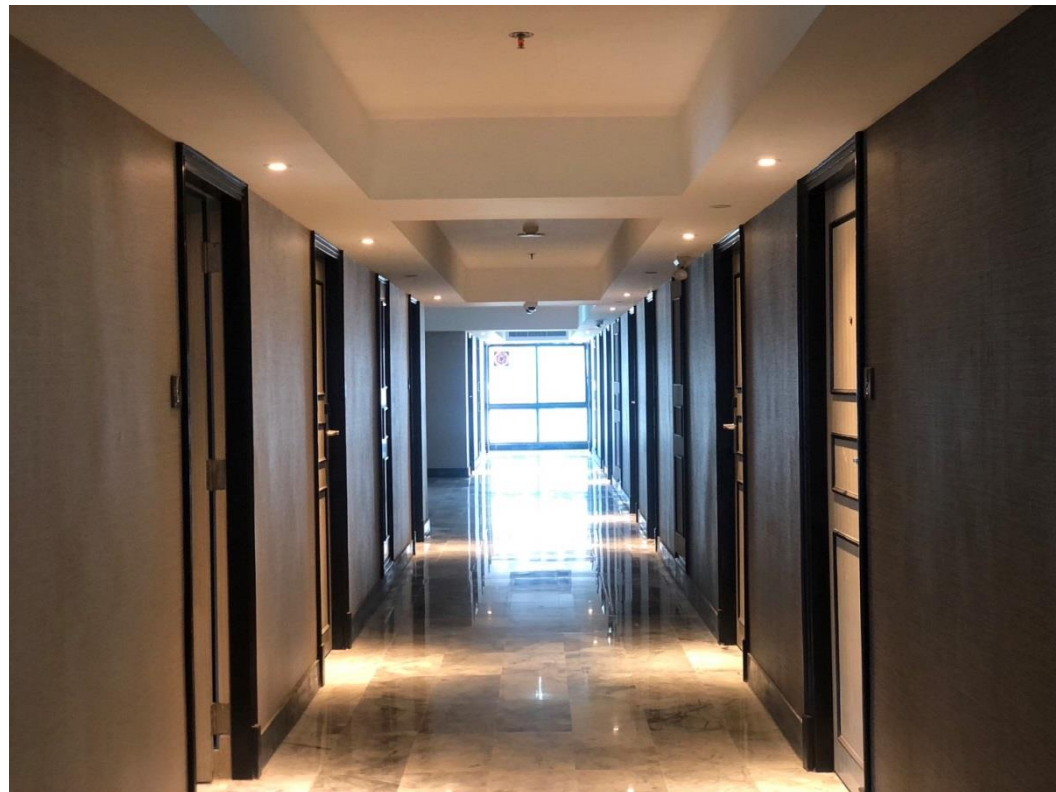

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor  
อาคารสยามวิงค์

