



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

29 JUNE 2023

แผนงาน KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารกรุงเทพ					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 10	29 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	80%	
1.2	ชั้น 11	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	0%	
1.3	ชั้น 12	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	0%	
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 14	3 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66	0%	
2.2	ชั้น 15	7 ก.ค. 66	8 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	0%	
2.3	ชั้น 16	10 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	0%	
2.4	ชั้น 17	11 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	0%	

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
3	(Phase 4)					
3.1	ชั้น 18	12 ก.ค. 66	13 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	0%	
3.2	ชั้น 19	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	
3.3	ชั้น 20	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	
3.4	ชั้น 21	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	
4	(Phase 5)					
4.1	ชั้น 22	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	0%	
4.2	ชั้น 23	25 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	0%	
4.3	ชั้น 24	26 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	
4.4	ชั้น 25	28 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	1 ส.ค. 66	0%	

แผนงาน SIAM WING

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน


ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารสยาม					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 10	14 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	0%	
1.2	ชั้น 11	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	0%	
1.3	ชั้น 12	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	0%	
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 14	26 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	0%	
2.2	ชั้น 15	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	

ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II



- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 7/07/66


6 FL.

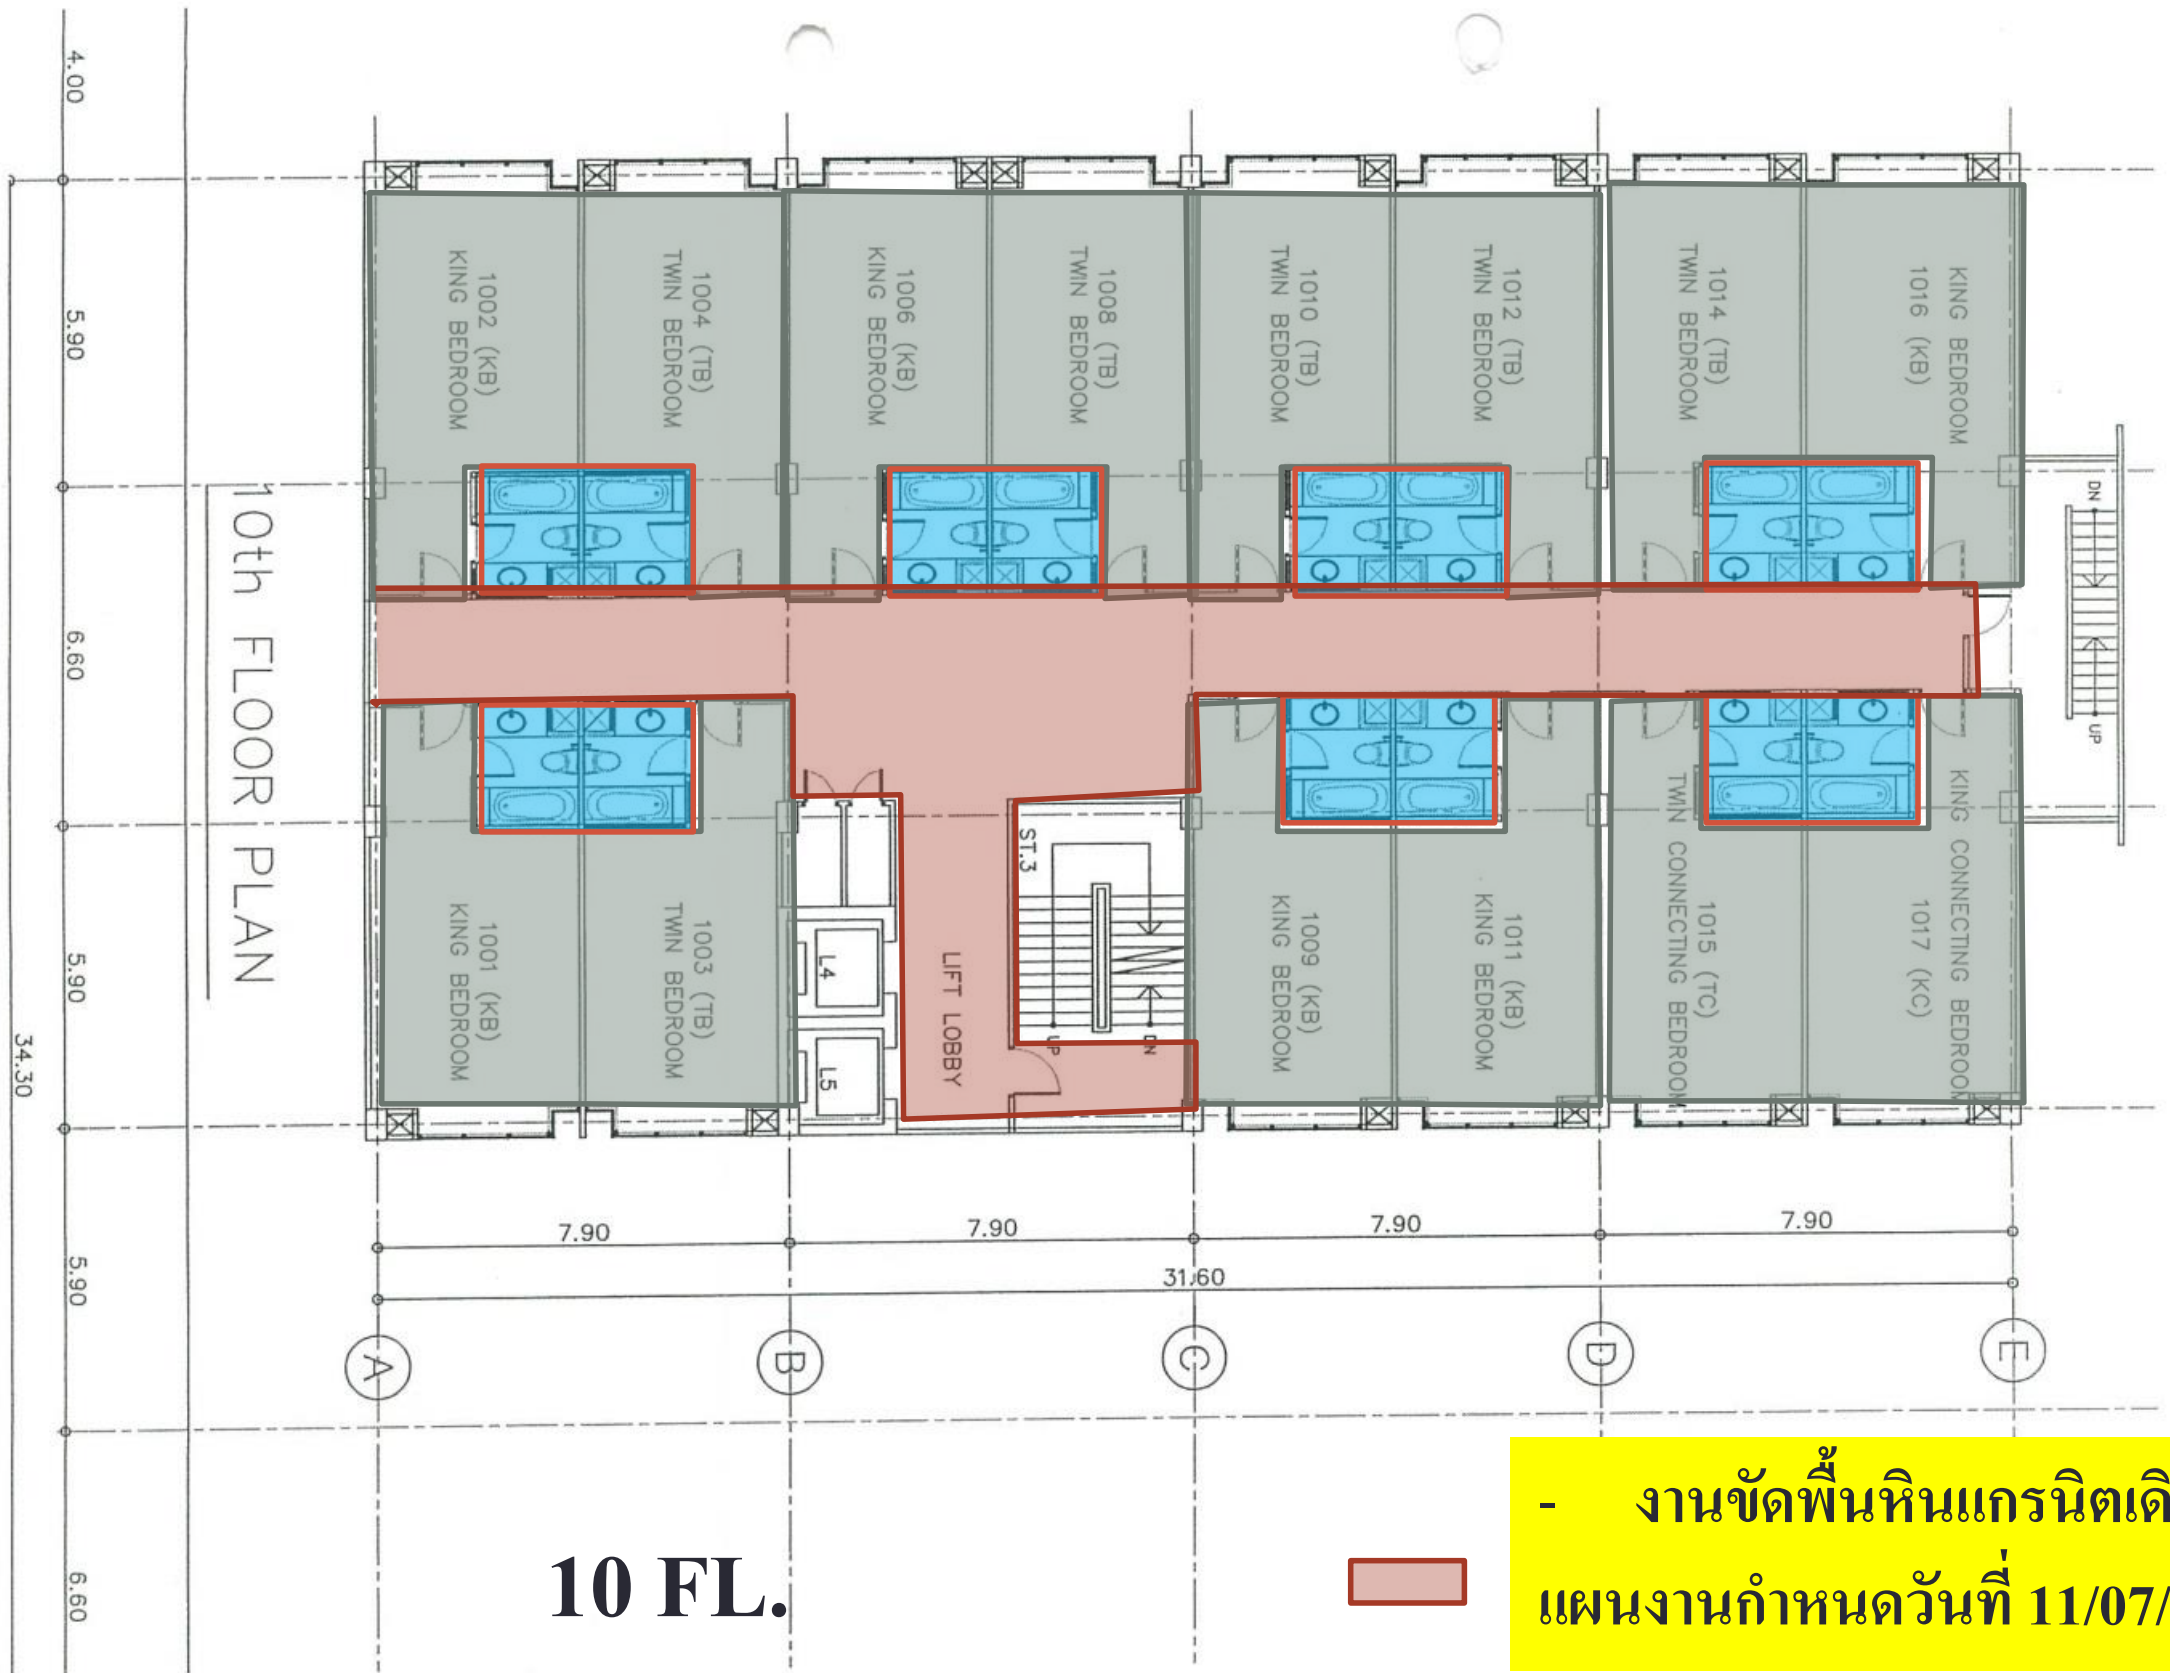

10 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 11/07/66

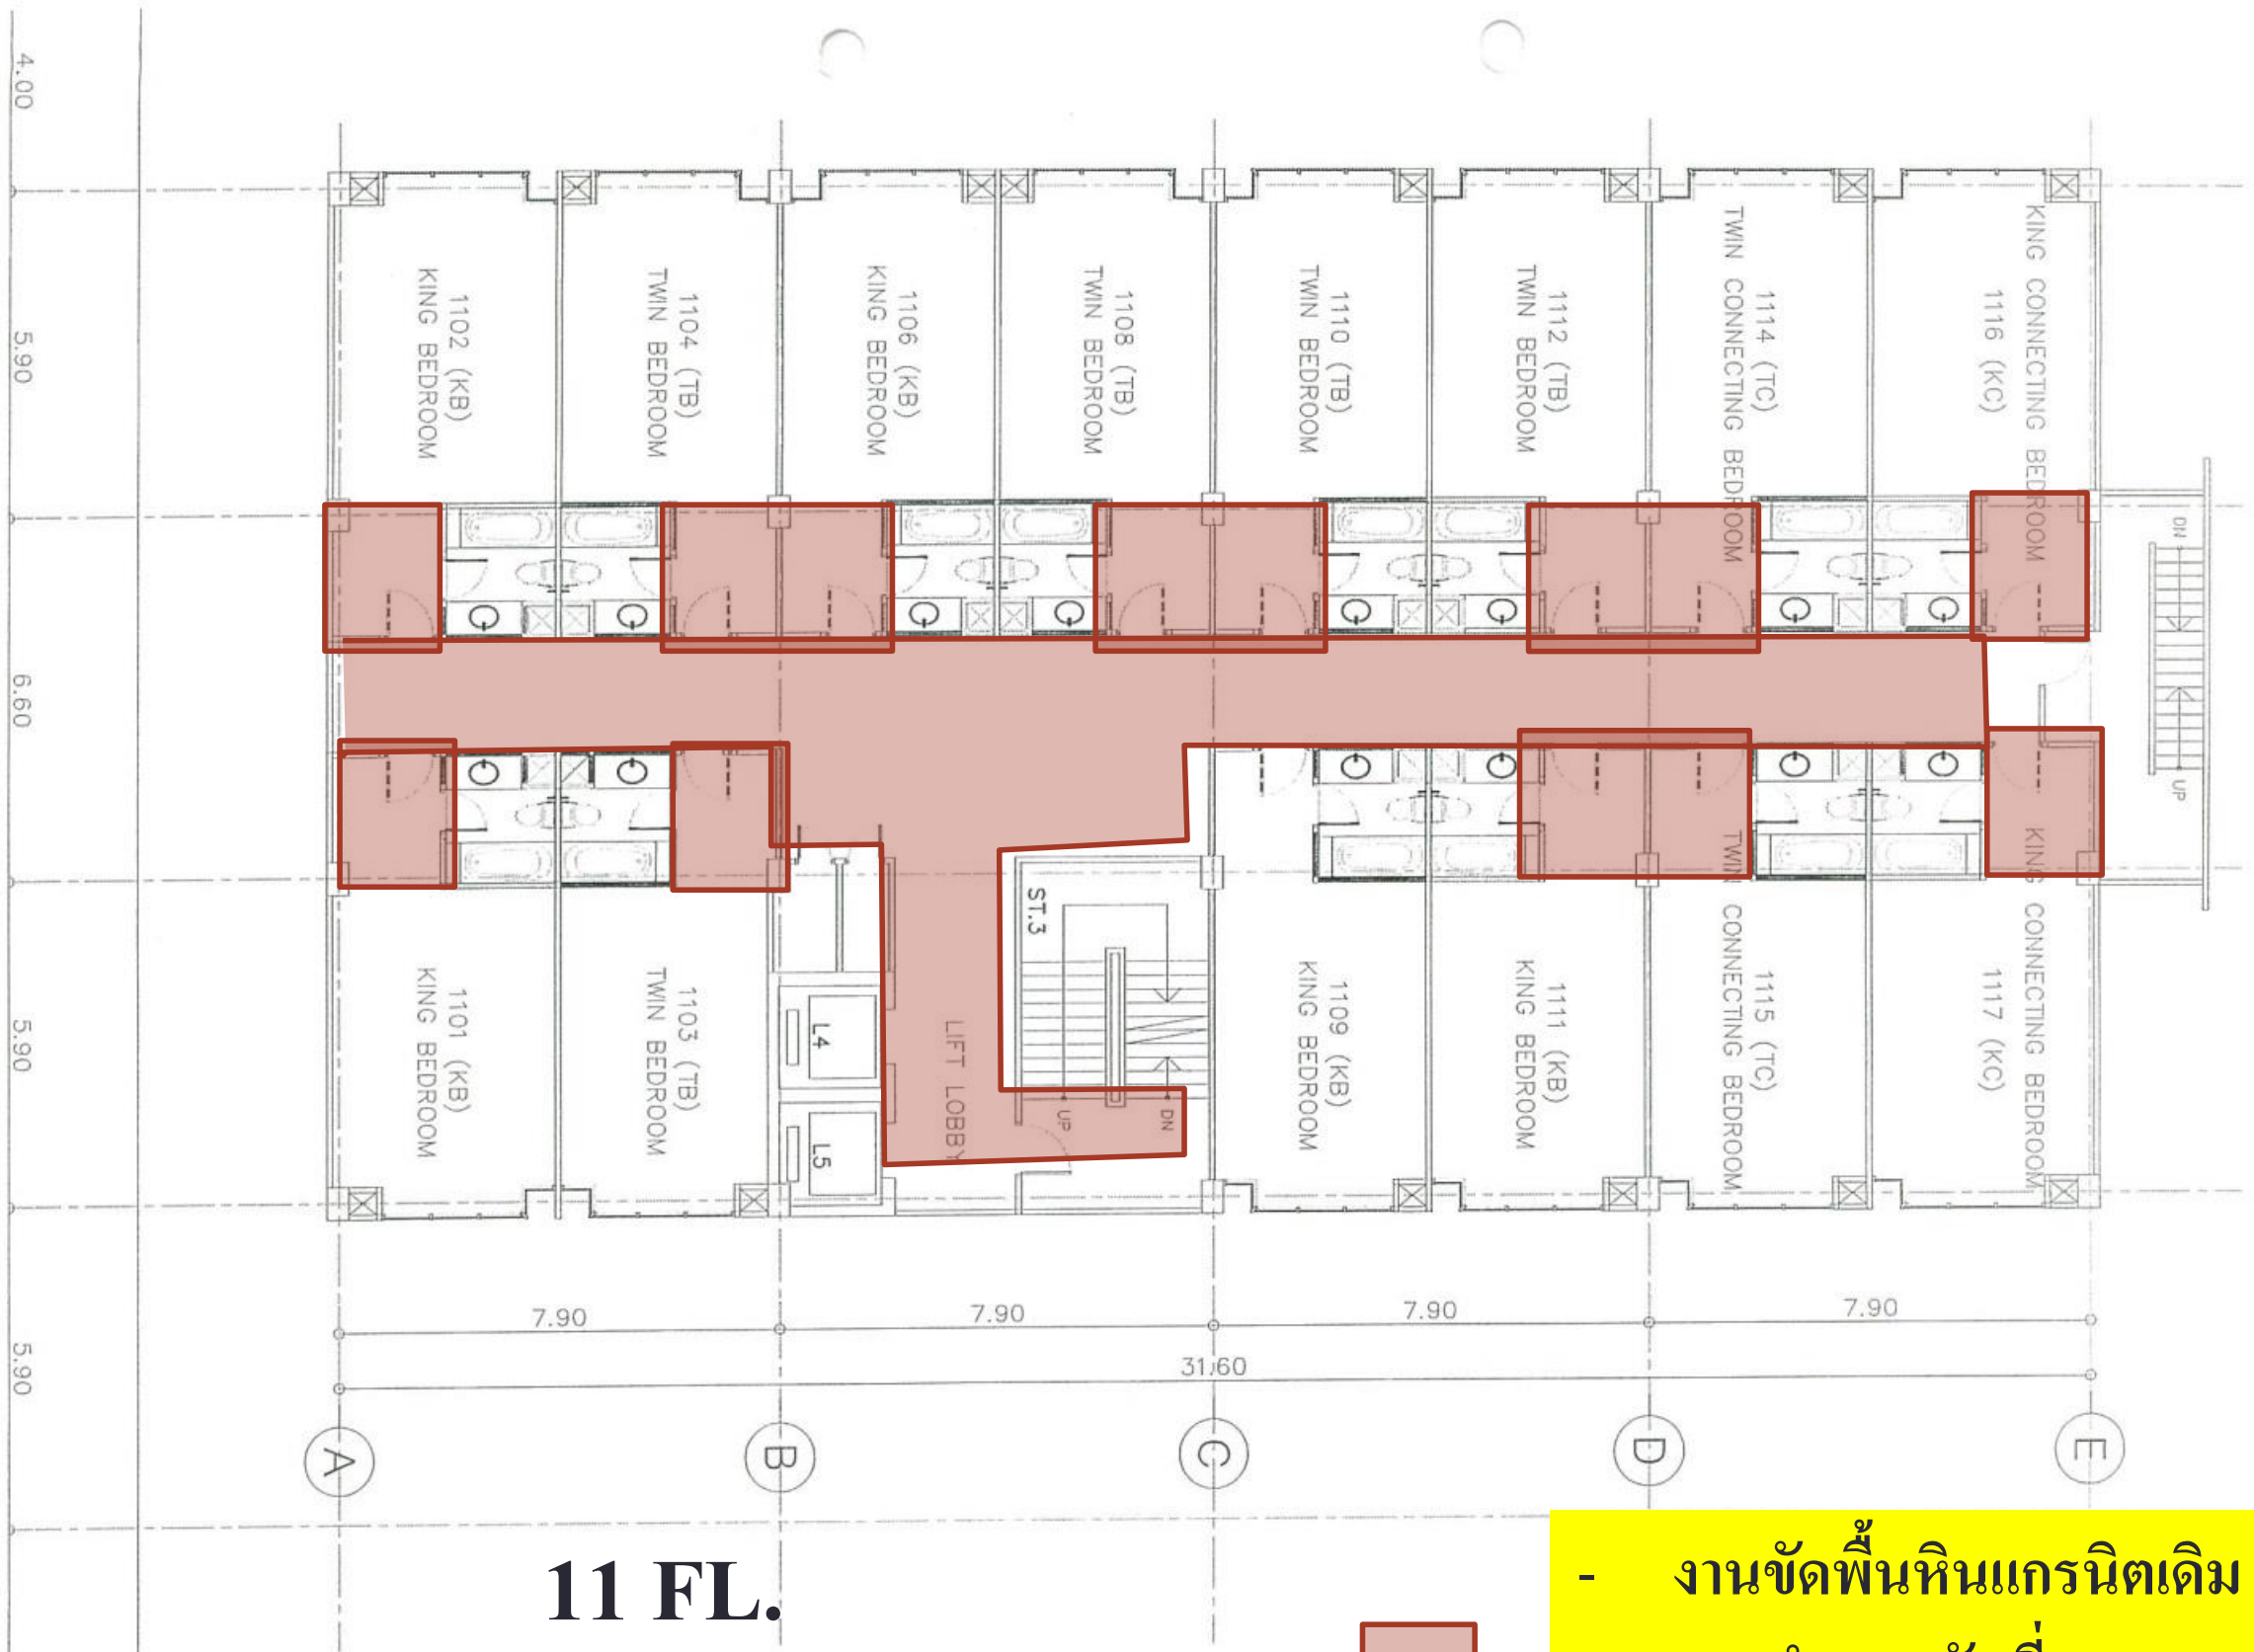

11 FL.




- งานตัดพื้นที่หินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 15/07/66

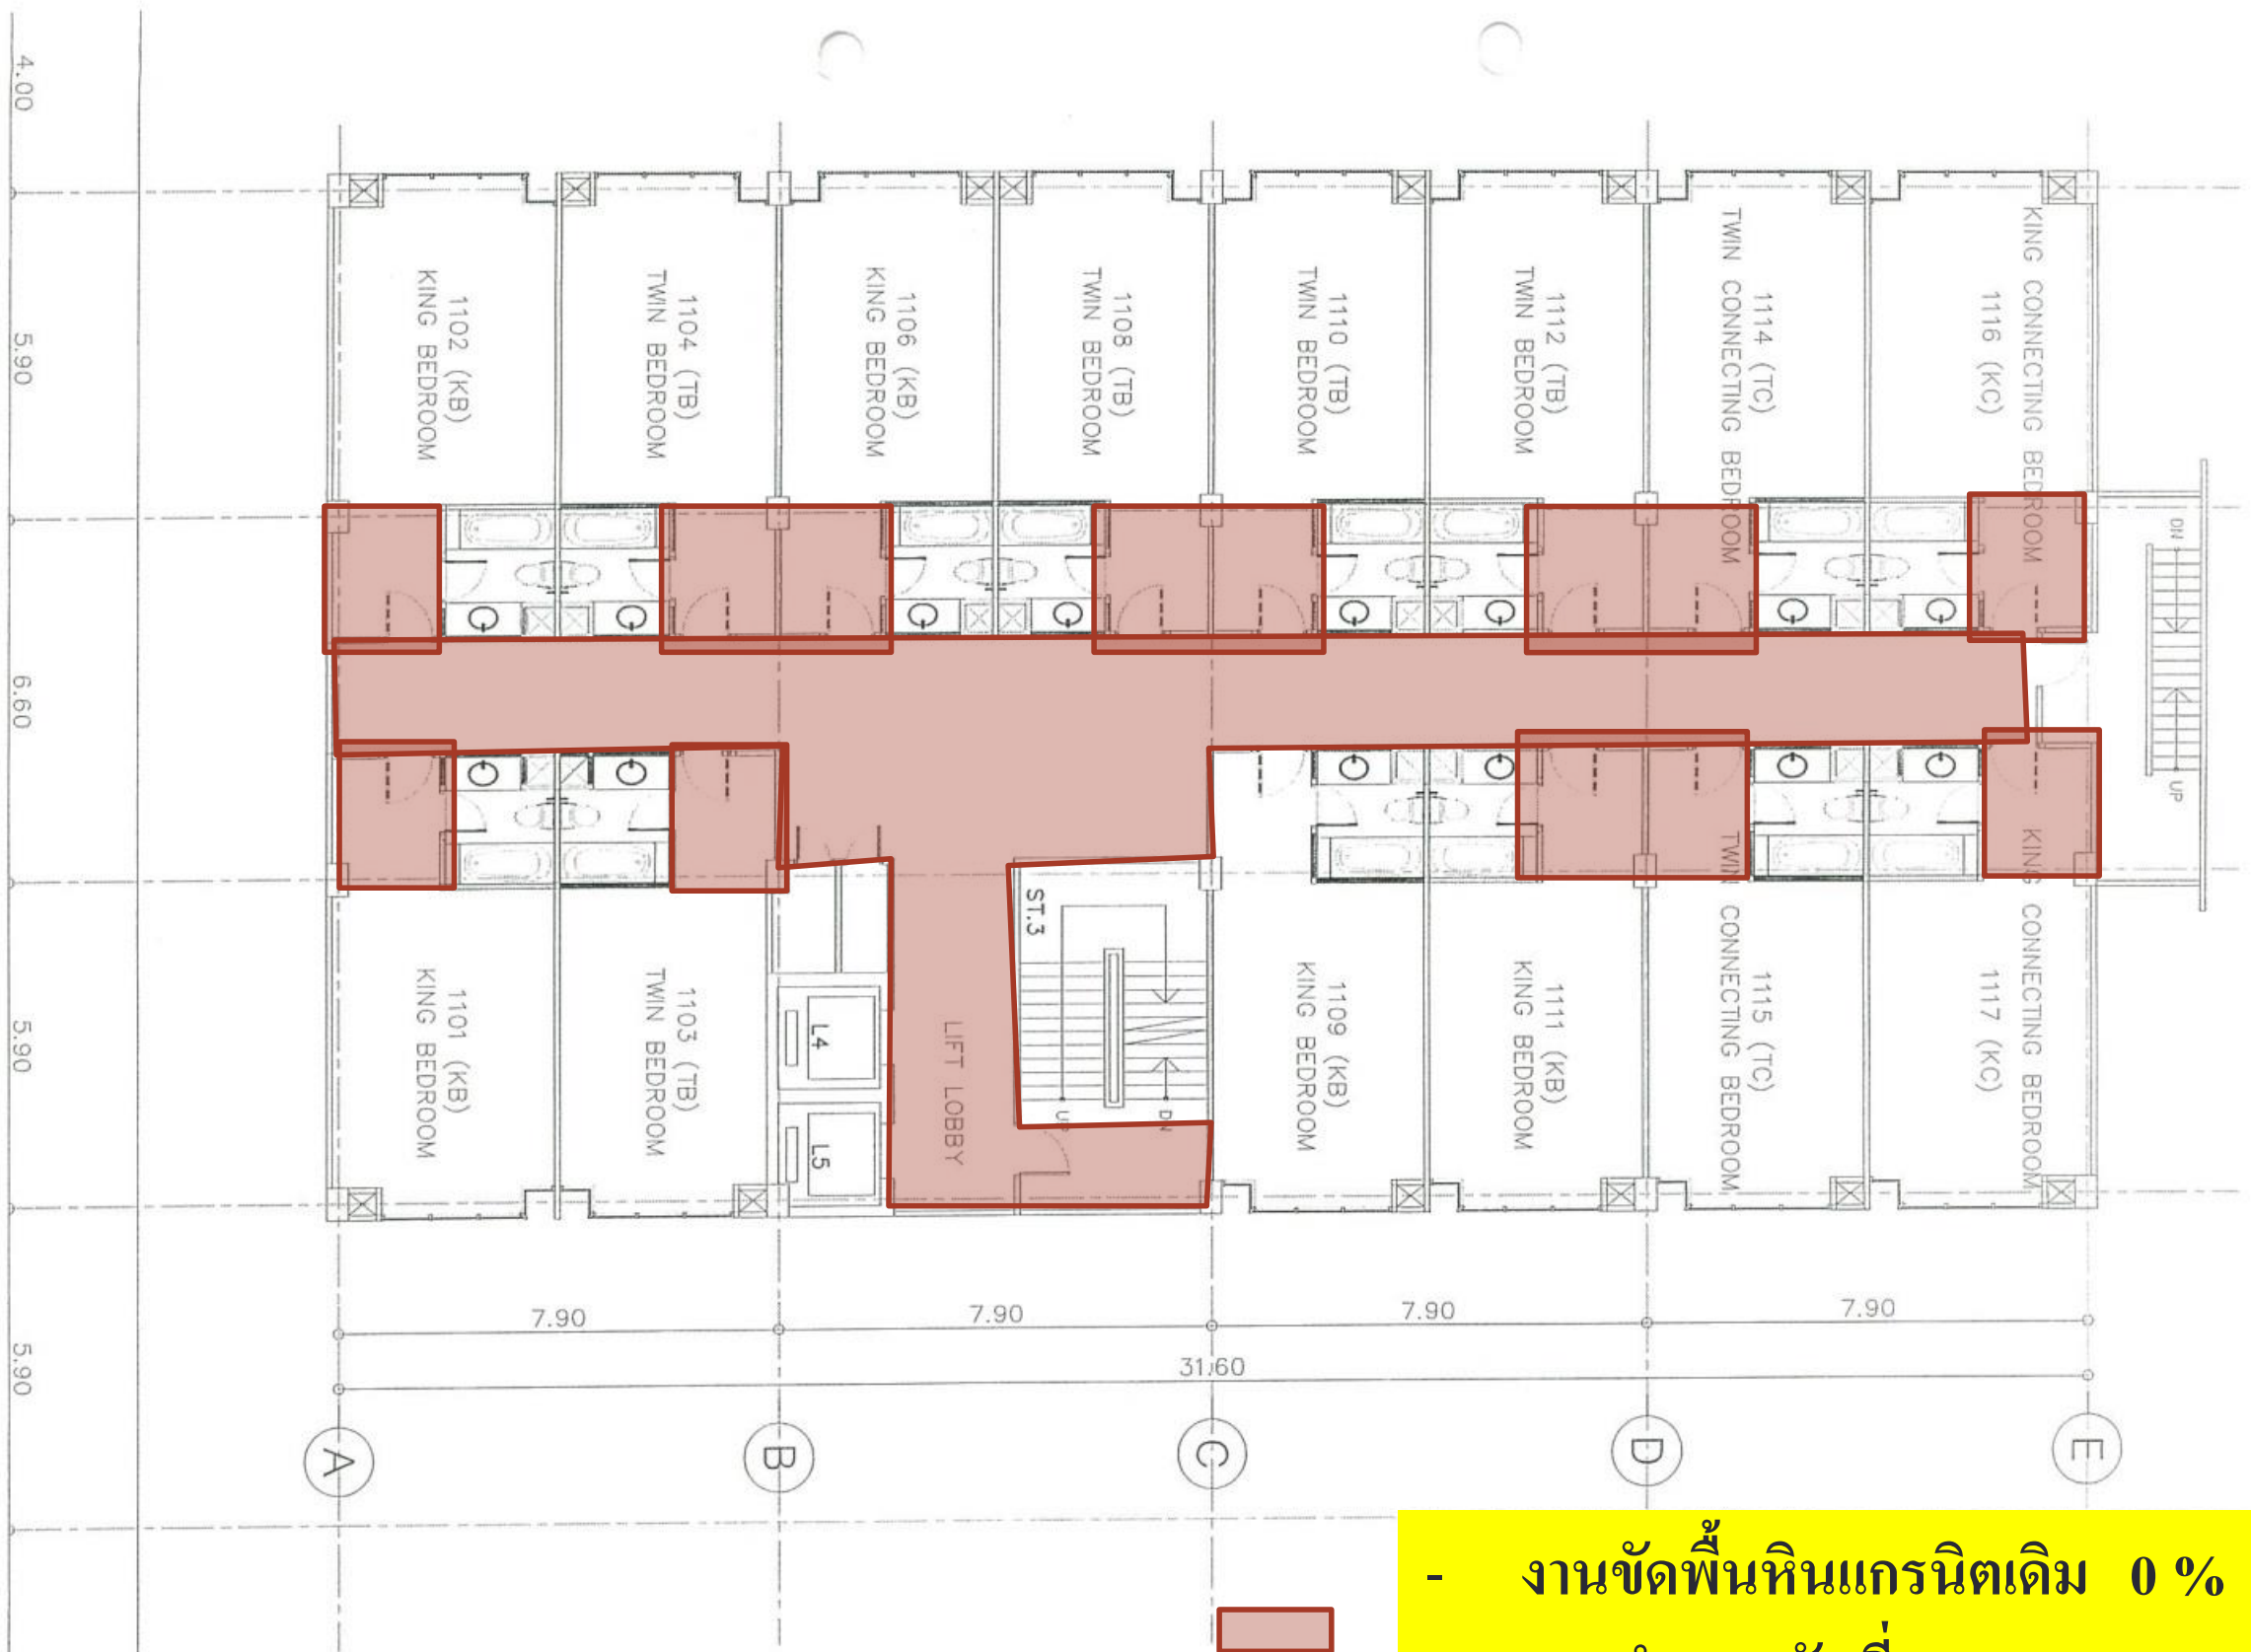

12 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 แผนงานกำหนดวันที่ 20/07/66

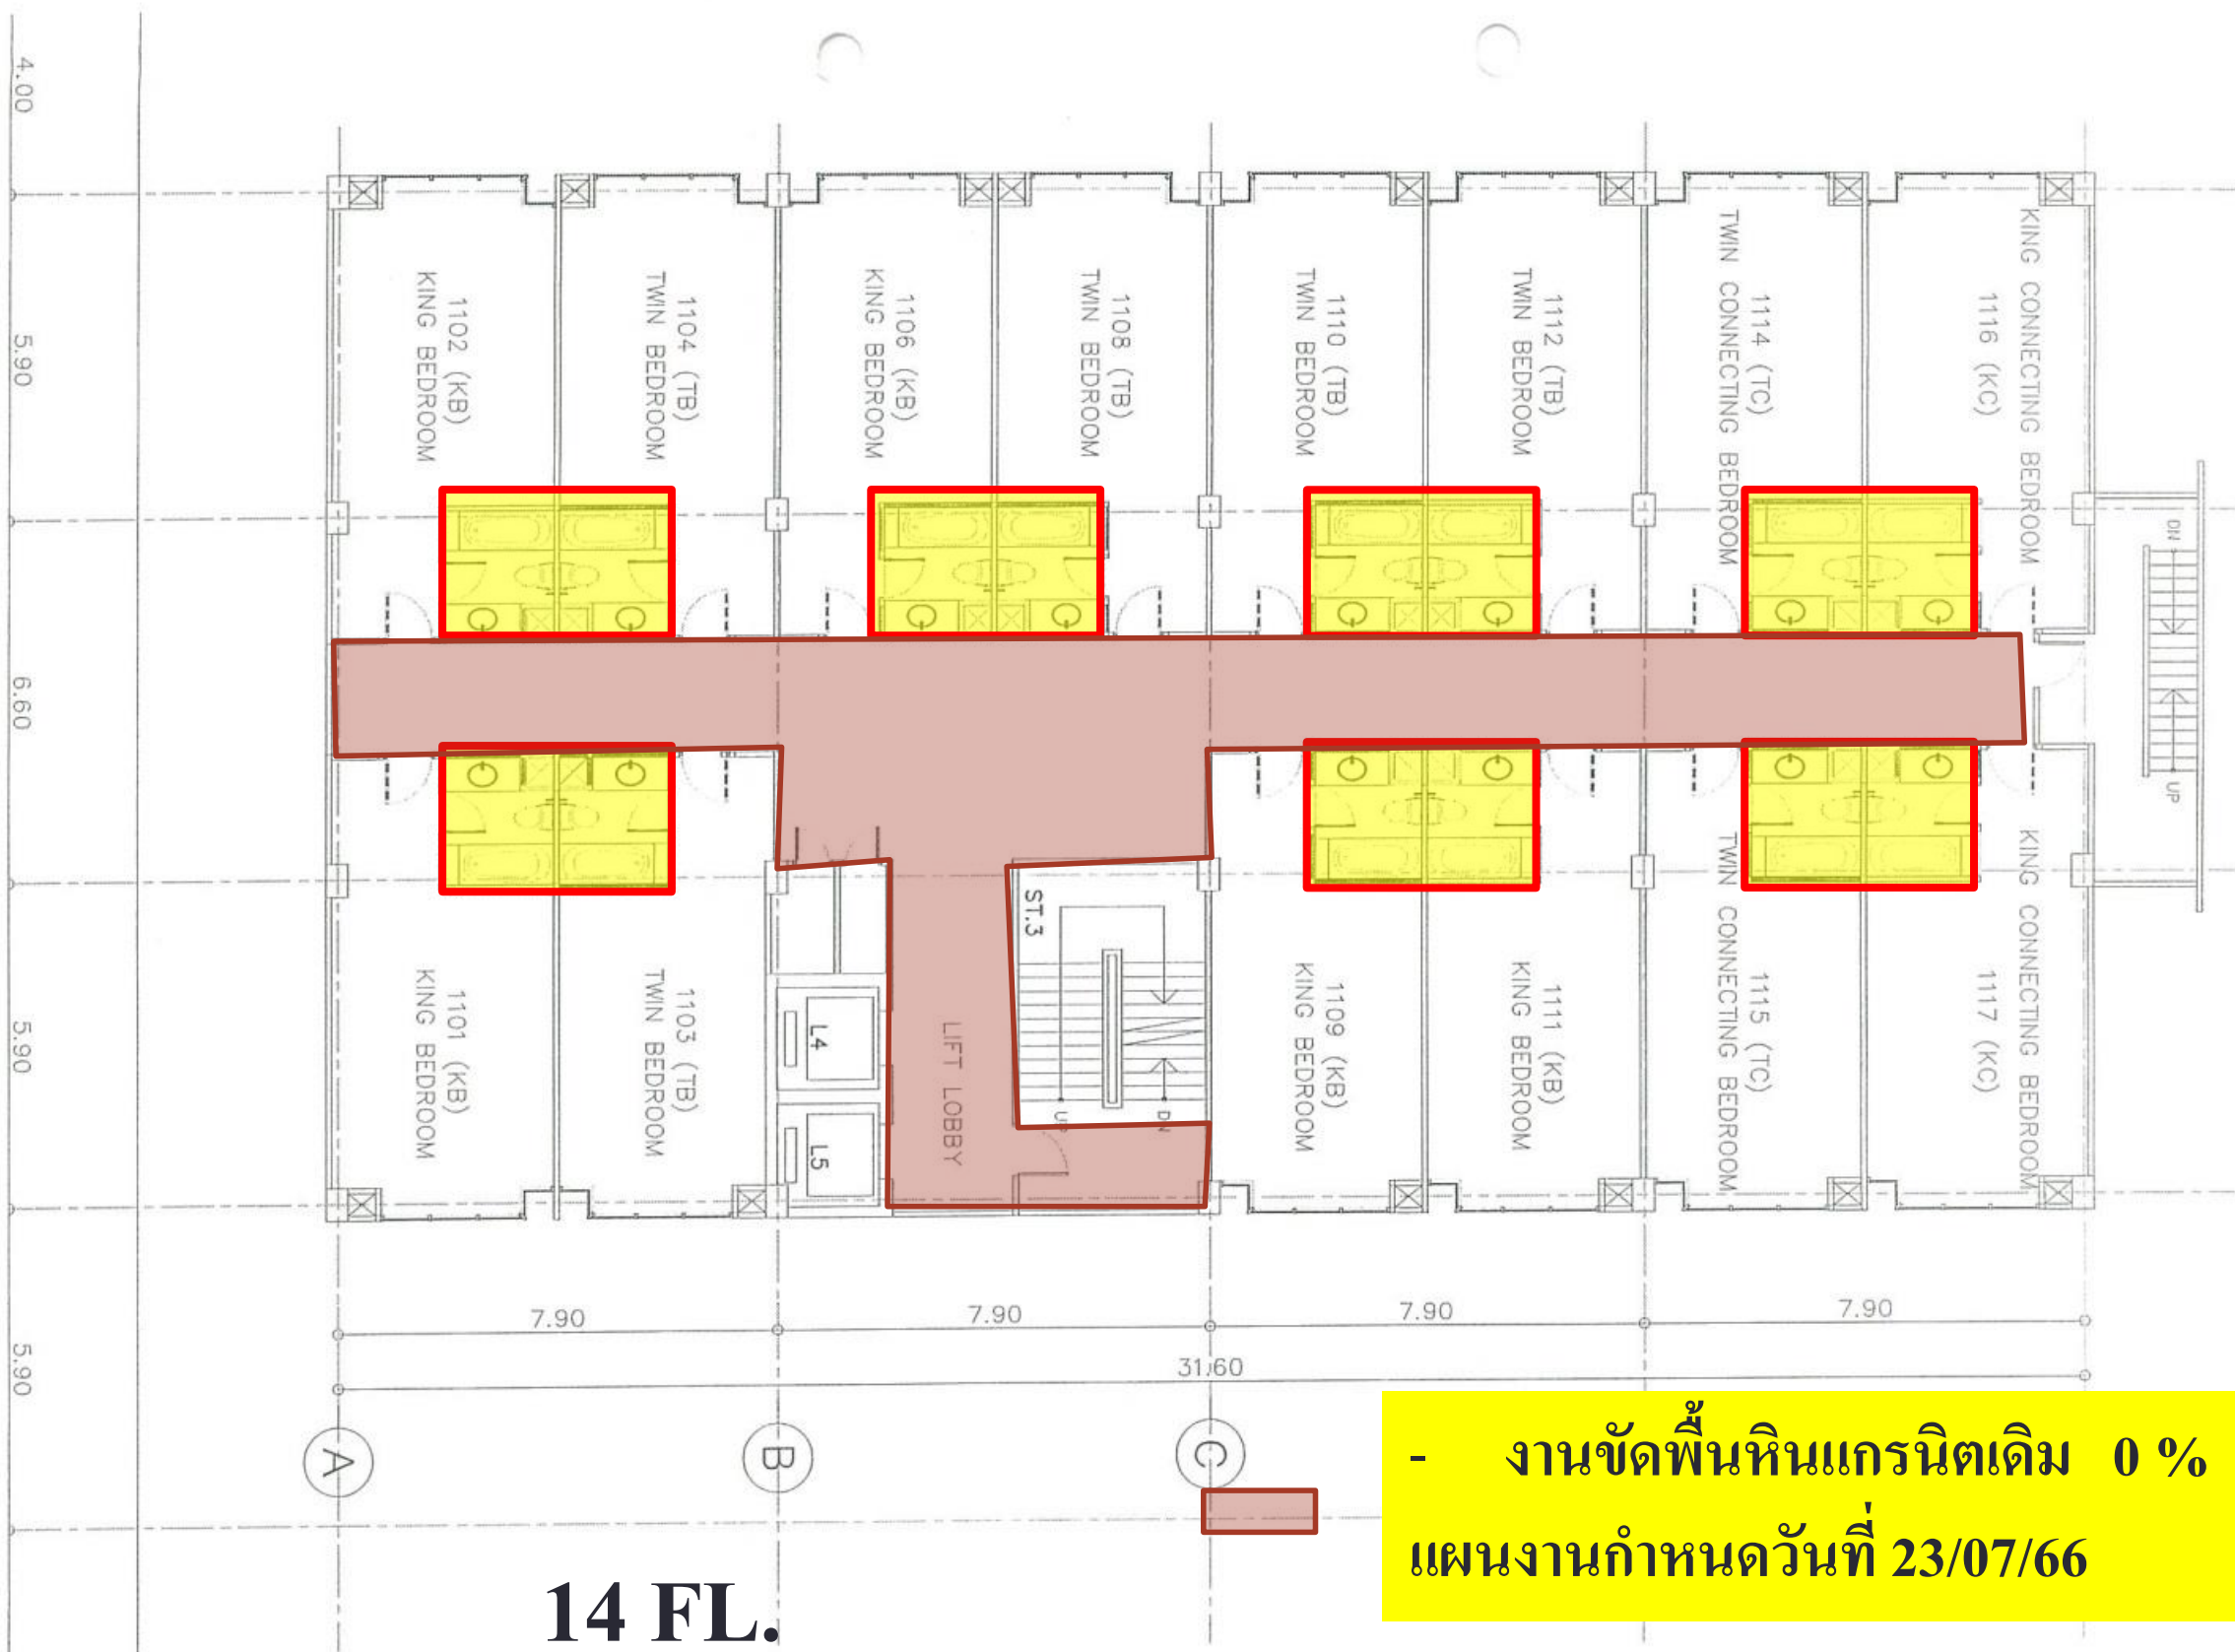

14 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 23/07/66



15 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 26/07/66

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug ภายในห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15-18



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งระบบ Keycard บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-16

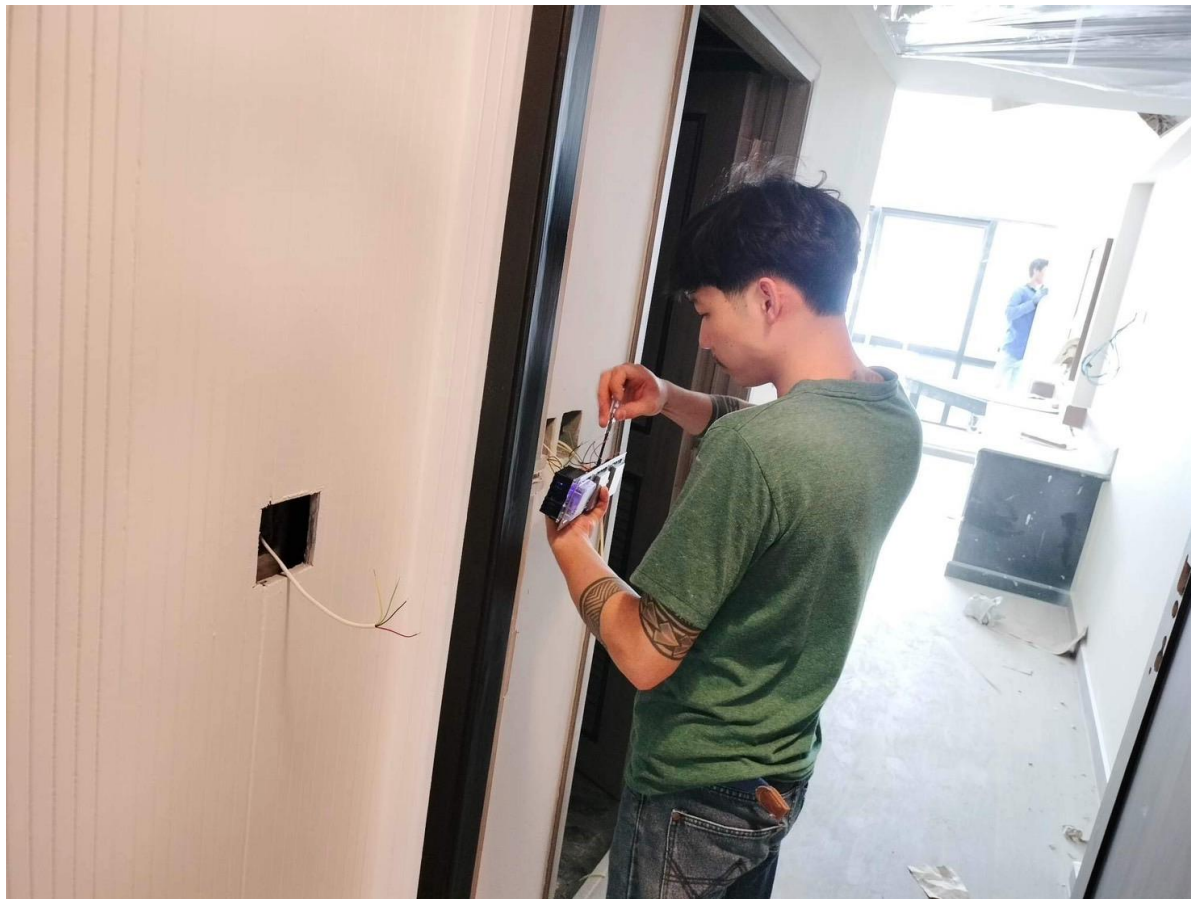

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งระบบ Keycard บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-16



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์แสดงสถานะบริเวณหน้าห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-16




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Power Relay บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งโคมไฟและ Smoke Detector บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21-24

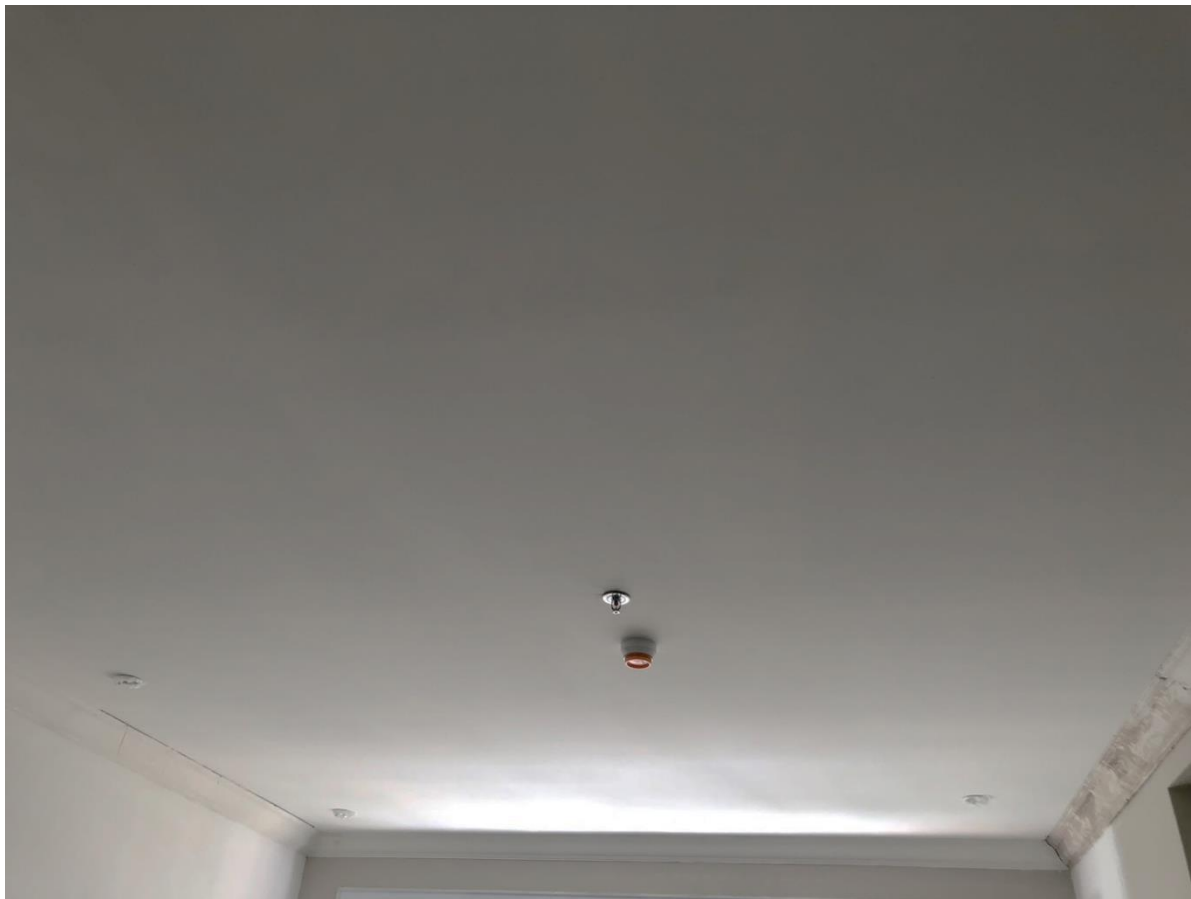

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งโคมไฟและ Smoke Detector บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21-24



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ,ลำโพงและ Smoke Detector บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21-23



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้งป้าย Exit Sign บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15-16



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานใส่หัวสปีนเกอร์บริเวณห้องพักและ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-25

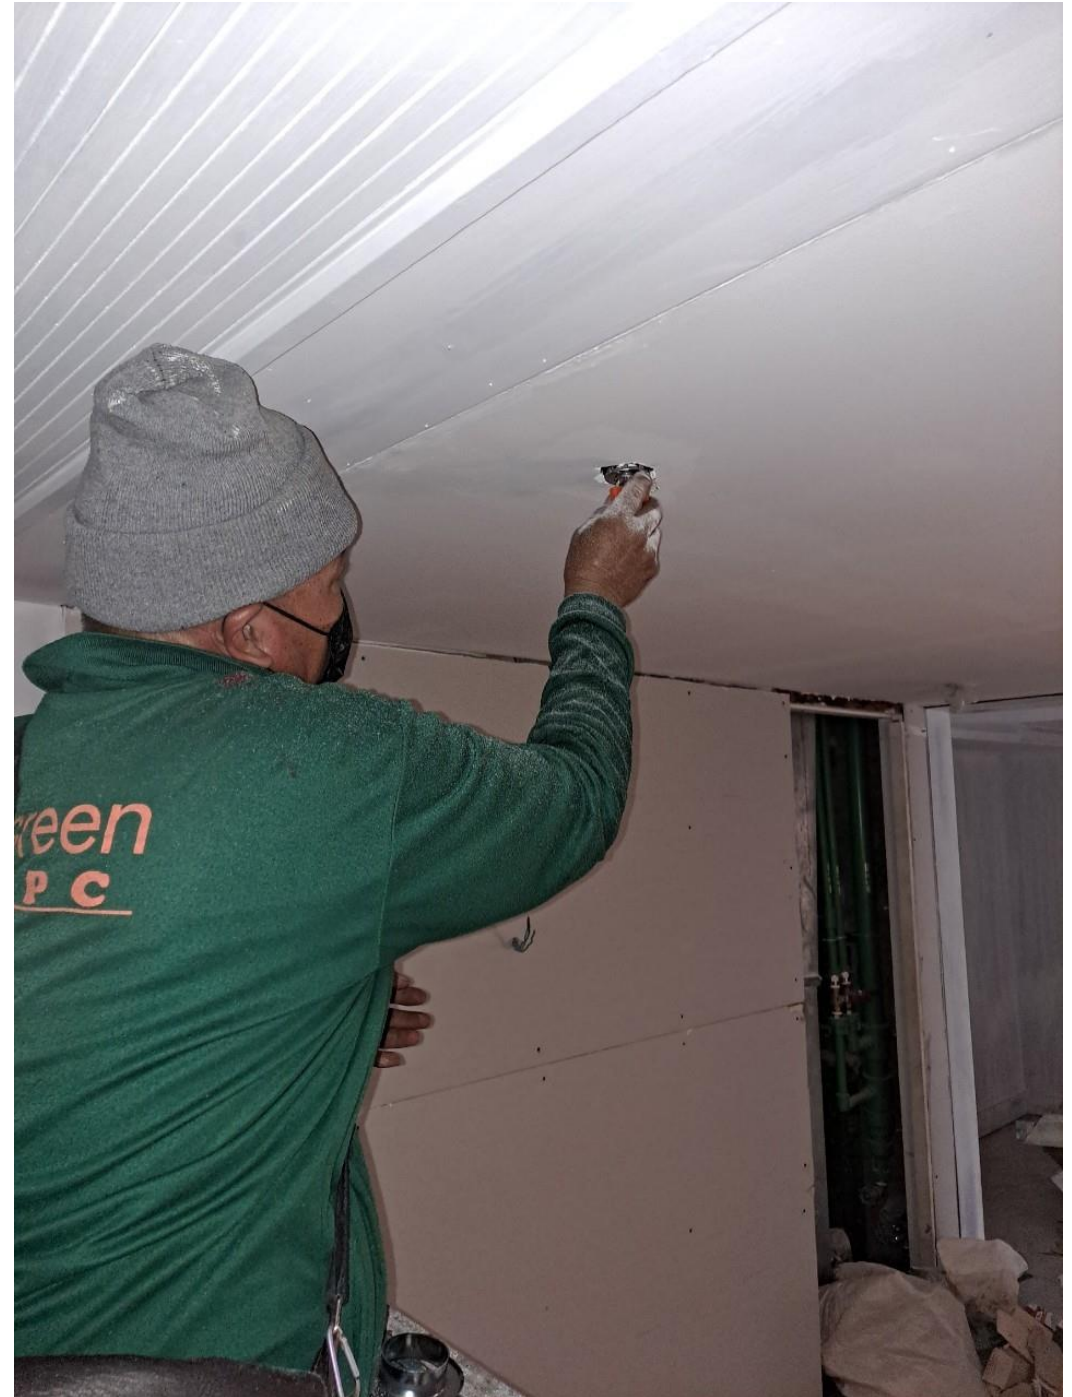

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานใส่หัวสปีเกอร์บริเวณห้องพักและ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-25




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานใส่หัวสปีเกอร์บริเวณห้องพักและ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

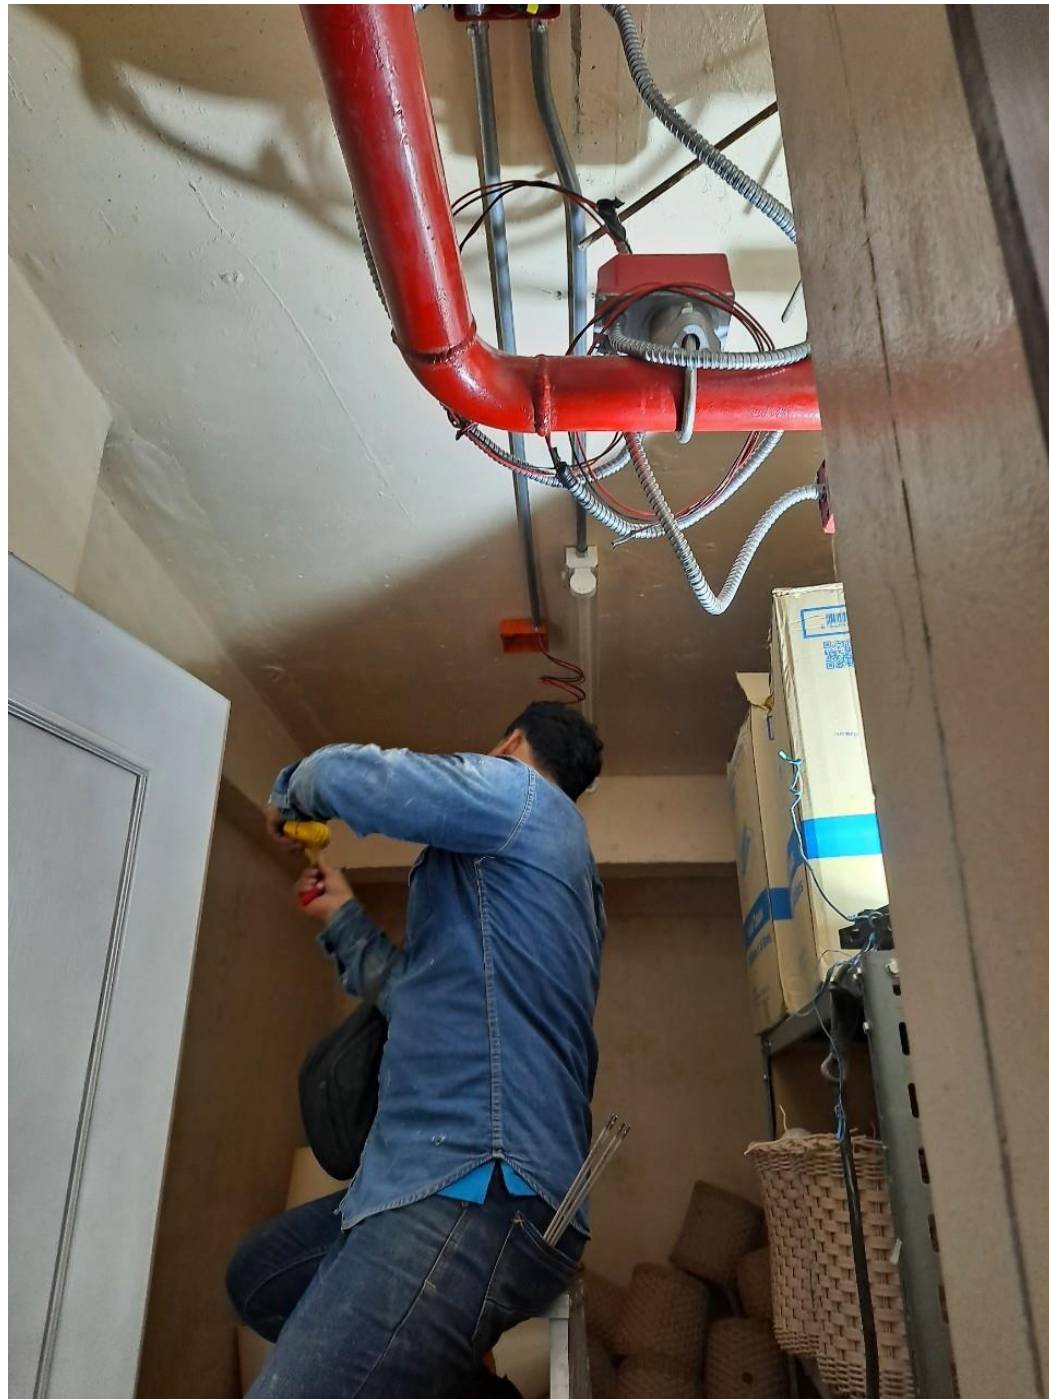

งานติดตั้งสปริงเกอร์บริเวณห้องแม่บ้าน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานแก้ไขที่ฝ้าฉนวนบริเวณลานจอดรถ อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 2



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานแก้ไขท่อน้ำฝนต้นบริเวณลานจอดรถ อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 2



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU + Consumer พร้อมเข้าสายบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU + Consumer พร้อมเข้าสายบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้ง Switch Plug บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งโคมไฟและ Smoke Detector บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Detector, ลำโพงและหัวสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14

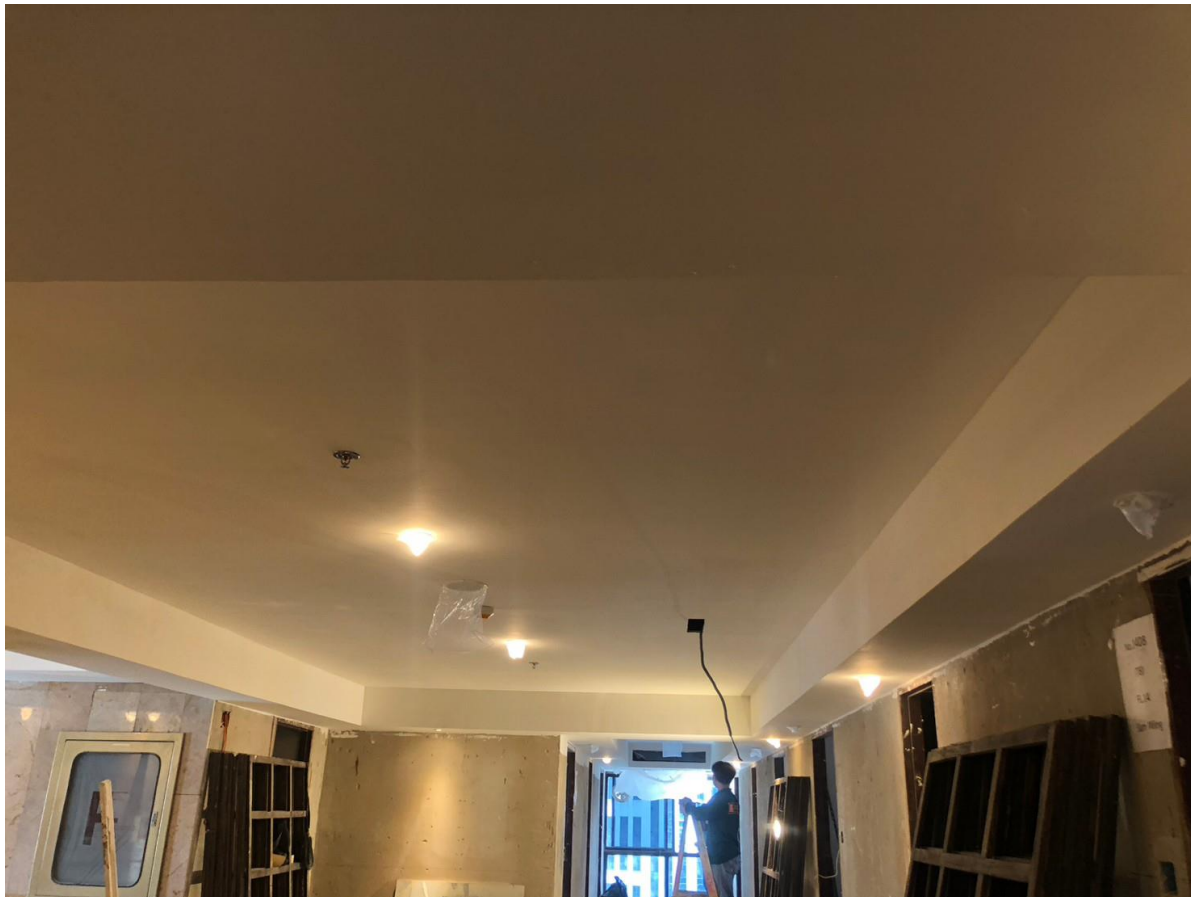

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Detector, ลำโพงและหัวสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14

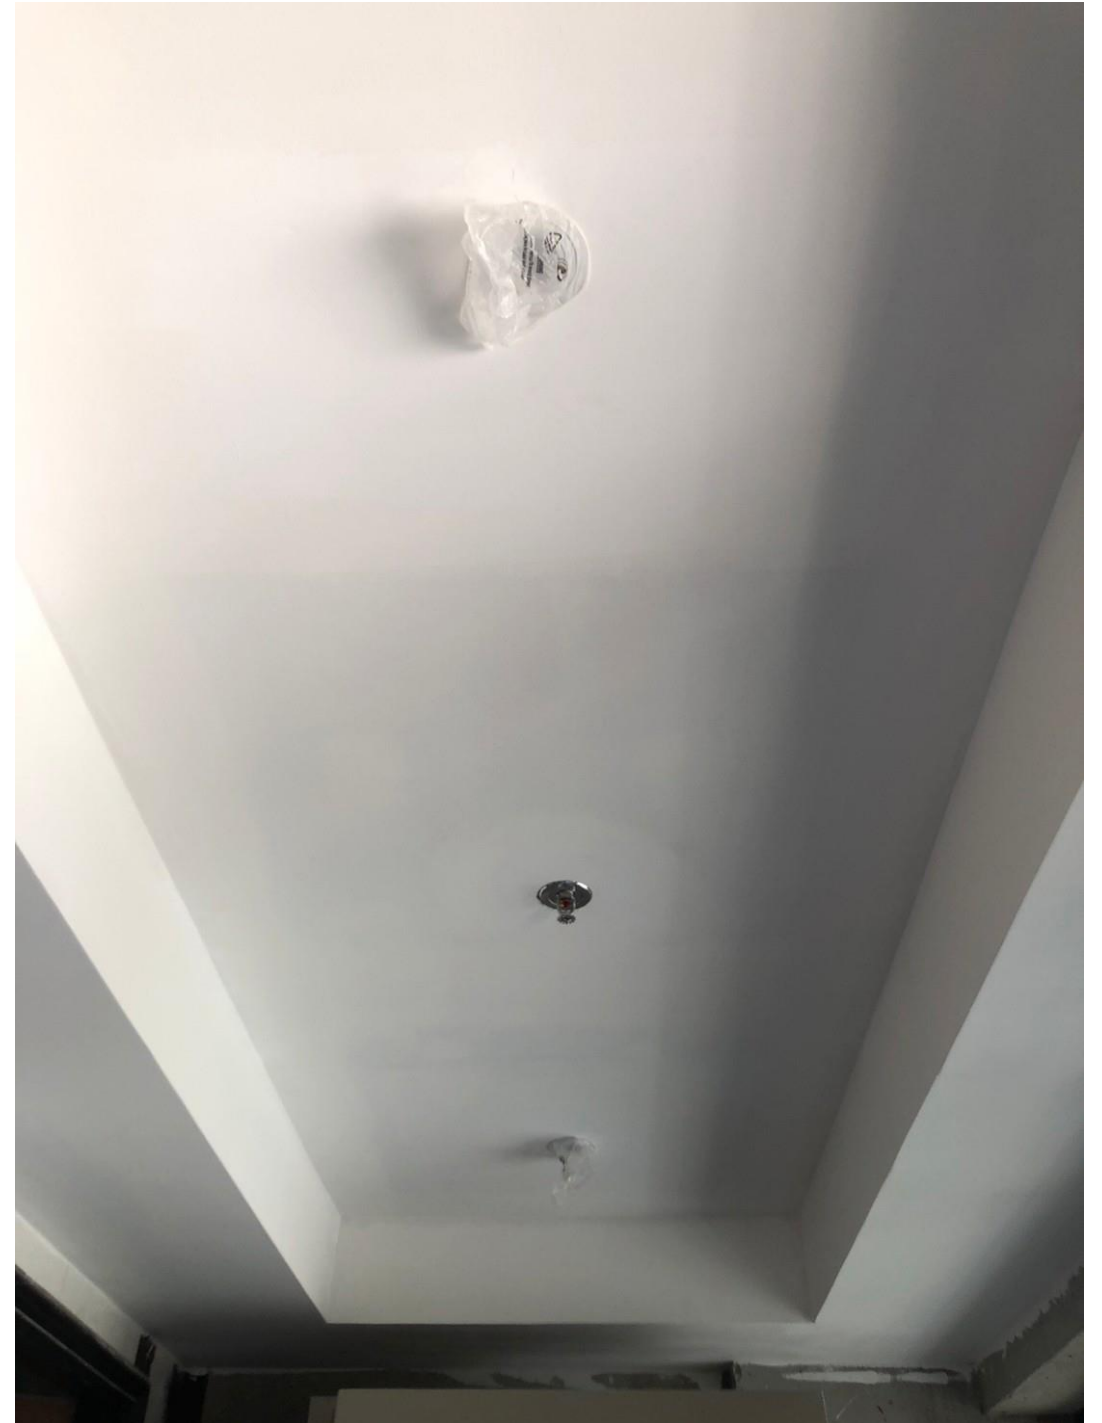

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้ง Control Lighting และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน พร้อมเข้าสายบริเวณห้องไฟฟ้า
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6-12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14

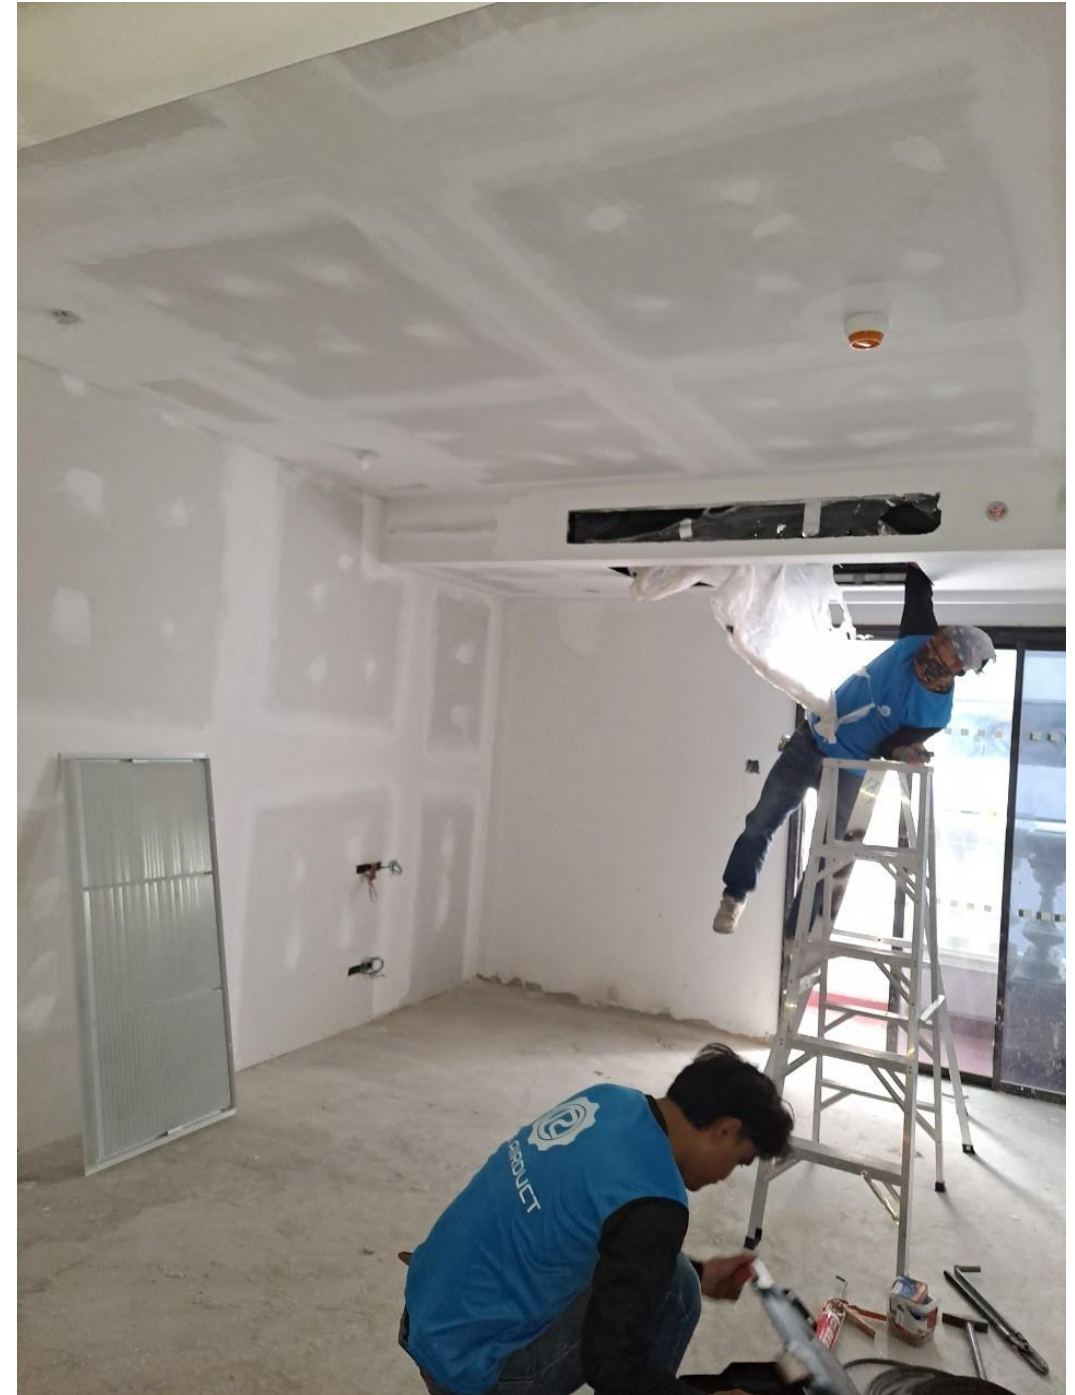

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานใส่หัวสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 14

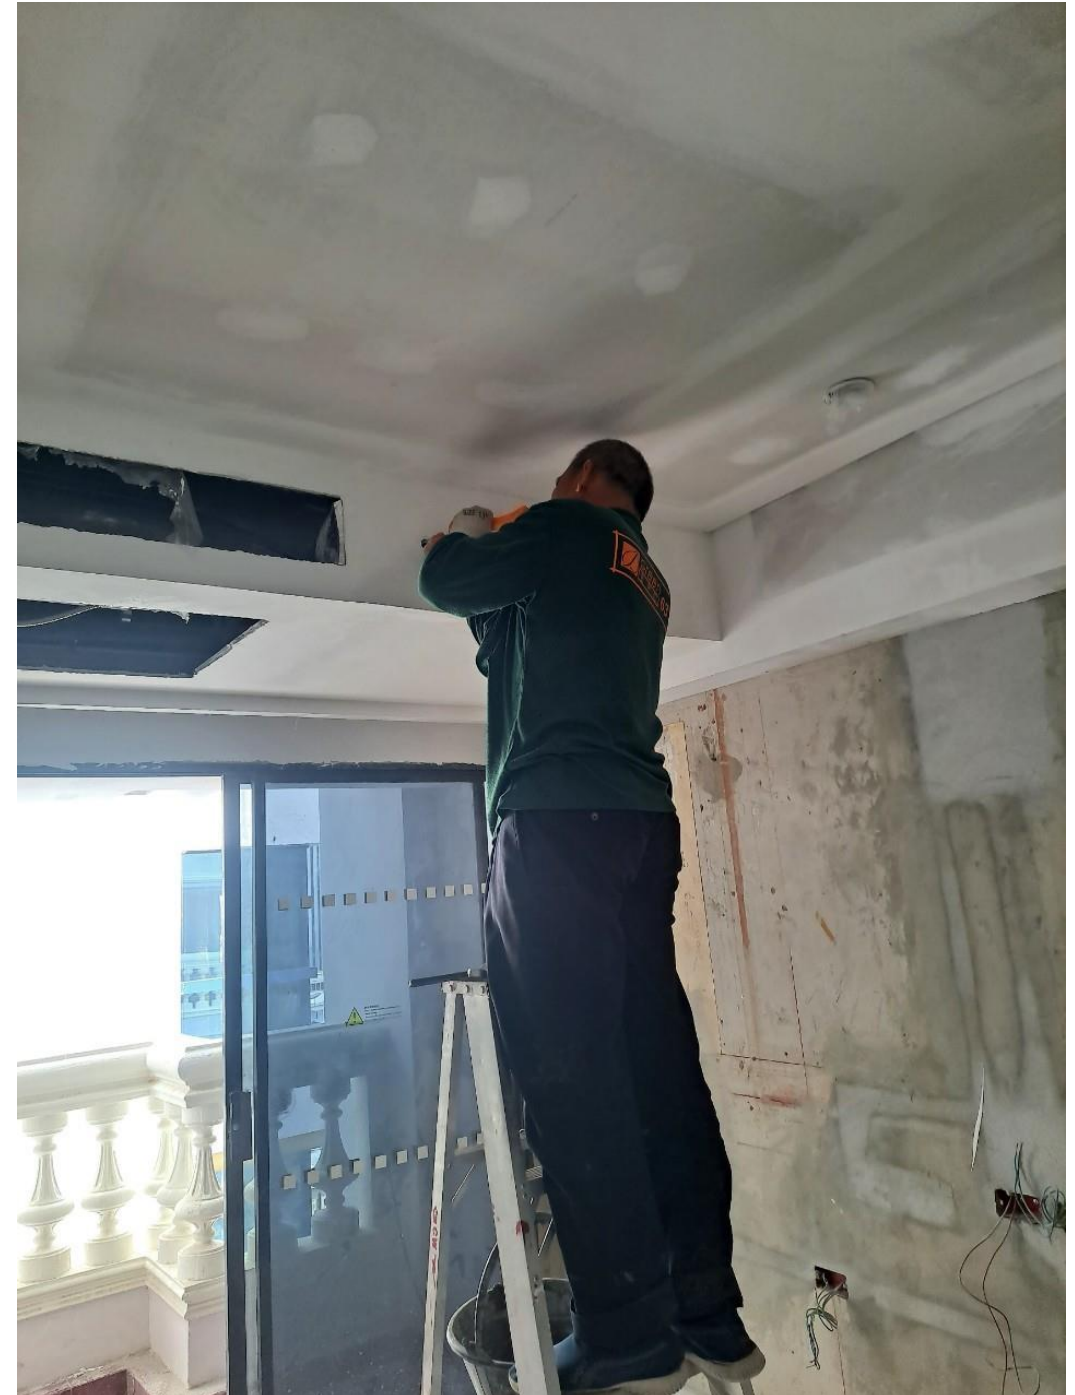

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) และใส่หัวสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) และใส่หัวสปริงเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 14




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12

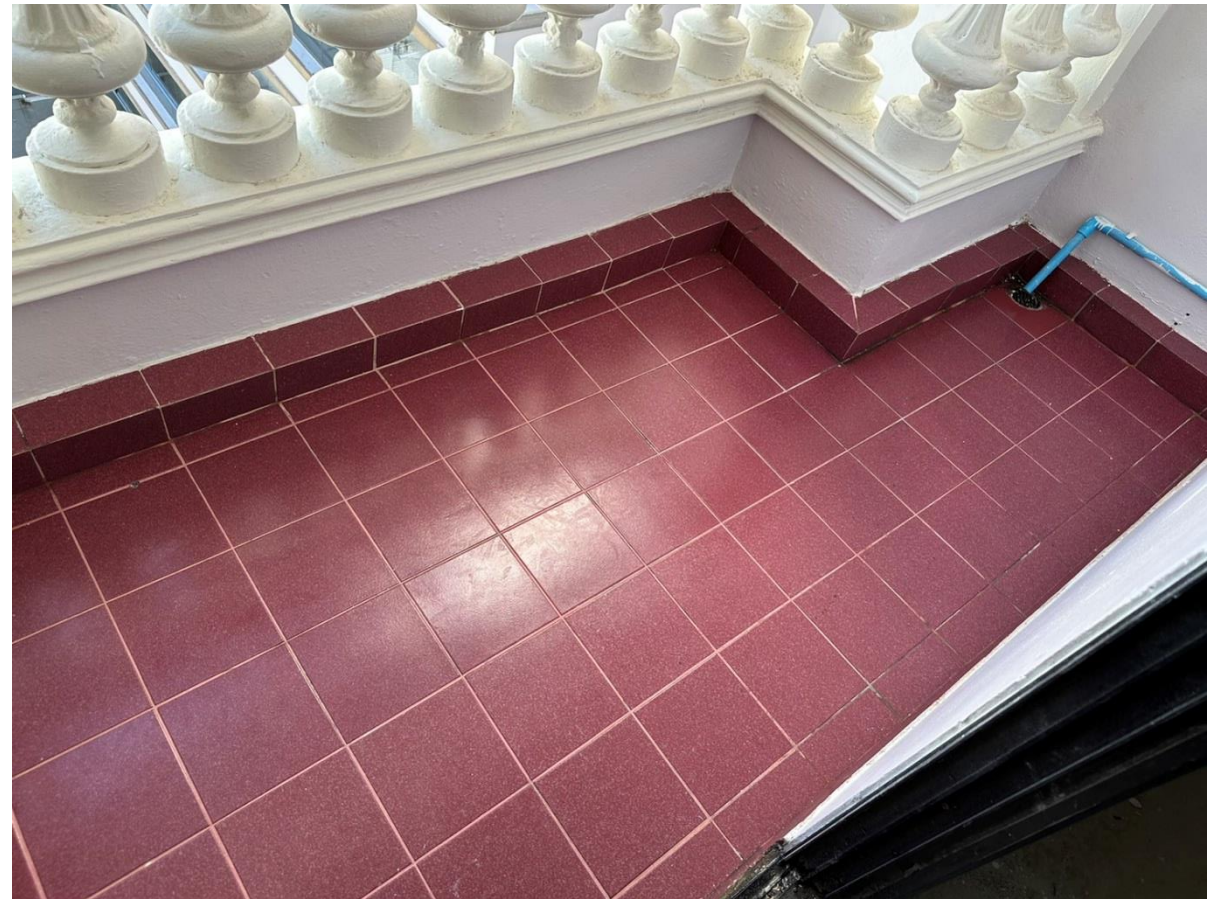

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานยาแนวกระเบื้องเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11

