



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

03 Aug 2023

แผนงาน KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารกรุงเทพ					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 10	29 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 3 ก.ค. 66
1.2	ชั้น 11	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 3 ก.ค. 66
1.3	ชั้น 12	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 6 ก.ค. 66
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 14	3 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 6 ก.ค. 66
2.2	ชั้น 15	7 ก.ค. 66	8 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 11 ก.ค. 66
2.3	ชั้น 16	10 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 12 ก.ค. 66
						รอกงาน Wall Paper Corridos
2.4	ชั้น 17	11 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 15 ก.ค. 67
						รอกงาน Wall Paper Corridos

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
3	(Phase 4)					
3.1	ชั้น 18	12 ก.ค. 66	13 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	70%	รองาน Wall Paper Corridos
3.2	ชั้น 19	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	70%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 25 ก.ค. 67 รองาน Wall Paper Corridos
3.3	ชั้น 20	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	70%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 27 ก.ค. 67 รองาน Wall Paper Corridos
3.4	ชั้น 21	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos รองานทาสีผนัง และทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำ
4	(Phase 5)					
4.1	ชั้น 22	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	0%	
4.2	ชั้น 23	25 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	0%	
4.3	ชั้น 24	26 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	
4.4	ชั้น 25	28 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	1 ส.ค. 66	0%	


แผนงาน SIAM WING

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน


ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารสยาม					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 6	10 ก.ค. 66	9 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	100%	
1.2	ชั้น 10	14 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	100%	
1.3	ชั้น 11	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	90%	รองาน Wall Paper Corridos
						รองานทาสีผนัง
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 12	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	70%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos
						รองานทาสีผนัง
2.2	ชั้น 14	26 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	0%	รอทางงานตกแต่งภายในส่งมอบพื้นที่
2.3	ชั้น 15	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	

ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II

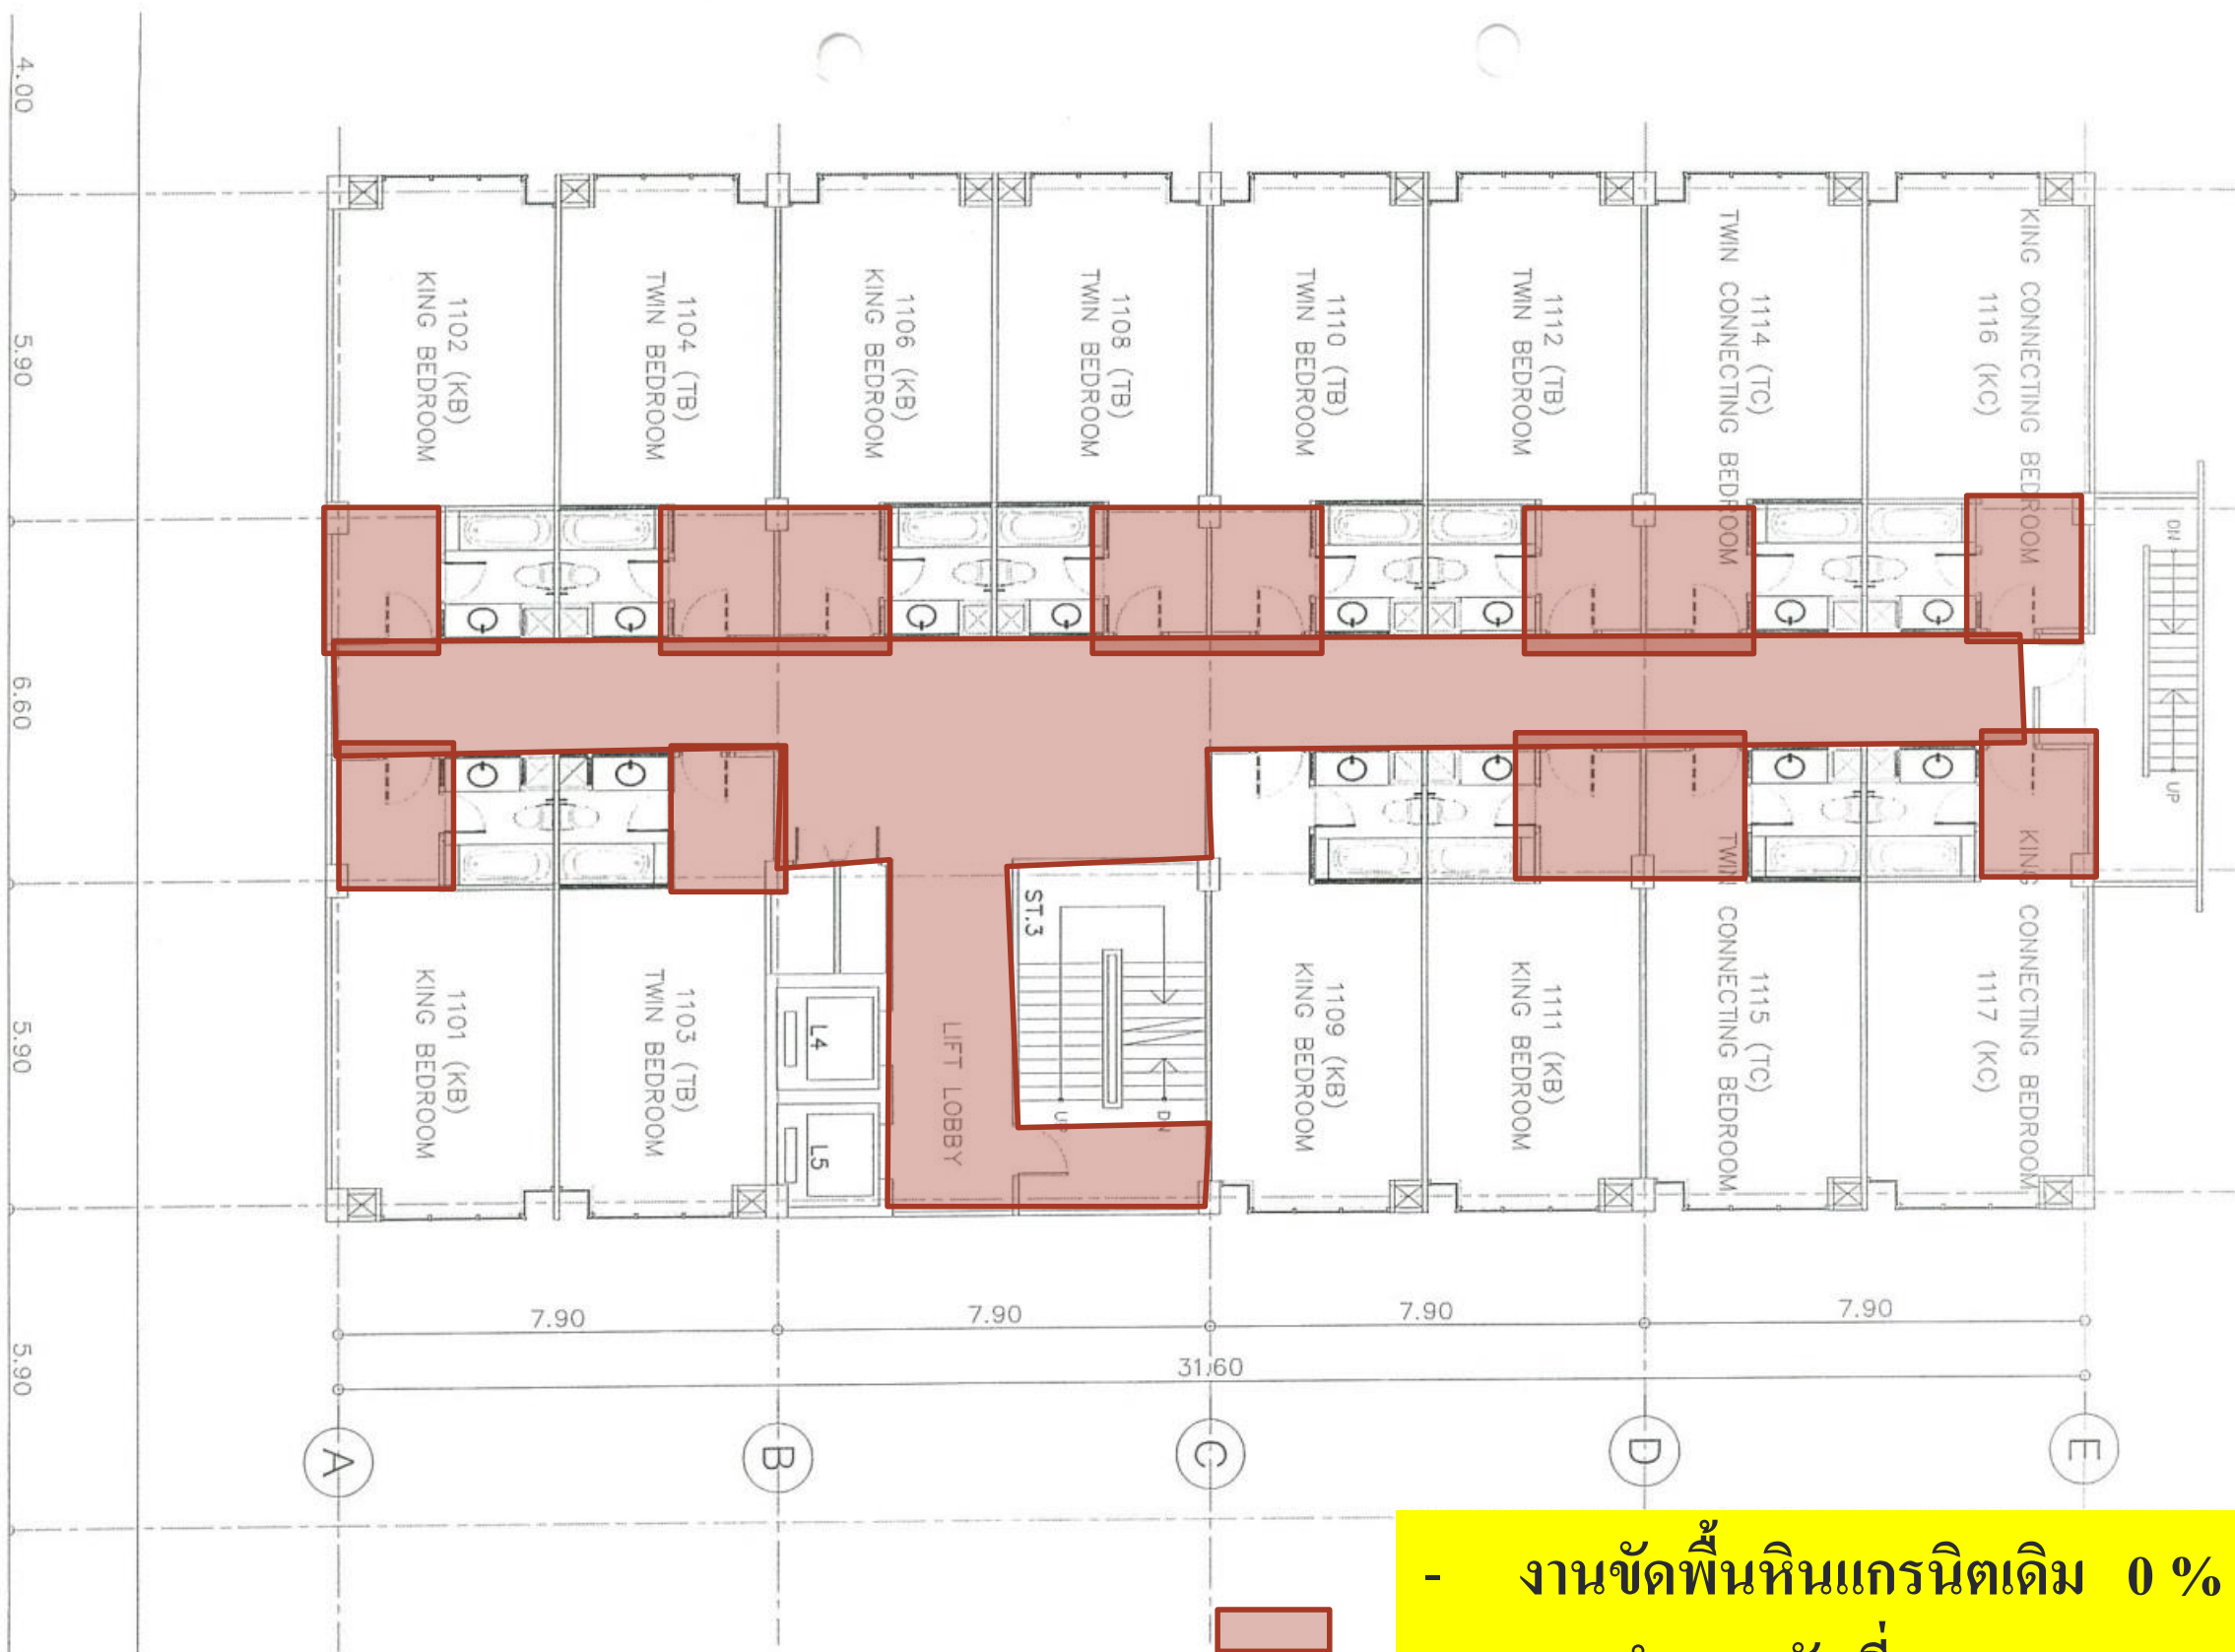

12 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 แผนงานกำหนดวันที่ 20/07/66

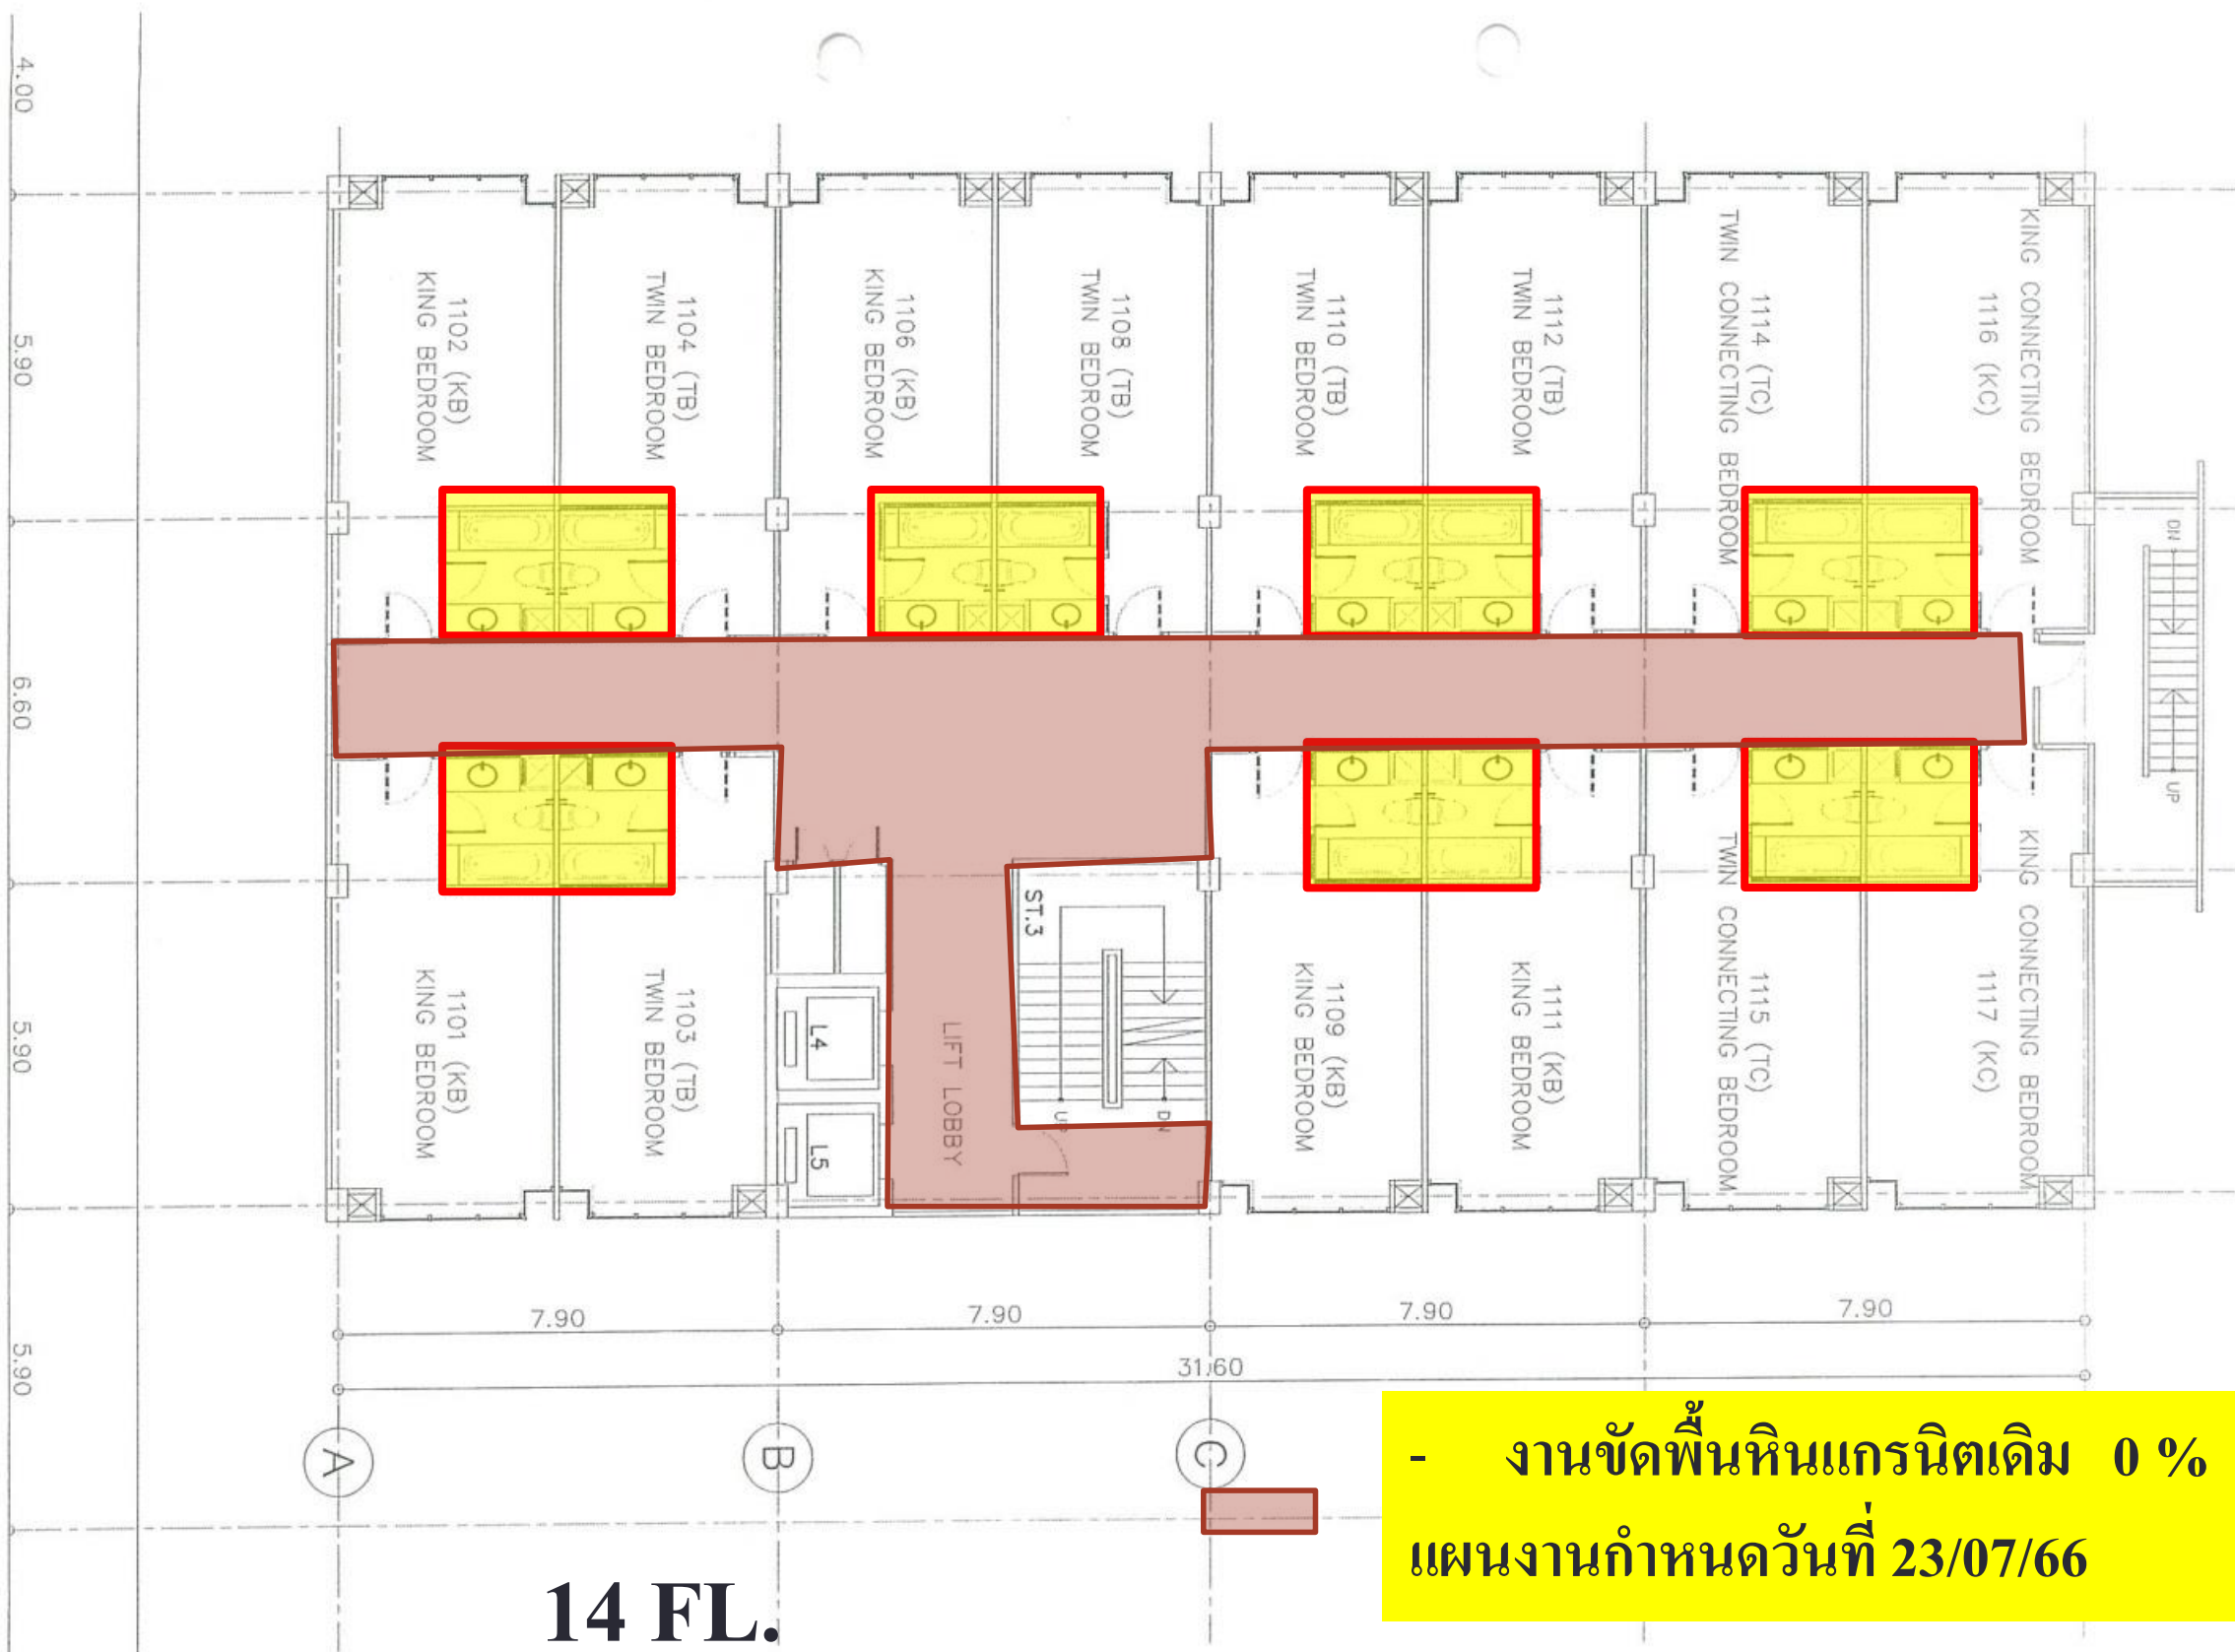

14 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- แผนงานกำหนดวันที่ 23/07/66



15 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 26/07/66

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งระบบ Keycard บริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 20-21




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง โคมไฟบริเวณห้องน้ำของห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 20



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 20-21

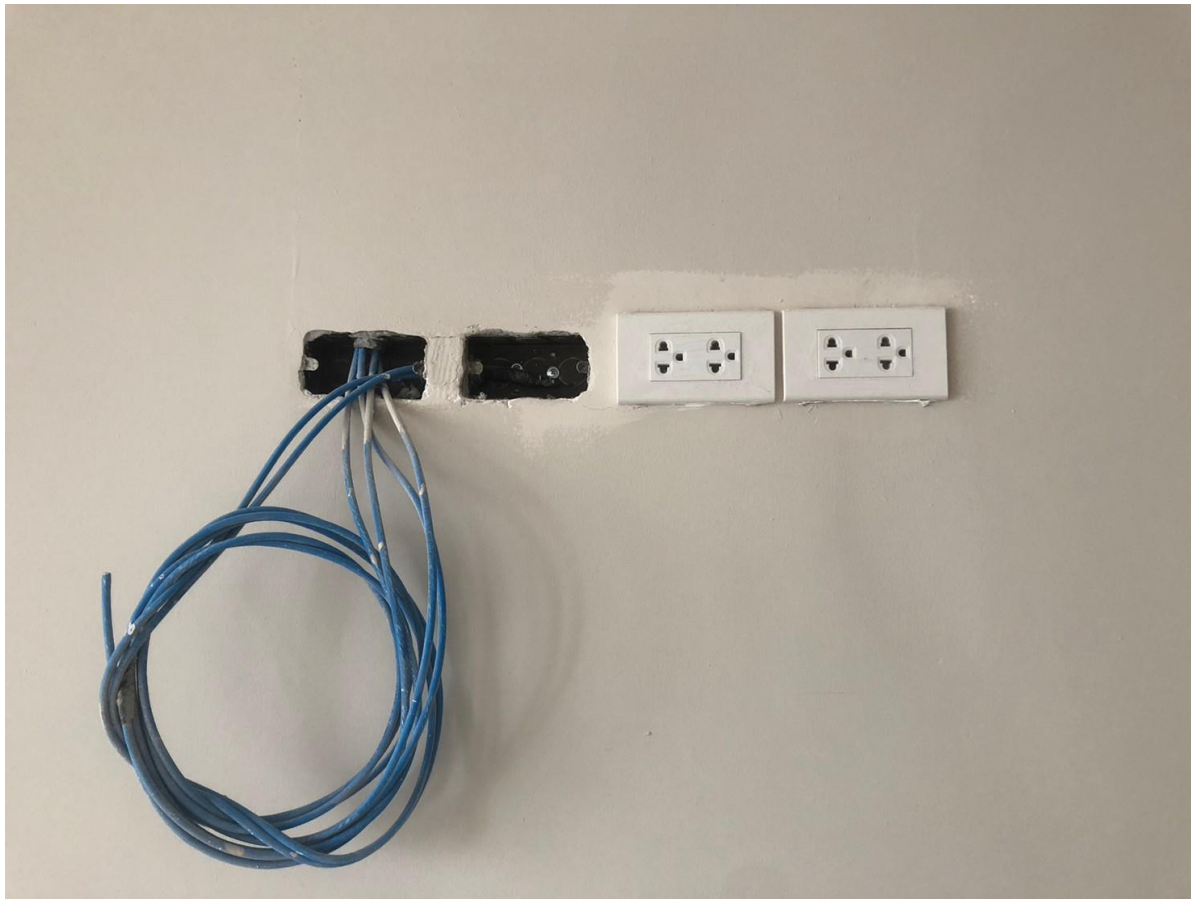

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งป้ายแสดงสถานะบริเวณหน้าห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 20-21



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียงภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-20



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียงภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-20




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ Control Lighting และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน บริเวณหน้าลิฟต์ Service อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17-19




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานทดสอบระบบ Fire Alarm บริเวณห้องพักและ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-25

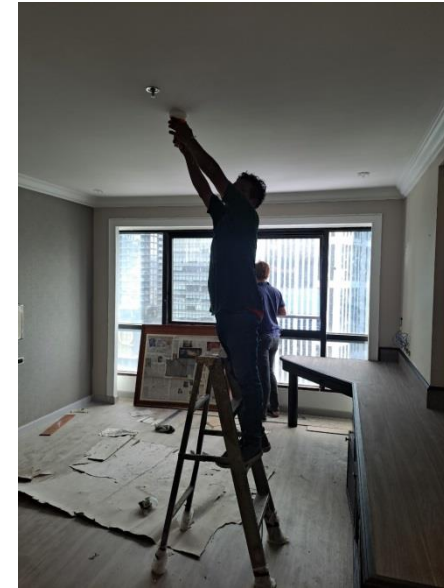



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานทดสอบระบบ Fire Alarm บริเวณห้องพักและ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-25

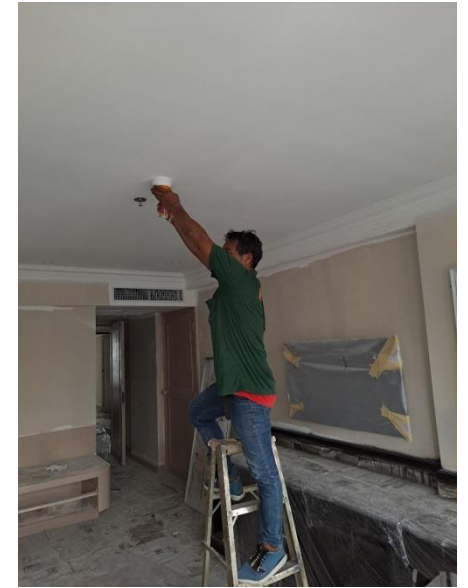



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบอุณหภูมิน้ำร้อนบริเวณห้องน้ำของห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-25

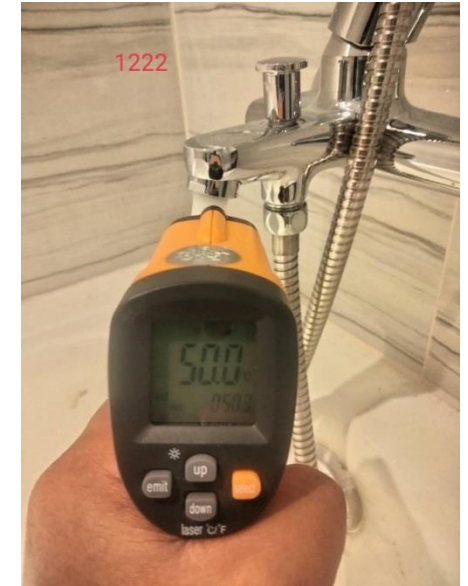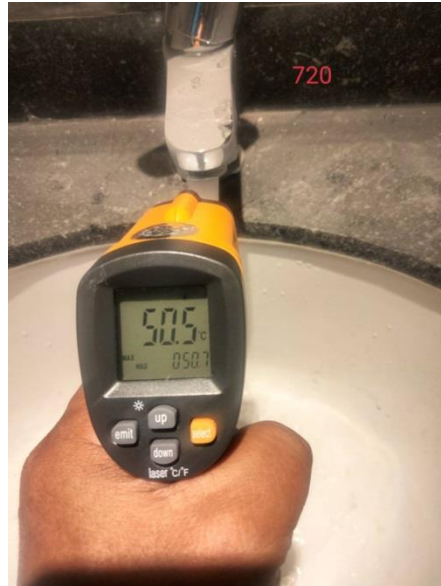

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบอุณหภูมิน้ำร้อนบริเวณห้องน้ำของห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-25

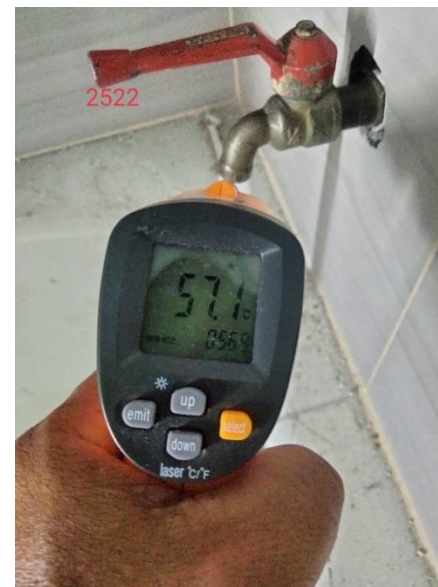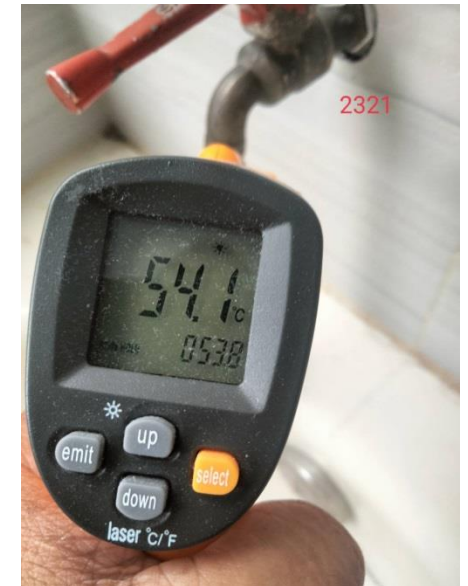

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug ฝั่งผนังที่บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 14-15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Keycard บริเวณหน้าห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้ง Thermo Room บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 14-15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 10

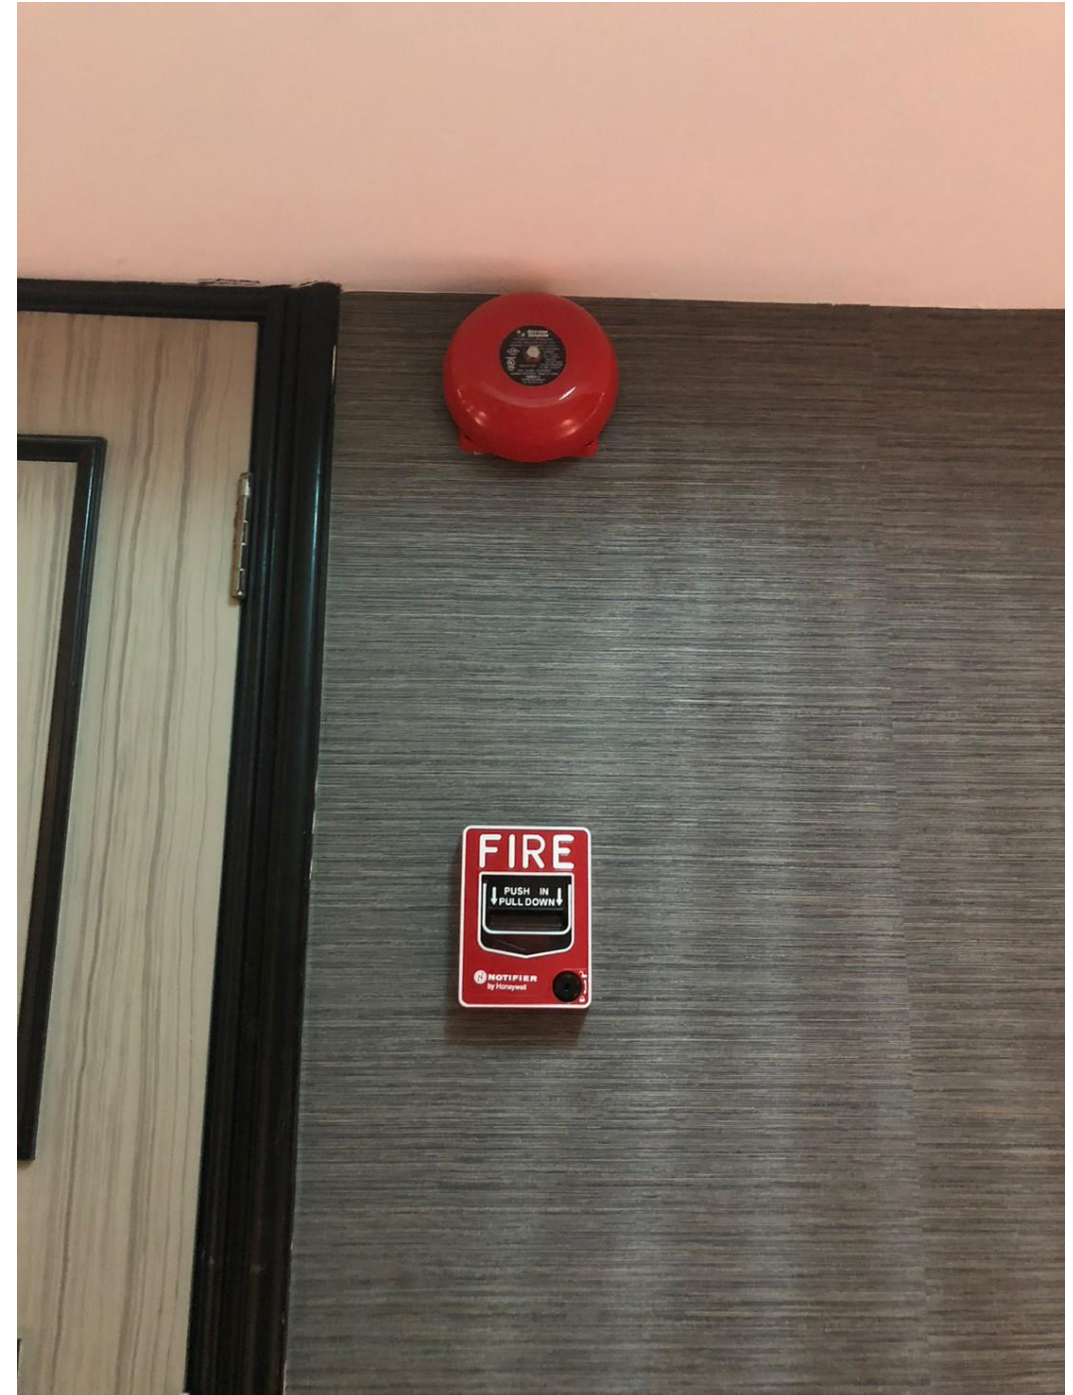

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานขัดพื้นหินของเดิมบริเวณห้องพักและ Corridor
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานขัดพื้นหินของเดิมบริเวณห้องพักและ Corridor
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานขัดพื้นหินของเดิมบริเวณห้องพักและ Corridor
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานทดสอบระบบ Fire Alarm บริเวณ ห้องพักและ Corridor
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11-15

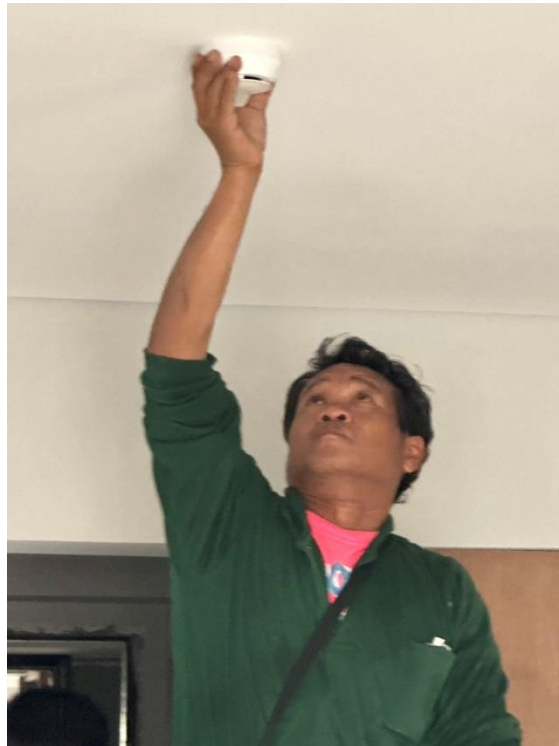

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบอุณหภูมิน้ำร้อนบริเวณ ห้องน้ำของห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 11-15

