



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

06 JULY 2023

แผนงาน KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารกรุงเทพ					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 10	29 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	90%	ได้รับพื้นที่วันที่ 3 ก.ค. 66
1.2	ชั้น 11	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	50%	ได้รับพื้นที่วันที่ 3 ก.ค. 66
1.3	ชั้น 12	30 มิ.ย. 66	1 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	0%	ได้รับพื้นที่วันที่ 6 ก.ค. 67
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 14	3 ก.ค. 66	4 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66	0%	
2.2	ชั้น 15	7 ก.ค. 66	8 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	0%	
2.3	ชั้น 16	10 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	0%	
2.4	ชั้น 17	11 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	0%	

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
3	(Phase 4)					
3.1	ชั้น 18	12 ก.ค. 66	13 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	0%	
3.2	ชั้น 19	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	
3.3	ชั้น 20	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	
3.4	ชั้น 21	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	0%	
4	(Phase 5)					
4.1	ชั้น 22	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	0%	
4.2	ชั้น 23	25 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	0%	
4.3	ชั้น 24	26 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	
4.4	ชั้น 25	28 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	1 ส.ค. 66	0%	

แผนงาน SIAM WING

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน


ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารสยาม					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 6	10 ก.ค. 66	9 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	0%	
1.2	ชั้น 10	14 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	0%	
1.3	ชั้น 11	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	0%	
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 12	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	0%	
2.2	ชั้น 14	26 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	0%	
2.3	ชั้น 15	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	0%	

ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II



- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 7/07/66


6 FL.

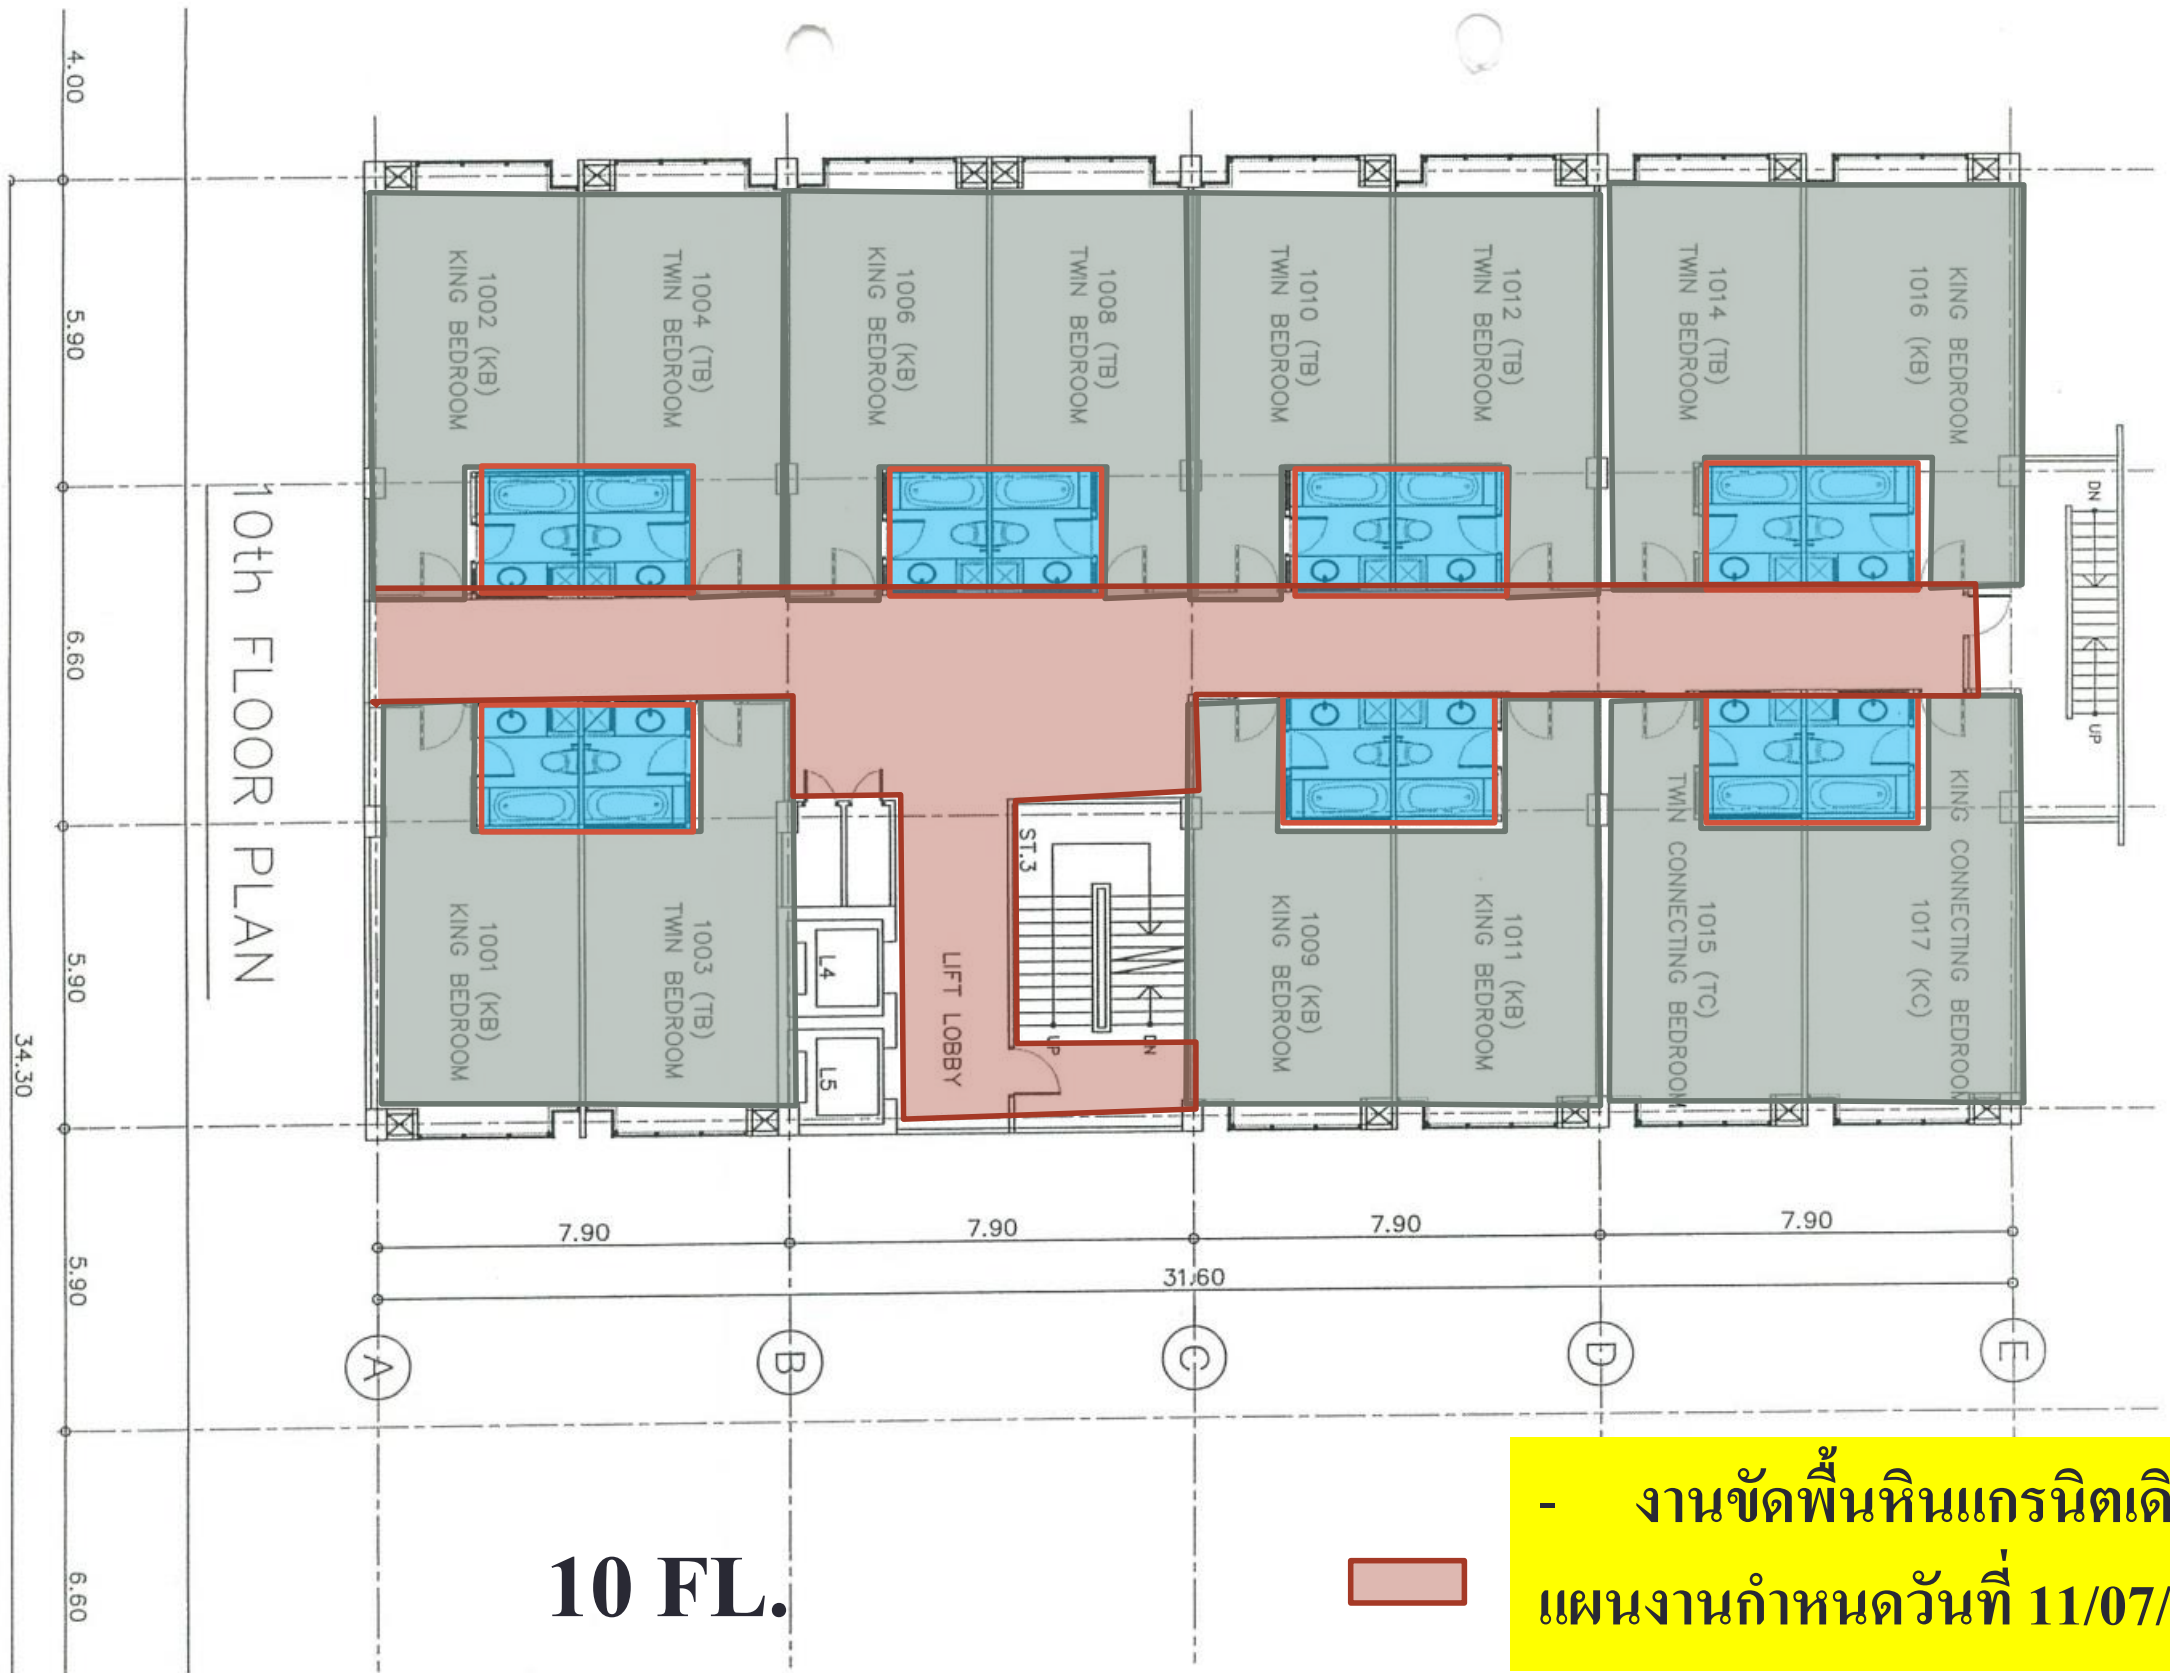

10 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 11/07/66

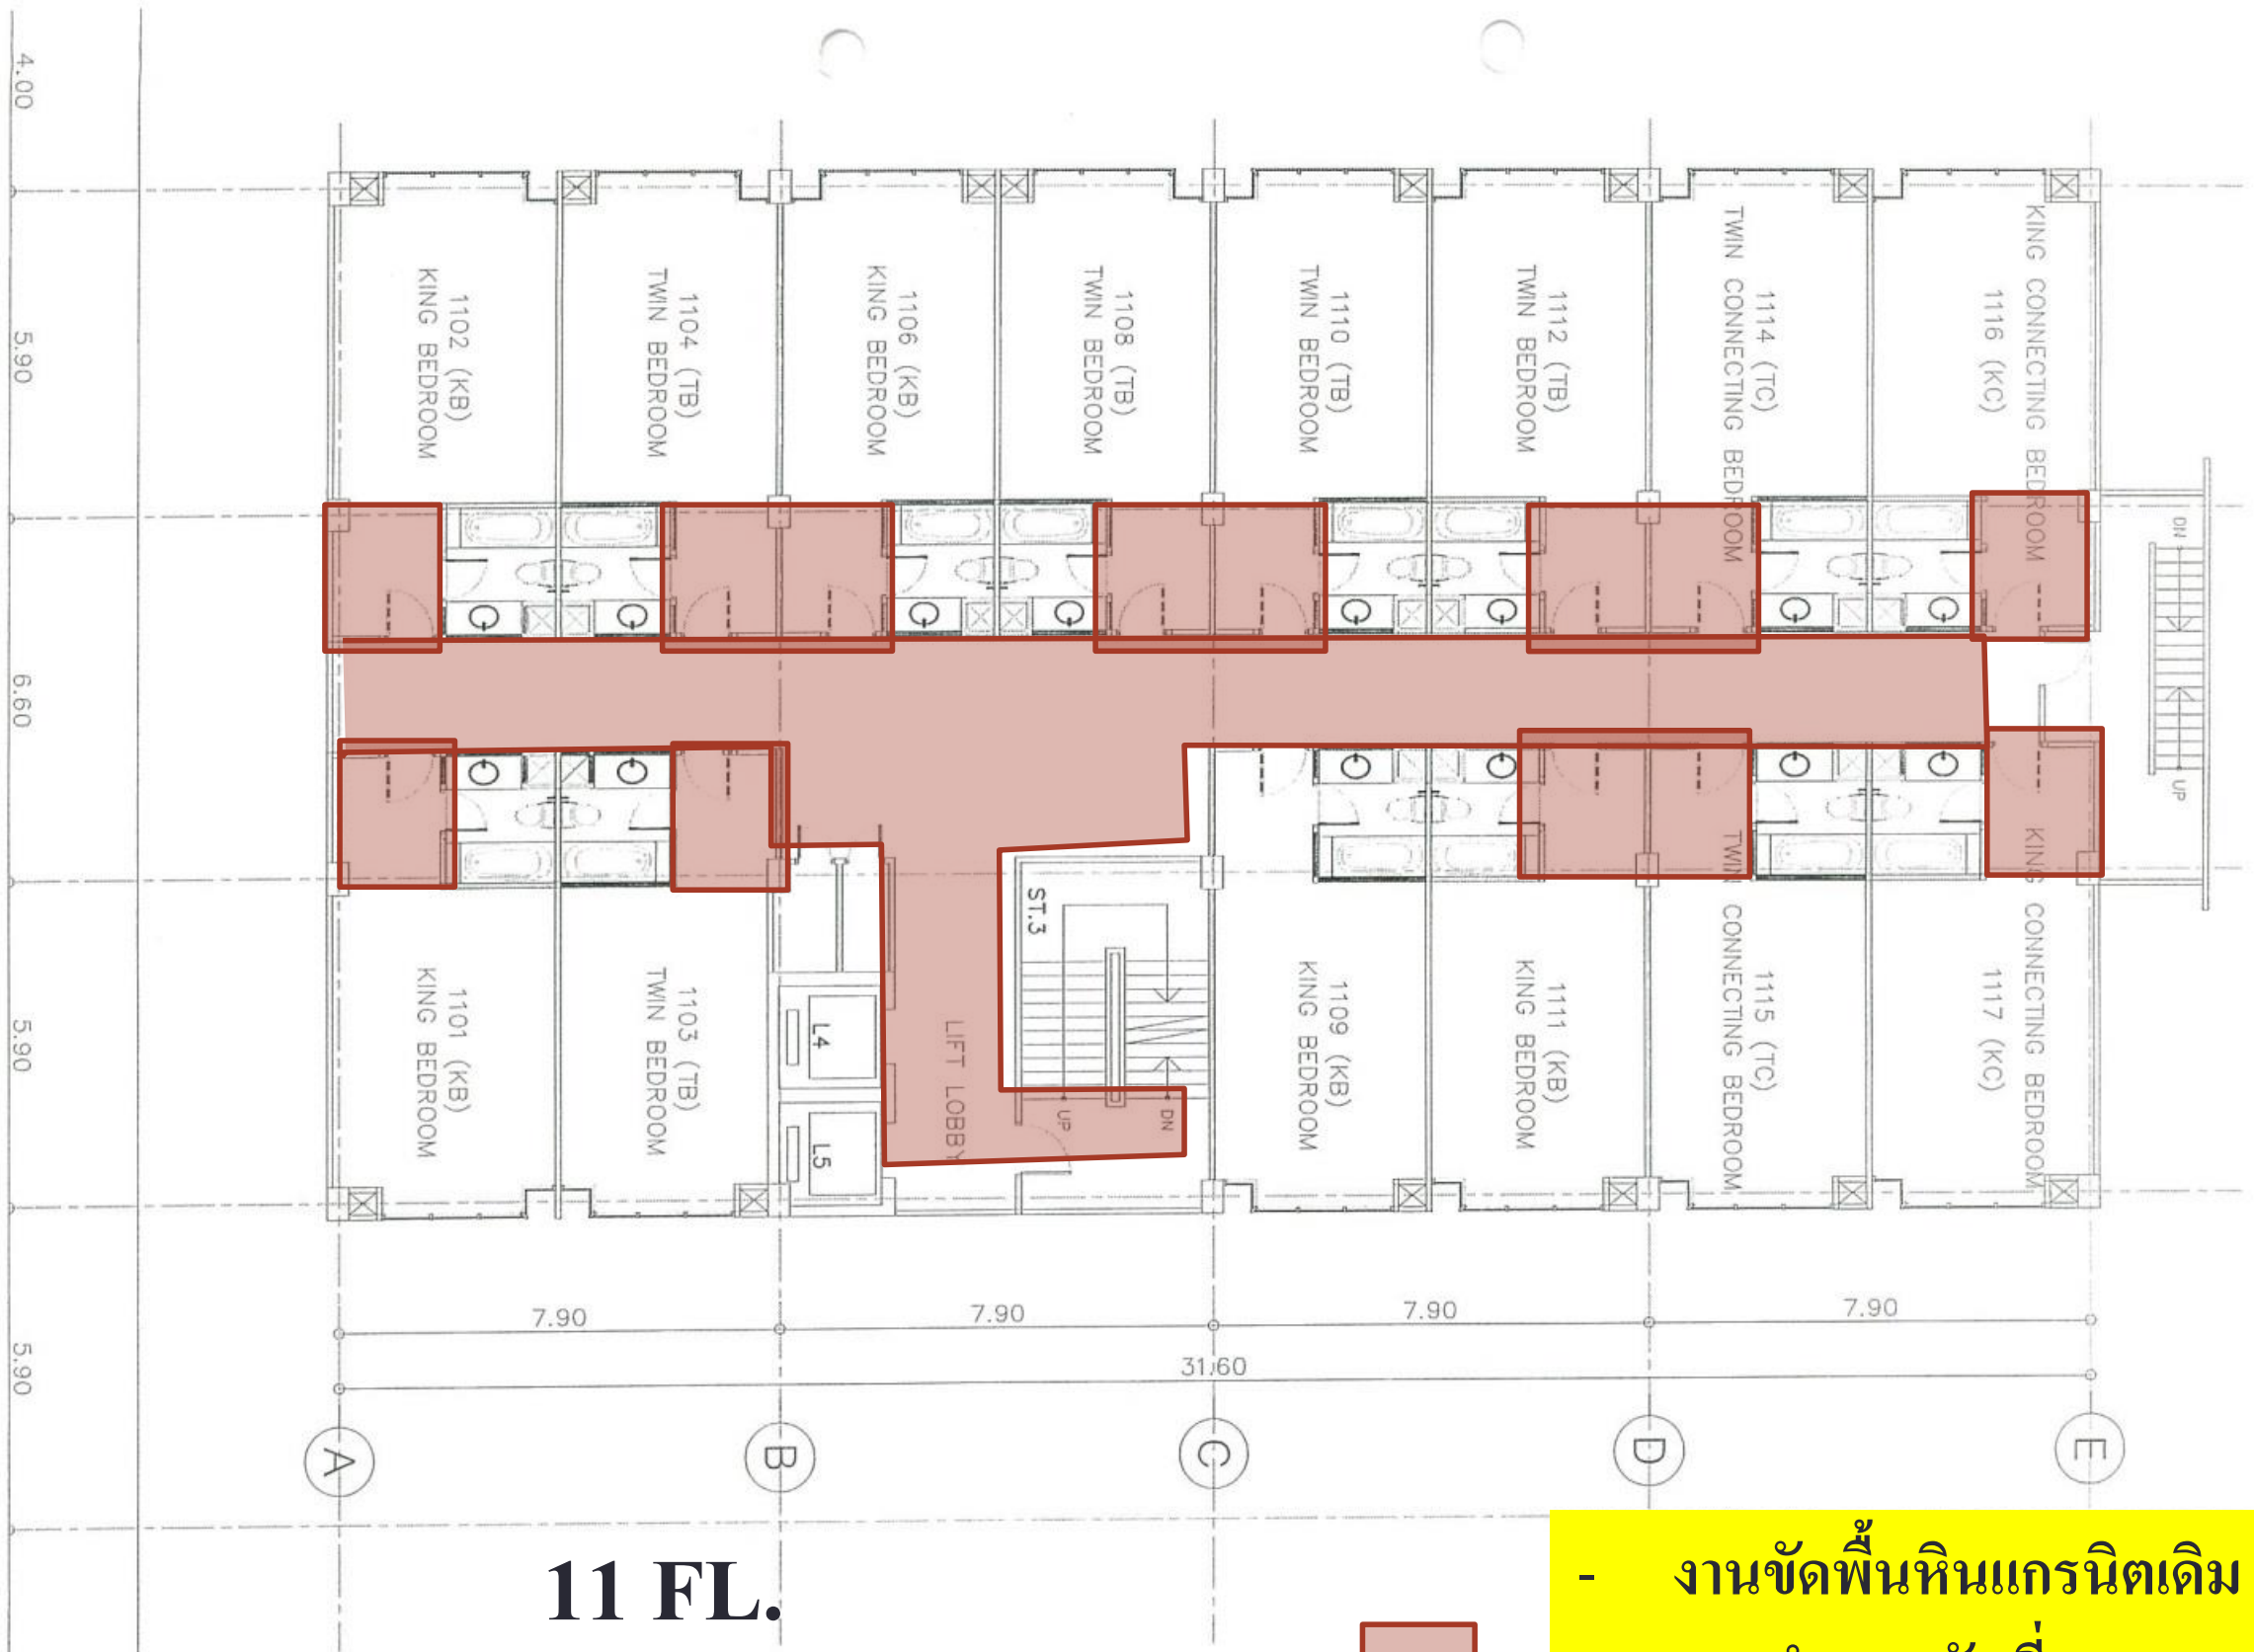

11 FL.




- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- แผนงานกำหนดวันที่ 15/07/66

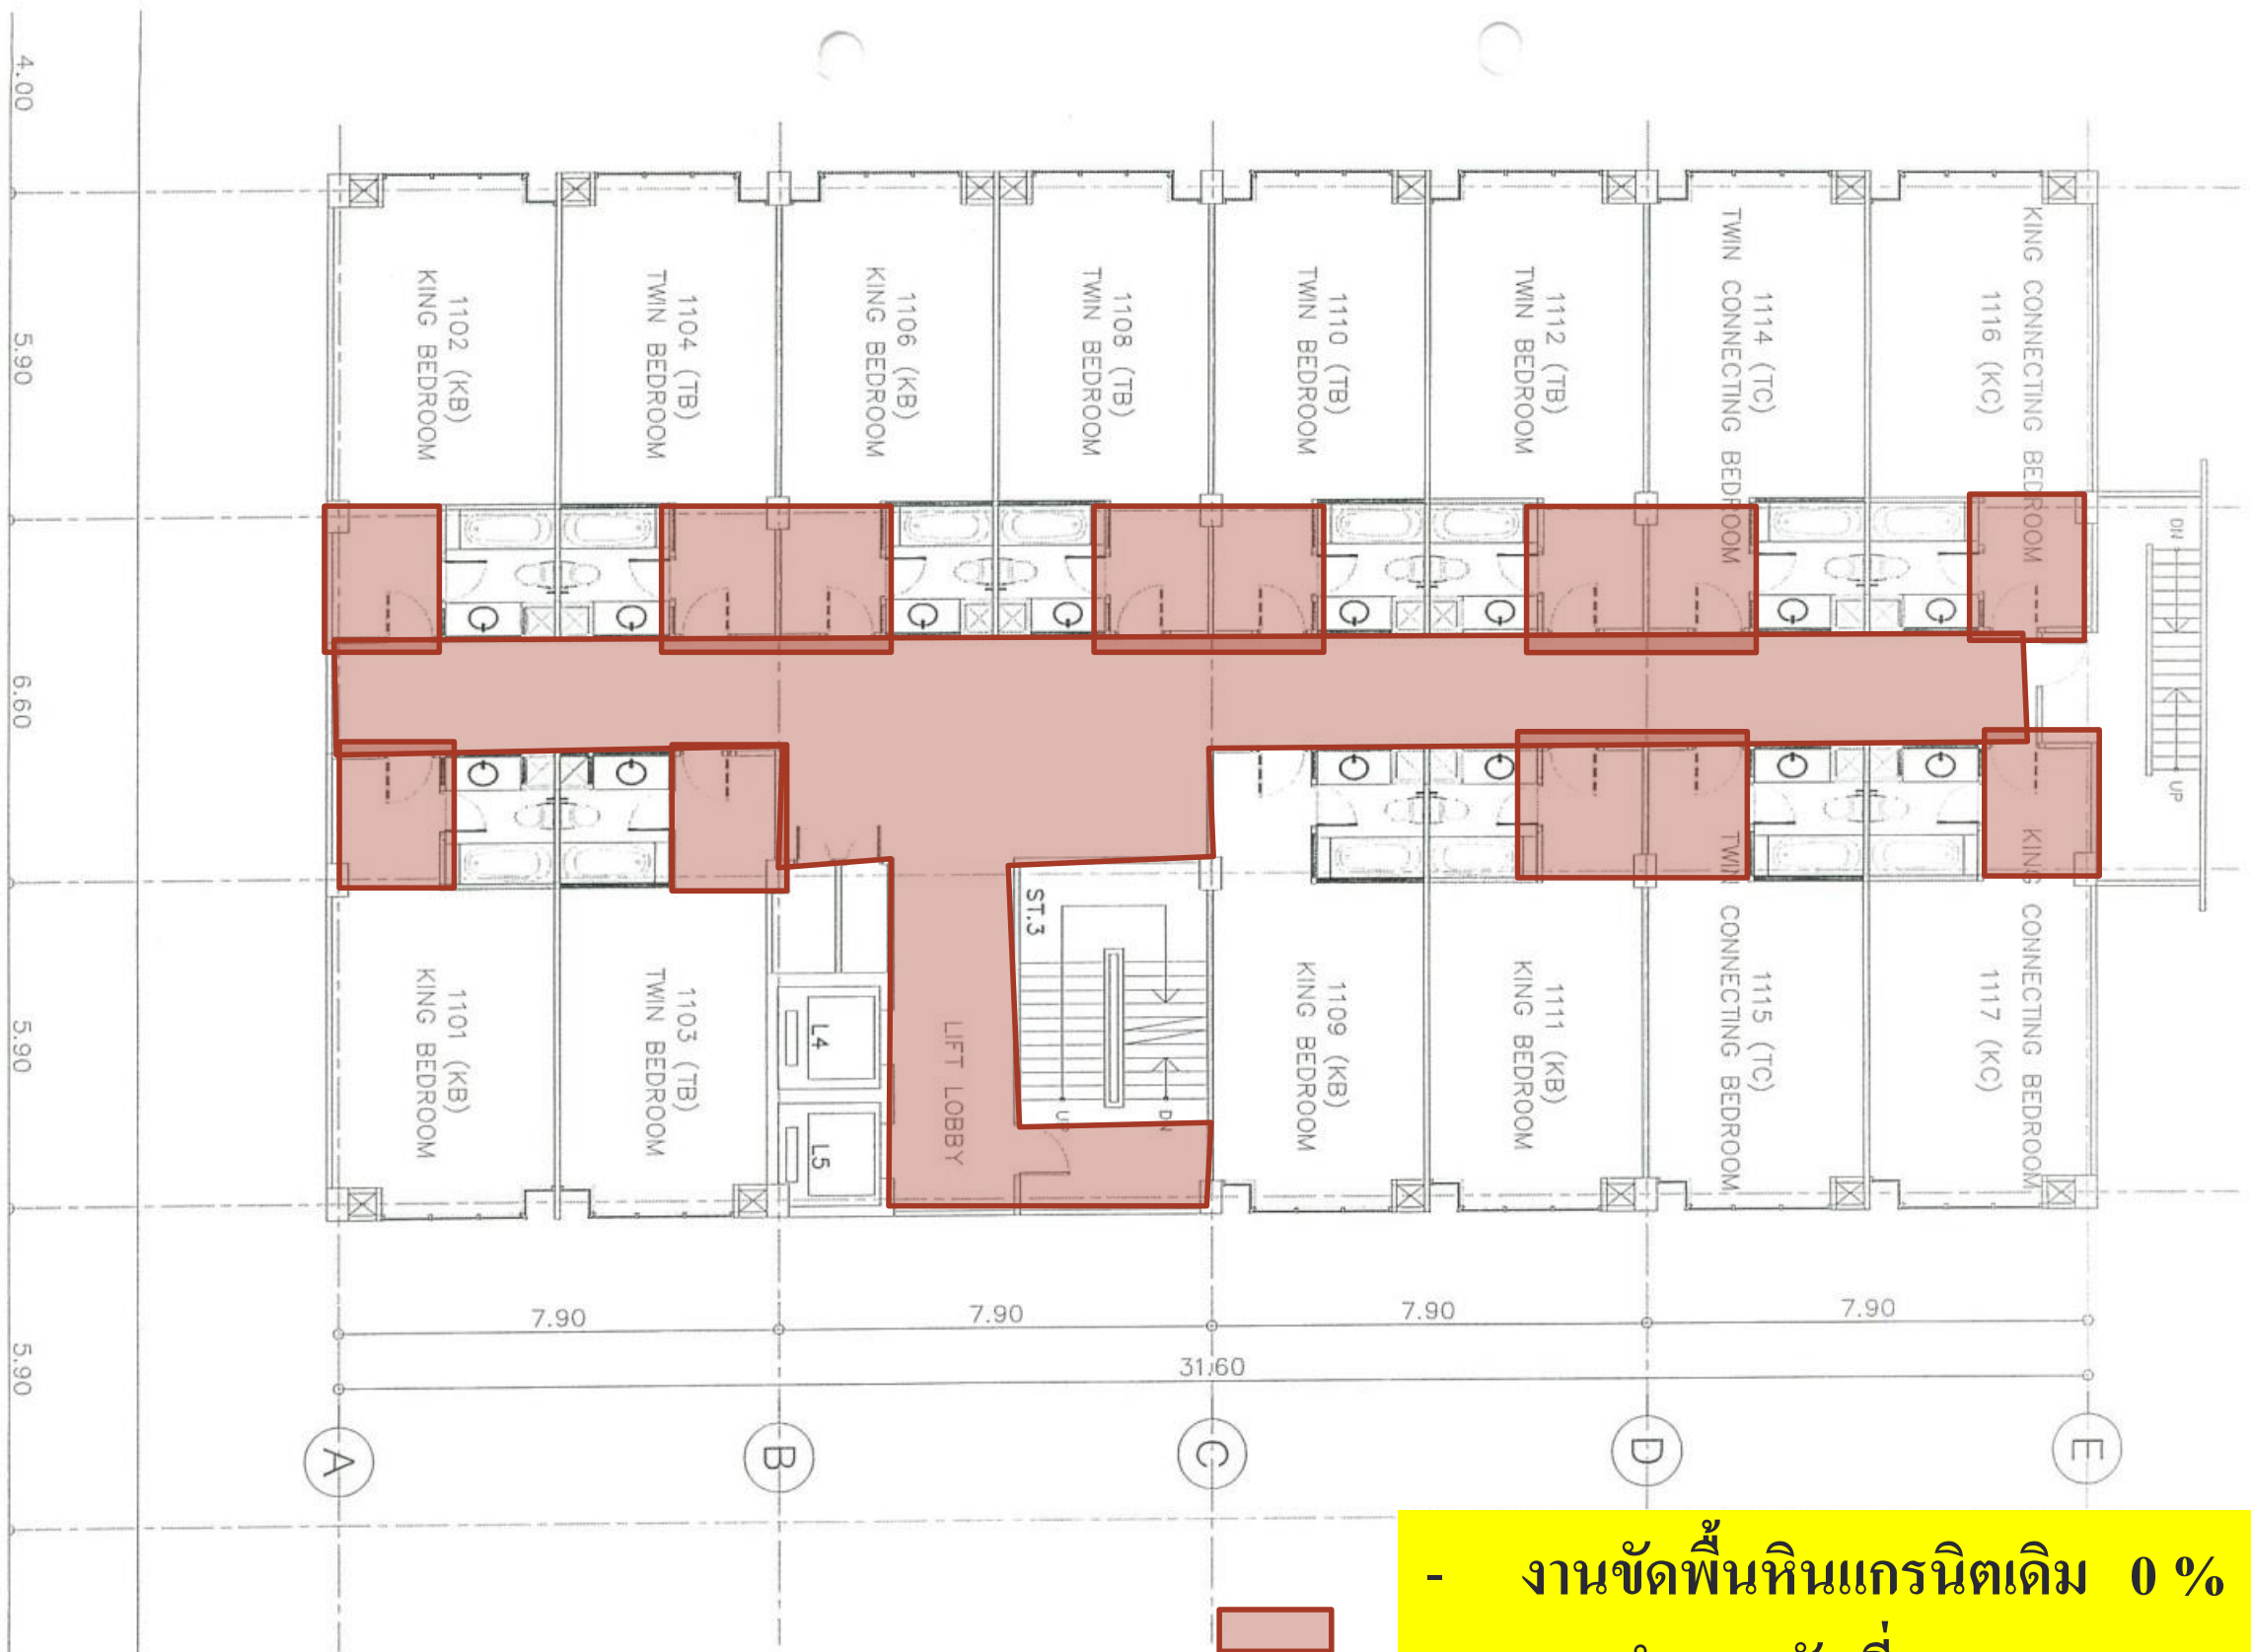

12 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 แผนงานกำหนดวันที่ 20/07/66

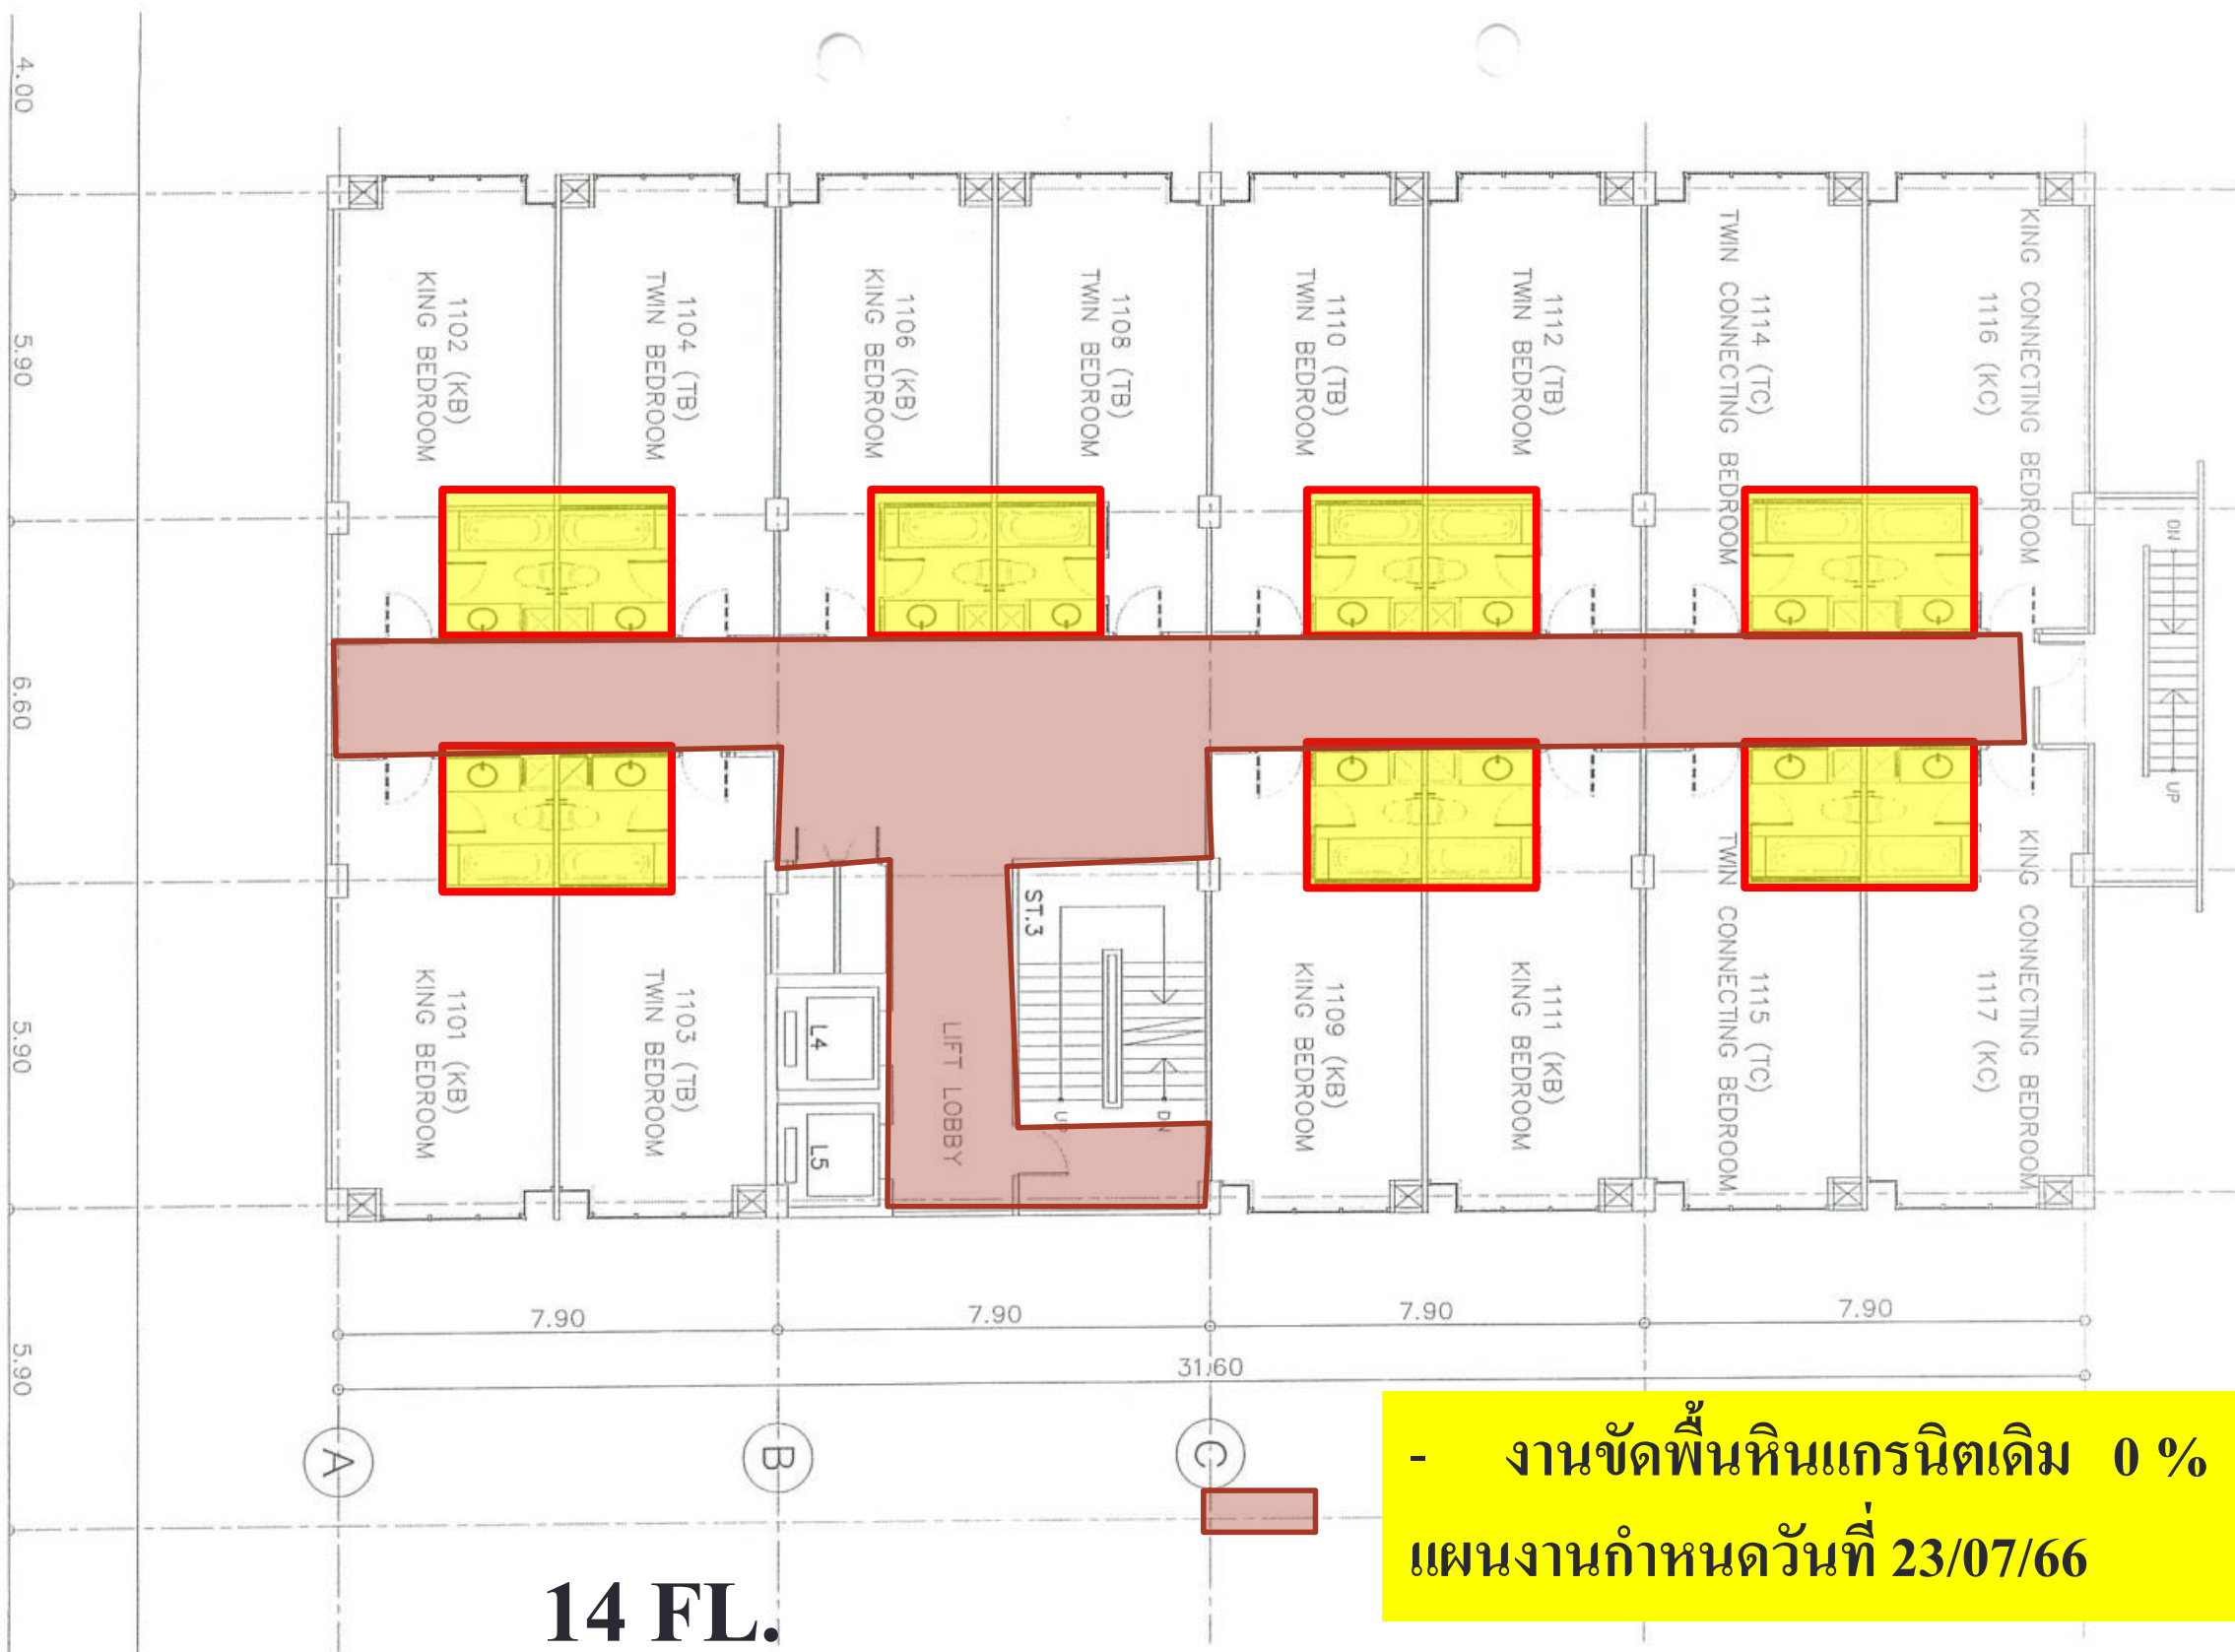

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
- แผนงานกำหนดวันที่ 23/07/66



15 FL.

- งานขัดพื้นหินแกรนิตเดิม 0 %
 - แผนงานกำหนดวันที่ 26/07/66

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายสำหรับจ่าย Emer บริเวณหน้าลิฟต์ Service อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 7-12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





งานติดตั้งคอมไฟบริเวณห้องพัก อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟท์เตียงพร้อมทดสอบระบบวงจรไฟฟ้าภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15

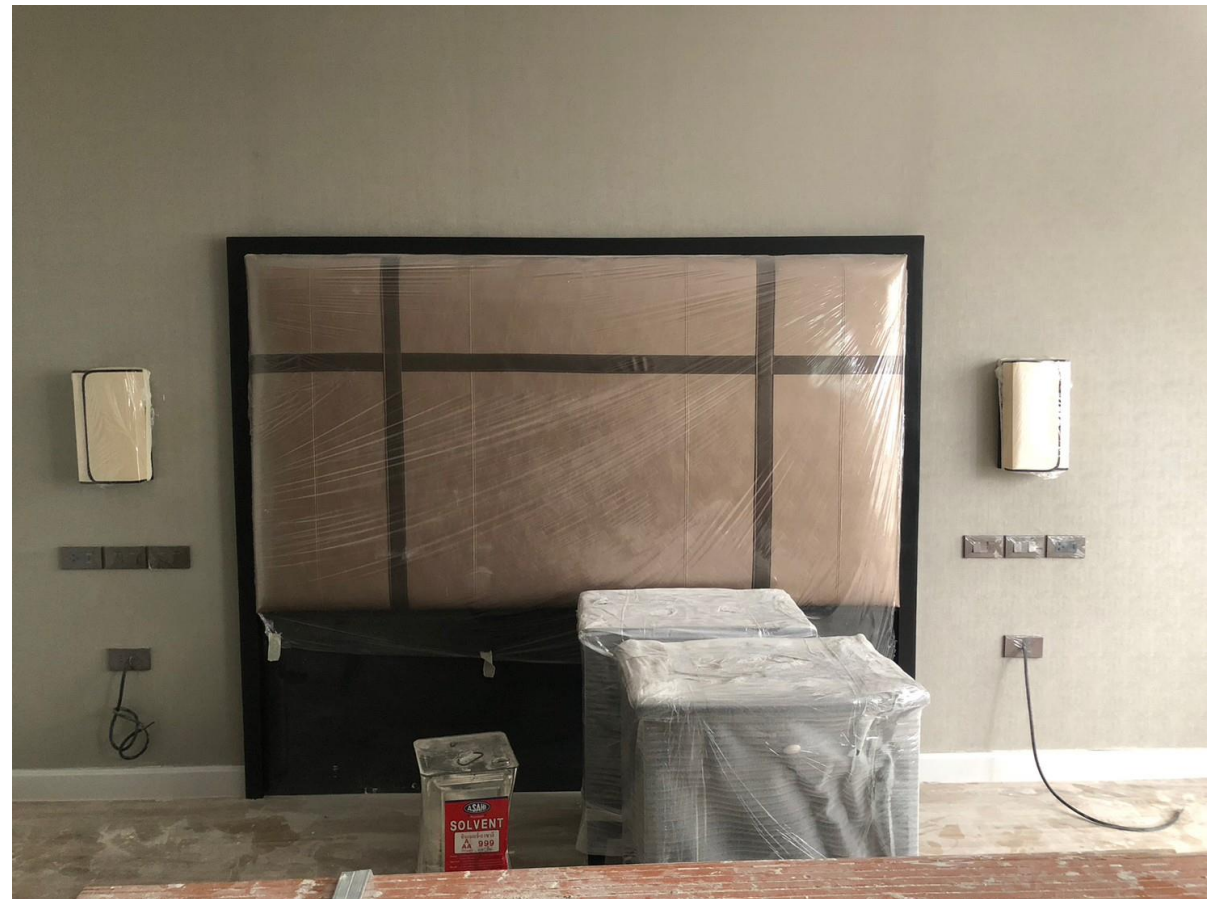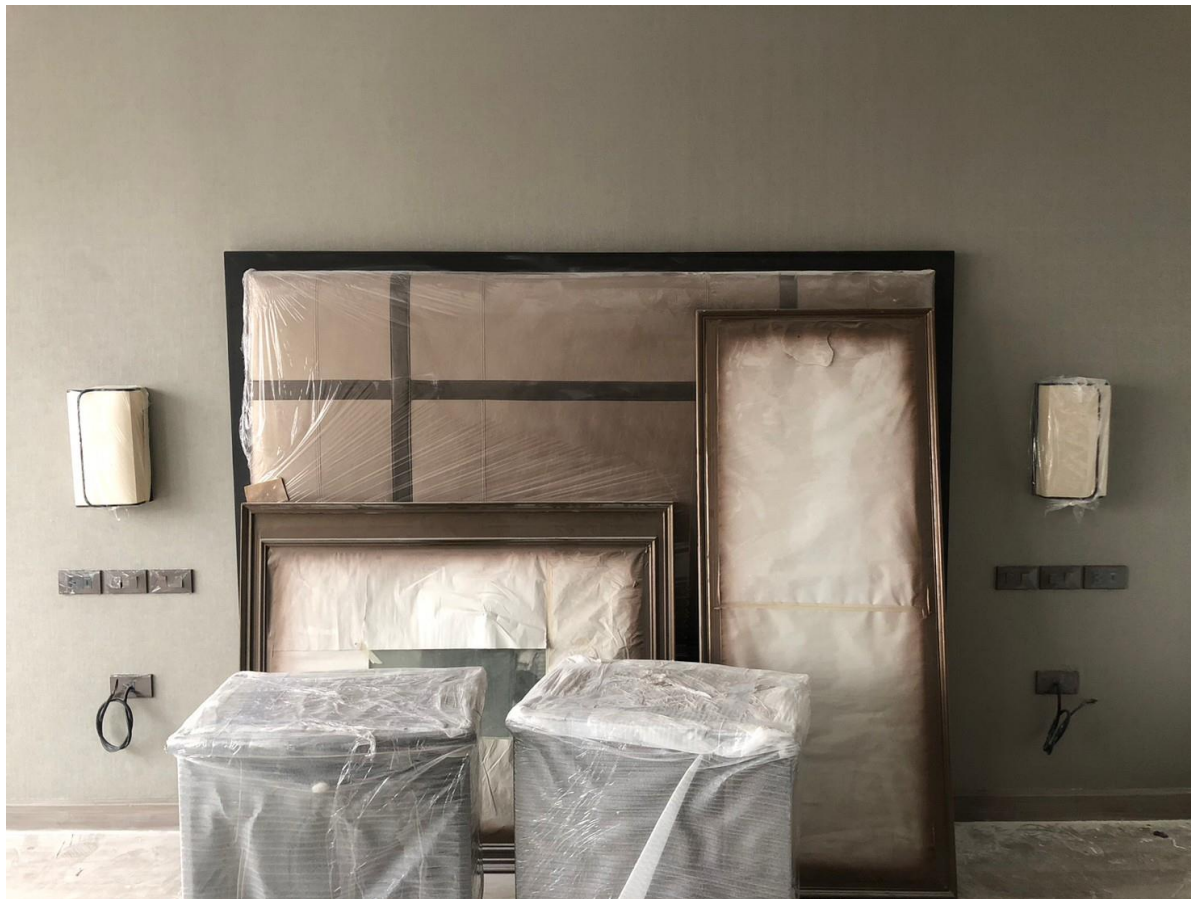


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟหัวเตียงพร้อมทดสอบระบบวงจรไฟฟ้าภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟท์เวียงพร้อมทดสอบระบบวงจรไฟฟ้าภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15

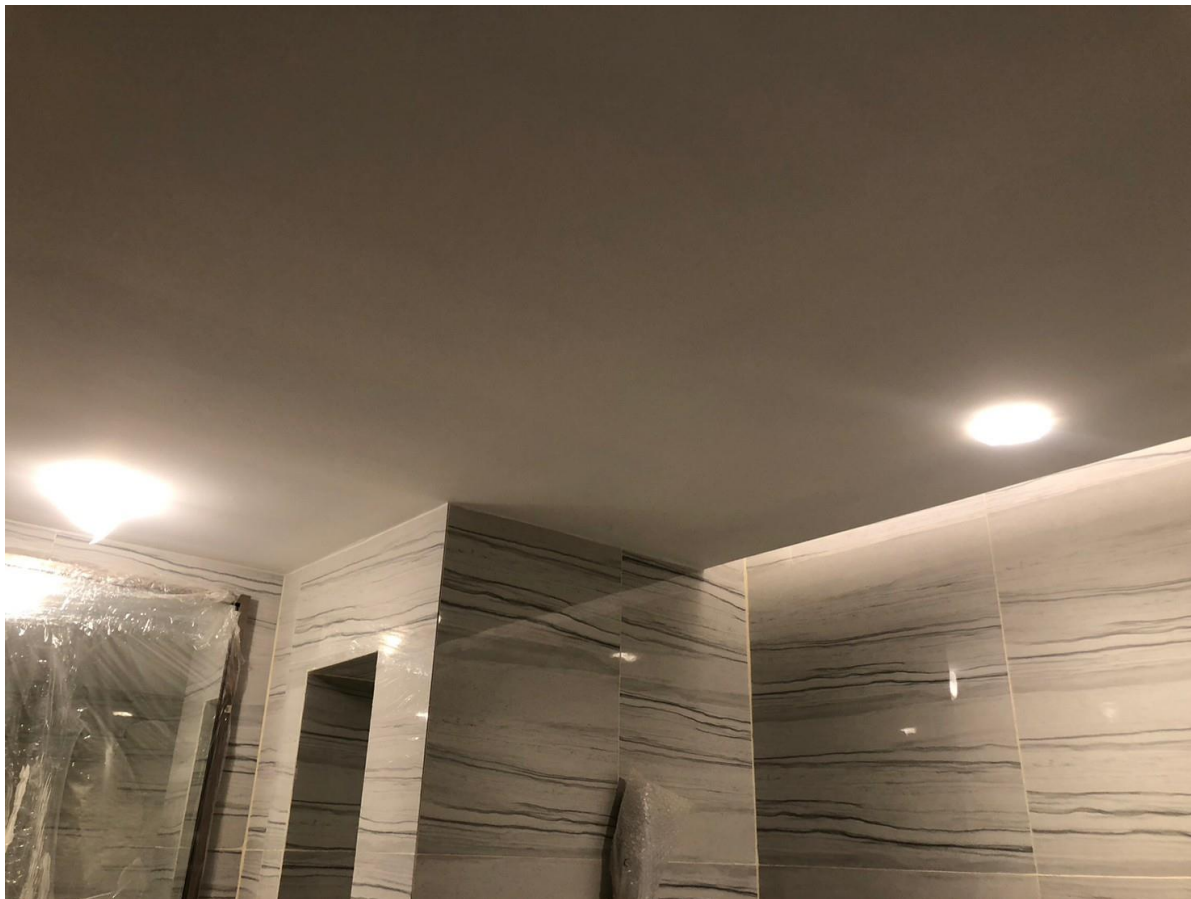

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งโคมไฟหัวเตียงพร้อมทดสอบระบบวงจรไฟฟ้าภายในห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15

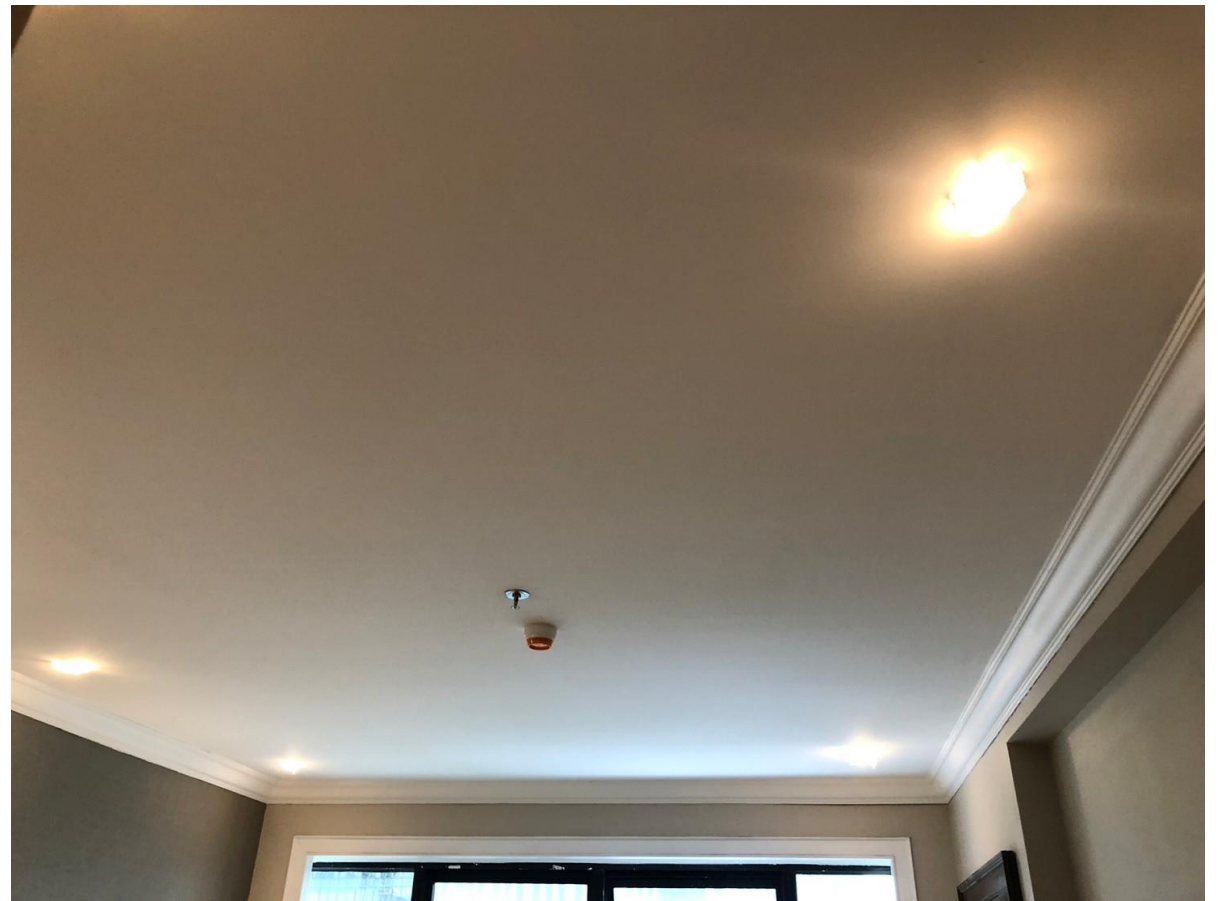

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,10,11




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,10,11



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,10,11

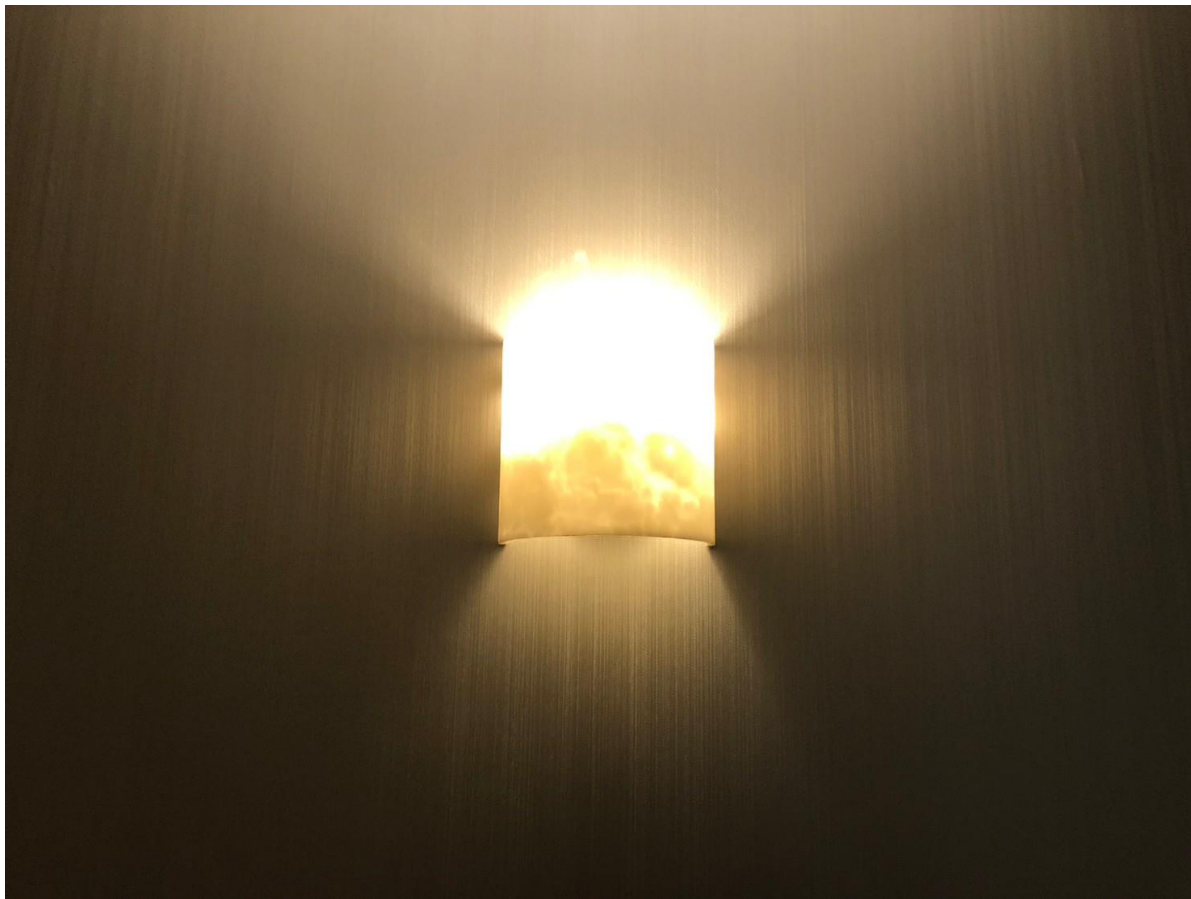

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-24



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหน้ากากแอร์ (SAG,RAG) บริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-24




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21-23




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21-24

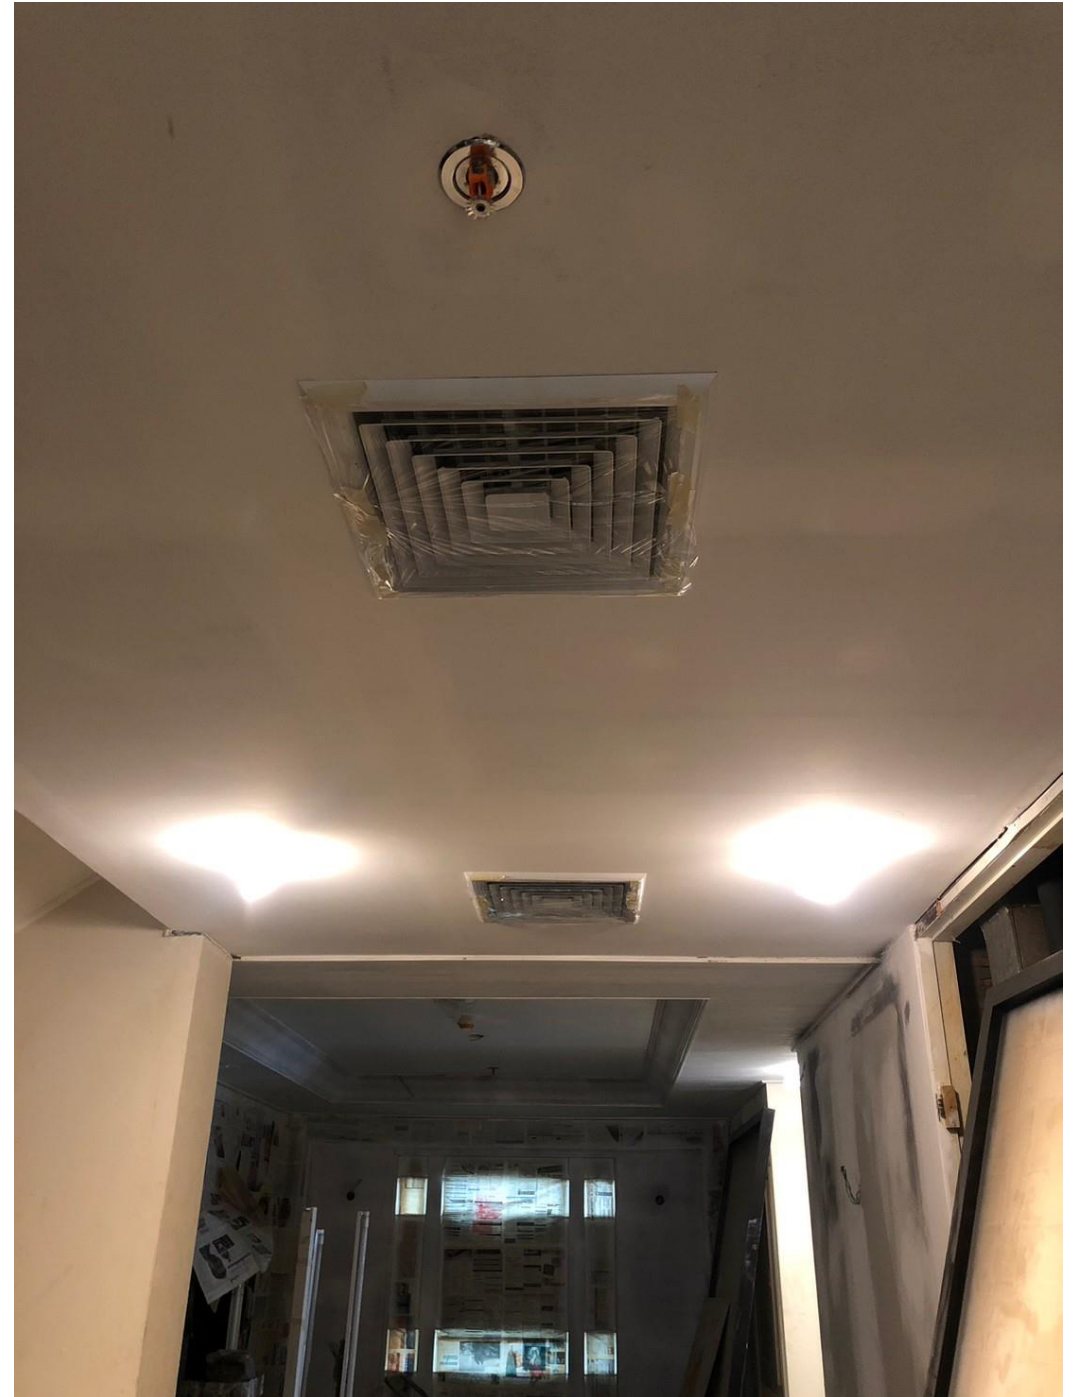


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 10

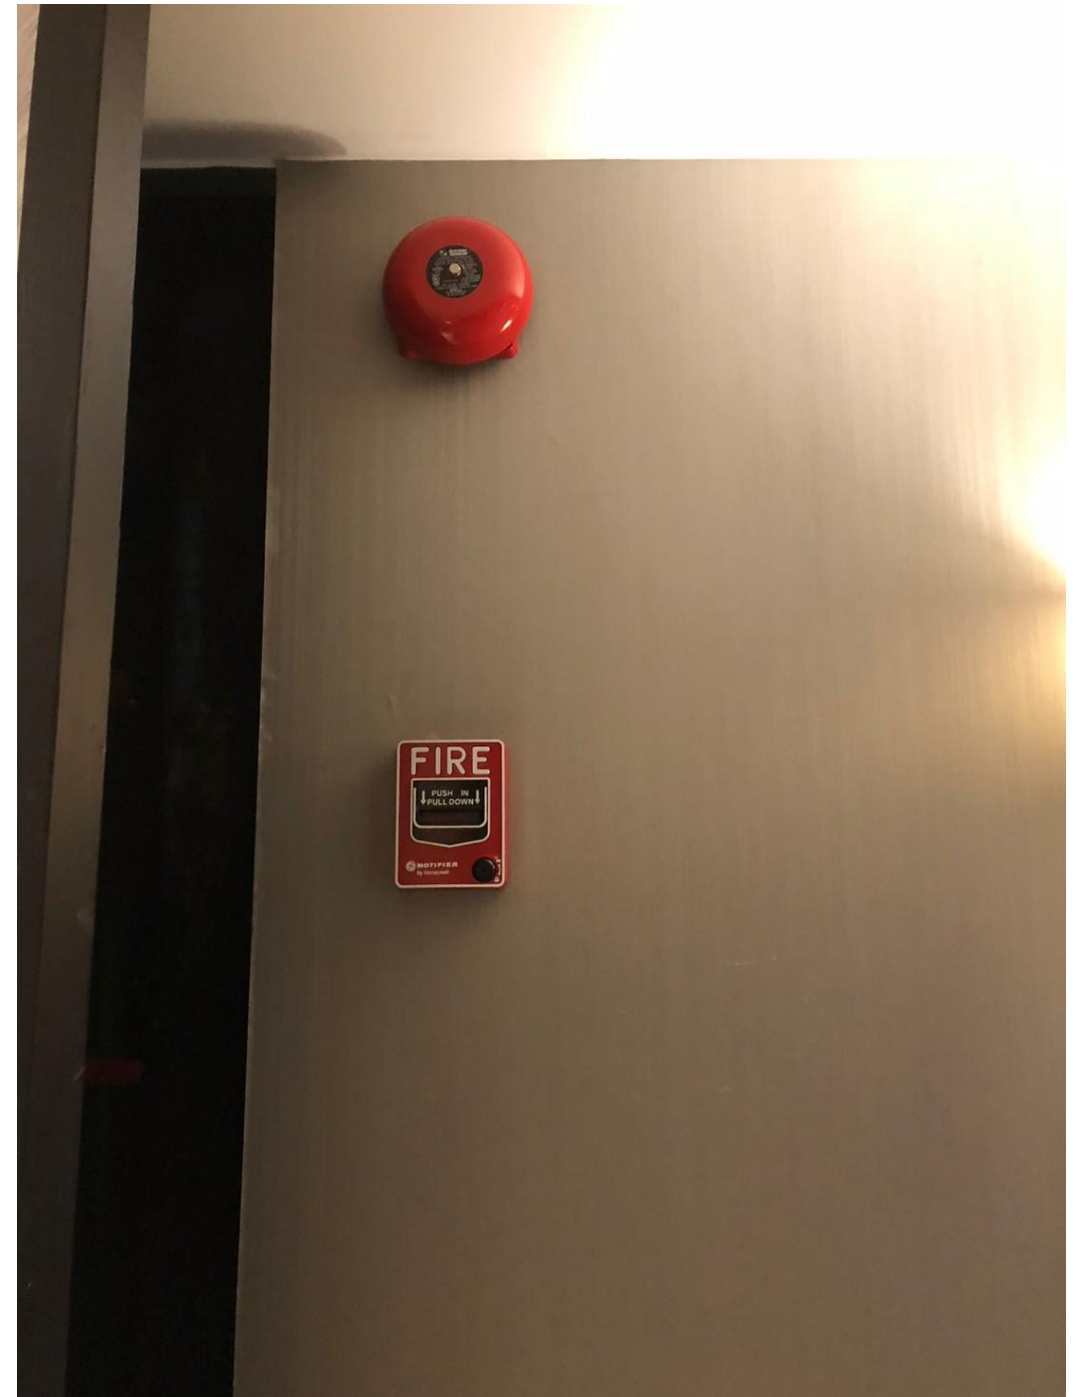

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ RCU + Consumer พร้อมเข้าสายบริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์
ชั้น 12

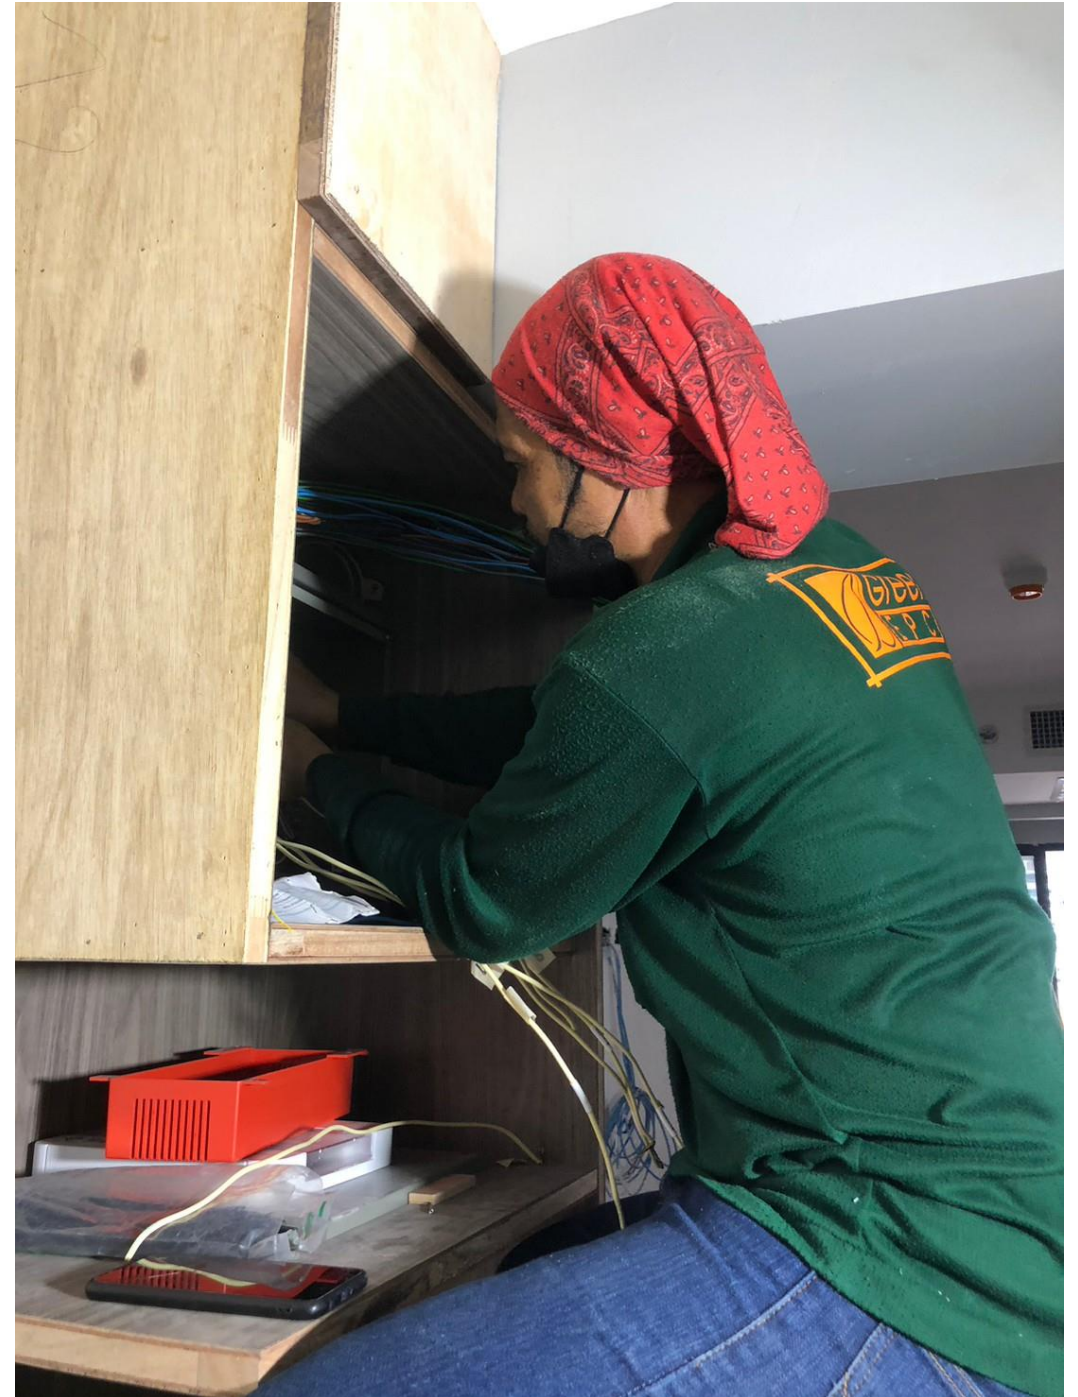

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งระบบ Keycard บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Switch Plug บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานใส่หัวสปีเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

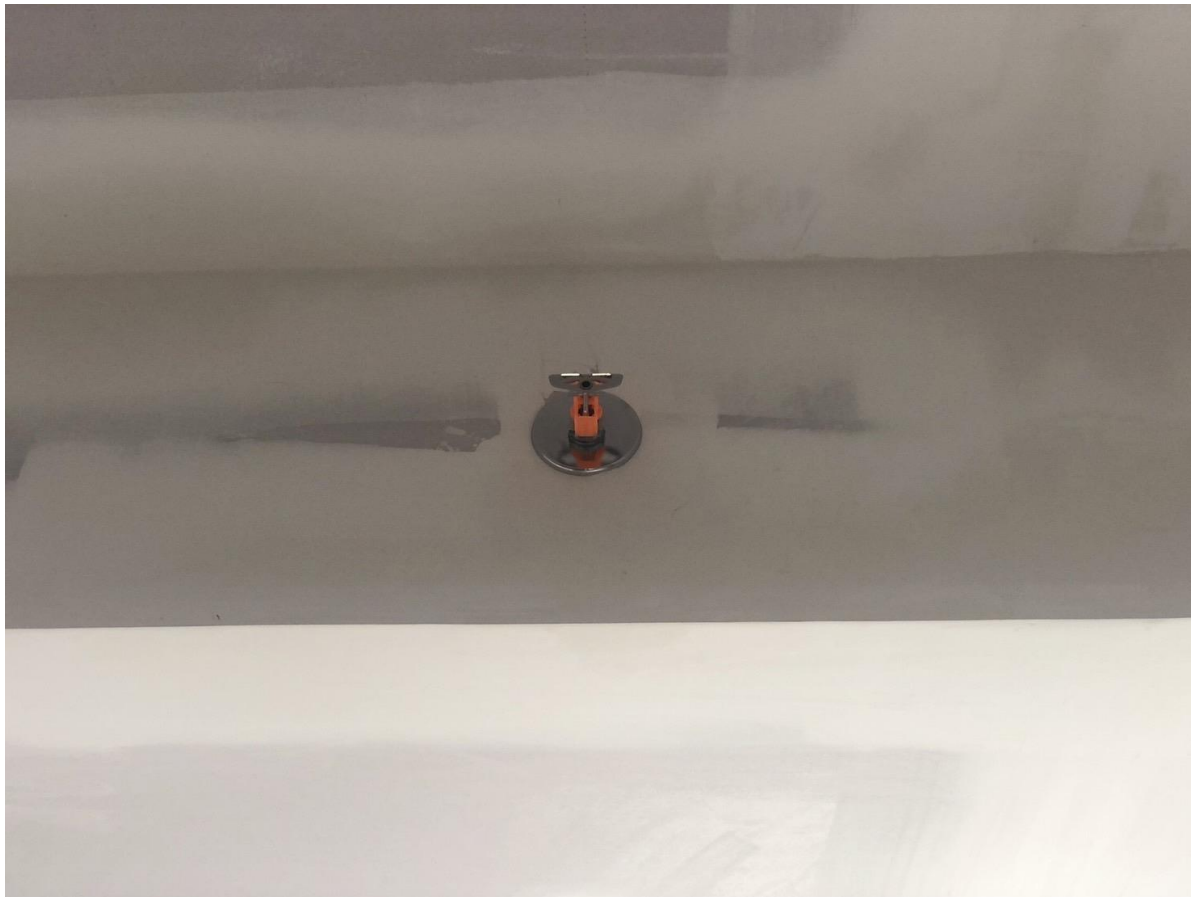

งานใส่หัวสปีเกอร์บริเวณห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

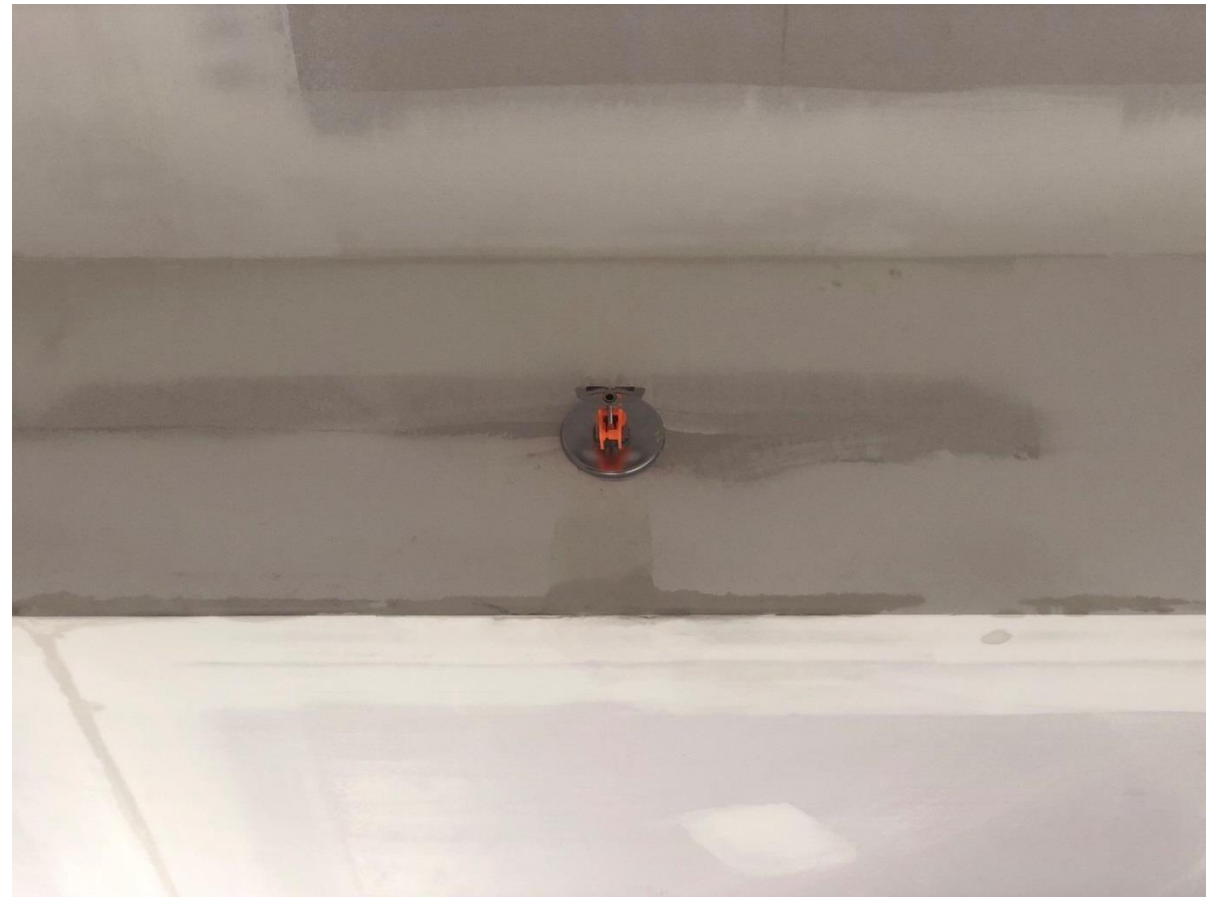

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งหินกล่องสบูบริเวณห้องน้ำของห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

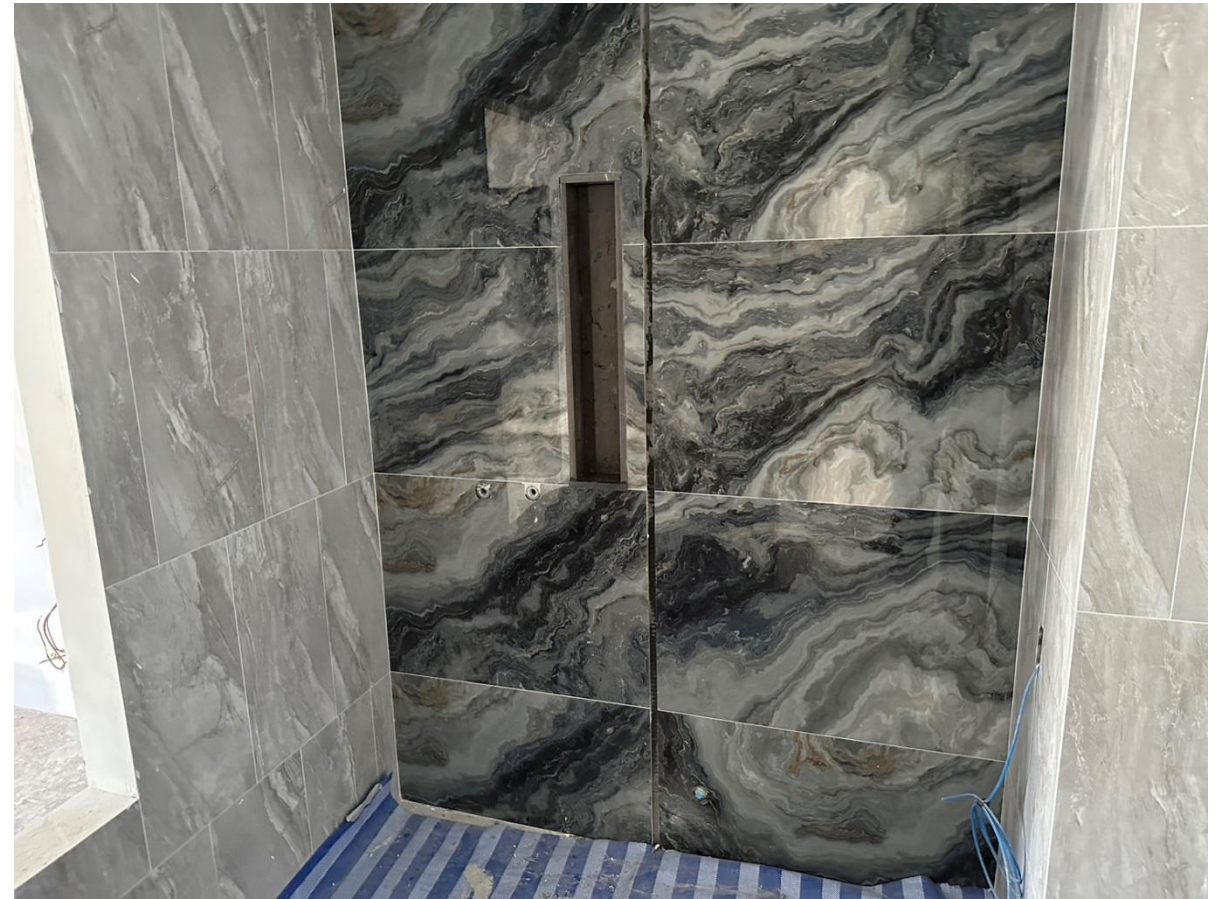

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานยาแนวกระเบื้องเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12-15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานยาแนวกระเบื้องเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12-15

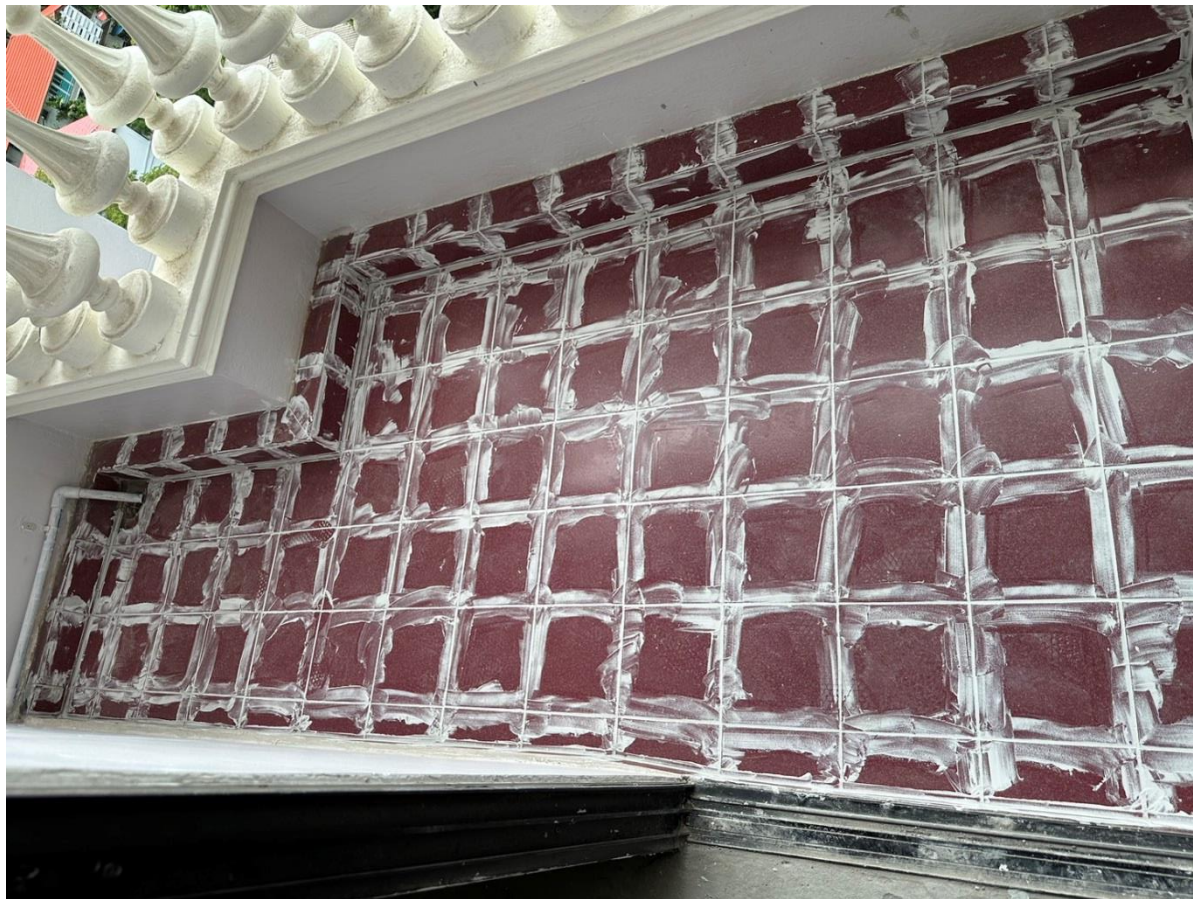

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานยาแนวกระเบื้องเดิมบริเวณระเบียงห้องพัก อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12-15

