



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

7 Sep 2023

แผนงาน KRUNGTHEP WING

แผนงาน 3 Week อาคารกรุงเทพวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบ พื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
3	(Phase 4)					
3.1	ชั้น 18	12 ก.ค. 66	13 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 22 ก.ค. 66
3.2	ชั้น 19	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 25 ก.ค. 66
3.3	ชั้น 20	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 27 ก.ค. 66
3.4	ชั้น 21	17 ก.ค. 66	18 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	100%	ได้เข้าพื้นที่วันที่ 11 ส.ค. 66
4	(Phase 5)					
4.1	ชั้น 22	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	85%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.2	ชั้น 23	25 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	85%	รองาน Wall Paper Bed Room
4.3	ชั้น 24	26 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	70%	รองาน Wall Paper Bed Room รองาน Wall Paper Corridor
4.4	ชั้น 25	28 ก.ค. 66	29 ก.ค. 66	1 ส.ค. 66	70%	รองาน Wall Paper Bed Room รองาน Wall Paper Corridor


แผนงาน SIAM WING

แผนงาน 3 Week อาคารสยามวิงค์

แผนงานส่งมอบพื้นที่ให้ GREEN EPC เข้าทำงาน

ลำดับ	รายละเอียดงานชั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	แผนงานที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ GEPC	วันที่เข้าดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
	อาคารสยาม					
1	(Phase 2)					
1.1	ชั้น 6	10 ก.ค. 66	9 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	100%	
1.2	ชั้น 10	14 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	15 ก.ค. 66	100%	
1.3	ชั้น 11	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	100%	
2	(Phase 3)					
2.1	ชั้น 12	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	100%	
2.2	ชั้น 14	26 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	90%	รองาน Wall Paper Corridos
2.3	ชั้น 15	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	80%	รองาน Wall Paper Bed Room & Corridos

ผลงานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมห้องพัก Phase II

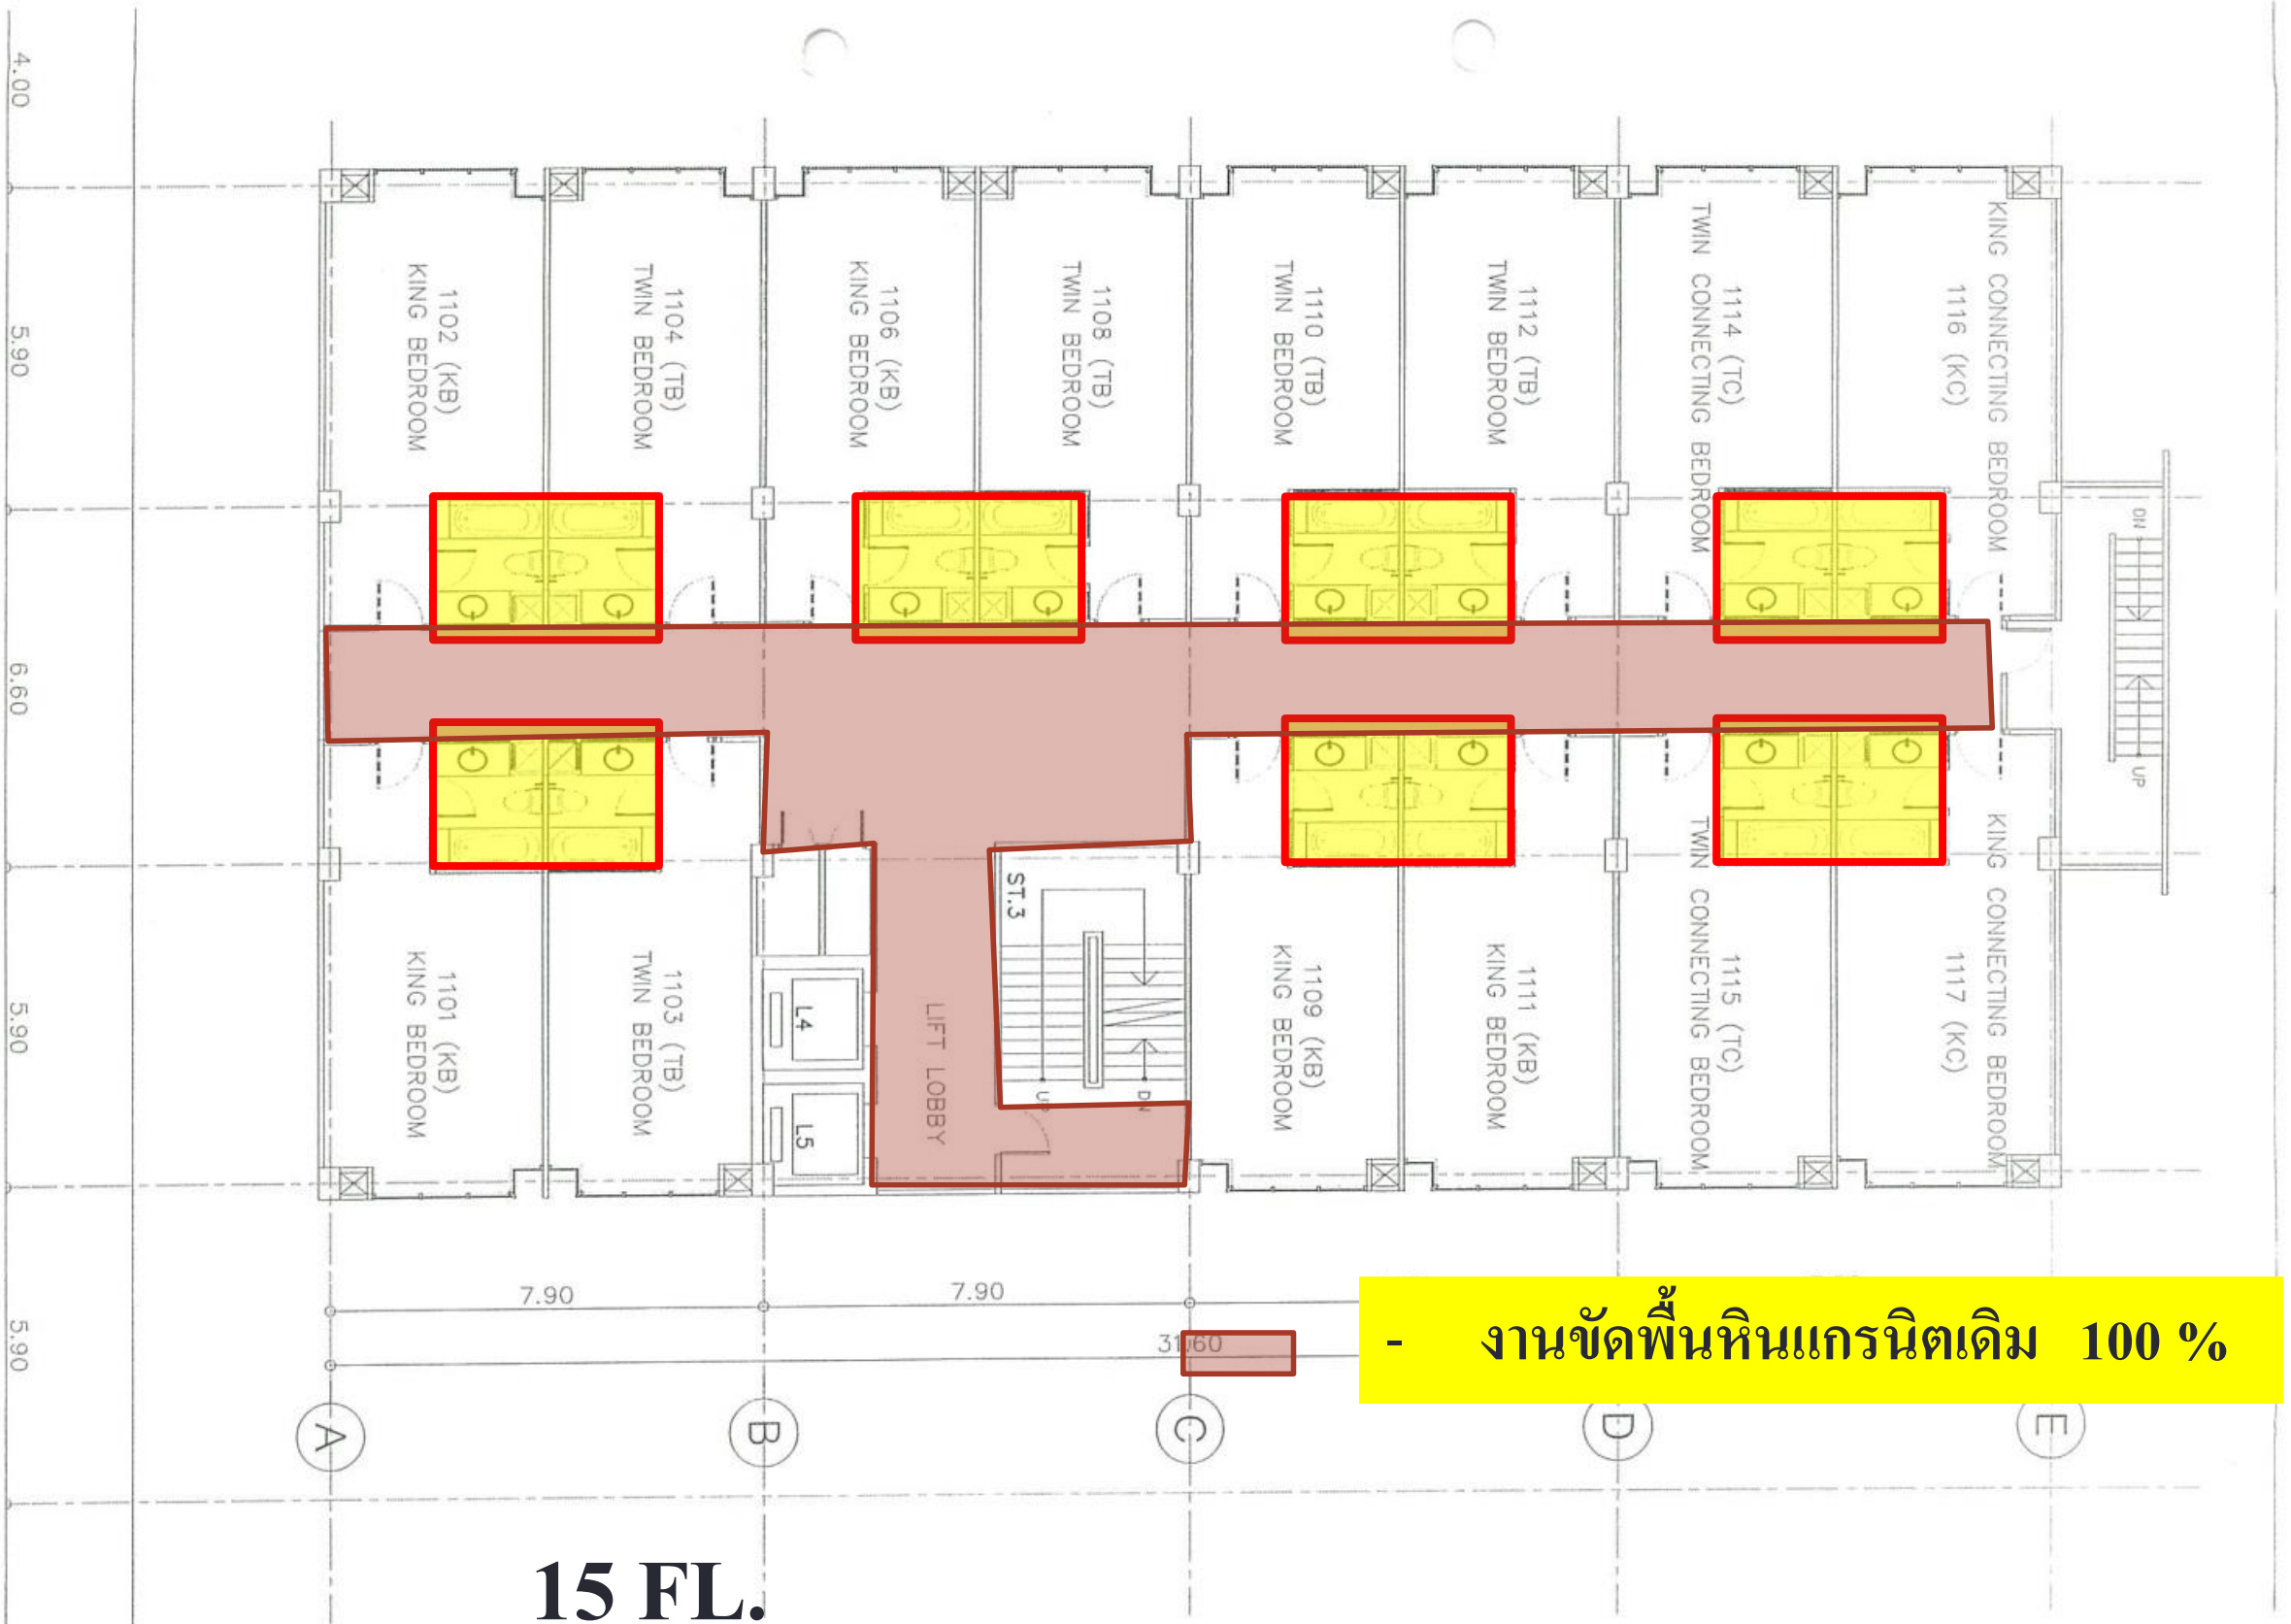

ภาพถ่ายแสดงการทำงาน (งานห้องพัก Phase 2)

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องพัก
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานรื้อถอนฝ้าเพดานสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายเคเบิลสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานรื้อถอนฝ้าเพดานสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานร้อยสายเคเบิลสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานขัดพื้นหินของเดิมบริเวณห้องพักและทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานขัดพื้นหินของเดิมบริเวณห้องพักและทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานขัดพื้นหินของเดิมบริเวณห้องพักและทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

