



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

05 May 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

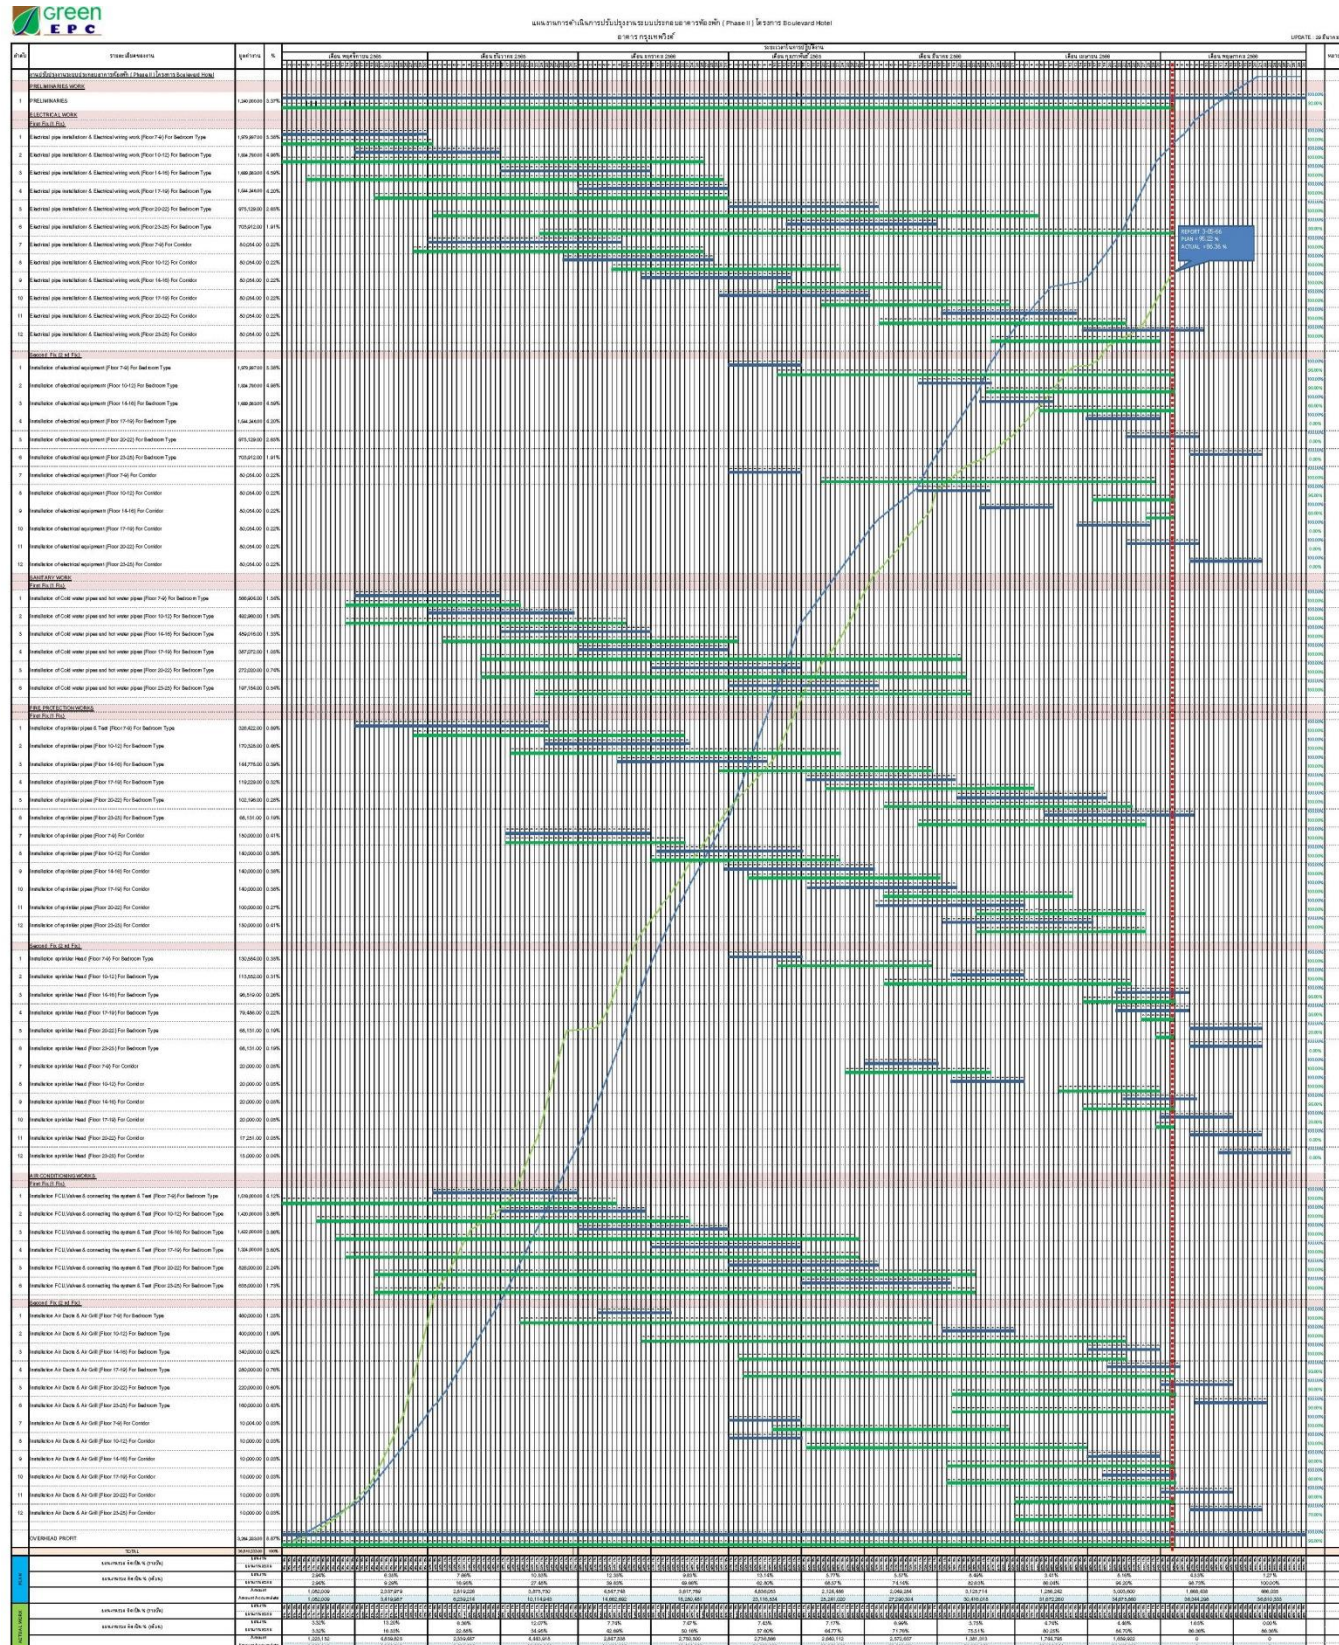


WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (3-05-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	95.22%	86.36%	- 8.86 % ล่าช้า 17 วัน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการโรงแรมสยามโฮเทล
อาคาร สยามโฮเทล

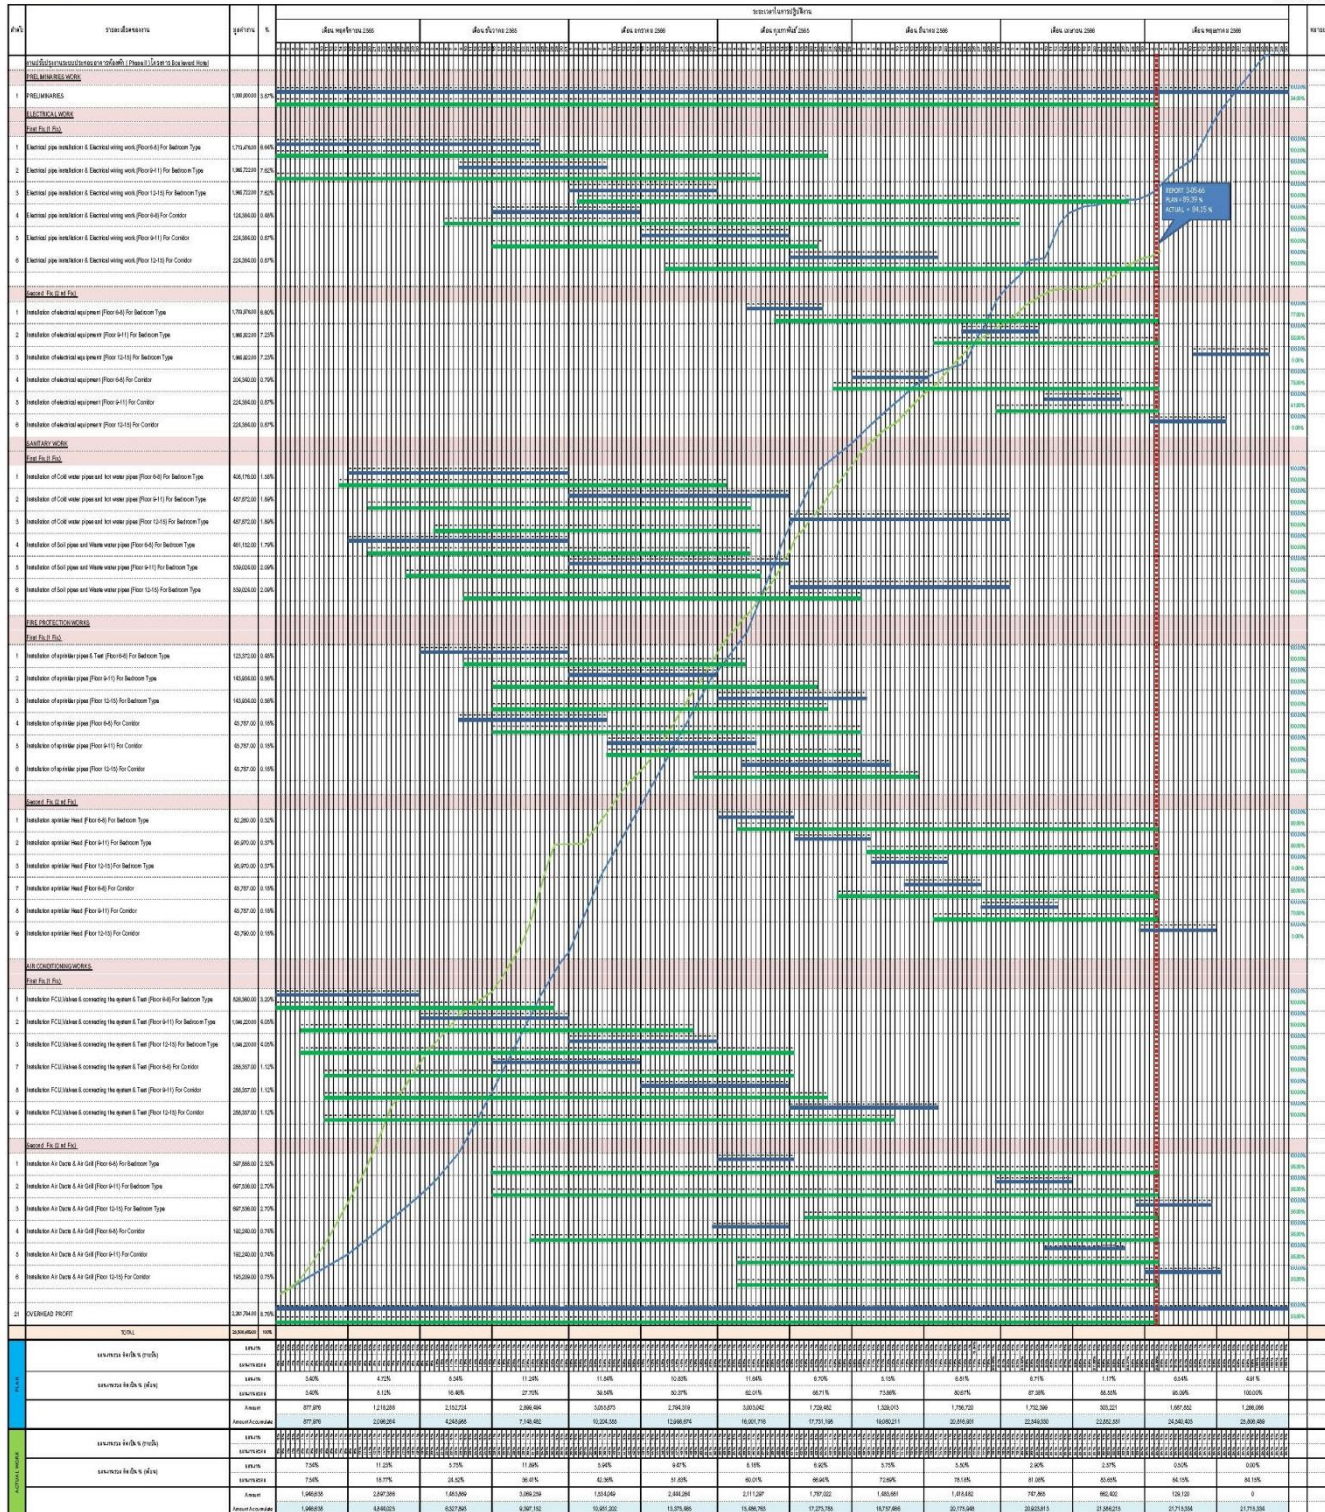

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (3-05-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
89.39%		84.15%	- 5.24 % ล่าช้า 10 วัน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเมษายน 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนเมษายน 2566																													เดือนพฤษภาคม 2566							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4			
1	Project Manager	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-				
2	Sanitation Engineer	-	-	1	1	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	2	2	2	1	1	1	1	1	-	2				
3	Electrical Engineer	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1				
4	Air Conditioning Engineer	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1			
5	Safety	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1				
6	Sanitary Foreman	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1		
7	Electrical Foreman	2	-	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	-	2				
8	Air Foreman	2	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-				
9	Site Admin	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1				
10	Electricians	16	-	26	21	21	30	31	30	26	22	9	9	4	4	4	-	10	6	13	21	19	14	13	23	13	21	21	13	19	14	-	22					
11	Plumber	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	2	-	3	-	3	-	3	6	6	6	6	6	6	6	6	-	6	6	6	6	6	-	6				
12	Sprinkler	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Air Conditioner	-	-	5	5	5	-	7	6	-	7	-	-	-	-	-	-	7	9	9	9	-	-	-	7	5	-	-	-	-	6	-	-	-				
14	General Technician	4	-	-	-	3	3	3	3	-	2	3	3	-	-	-	-	-	3	3	3	-	3	-	3	-	4	4	3	3	-	-	4					
15	Store	2	-	2	2	3	3	3	3	1	1	-	-	1	-	1	-	1	3	3	3	3	3	1	3	2	2	3	3	3	1	-	3					
16	Tiler	19	13	20	24	23	23	25	22	15	23	15	15	-	-	-	6	6	10	11	12	16	13	6	12	10	10	11	10	10	10	10	-	11				
17	Skim Coat	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	5	-	4	2	2	3	3	3	2	-	2					
	รวม	53	15	61	61	73	74	87	81	52	69	38	30	9	4	9	7	35	46	57	66	57	55	30	69	41	54	56	46	59	36	-	57					

หมายเหตุ


 วันอาทิตย์

 วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

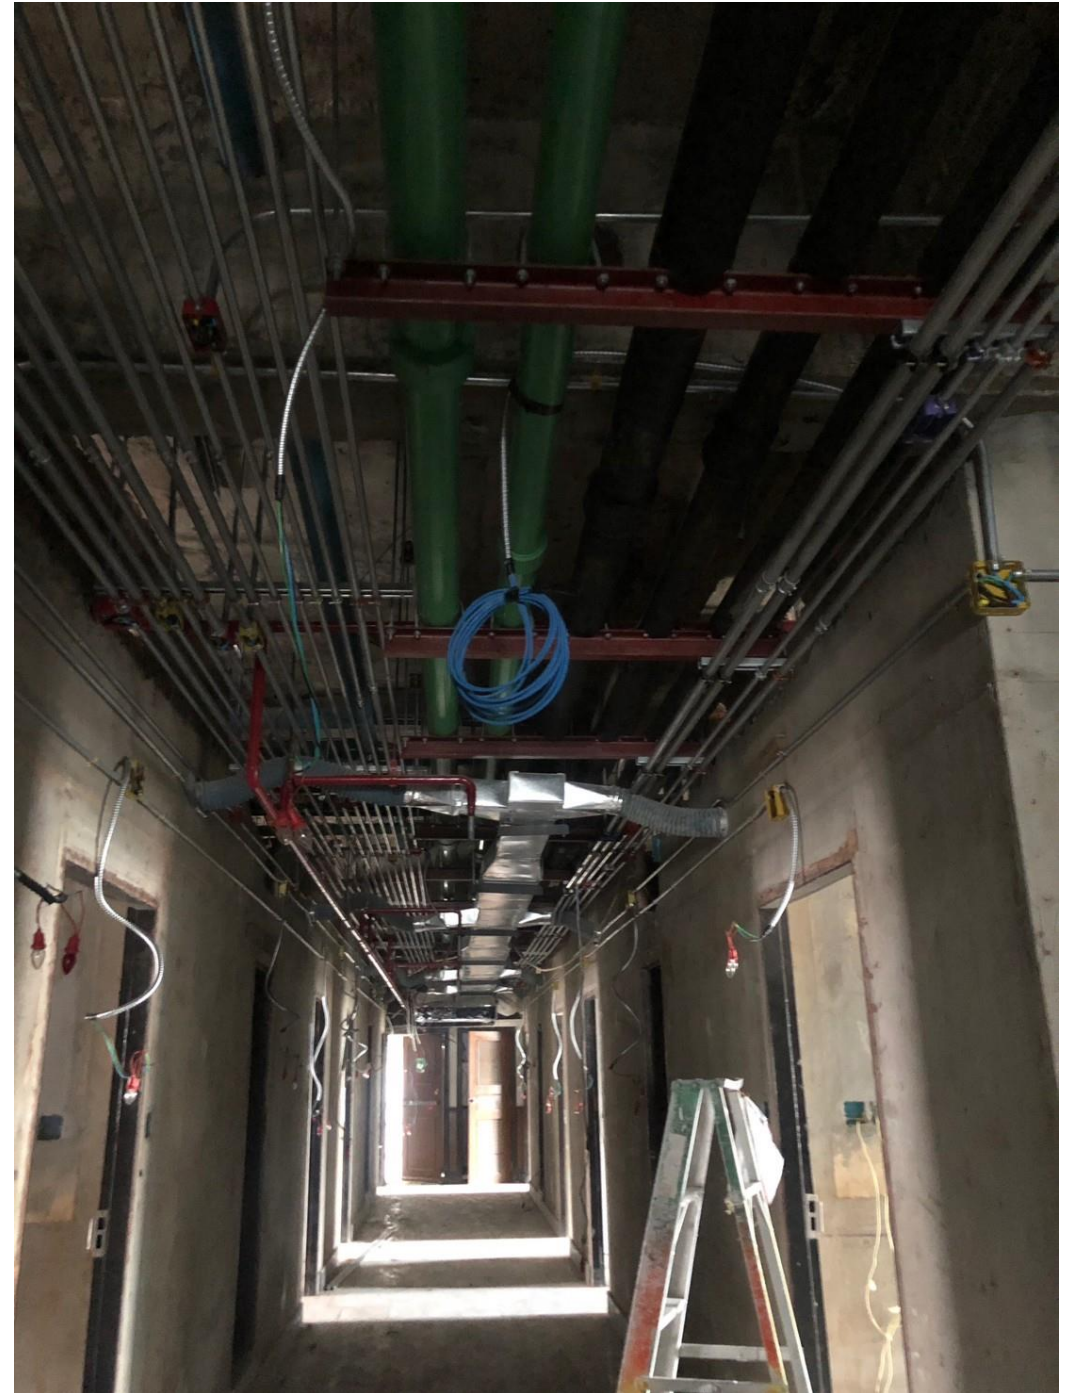

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

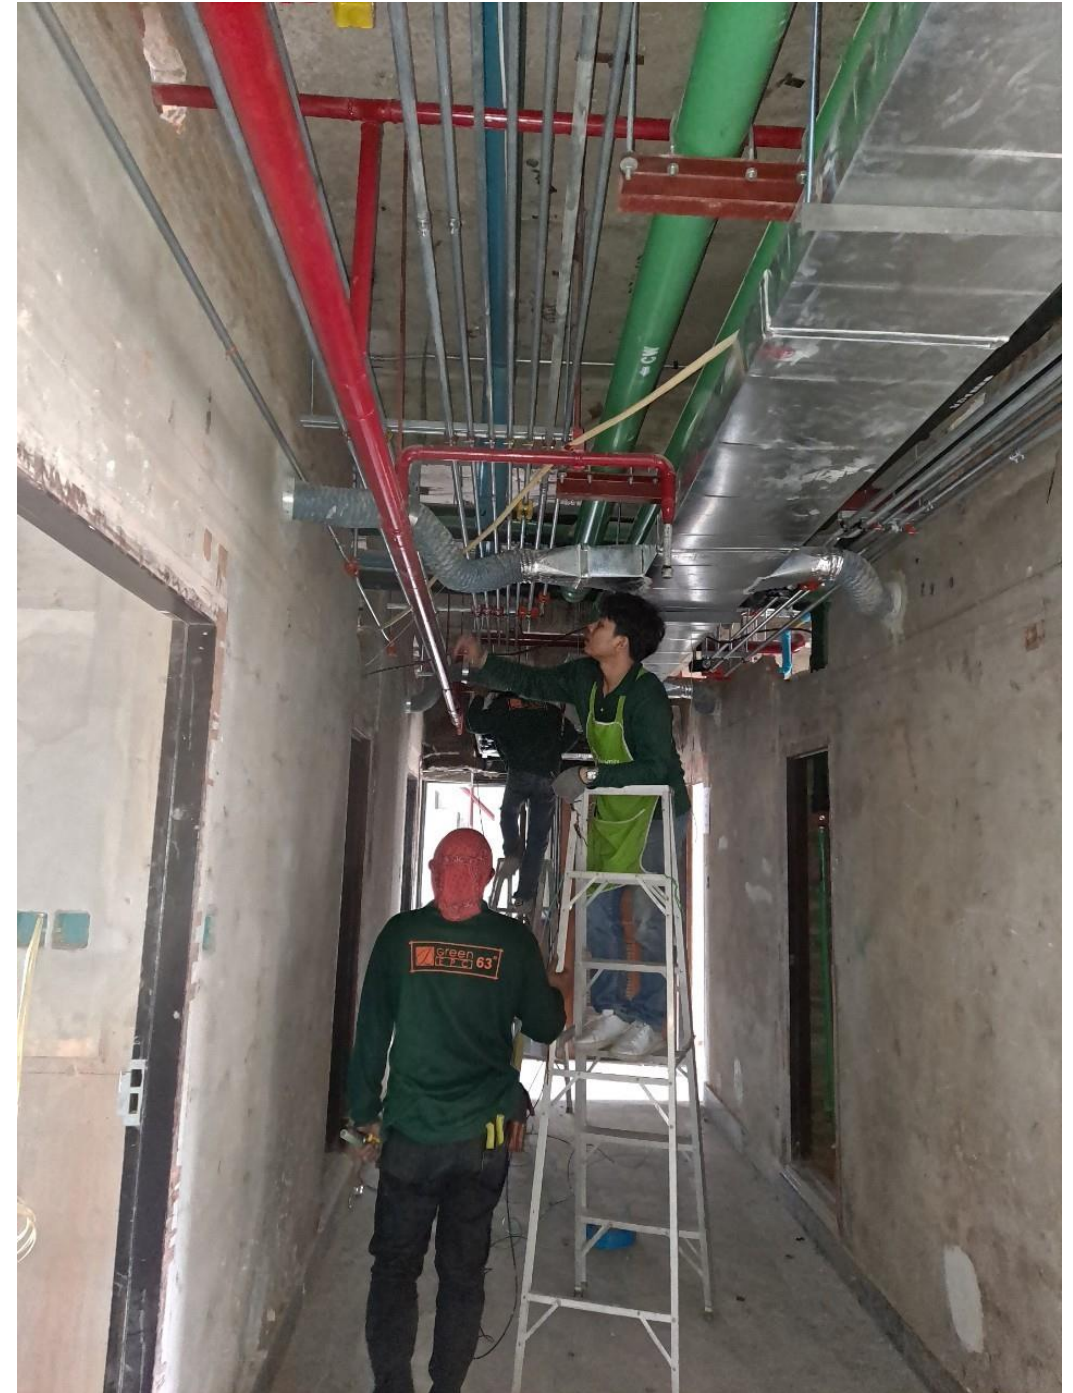

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อ CW,HW สำหรับจ่ายห้องน้ำส่วนกลาง
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6

