



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT


**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

**03 Aug 2023**

## แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II



# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

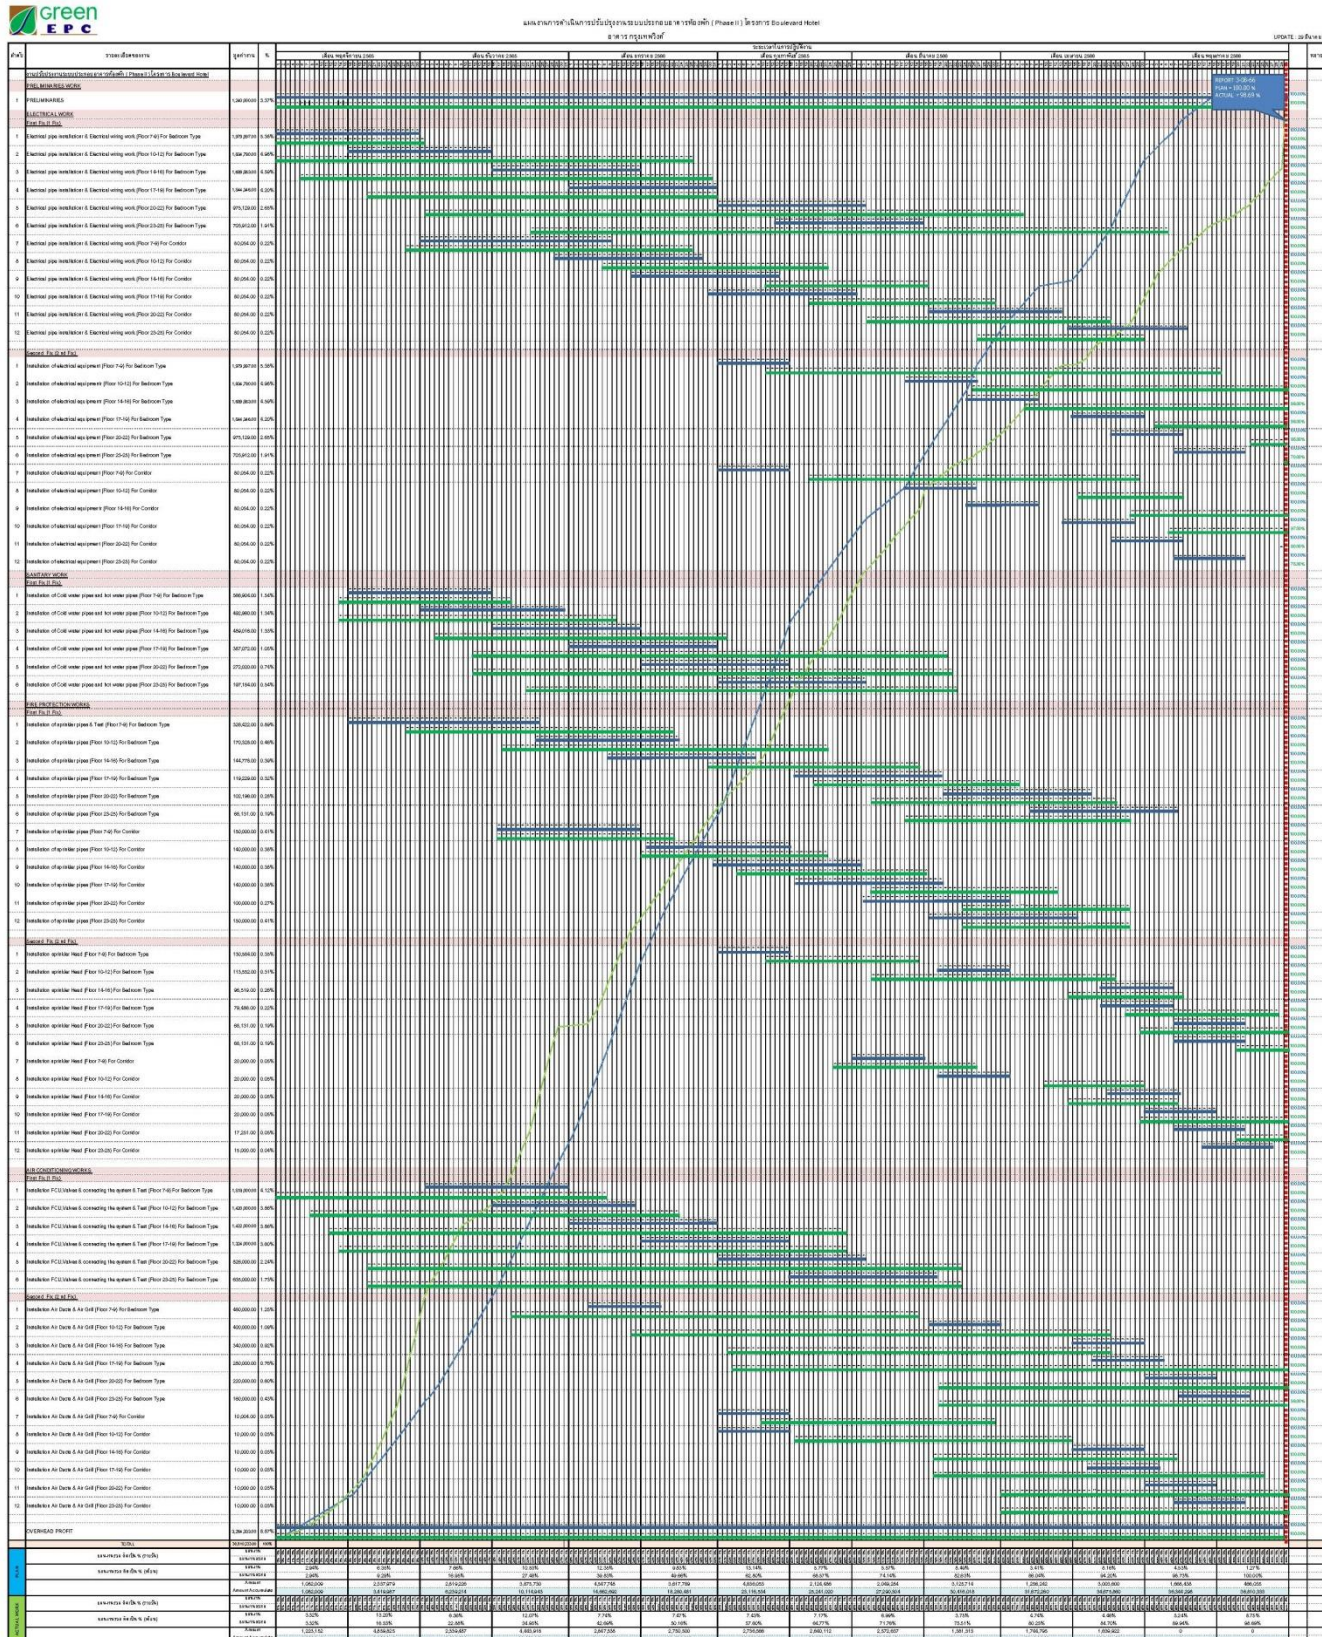

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (03-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	98.69%	- % ล่าช้า 77 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน




# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงระบบอาคารพัก (Phase II) | โครงการ Boulevard Hotel

อาคาร สยามวิเศษ

UPDATE: 03/08/2024

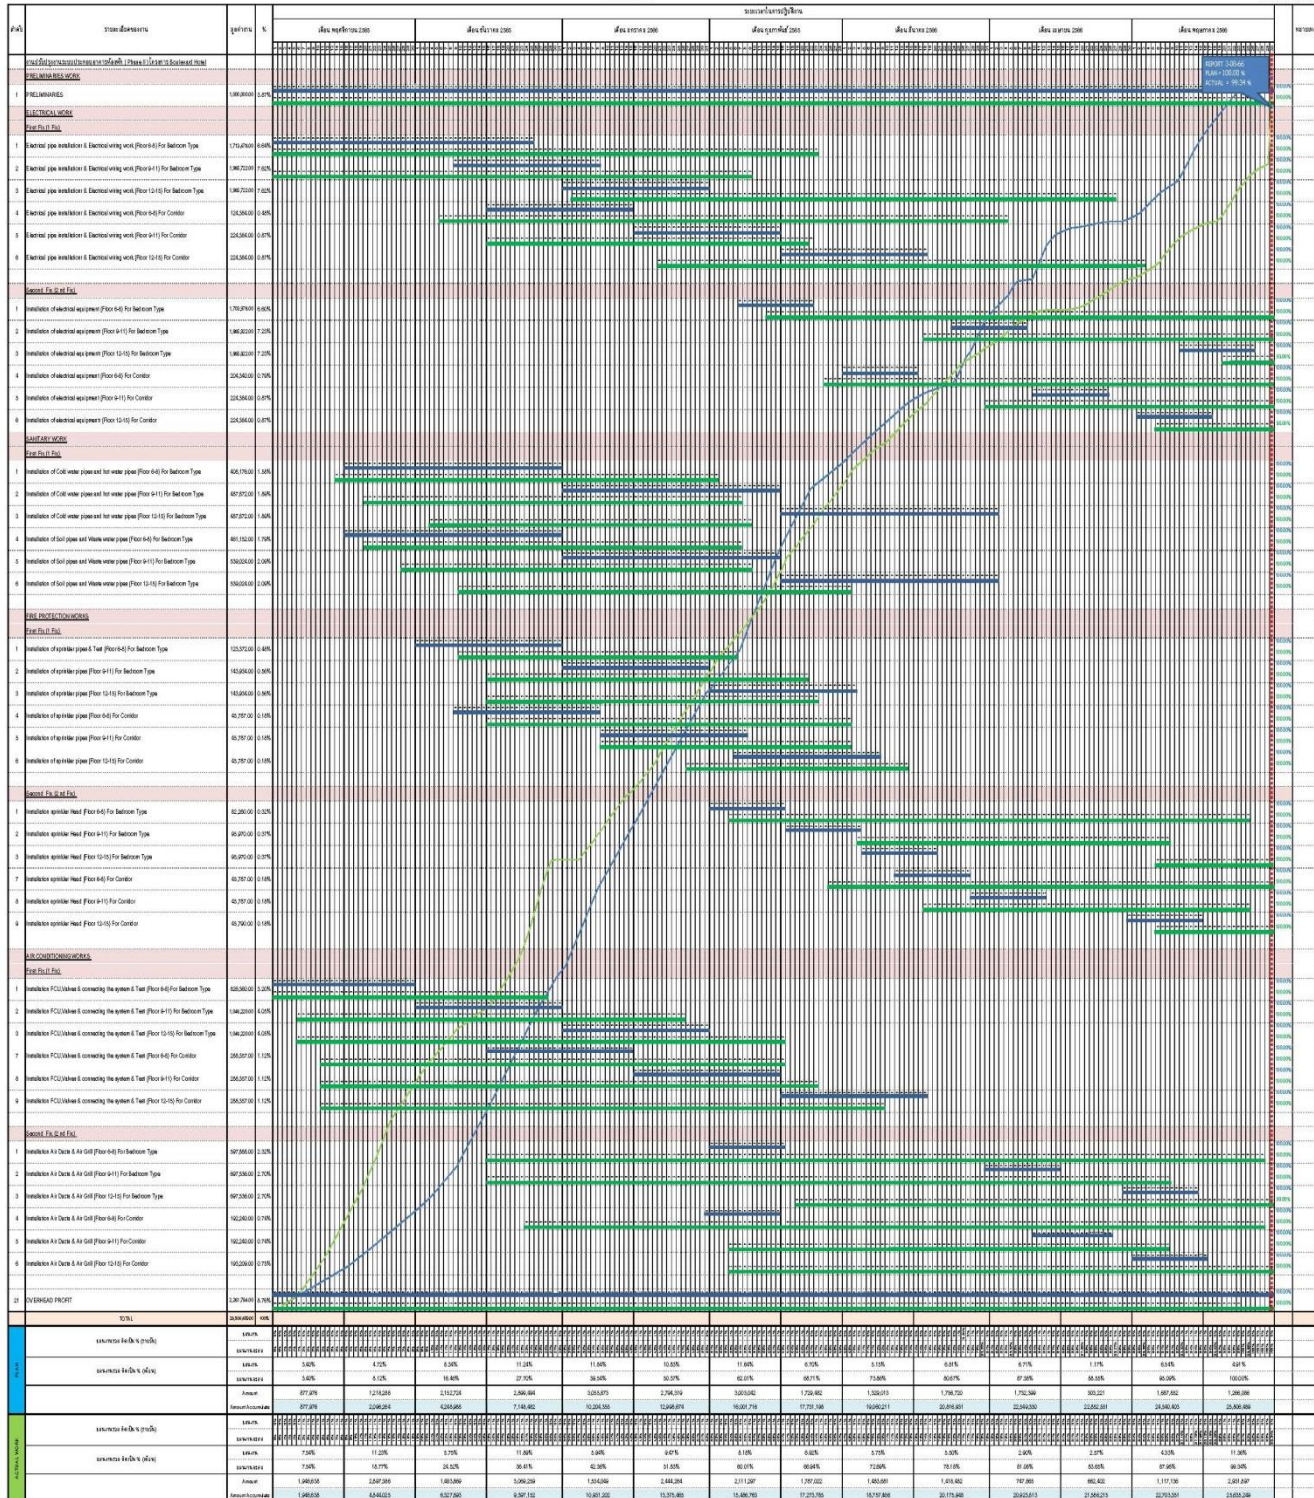

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (03-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.34%	- % ล่าช้า 77 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

**MAN POWER**

# ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2566



## ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกรกฎาคม 2566																															เดือนสิงหาคม 2566			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
1	Project Manager	1		1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1		
2	Architecture Engineer	1		2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	-	2	2	2	2	2	1	-	1	2	2	1	1	-	-	1	1	1		
3	Electrical Engineer	-		1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1			
4	Air Conditioning Engineer	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Safety	1		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1		
6	Sanitary Foreman	-		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1		
7	Electrical Foreman	2		2	2	1	2	2	1	-	2	2	2	2	2	-	1	1	1	2	2	2	-	2	2	2	2	2	1	1	-	1	1	1		
8	Air Foreman	1		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
9	Site Admin	1		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1		
10	Electricians	12		14	14	7	14	13	7	-	16	15	15	12	12	15	-	4	8	9	13	13	13	-	13	13	13	13	9	5	-	4	5	7		
11	Plumber	-		6	6	6	6	6	6	-	6	6	6	6	6	-	6	6	6	6	5	5	-	5	-	5	5	5	5	5	-	5	5	5		
12	Sprinkler	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Air Conditioner	6		6	-	6	-	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	General Technician	3		-	4	4	10	10	6	6	6	7	3	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	-	4	6	7	7	3	7	-	4	4	4		
15	Store	2		1	3	1	3	3	1	-	3	3	1	3	3	3	-	3	3	3	3	3	-	3	2	3	3	3	3	3	-	1	3	1		
16	Tiler	4		4	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Skim Coat	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>รวม</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>24</b>		

หมายเหตุ



วันอาทิตย์



วันหยุดนักขัตฤกษ์



## รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งตู้ Control Lighting และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน บริเวณหน้าลิฟต์ Service อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17-19



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 10

