



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT


**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

05 April 2023

## แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II



# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

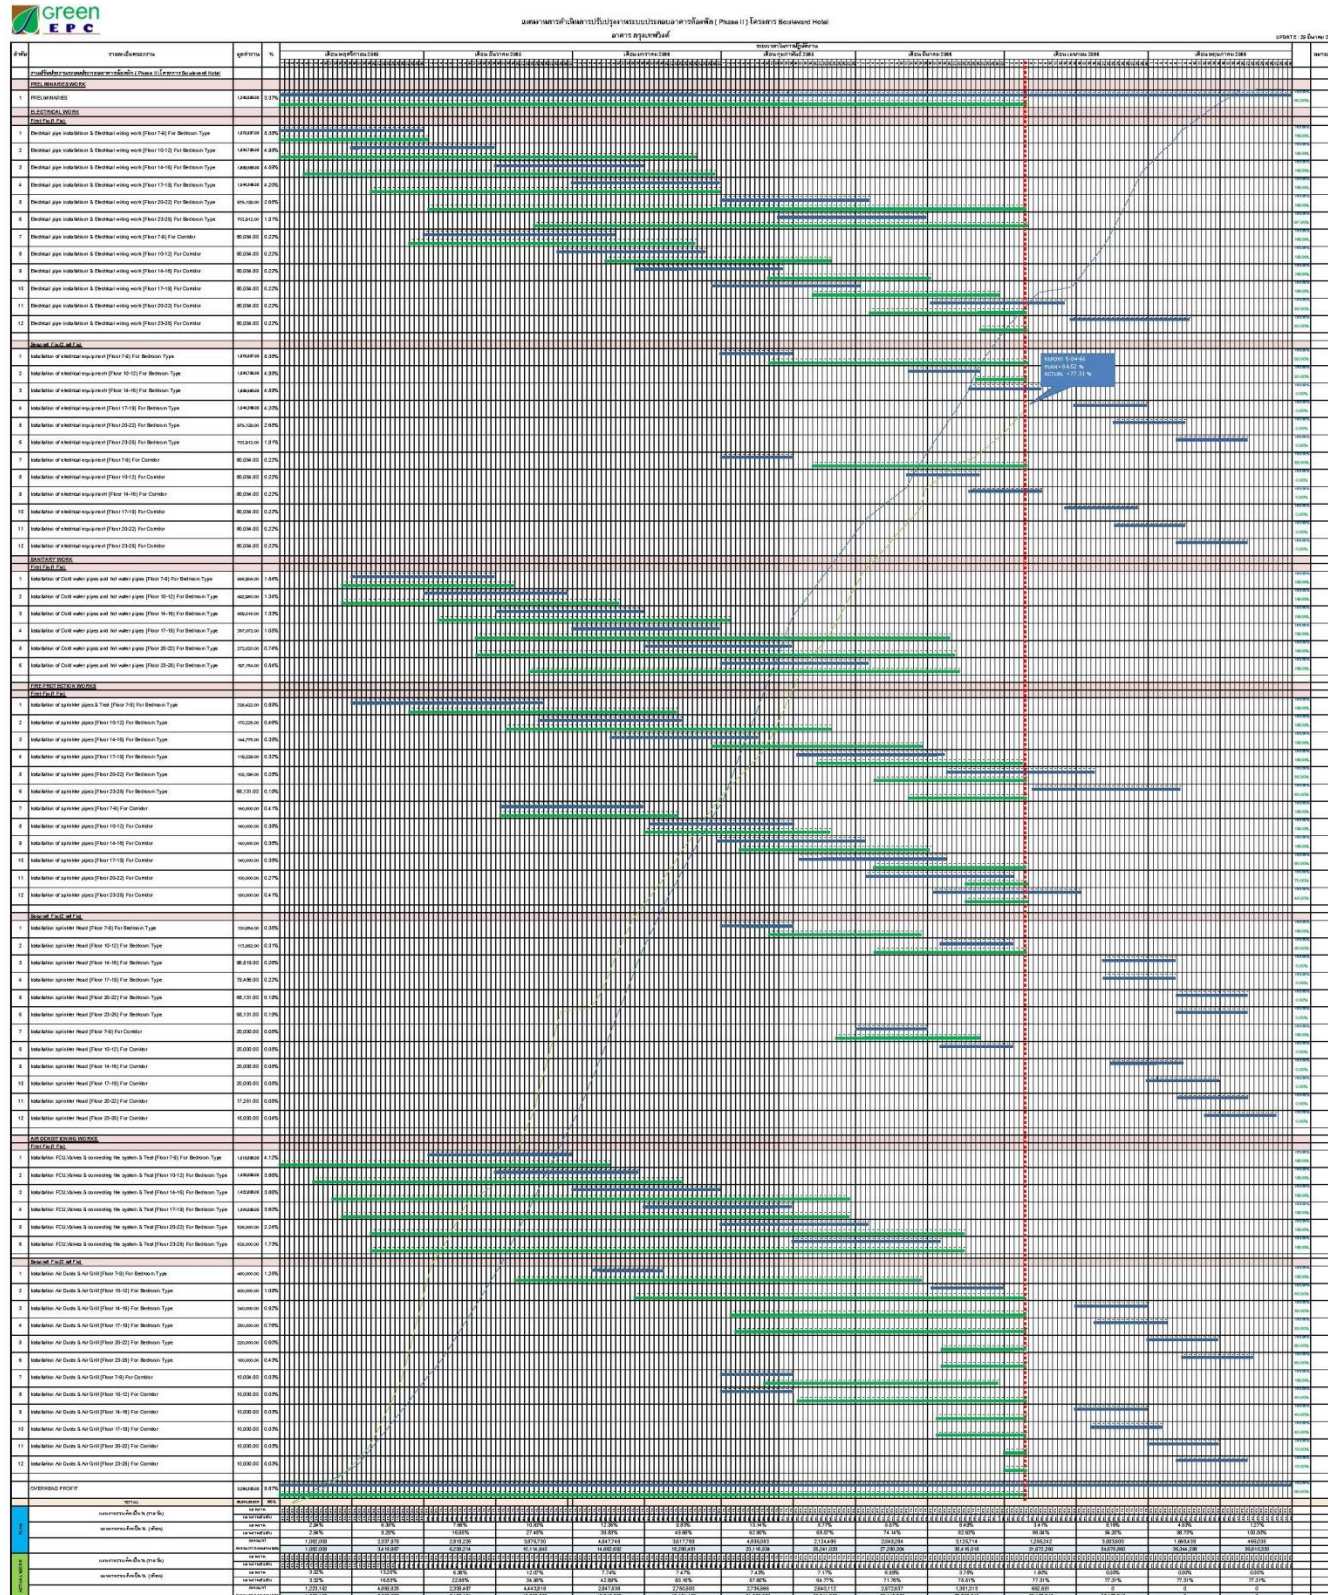


## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-04-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	84.52%	77.31%	-7.21 % ล่าช้า 14 วัน



# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)

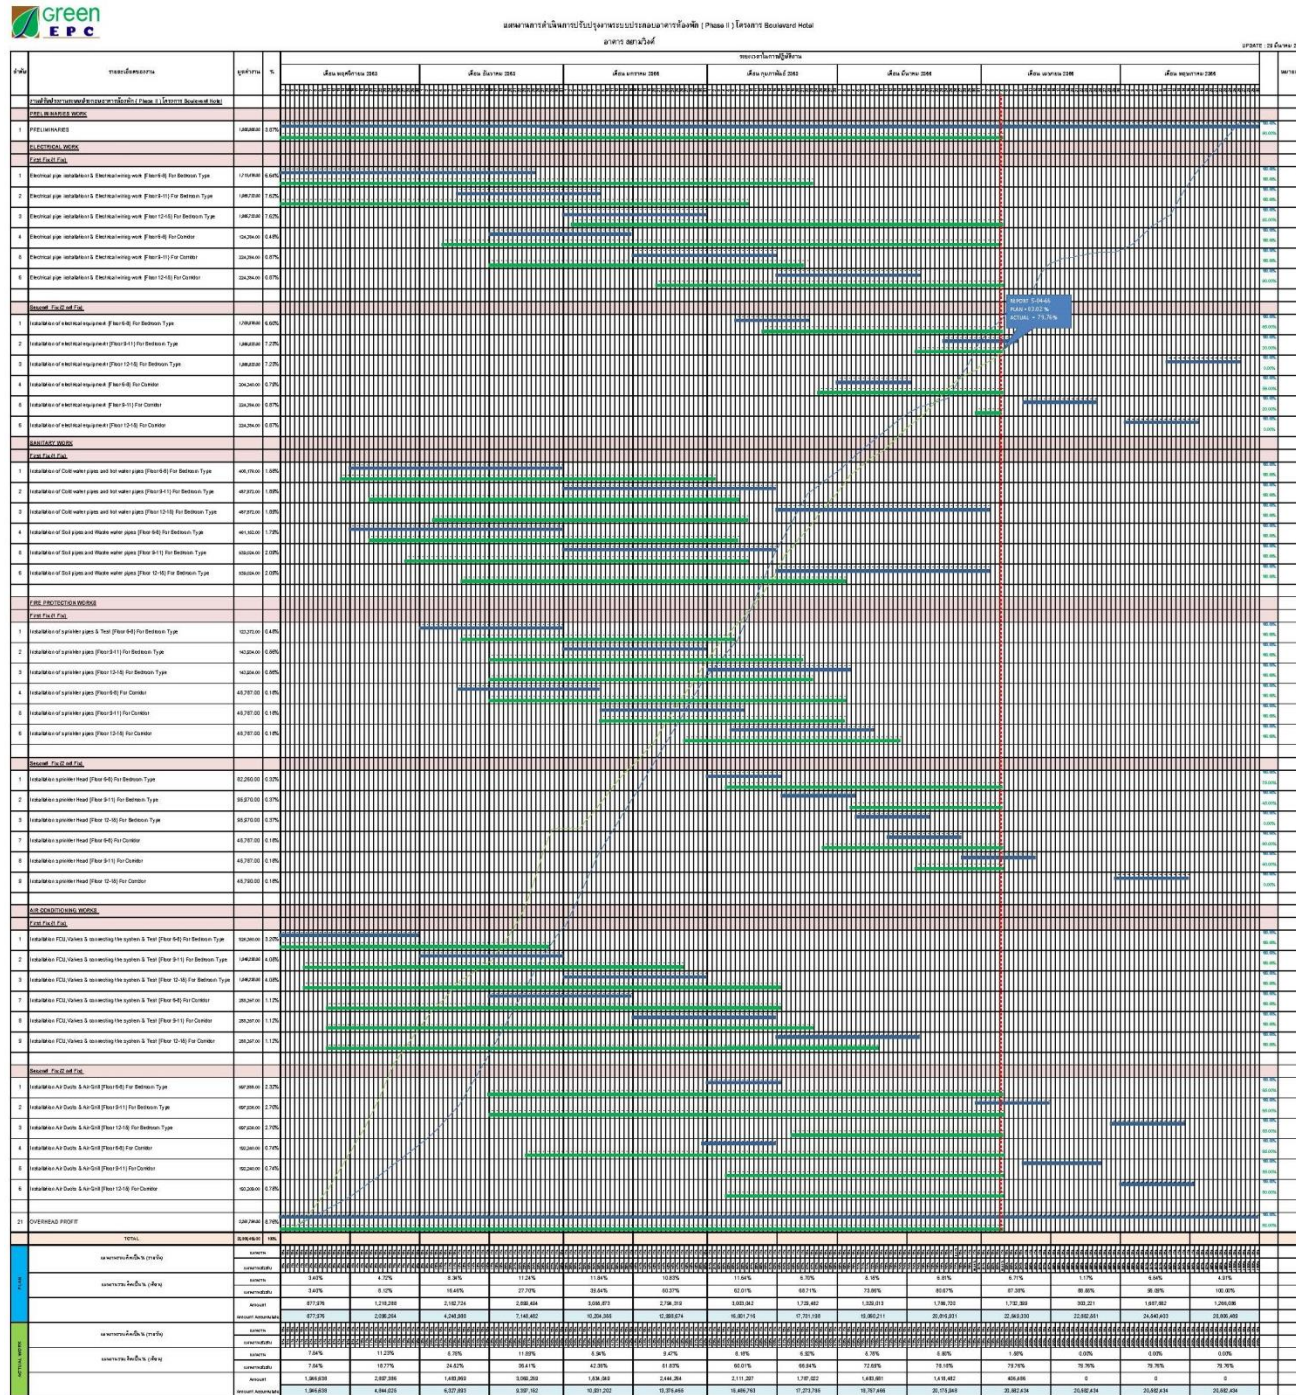

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-04-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	83.02%	79.76%	- 3.26 % ล่าช้า 6 วัน

**MAN POWER**

# ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเมษายน 2566



## ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนเมษายน 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Project Manager	1	-	1	1																											
2	Sanitation Engineer	-	-	1	1																											
3	Electrical Engineer	1	1	1	1																											
4	Air Conditioning Engineer	-	1	1	1																											
5	Safety	1	-	1	1																											
6	Sanitary Foreman	-	-	1	1																											
7	Electrical Foreman	1	-	1	1																											
8	Air Foreman	2	-	-	1																											
9	Site Admin	1	-	1	1																											
10	Electricians	16	-	26	21																											
11	Plumber	-	-	-	-																											
12	Sprinkler	-	-	-	-																											
13	Air Conditioner	-	-	5	5																											
14	General Technician	4	-	-	-																											
15	Store	2	-	2	2																											
16	Tiler	19	13	20	24																											
17	Skim Coat	4	-	-	-																											
	รวม	52	15	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ

วันอาทิตย์


วันหยุดนักขัตฤกษ์



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเดินท่อไฟและร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 22-24

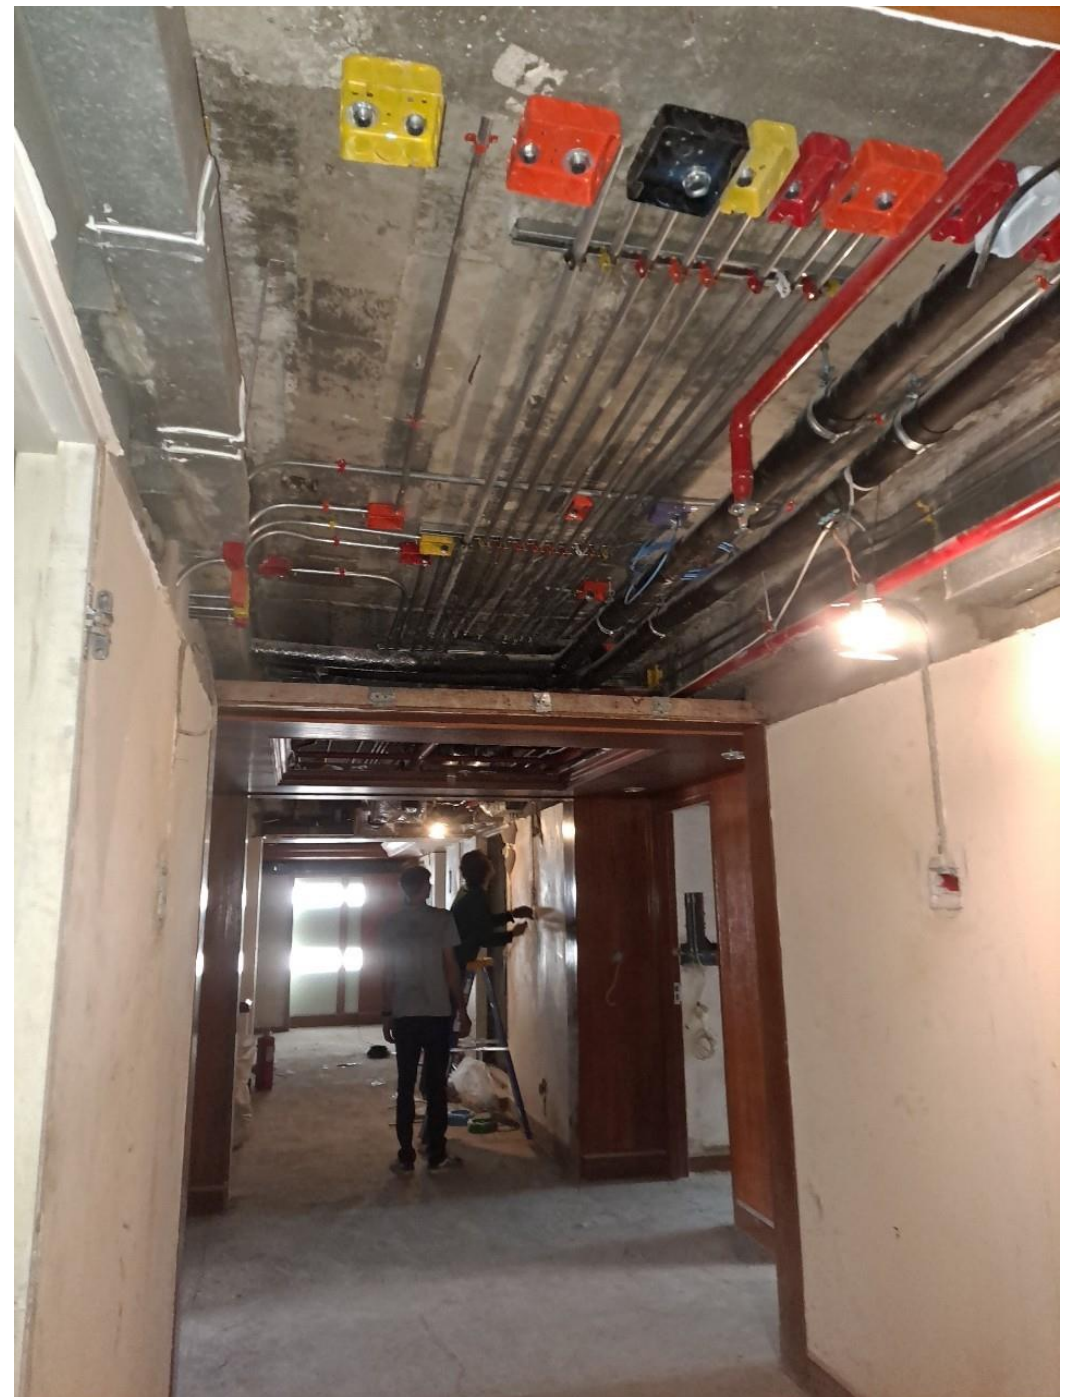



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา










งานเดินท่อไฟและร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 22-24





# รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

## ตรวจสอบงานทดสอบวงจร Lighting & Power Reception บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22

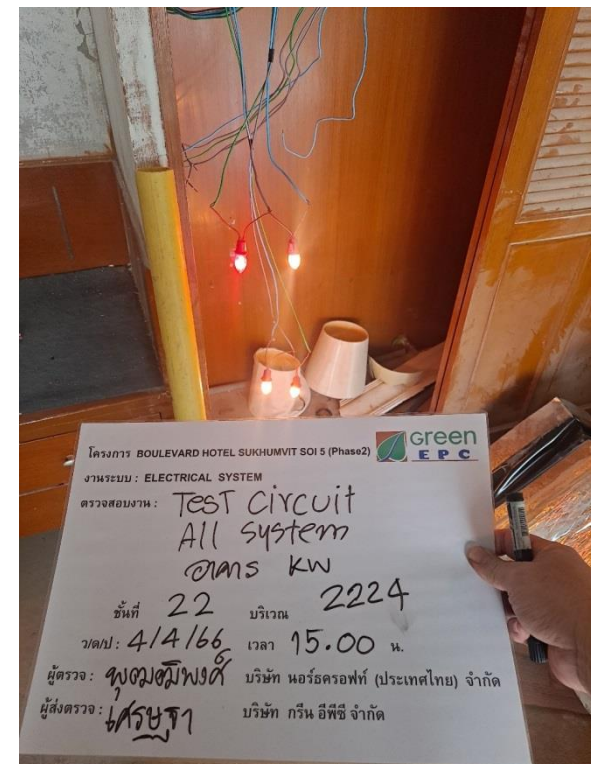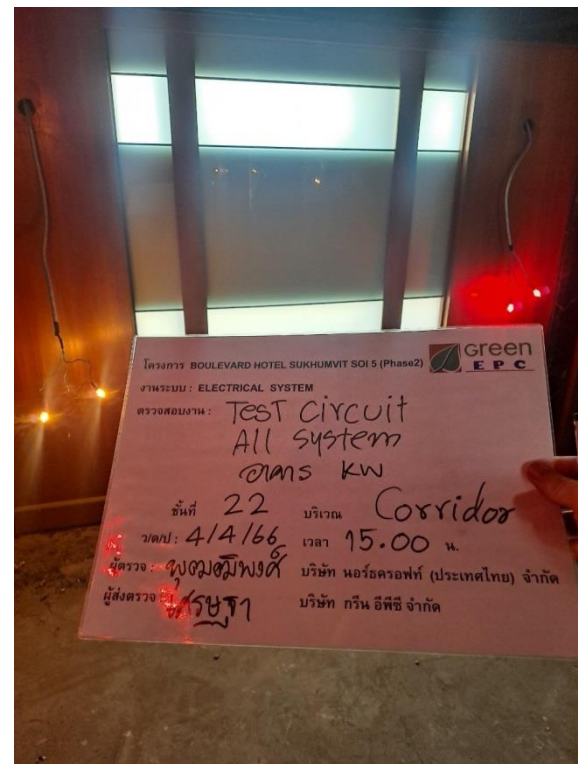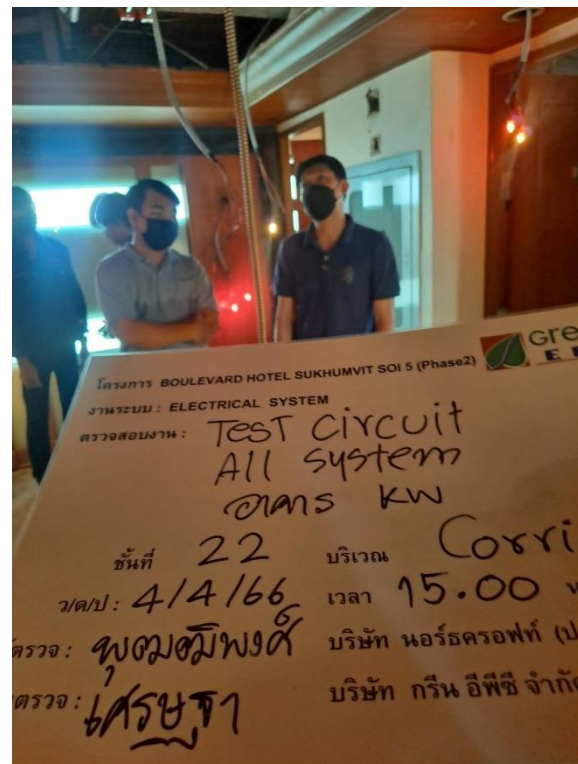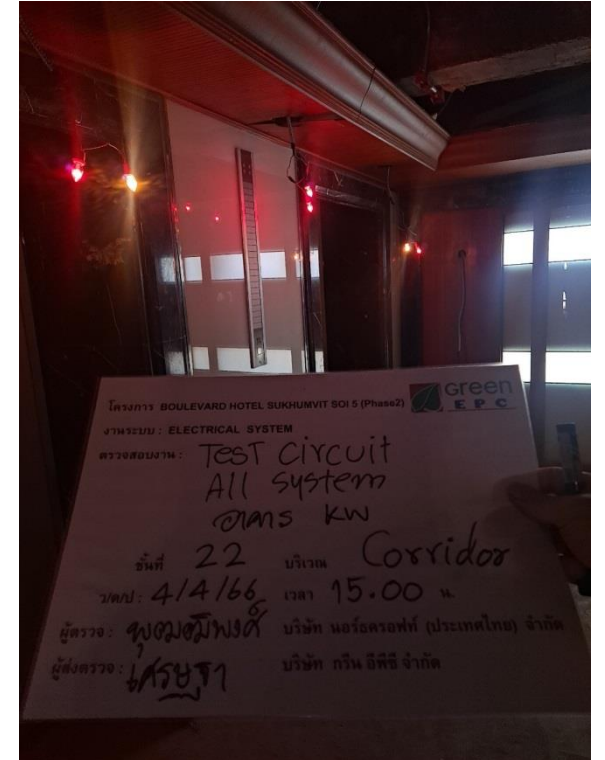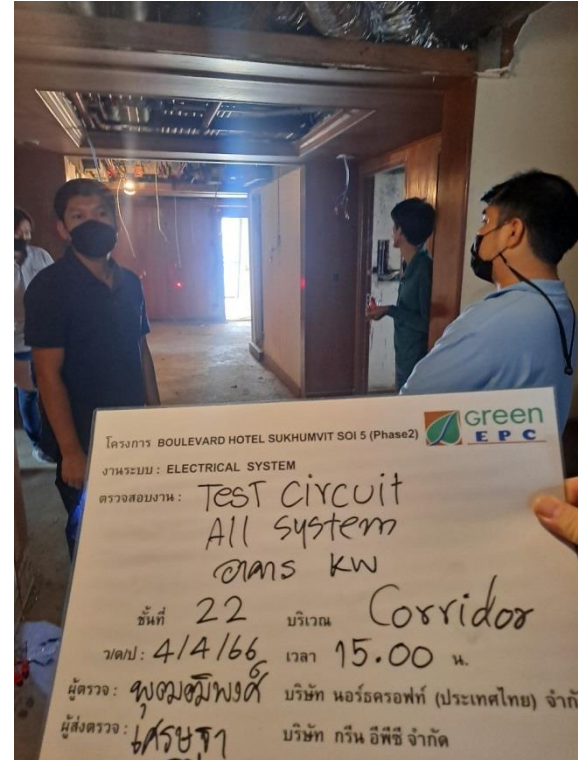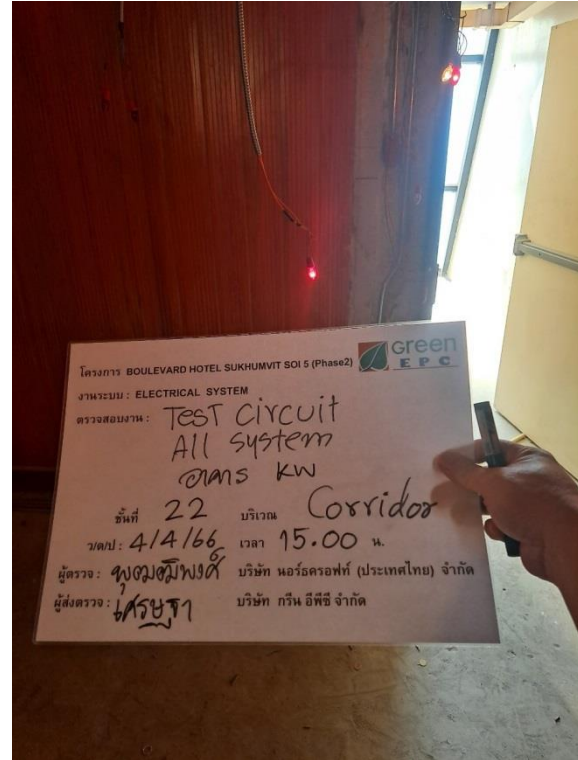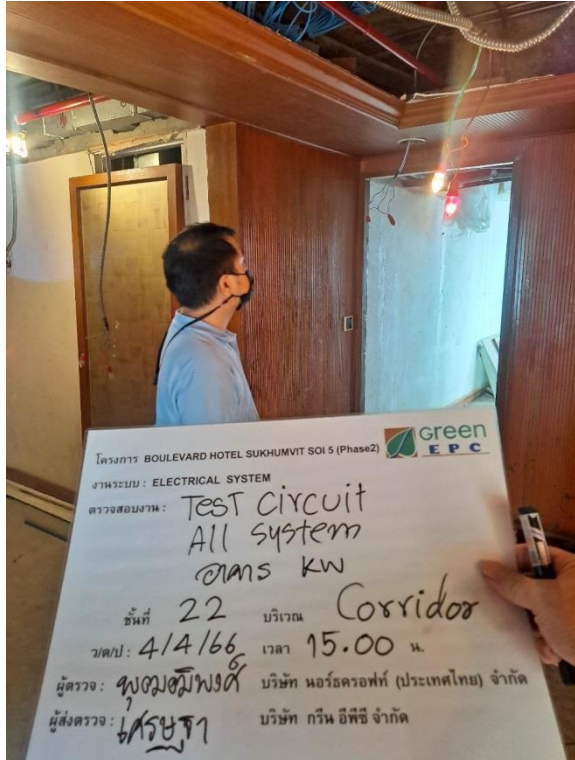



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งลำโพงบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,8,9






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งลำโพงบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,8,9

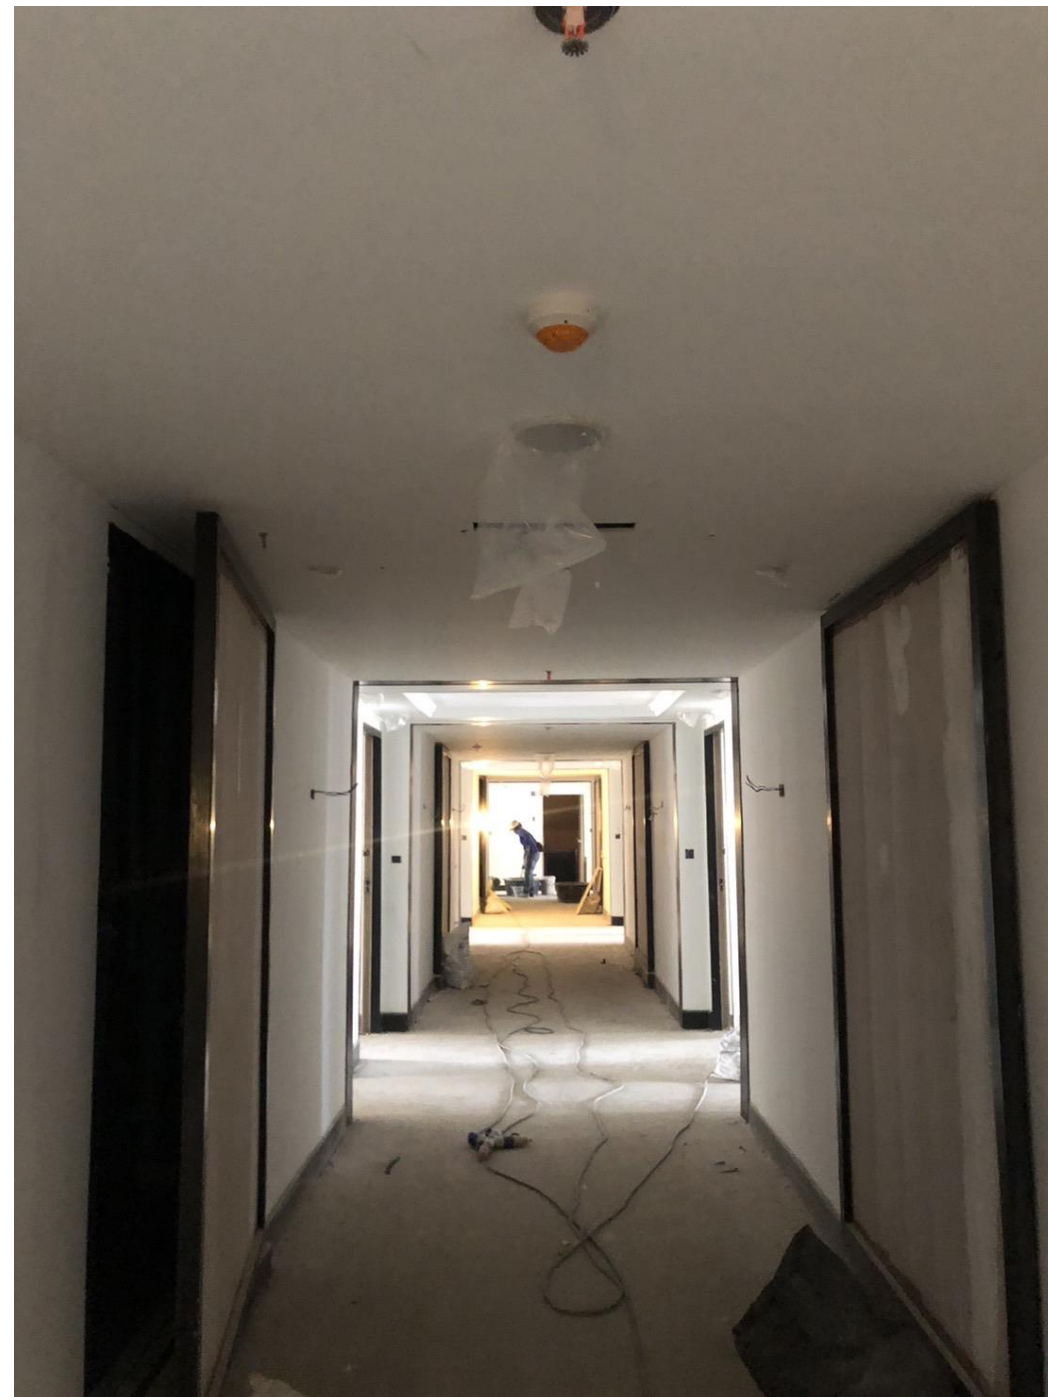

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อดักส้วมบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18-21





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อดักส้วบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18-21






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6

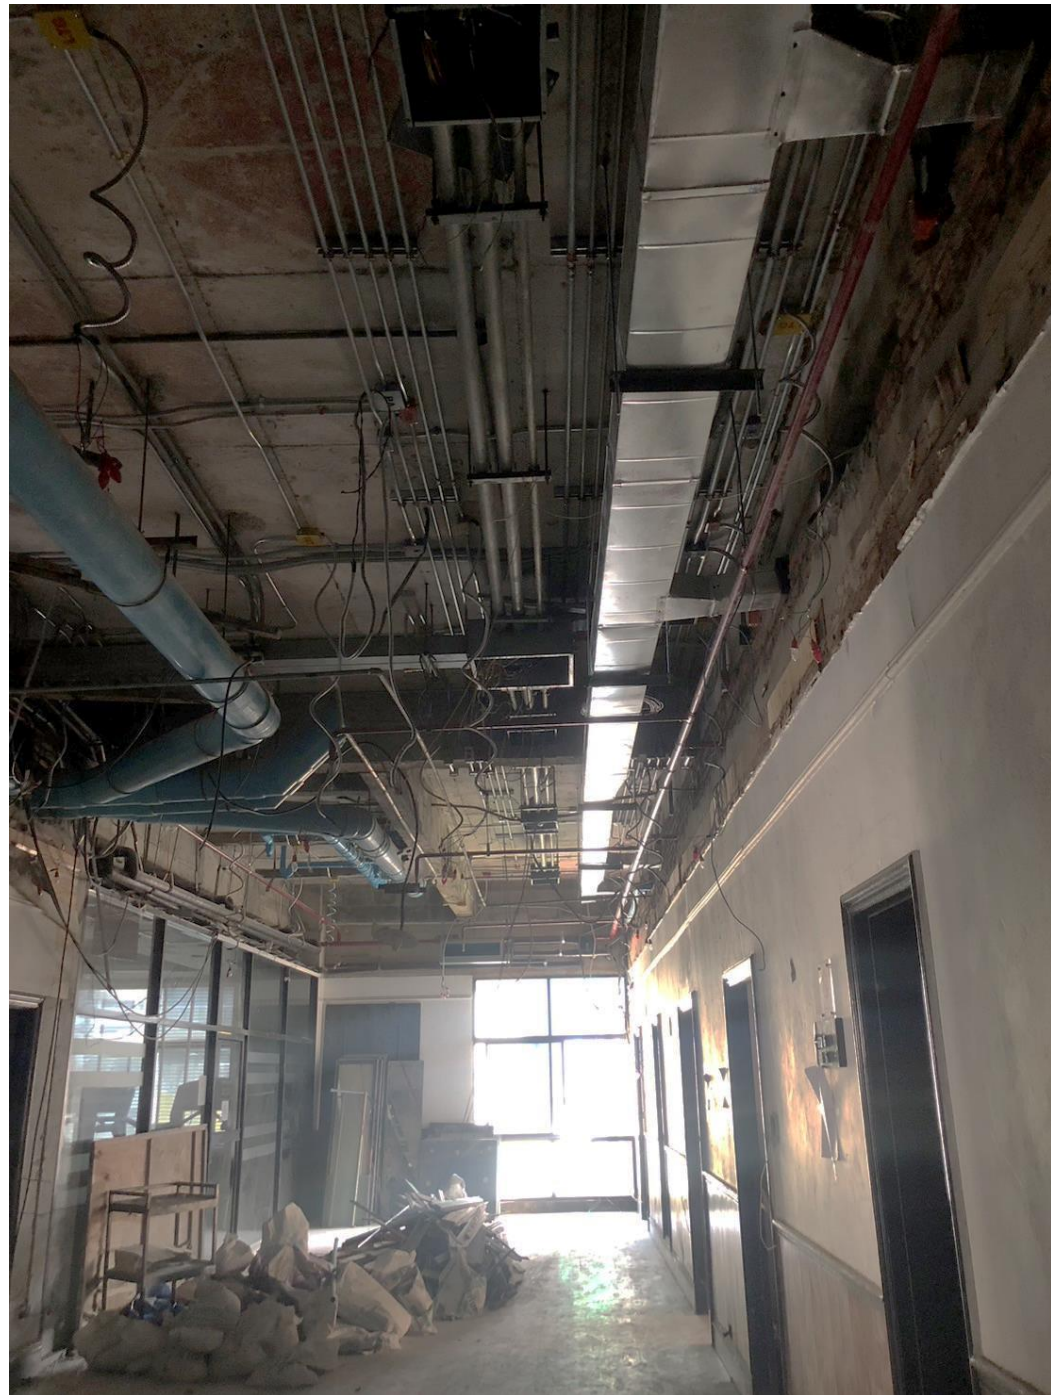



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งป้าย Exit Sign บริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-9






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งป้าย Exit Sign บริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-9

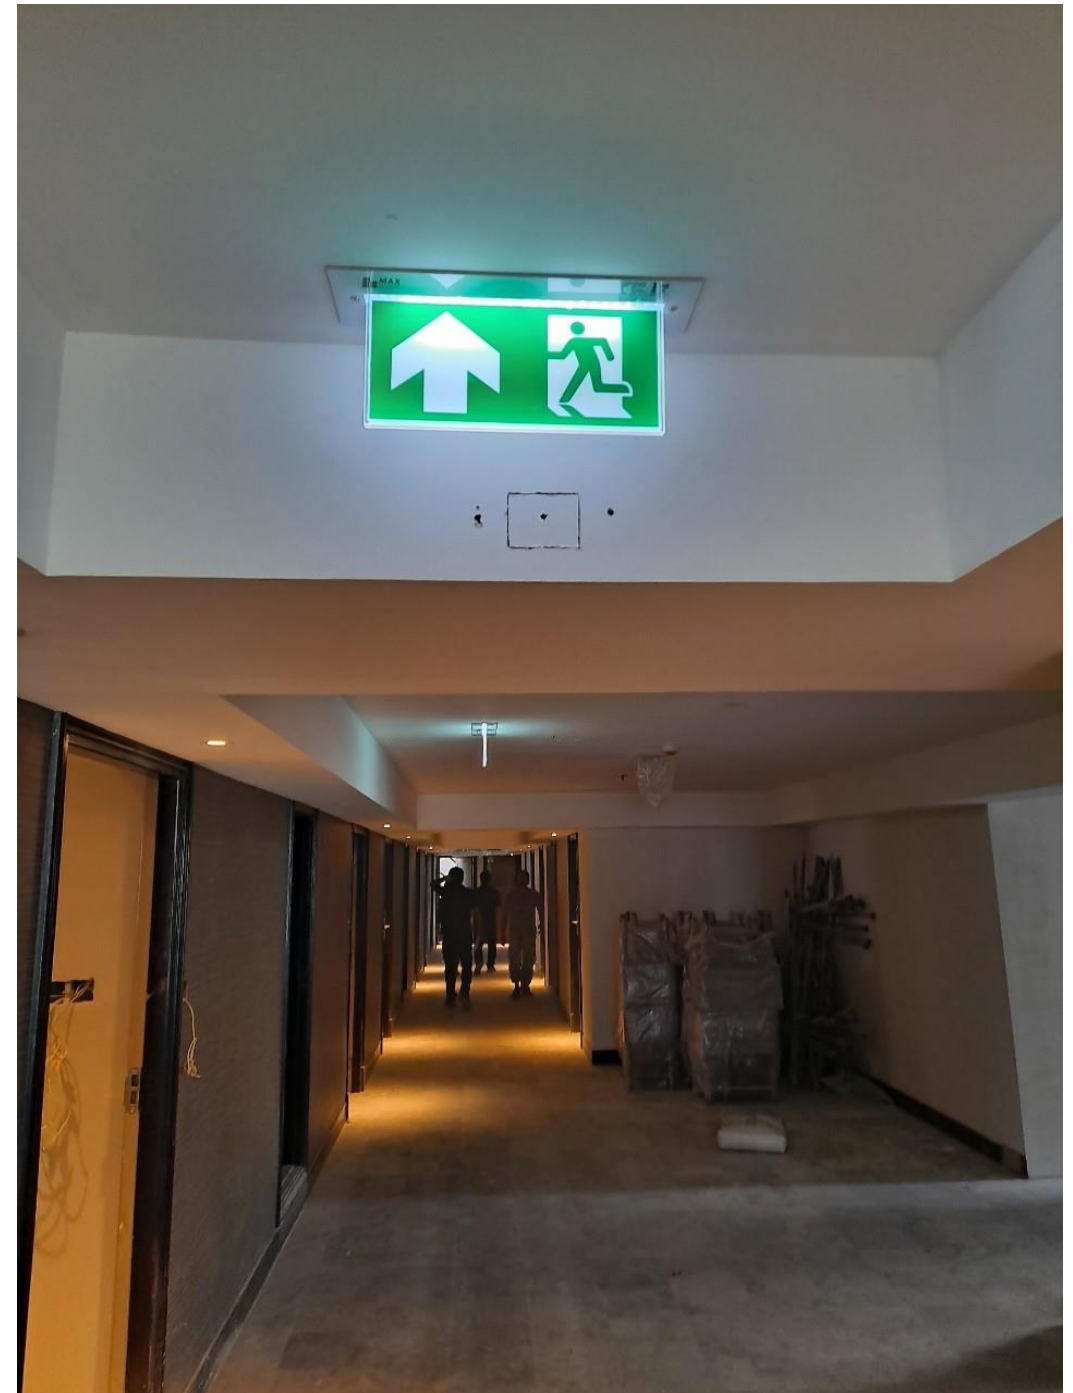



# รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

# ตรวจสอบงานทดสอบวงจร Lighting & Power Reception บริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6

