



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT


**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

05 Oct 2023

## แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II



# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

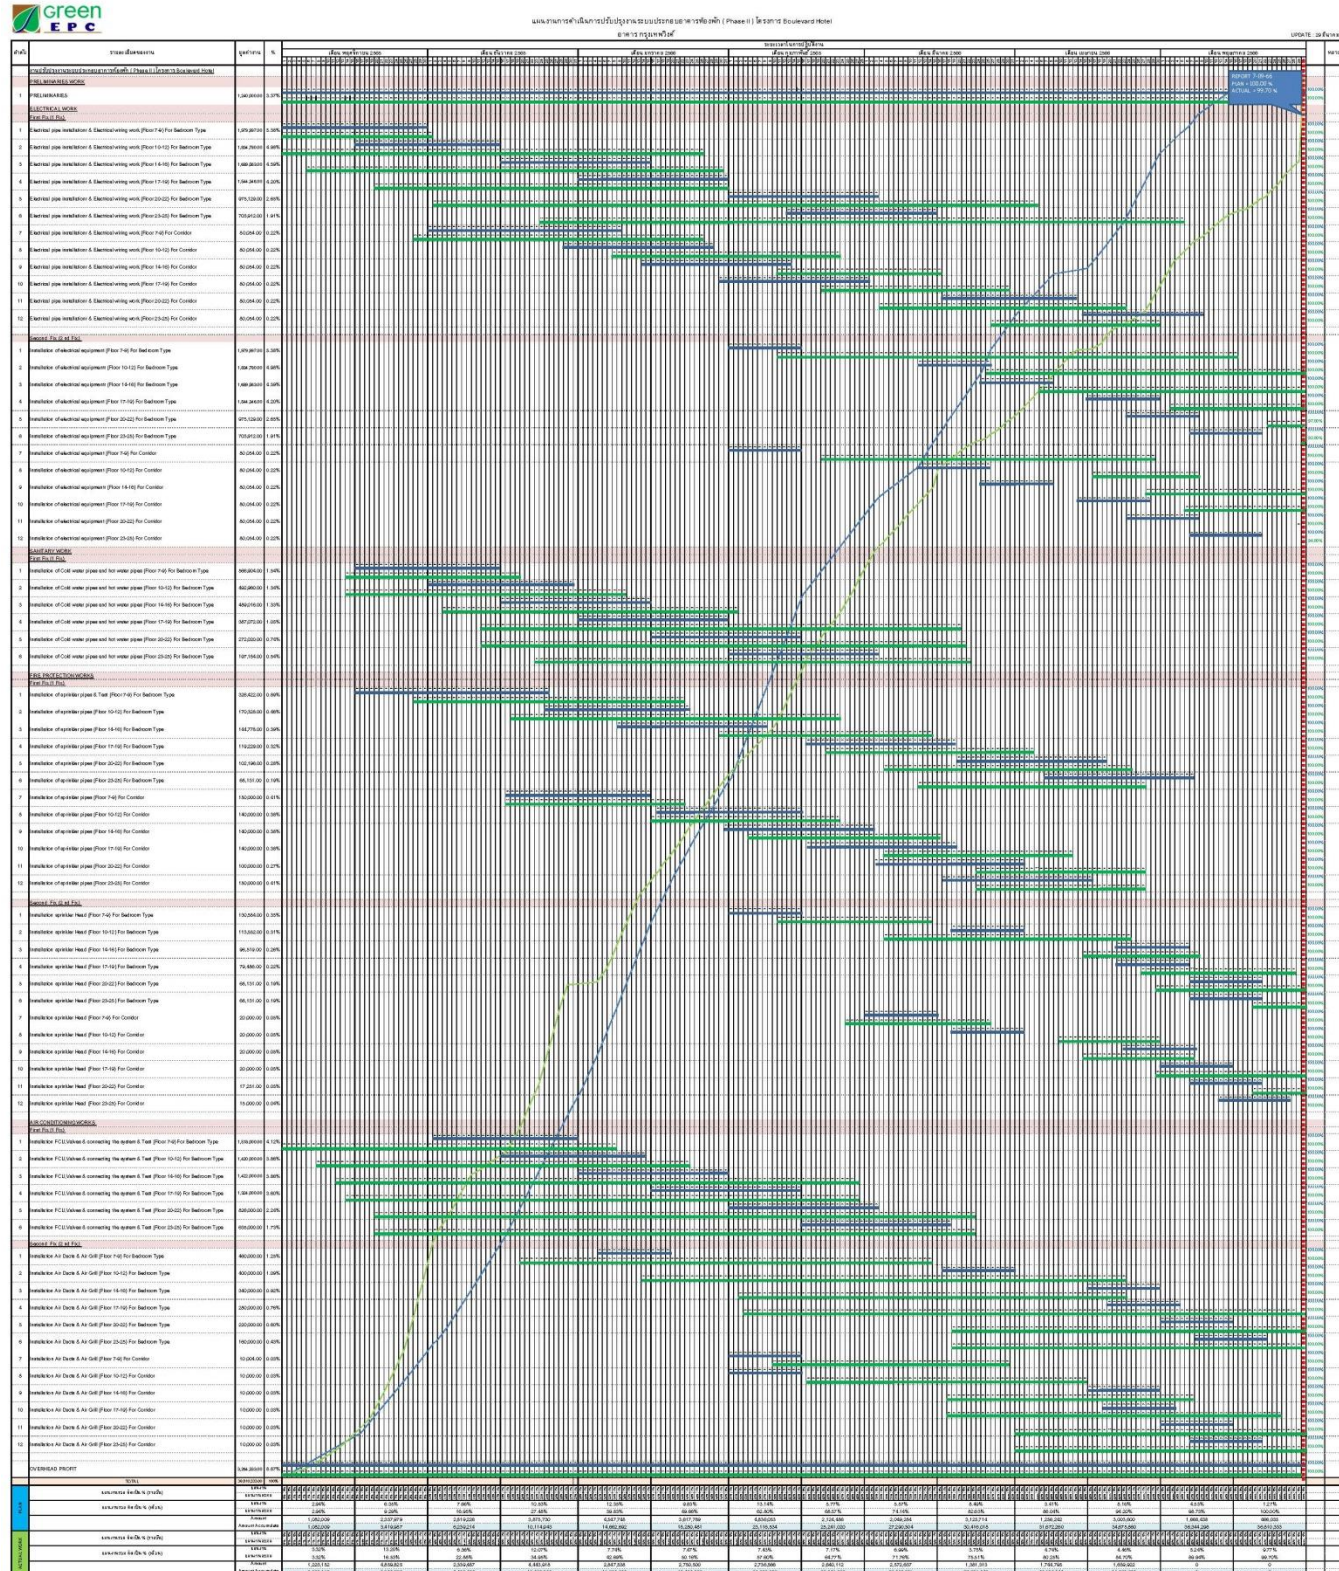

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-10-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.89%	- % ล่าช้า 141 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน




# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) | โครงการ Boulevard Hotel  
อาคารสยามวิเศษ

UPD DATE : 28 Nov 2016

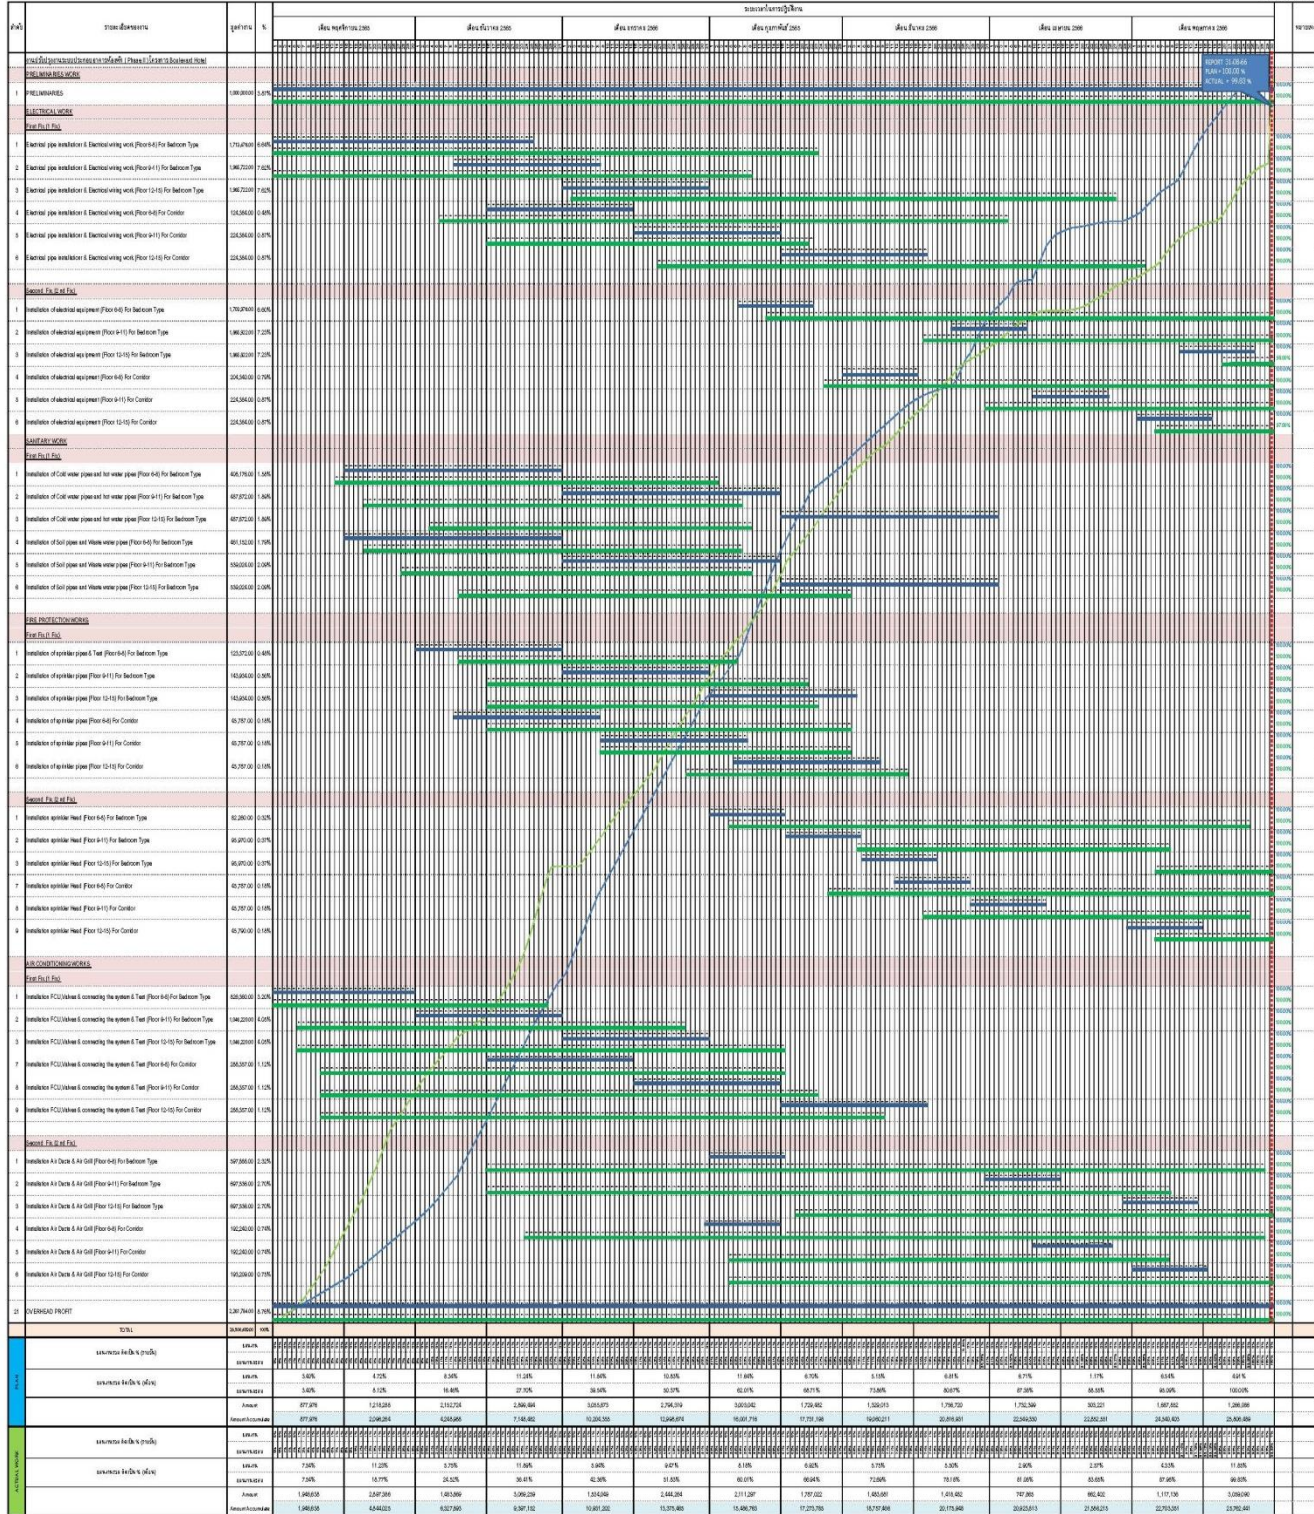

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-10-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.84%	- % ล่าช้า 141 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

**MAN POWER**

# ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2566



## ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกันยายน 2566																														เดือนตุลาคม 2566						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4			
1	Project Manager	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-			
2	Architecture Engineer	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	
3	Electrical Engineer	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-			
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Safety	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	
6	Sanitary Foreman	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Electrical Foreman	1	1	-	1	1	1	2	2	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Site Admin	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	
10	Electricians	7	5	-	6	6	6	11	12	10	-	5	5	5	-	4	4	-	6	5	6	5	6	6	-	7	6	7	7	7	7	6	-	7	6	-		
11	Plumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sprinkler	-	-	-	5	5	4	3	3	-	-	3	-	3	3	3	3	-	3	3	3	-	3	-	-	-	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	General Technician	11	8	-	6	6	8	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	4	3		
15	Store	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>	24	17	0	21	23	23	23	25	16	0	18	13	14	9	15	16	0	17	13	17	15	20	16	0	15	22	21	19	19	15	3	16	20	10			

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานประกอบท่อสปริงเกอร์สำหรับติดตั้งบริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานประกอบท่อสปริงเกอร์สำหรับติดตั้งบริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

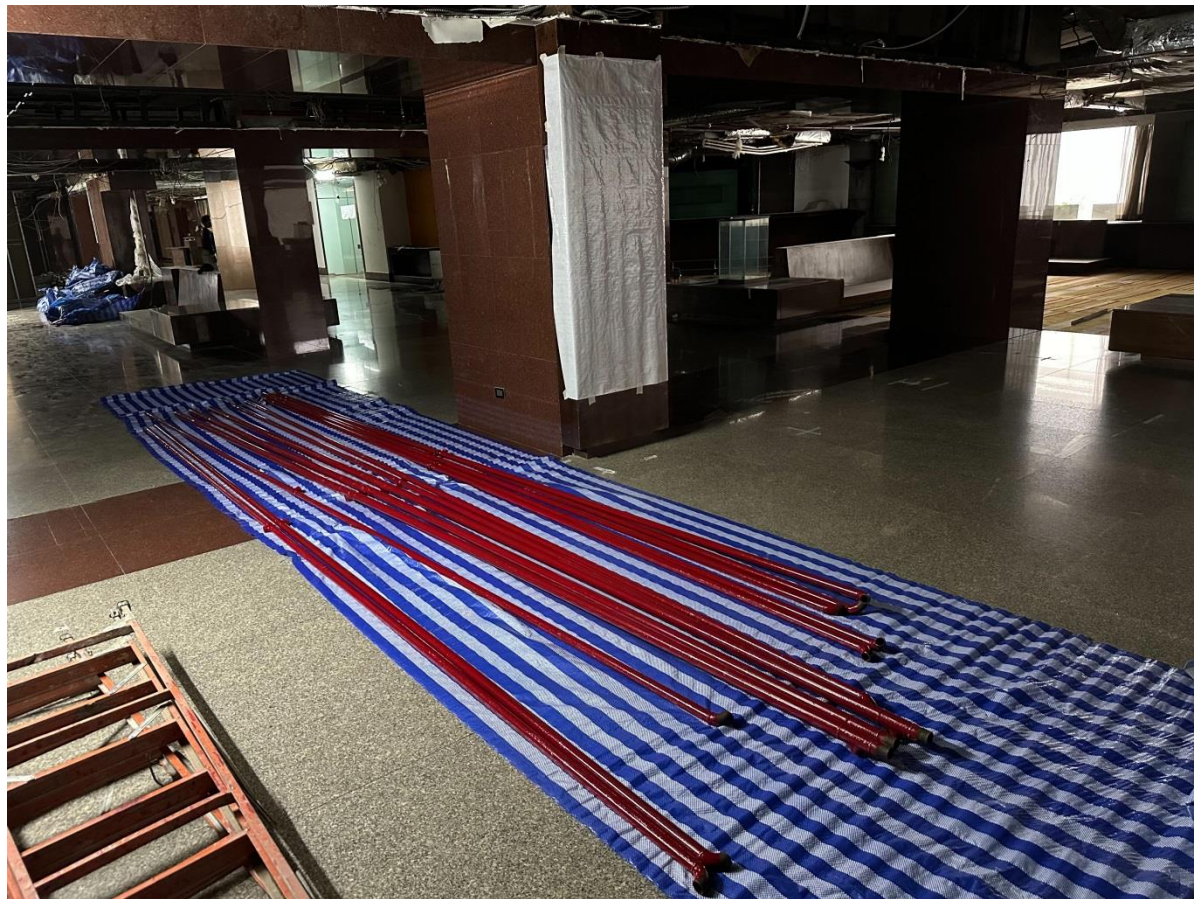



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

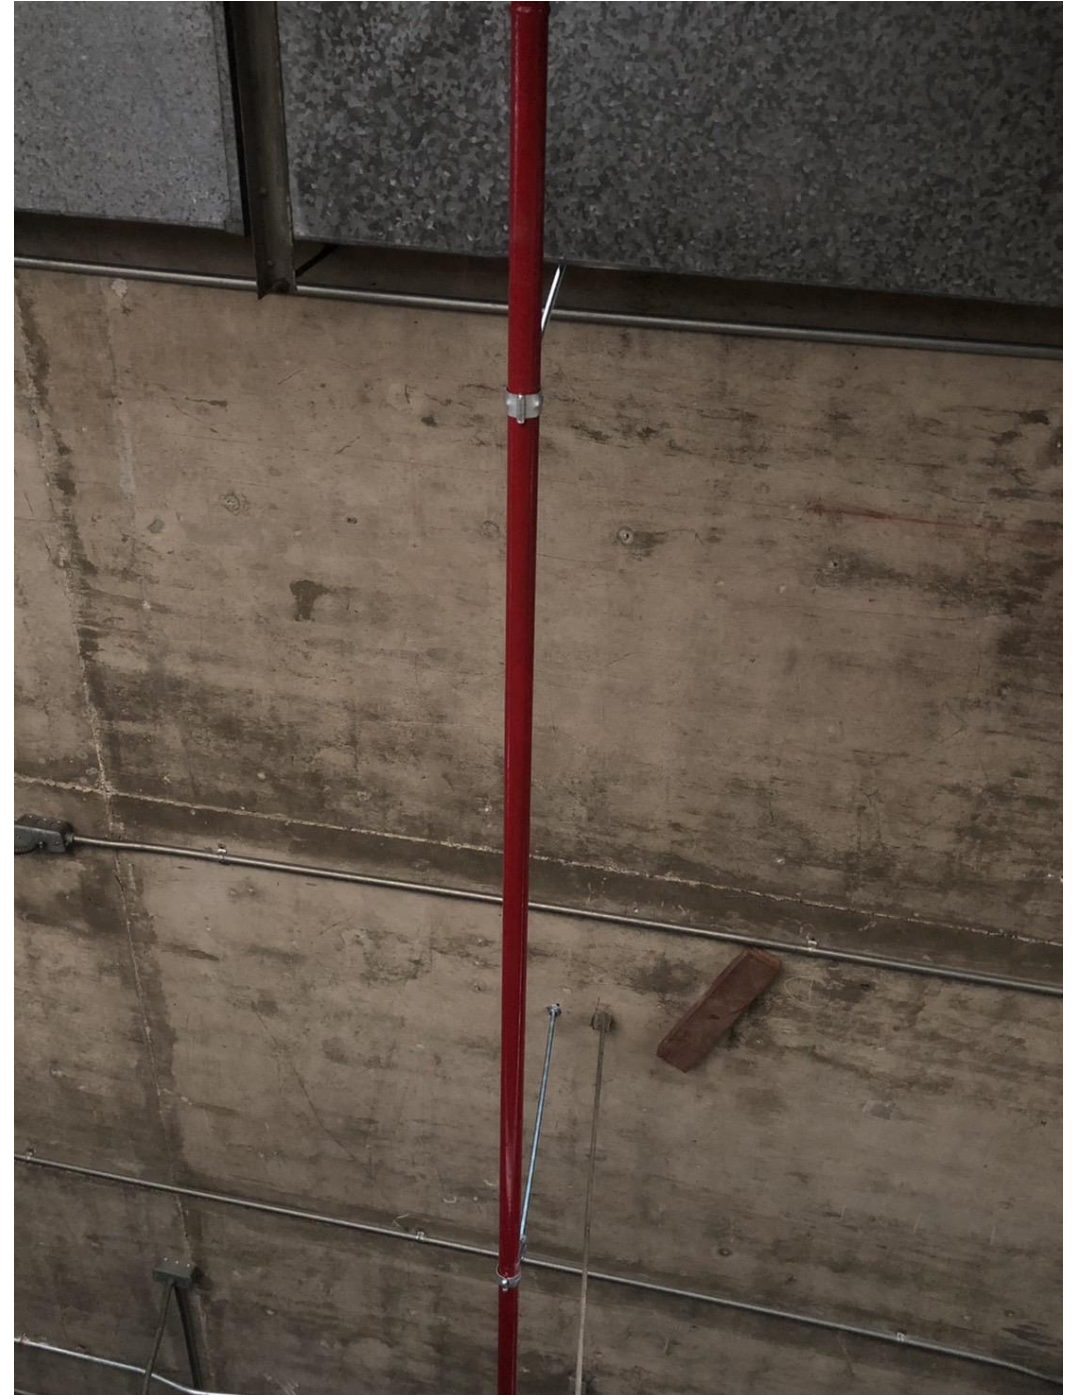



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบตำแหน่งหัวสปริงเกอร์บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

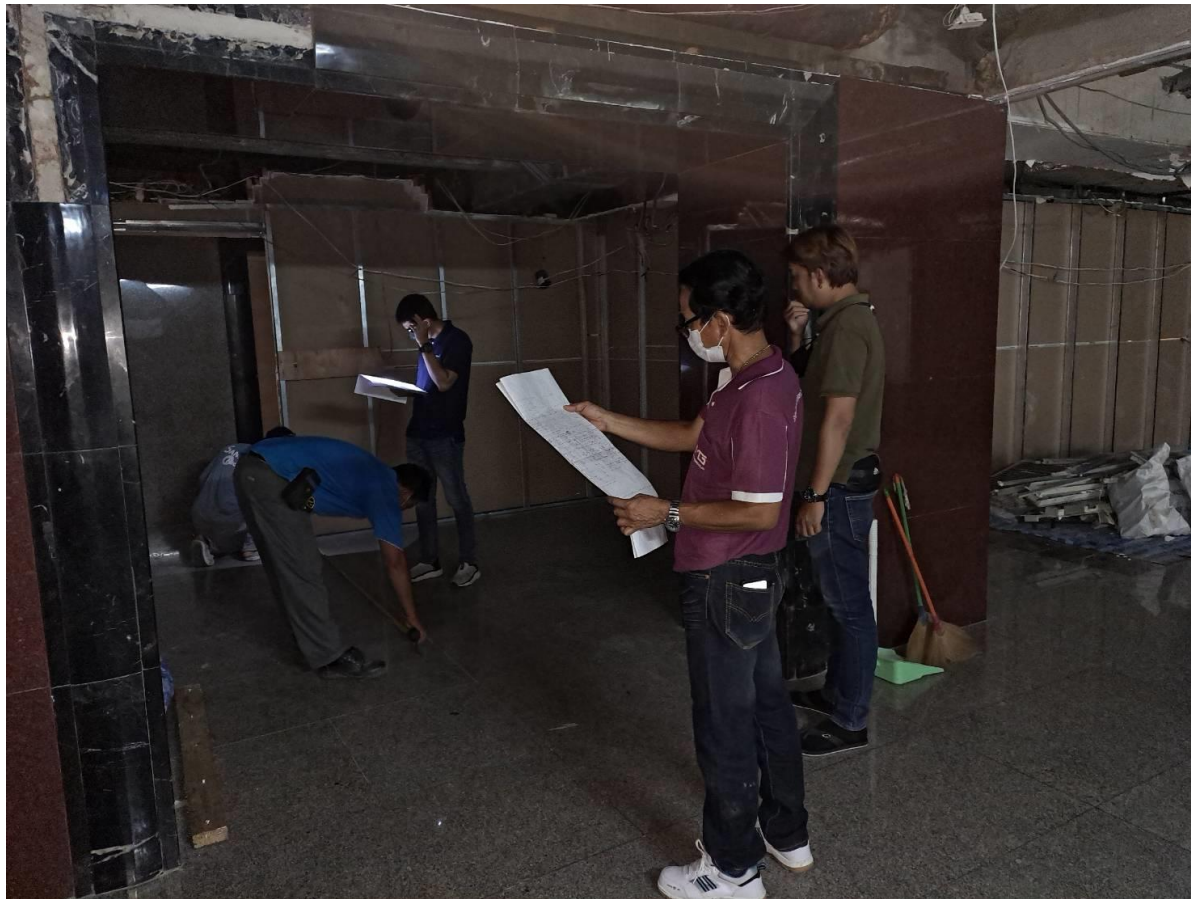



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบตำแหน่งหัวสปริงเกอร์บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

