



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**


06 JULY 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารที่พัก (Phase II) | โครงการ กรุงเทพฯ

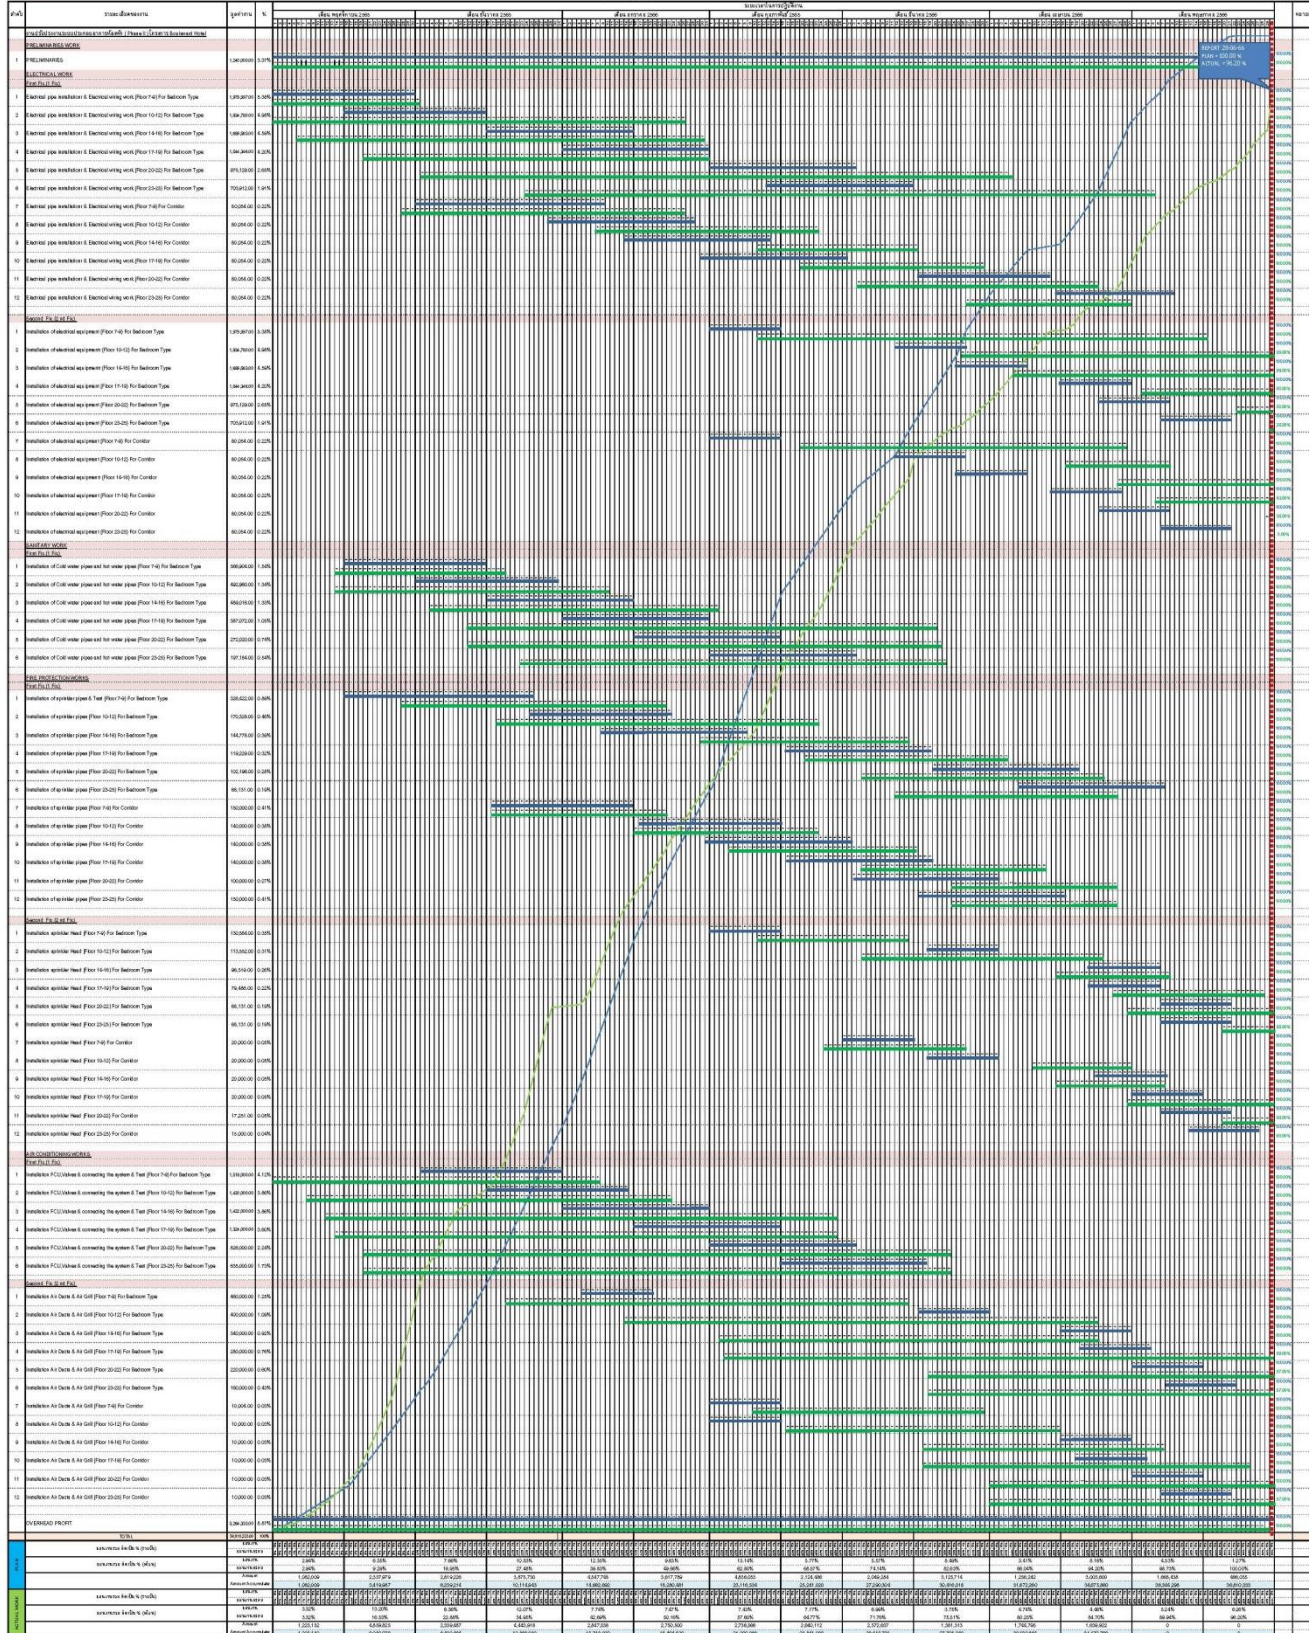

WEEKLY PROGRESS REPORT

| PROGRESS CURRENT (6-07-66) | PLAN (%) | ACTUAL (%) | DELAY |
|----------------------------|----------|------------|----------------------|
| | 100.00% | 96.76% | - % ล่าช้า 49 วัน |


หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ Business Hotel
อาคาร สยามวิเศษ

UPDATE: 06/07/66

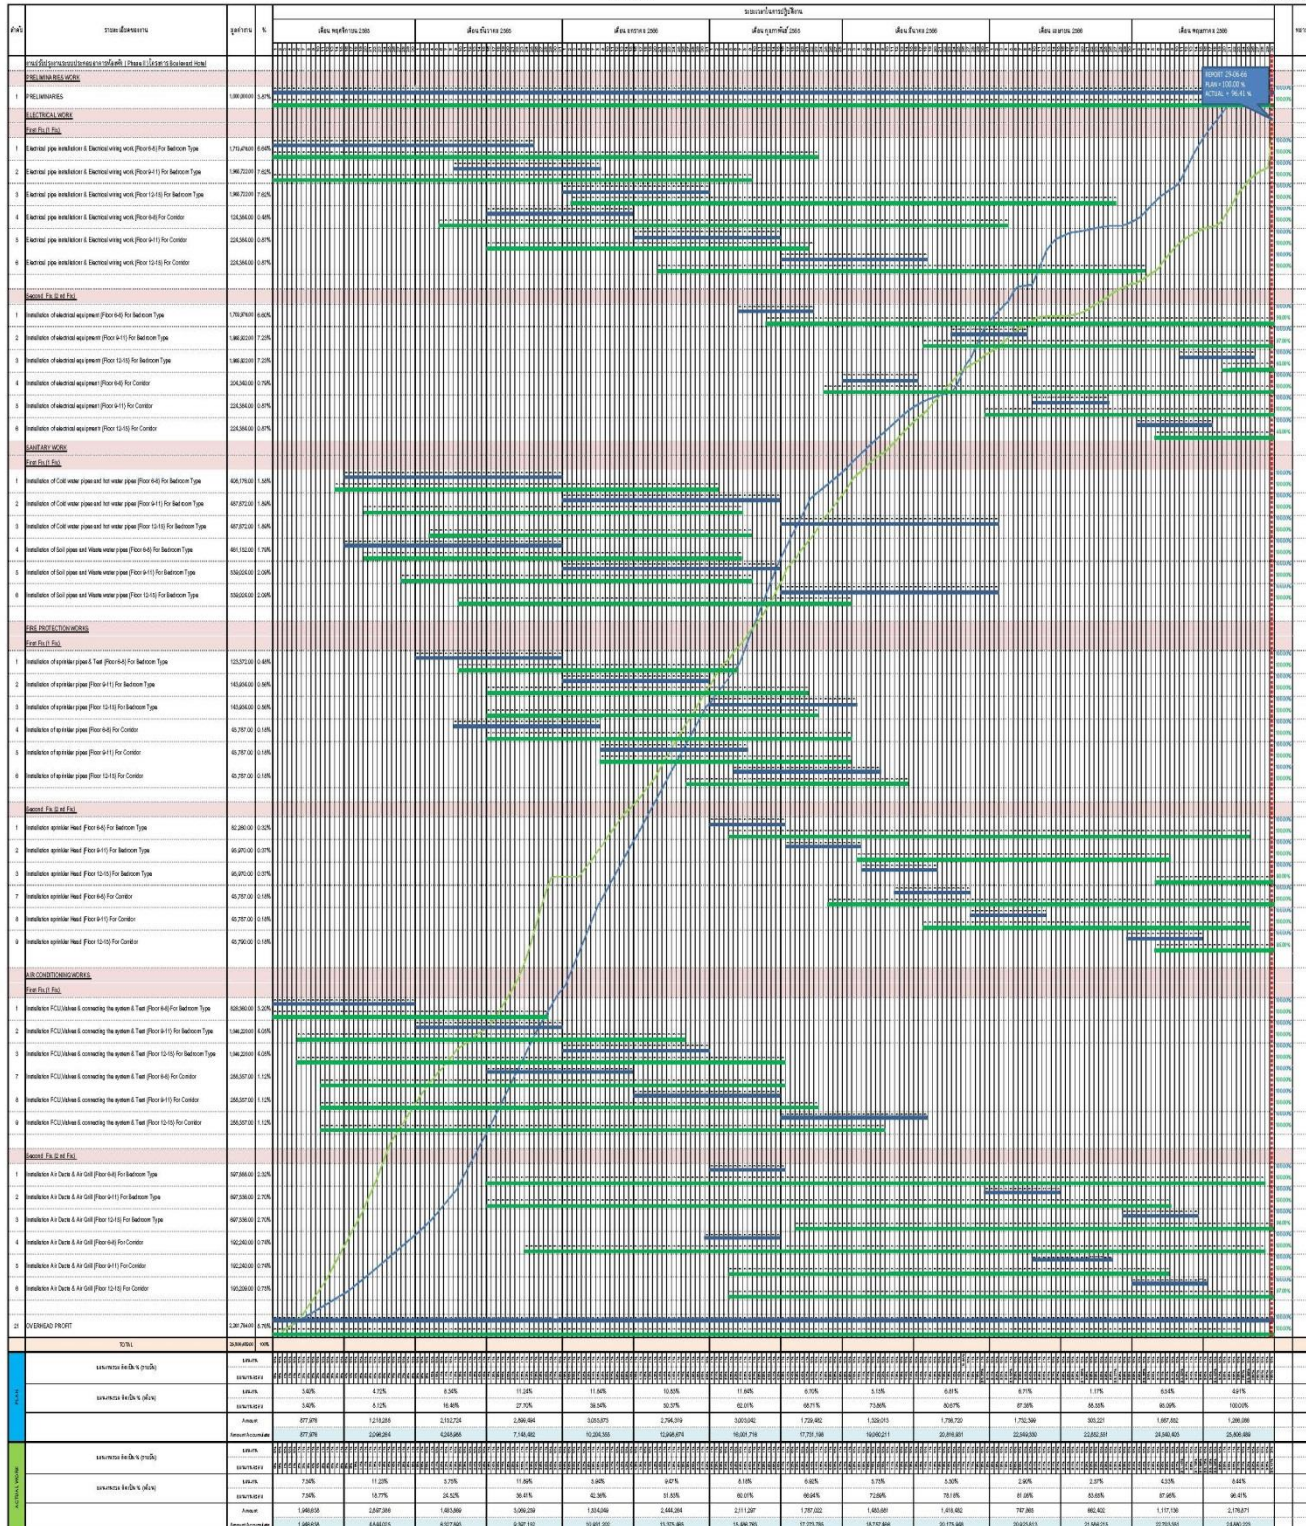

WEEKLY PROGRESS REPORT

| PROGRESS CURRENT (6-07-66) | PLAN (%) | ACTUAL (%) | DELAY |
|----------------------------|----------|------------|----------------------|
| | 100.00% | 97.40% | - % ล่าช้า 49 วัน |

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

| ลำดับที่ | พนักงาน | เดือนกรกฎาคม 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|---|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | Project Manager | 1 | | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Architecture Engineer | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Electrical Engineer | - | | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Air Conditioning Engineer | - | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Safety | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sanitary Foreman | - | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Electrical Foreman | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Air Foreman | 1 | | 1 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Site Admin | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Electricians | 12 | | 14 | 14 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Plumber | - | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sprinkler | - | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Air Conditioner | 6 | | 6 | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | General Technician | 3 | | - | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Store | 2 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Tiler | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Skim Coat | - | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | 34 | 0 | 41 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายสำหรับจ่าย Emer บริเวณหน้าลิฟต์ Service อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 7-12



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,10,11



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,10,11



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7,10,11




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 21-24



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 10

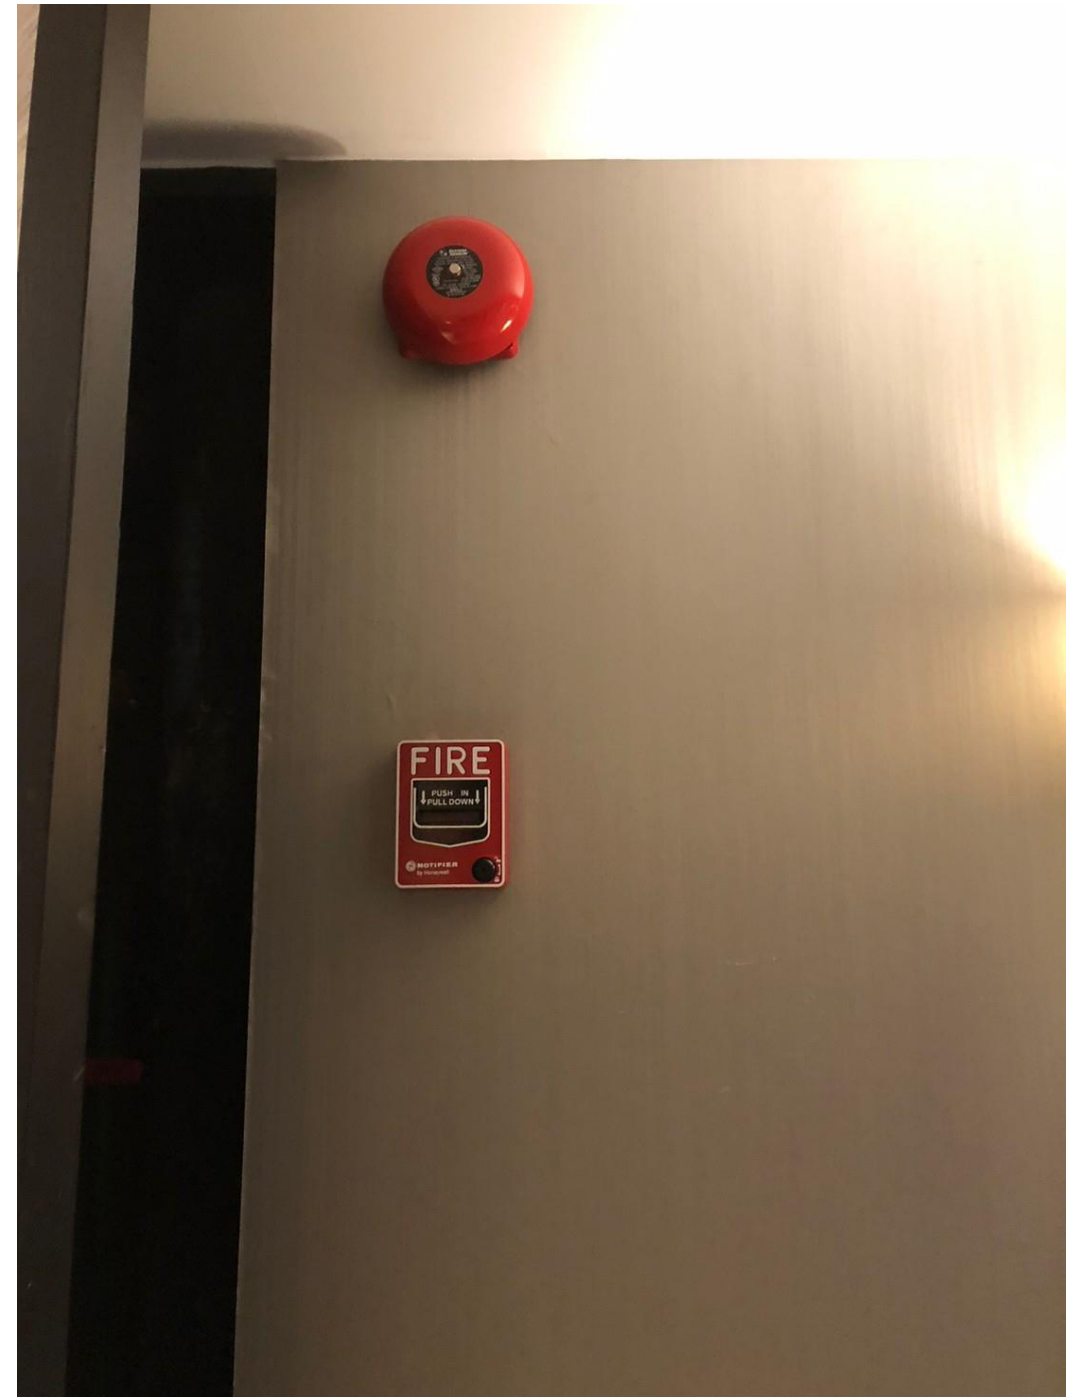

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ อาคารสยามวิงค์ ชั้น 6

