



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

7 Sep 2023


แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) | โครงการ Boulevard Hotel
อาคารสยามวิเศษ

UPD: 16/09/2016

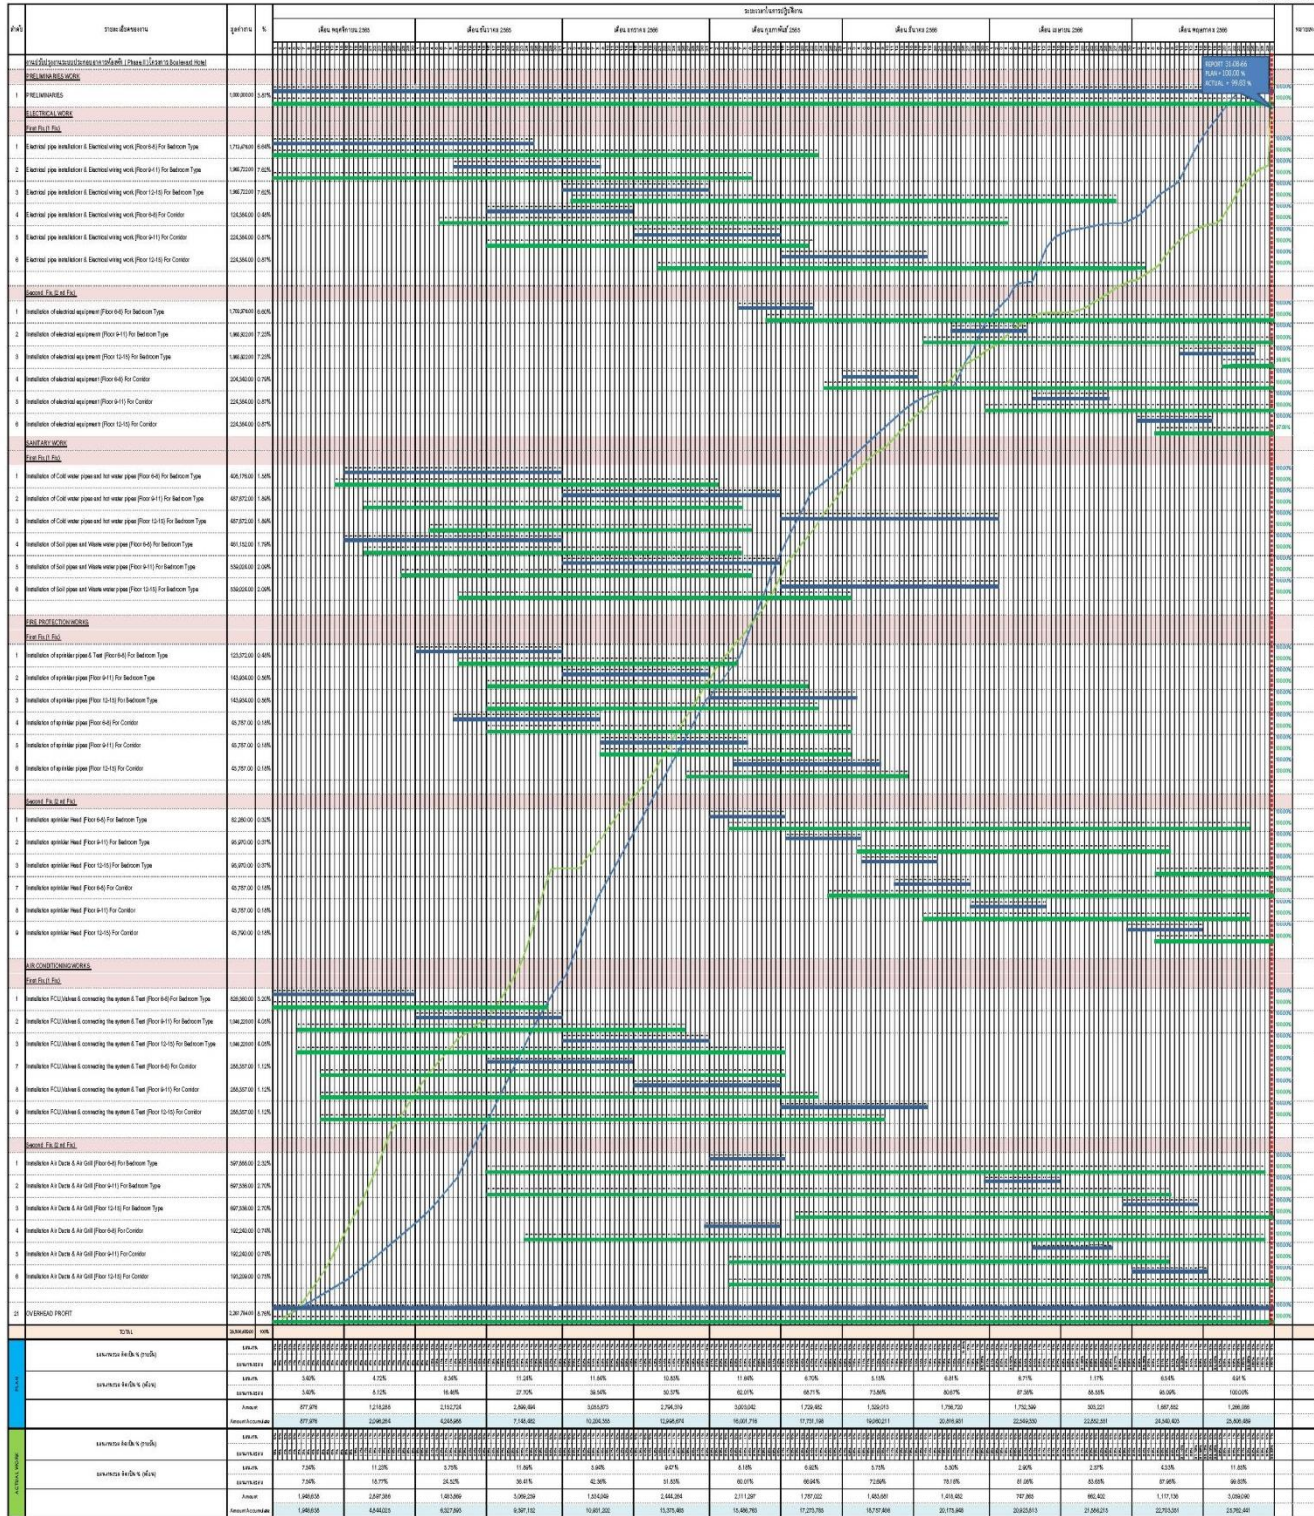

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (7-09-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.83%	- % ล่าช้า 112 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกันยายน 2566																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Project Manager	1	-	-	1	1	-																								
2	Architecture Engineer	1	1	-	1	1	1																								
3	Electrical Engineer	1	-	-	-	1	1																								
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-																								
5	Safety	1	1	-	-	1	1																								
6	Sanitary Foreman	-	-	-	-	-	-																								
7	Electrical Foreman	1	1	-	1	1	1																								
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-																								
9	Site Admin	1	1	-	1	1	1																								
10	Electricians	7	5	-	6	6	6																								
11	Plumber	-	-	-	-	-	-																								
12	Sprinkler	-	-	-	5	5	-																								
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-																								
14	General Technician	11	8	-	6	6	8																								
15	Store	-	-	-	-	-	-																								
16	Tiler	-	-	-	-	-	-																								
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-																								
	รวม	24	17	0	21	23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานรื้อถอนฝ้าเพดานสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสายเคเบิลสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานรื้อถอนฝ้าเพดานสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานร้อยสายไฟเพดานสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1

