



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

10 Aug 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

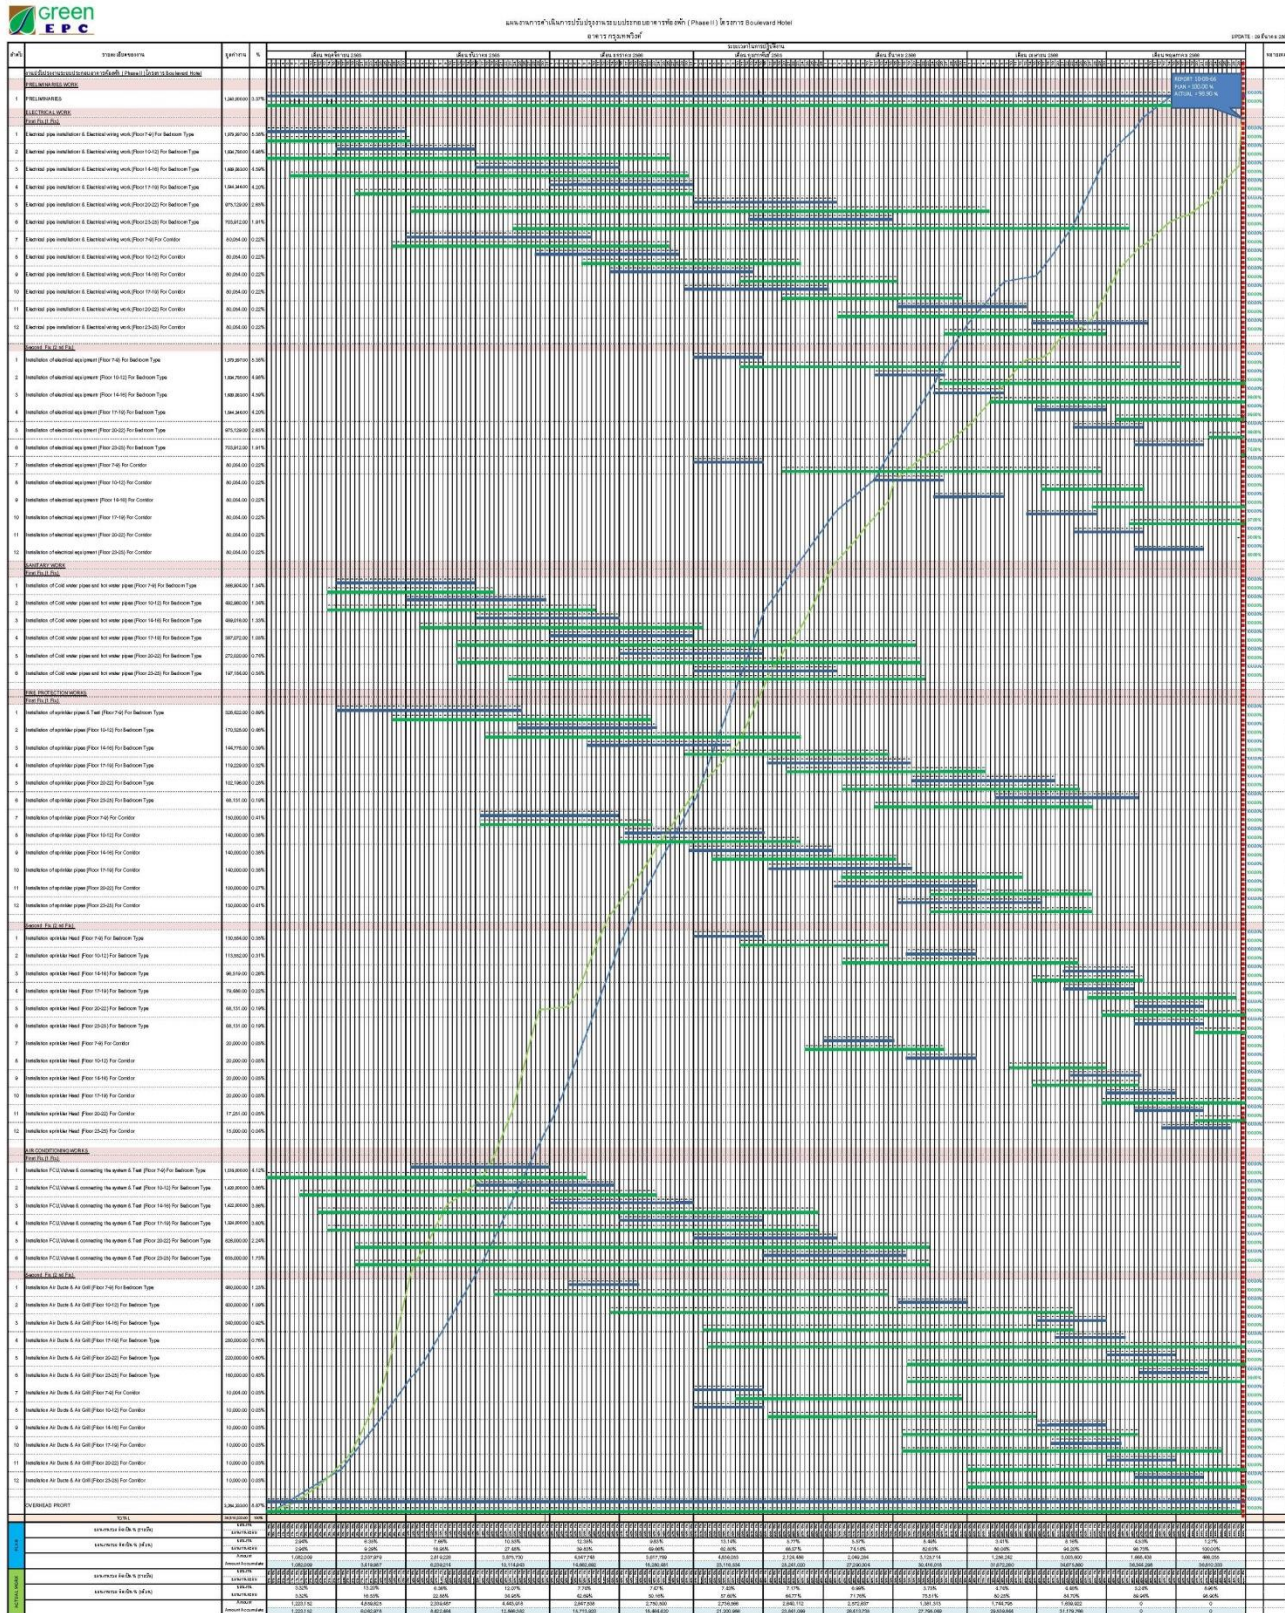


WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (10-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	98.90%	- % ล่าช้า 84 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)

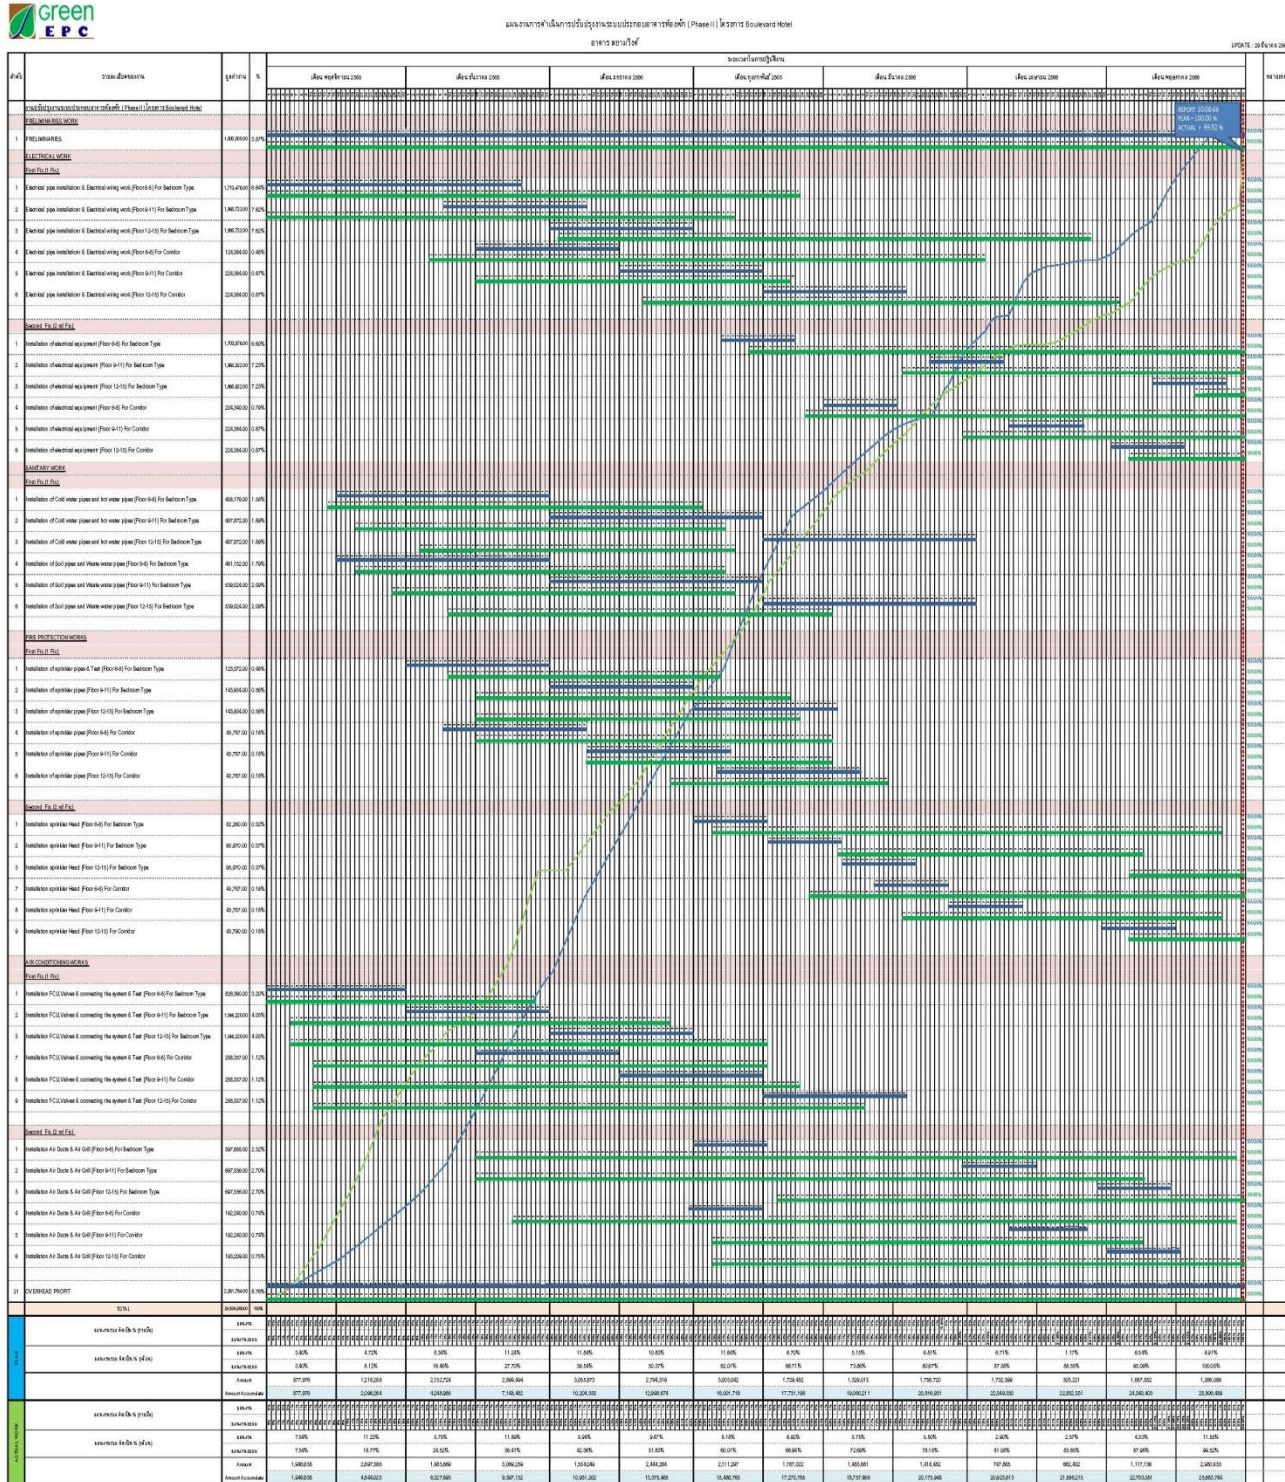

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (10-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.52%	- % ล่าช้า 84 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนสิงหาคม 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Project Manager	-	1	1	1	-	-	1	1	-																						
2	Architecture Engineer	1	1	1	1	1	-	1	1	1																						
3	Electrical Engineer	1	1	1	1	1	-	1	1	1																						
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
5	Safety	1	1	1	1	1	-	1	1	1																						
6	Sanitary Foreman	1	1	1	-	-	-	-	-	1																						
7	Electrical Foreman	1	1	2	2	2	-	2	2	2																						
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
9	Site Admin	1	1	1	1	1	-	1	1	1																						
10	Electricians	5	7	12	12	11	-	12	12	12																						
11	Plumber	5	5	5	-	-	-	-	-	4																						
12	Sprinkler	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
14	General Technician	4	4	-	4	4	-	4	4	4																						
15	Store	3	1	3	3	2	-	2	2	3																						
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
	รวม	23	24	28	26	23	0	25	25	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งป้าย Exit บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์
ชั้น 19-24



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานร้อยสาย Main EMER บริเวณหน้าลิฟต์
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-22



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานร้อยสาย Main EMER บริเวณหน้าลิฟต์
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-22

