



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

11 May 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

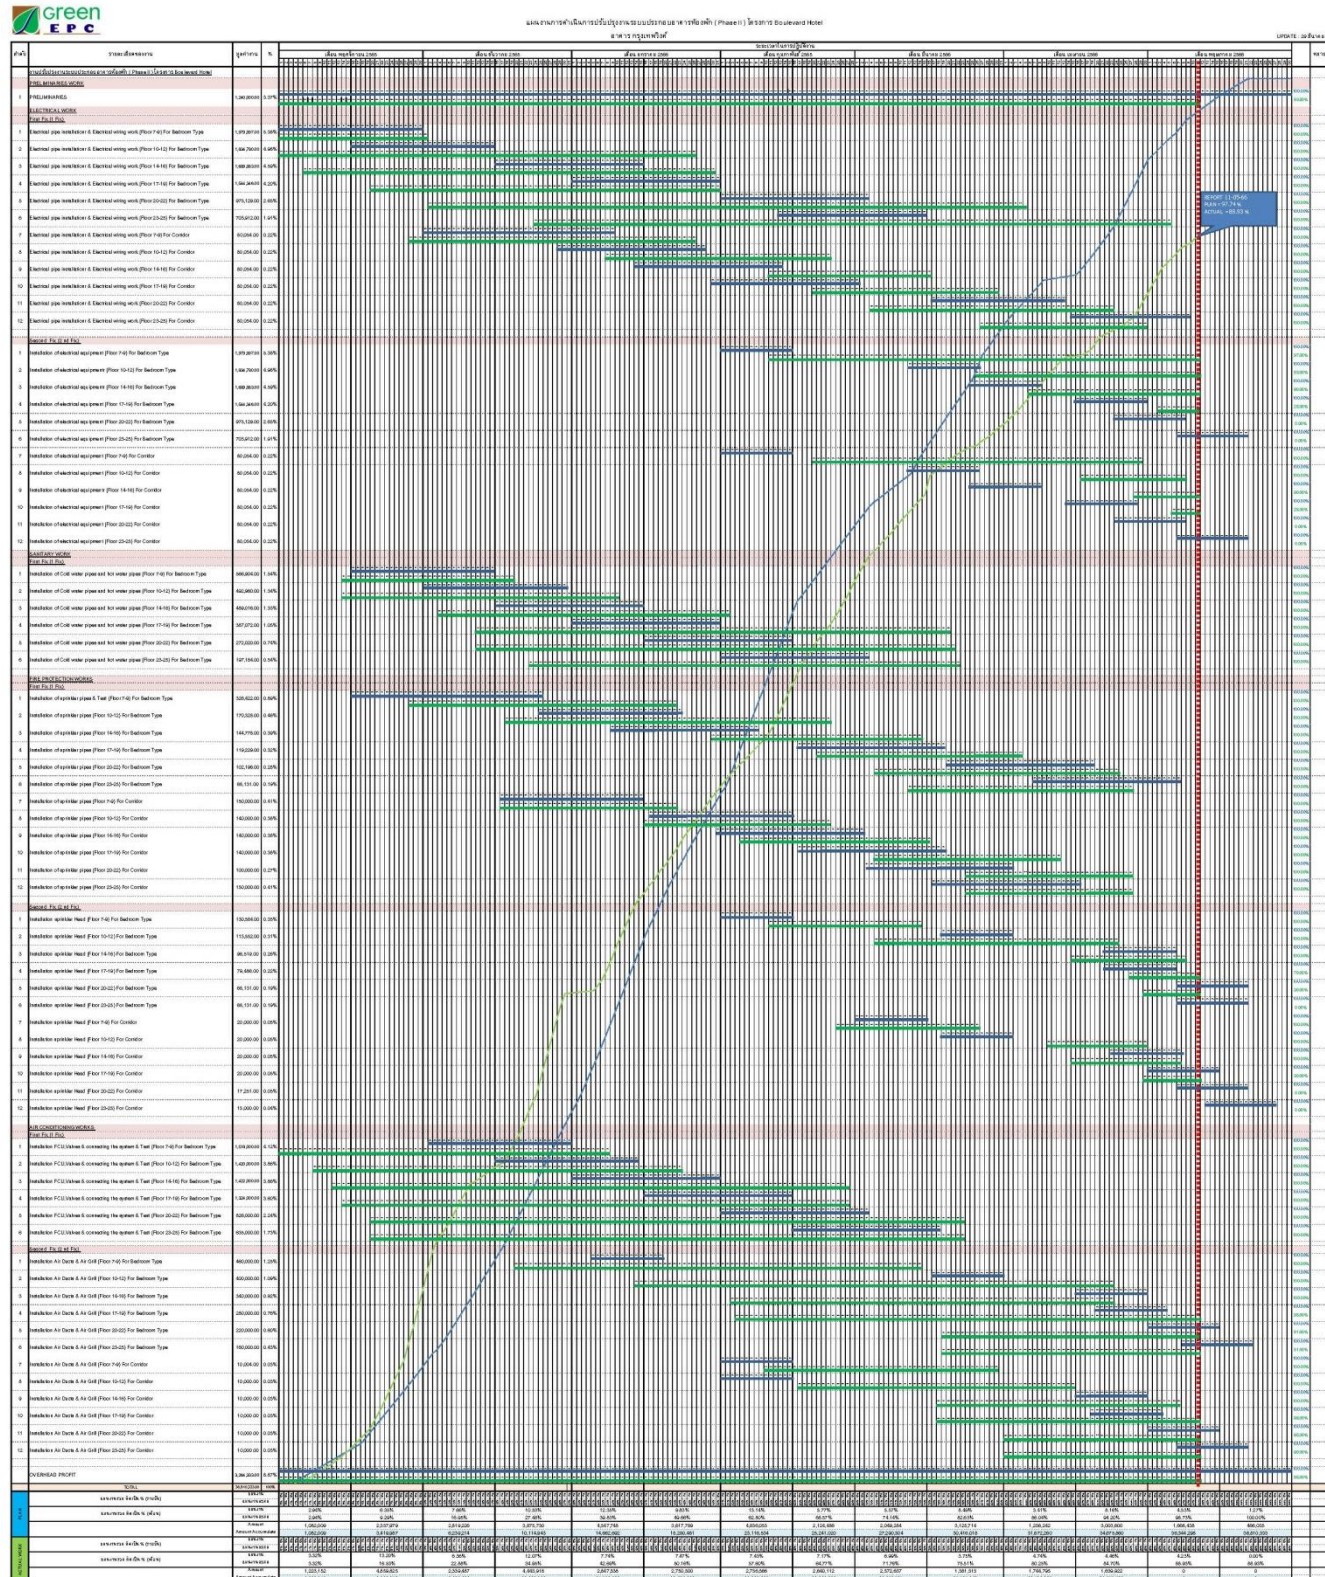

WEEKLY PROGRESS REPORT


PROGRESS CURRENT (11-05-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
97.74%		88.93%	- 8.81 % ล่าช้า 17 วัน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารพัก (Phase II) | โรงแรม สยามบีช รีสอร์ท
อาคาร สยามบีช

UPDATE: 20 พฤษภ 2566

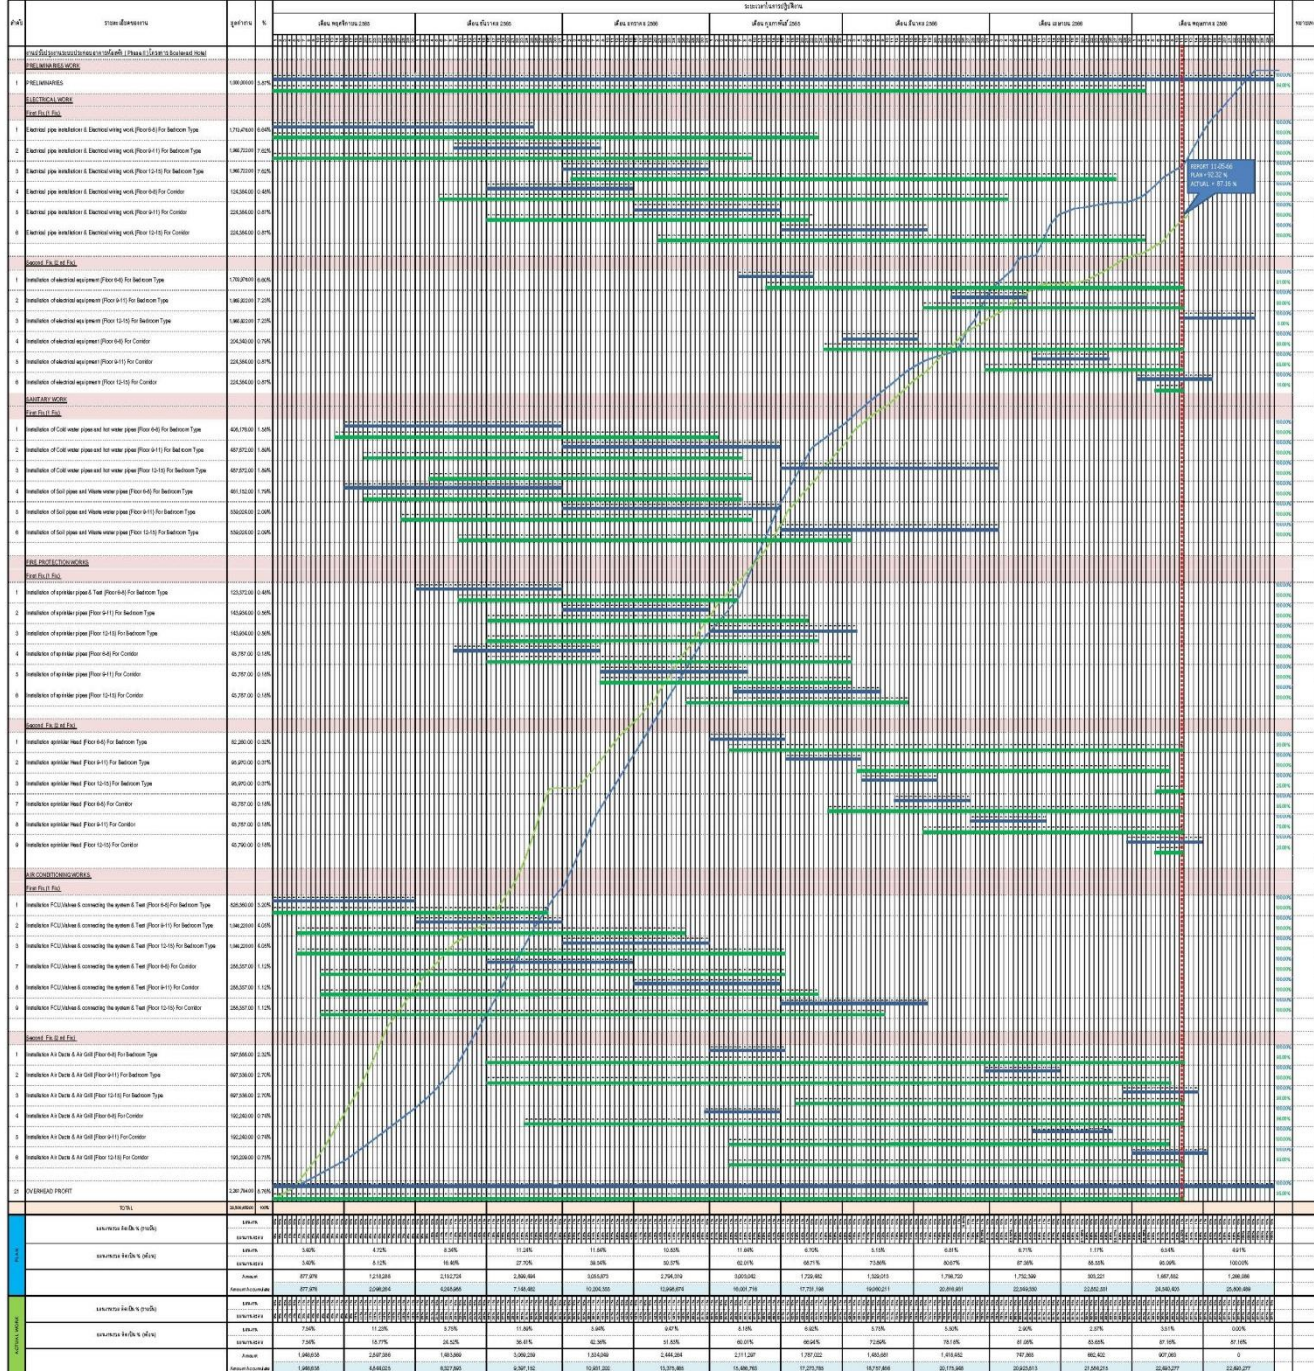

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (11-05-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
92.32%		87.16%	- 5.16 % ล่าช้า 10 วัน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนพฤษภาคม 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Project Manager		-	-	1	1	1	1	1	1	1																					
2	Sanitation Engineer		2	1	1	2	1	-	1	1	2																					
3	Electrical Engineer		1	1	1	1	1	-	1	1	1																					
4	Air Conditioning Engineer		1	1	-	-	1	1	-	1	1																					
5	Safety		1	1	1	1	1	-	1	1	1																					
6	Sanitary Foreman		1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
7	Electrical Foreman		2	2	2	2	1	1	2	2	2																					
8	Air Foreman		-	-	-	1	-	-	-	-	-																					
9	Site Admin		1	1	-	1	1	-	1	1	1																					
10	Electricians		22	26	20	22	6	3	18	17	17																					
11	Plumber		6	6	6	6	6	6	6	6	6																					
12	Sprinkler		-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
13	Air Conditioner		-	-	-	7	-	-	-	-	-																					
14	General Technician		4	4	4	4	4	4	-	-	-																					
15	Store		3	3	3	3	3	1	3	3	3																					
16	Tiler		11	11	11	11	16	14	15	12	12																					
17	Skim Coat		2	3	2	2	3	3	3	2	2																					
	รวม	0	57	61	53	65	46	35	53	49	50																					

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16,17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงก์ ชั้น 16,17



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17

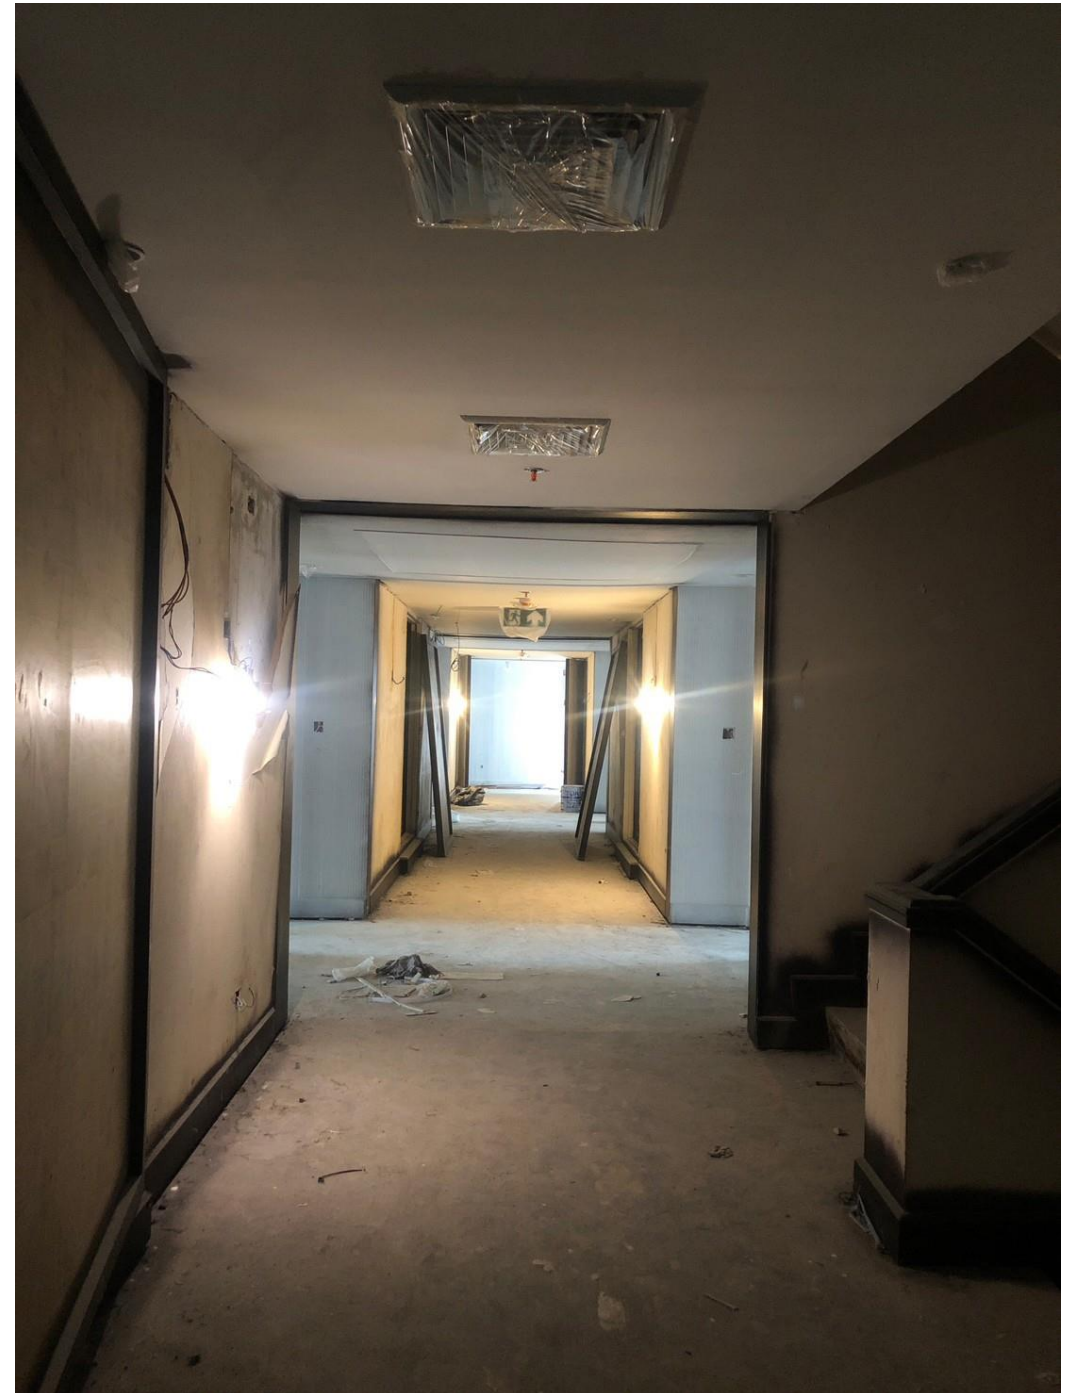

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อ Main สำหรับจ่าย Exhaust บริเวณบันไดหนีไฟ
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-15

