



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

12 Oct 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

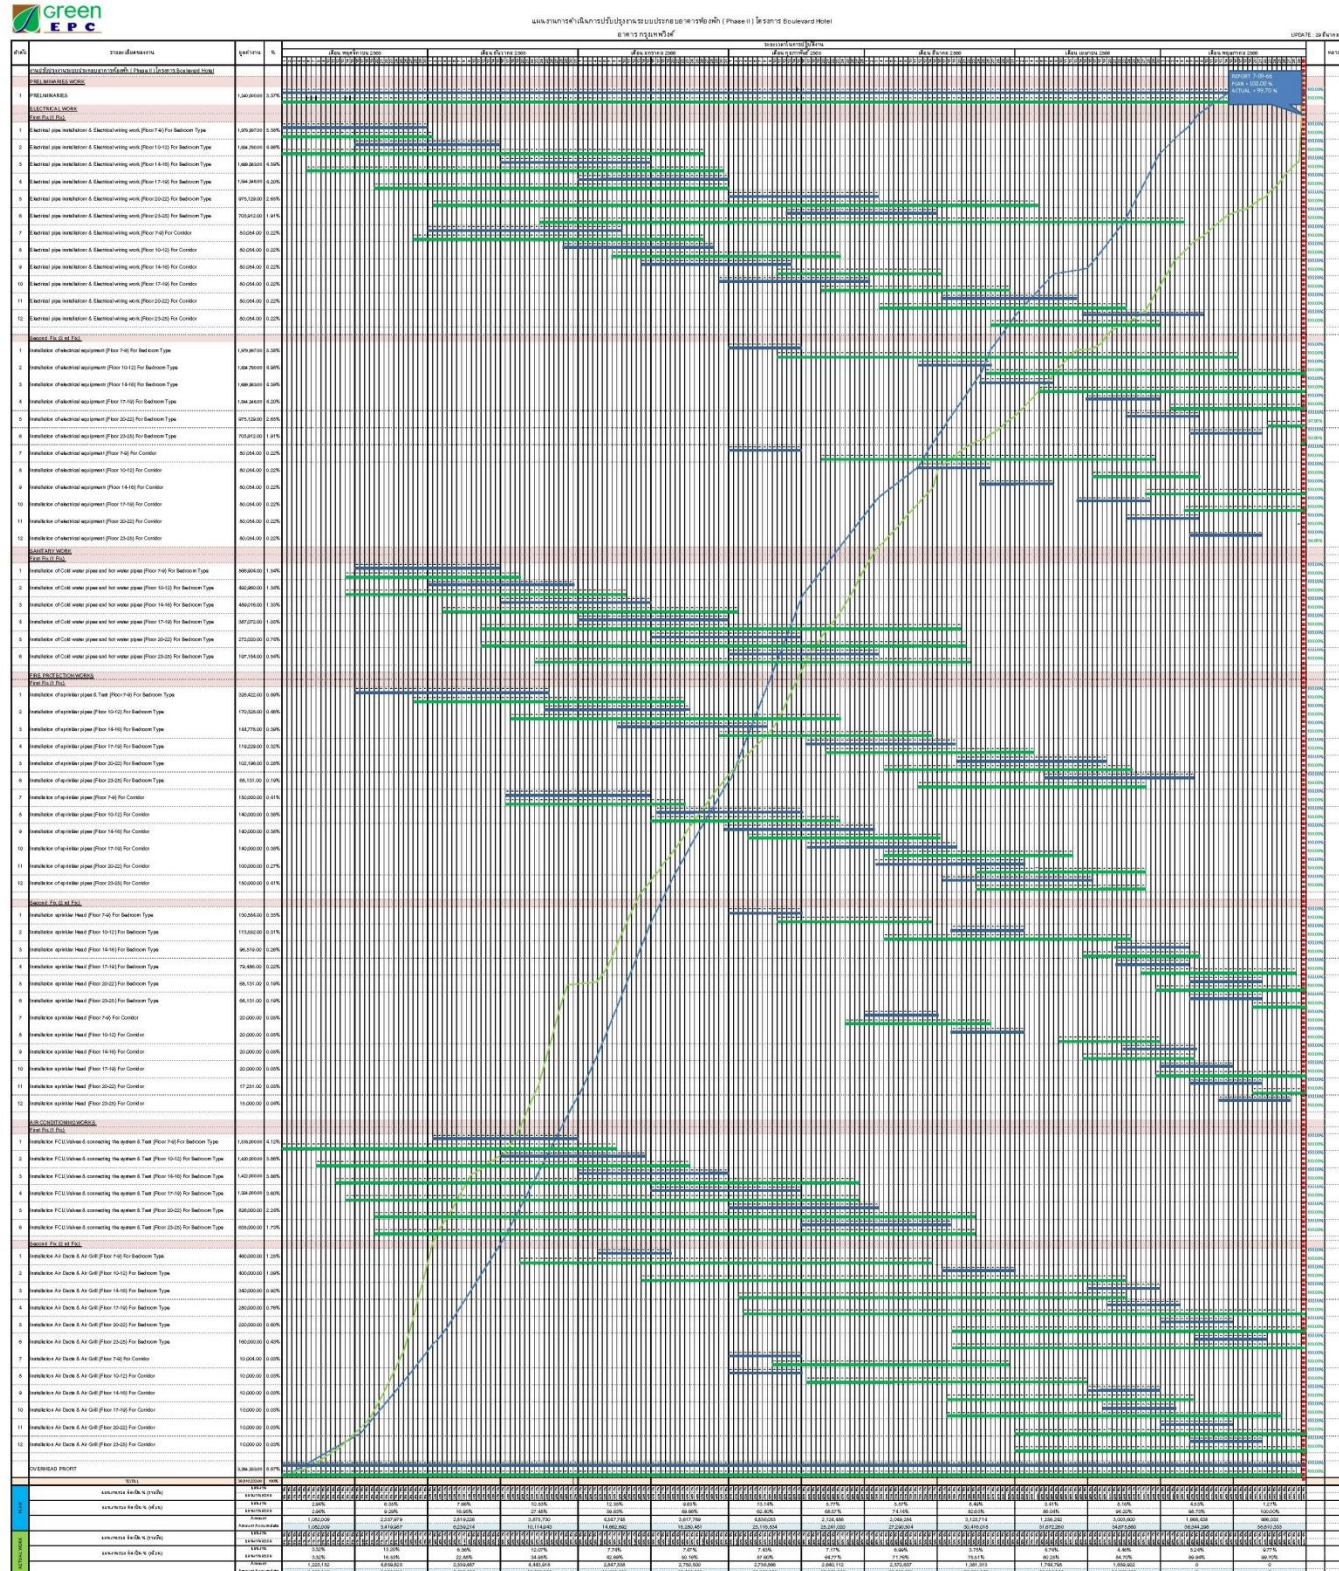

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-10-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	99.92%	- %	ล่าช้า 148 วัน


หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel
อาคารสยามวิเศษ

UPD: 16/10/2016

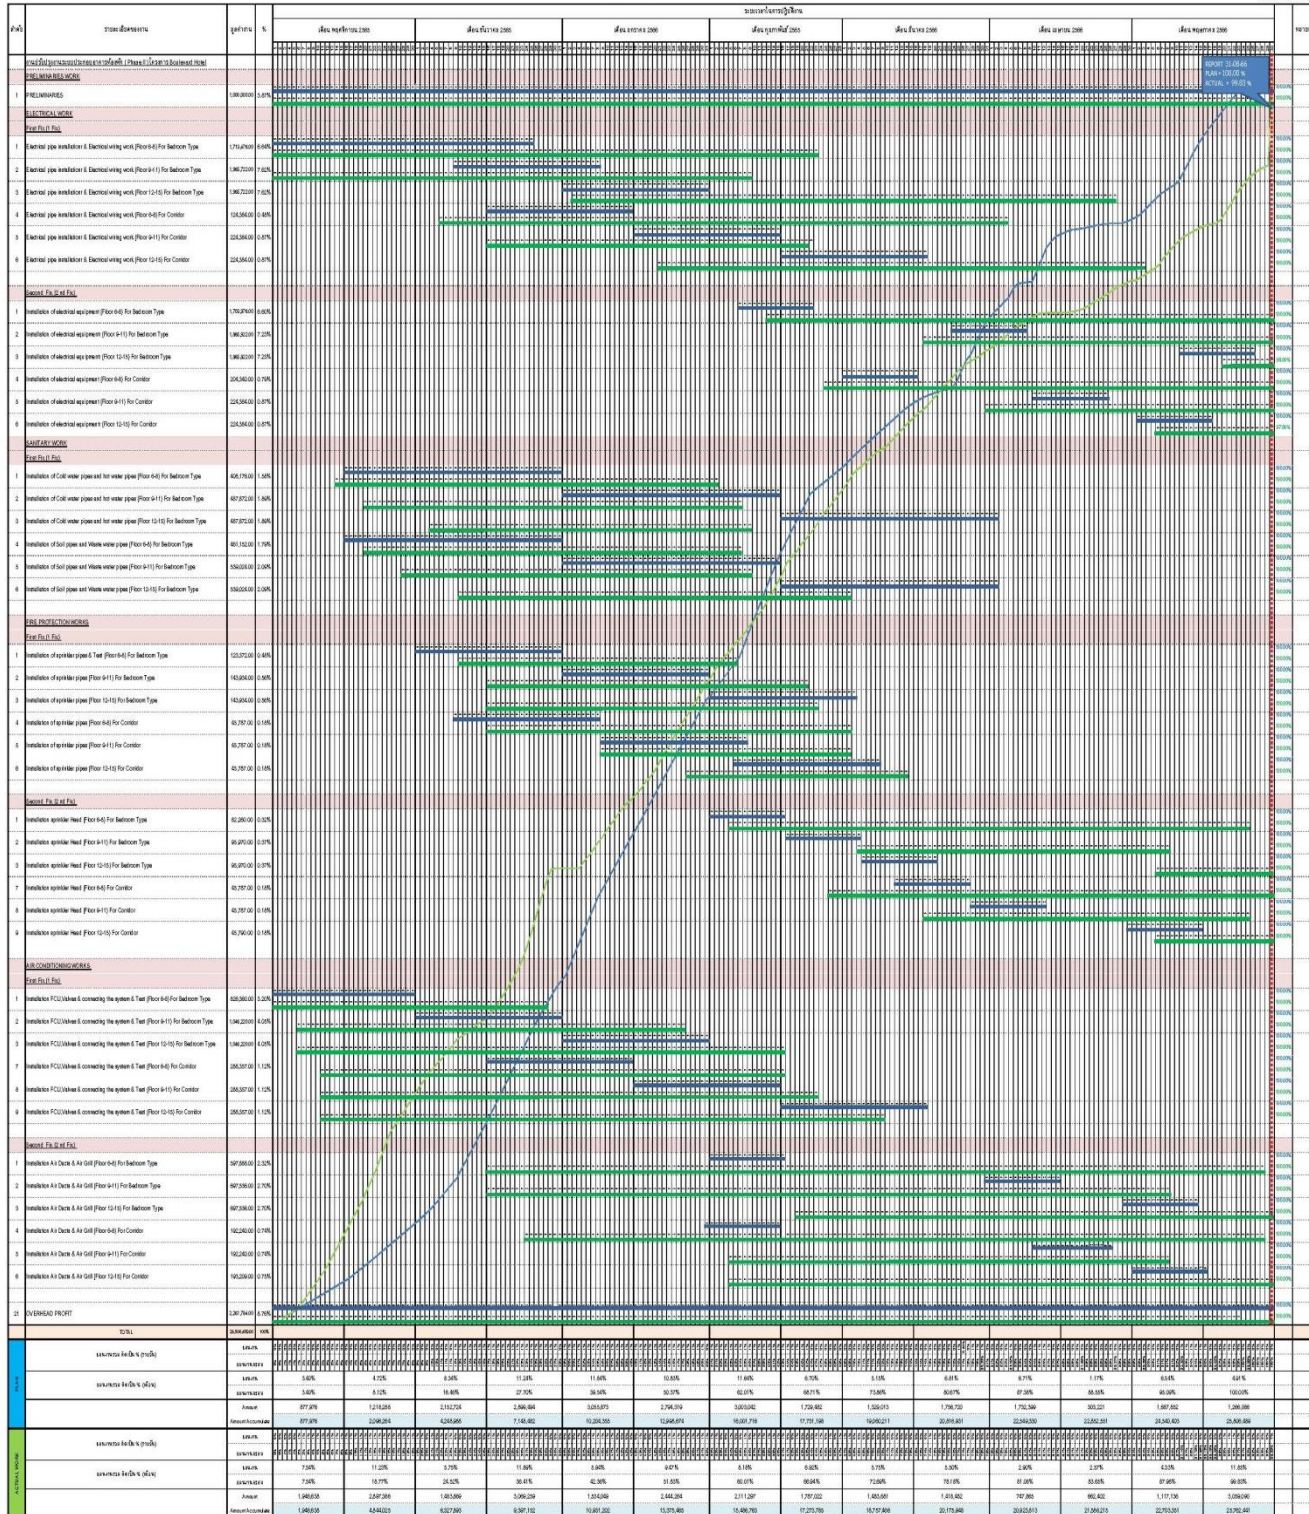

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-10-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	100.00%	99.84%	- % ล่าช้า 148 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเดือนตุลาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนตุลาคม 2566																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Project Manager	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-																							
2	Architecture Engineer	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1																							
3	Electrical Engineer	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-																							
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
5	Safety	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1																							
6	Sanitary Foreman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
7	Electrical Foreman	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-																							
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
9	Site Admin	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1																							
10	Electricians	-	7	6	-	7	6	6	-	7	7	4																							
11	Plumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2																							
12	Sprinkler	2	3	3	3	3	3	3	2	2	-	4																							
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
14	General Technician	-	-	4	3	4	-	-	-	-	-	-																							
15	Store	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-																							
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
	รวม	3	16	20	10	23	17	14	3	15	16	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		


หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

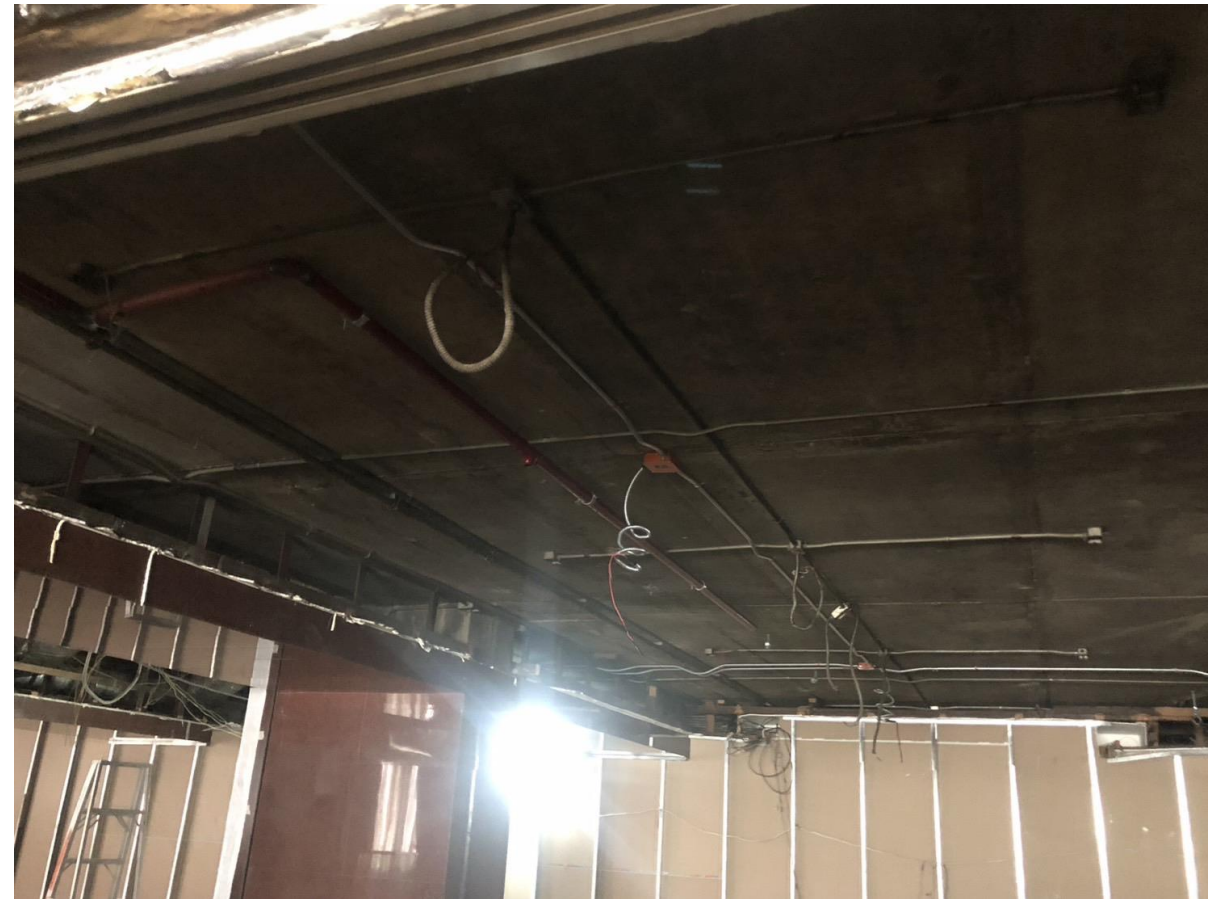


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

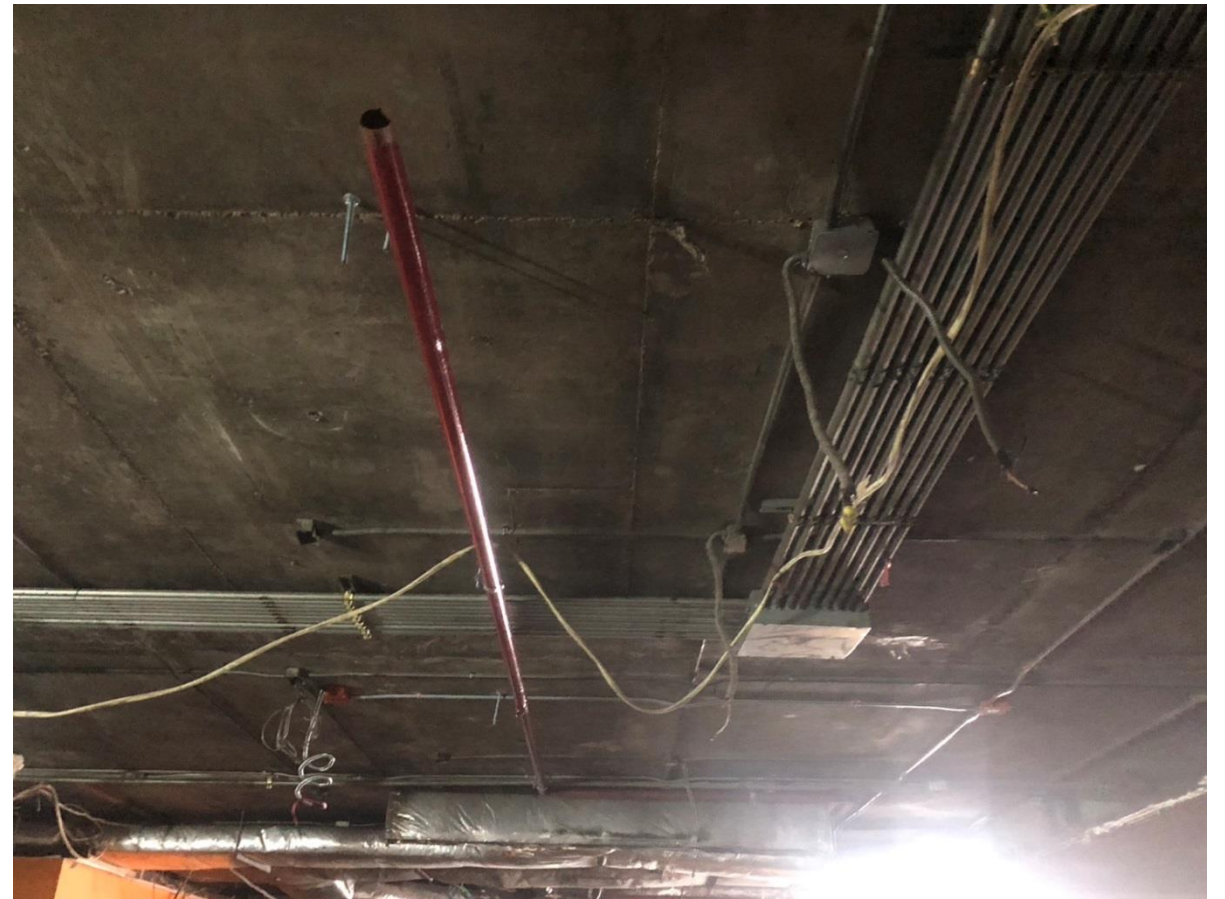

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อและร้อยสายไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

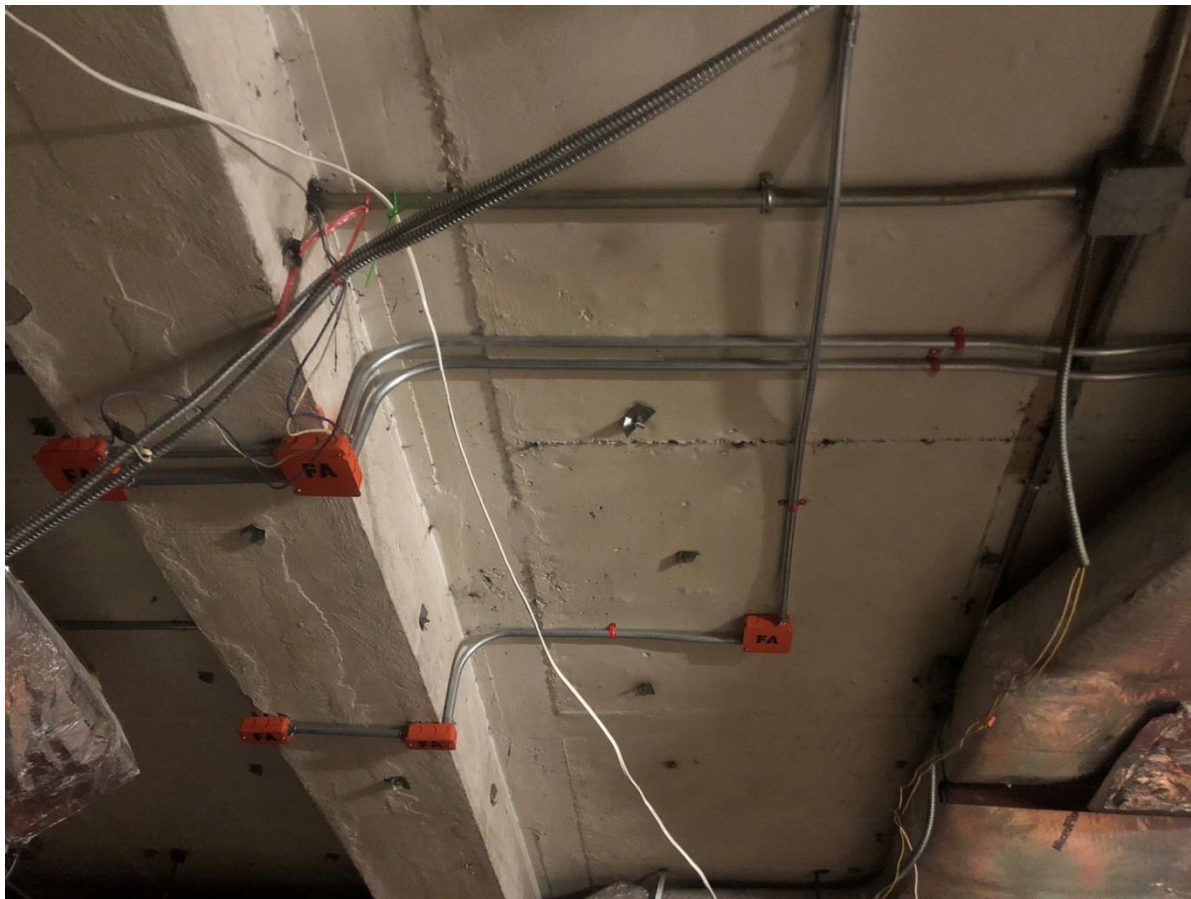

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อและร้อยสายไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

