



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

13 JULY 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

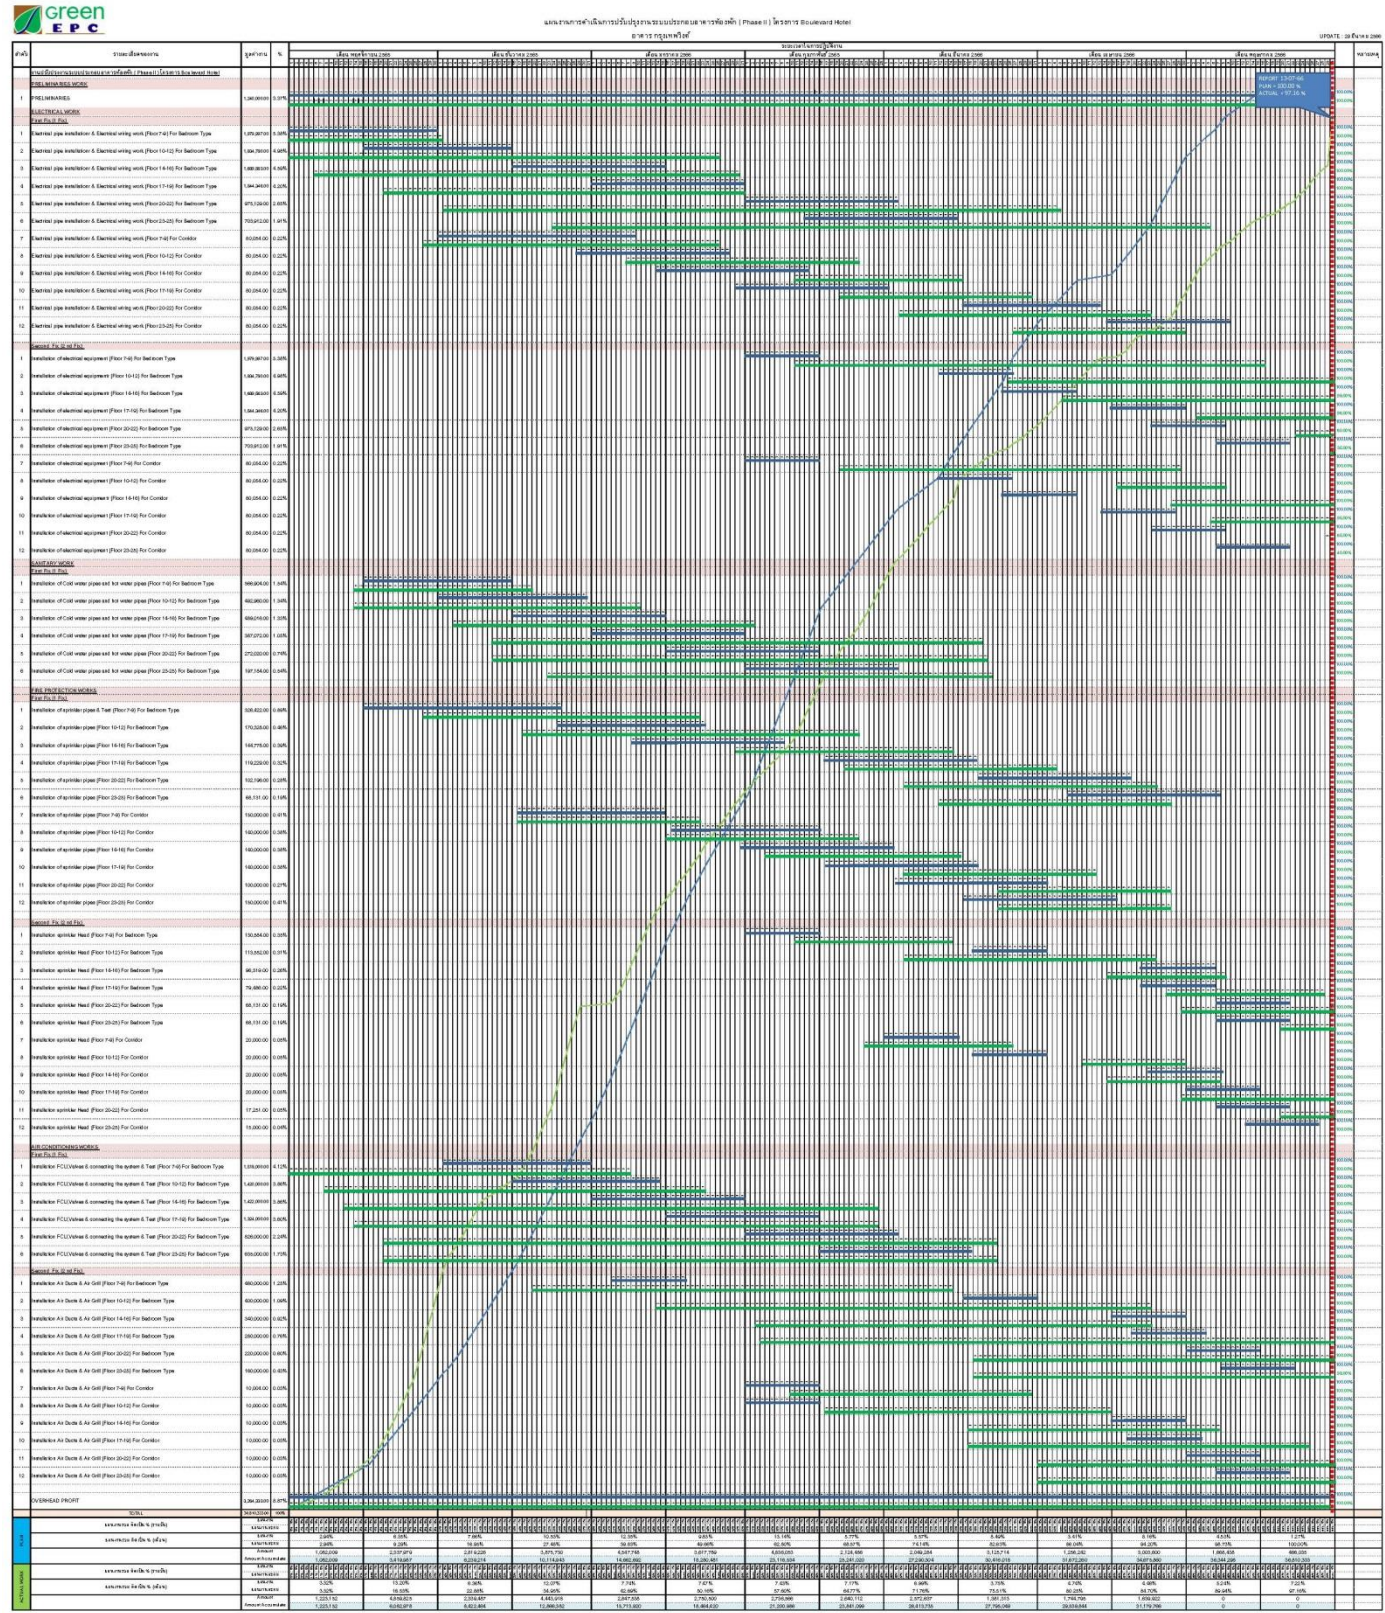


WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (13-07-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	97.16%	- % ล่าช้า 56 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)

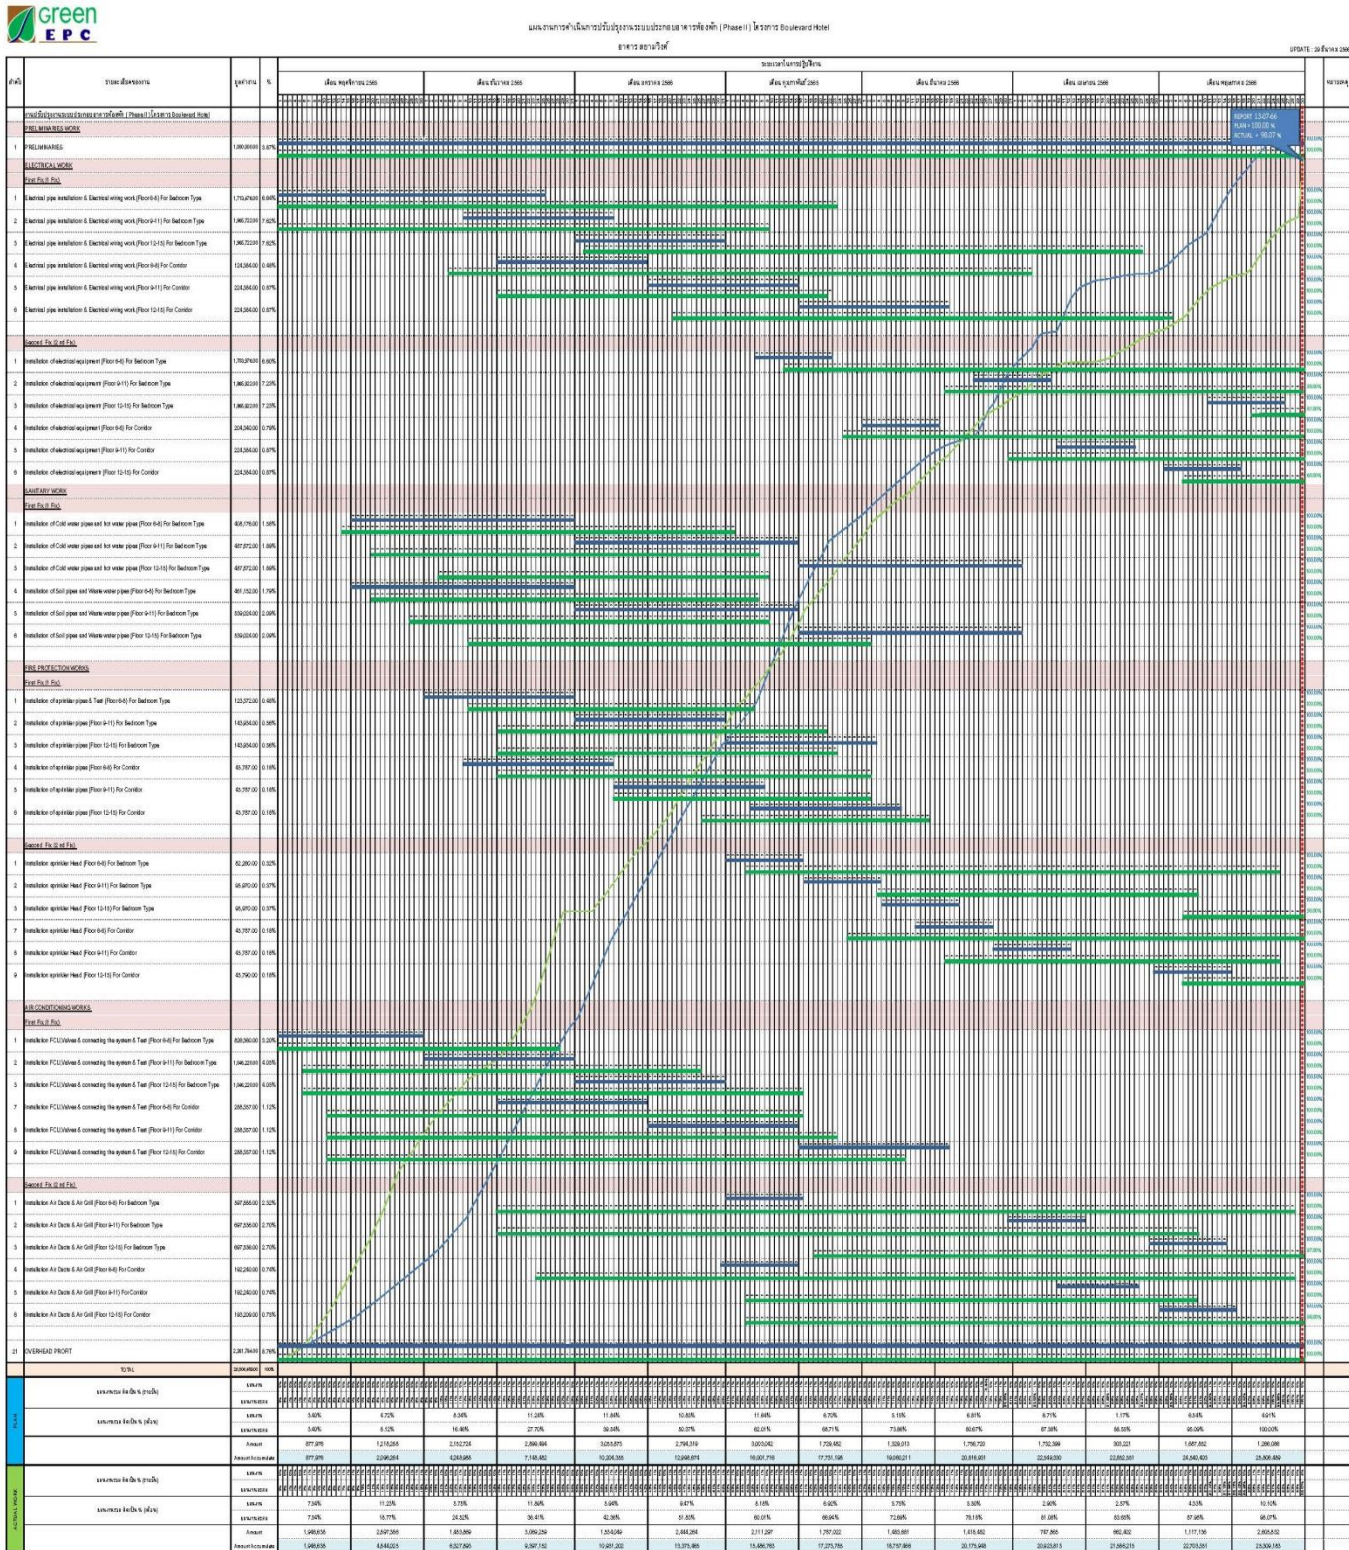

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (13-07-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	98.07%	- % ล่าช้า 56 วัน	

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกรกฎาคม 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Project Manager	1		1	1	-	1	1	1	-	1	1	1																			
2	Architecture Engineer	1		2	1	2	1	2	1	1	2	1	2																			
3	Electrical Engineer	-		1	1	-	1	1	-	-	1	1	1																			
4	Air Conditioning Engineer	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
5	Safety	1		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1																			
6	Sanitary Foreman	-		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1																			
7	Electrical Foreman	2		2	2	1	2	2	1	-	2	2	2																			
8	Air Foreman	1		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-																			
9	Site Admin	1		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1																			
10	Electricians	12		14	14	7	14	13	7	-	16	15	15																			
11	Plumber	-		6	6	6	6	6	6	-	6	6	6																			
12	Sprinkler	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
13	Air Conditioner	6		6	-	6	-	2	-	-	-	-	-																			
14	General Technician	3		-	4	4	10	10	6	6	6	7	3																			
15	Store	2		1	3	1	3	3	1	-	3	3	1																			
16	Tiler	4		4	4	4	-	4	-	-	-	-	-																			
17	Skim Coat	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	รวม	34	0	41	39	35	41	47	26	7	40	39	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ

 วันอาทิตย์

 วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟบริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 23



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12-14



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12-14




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12-14




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12-17

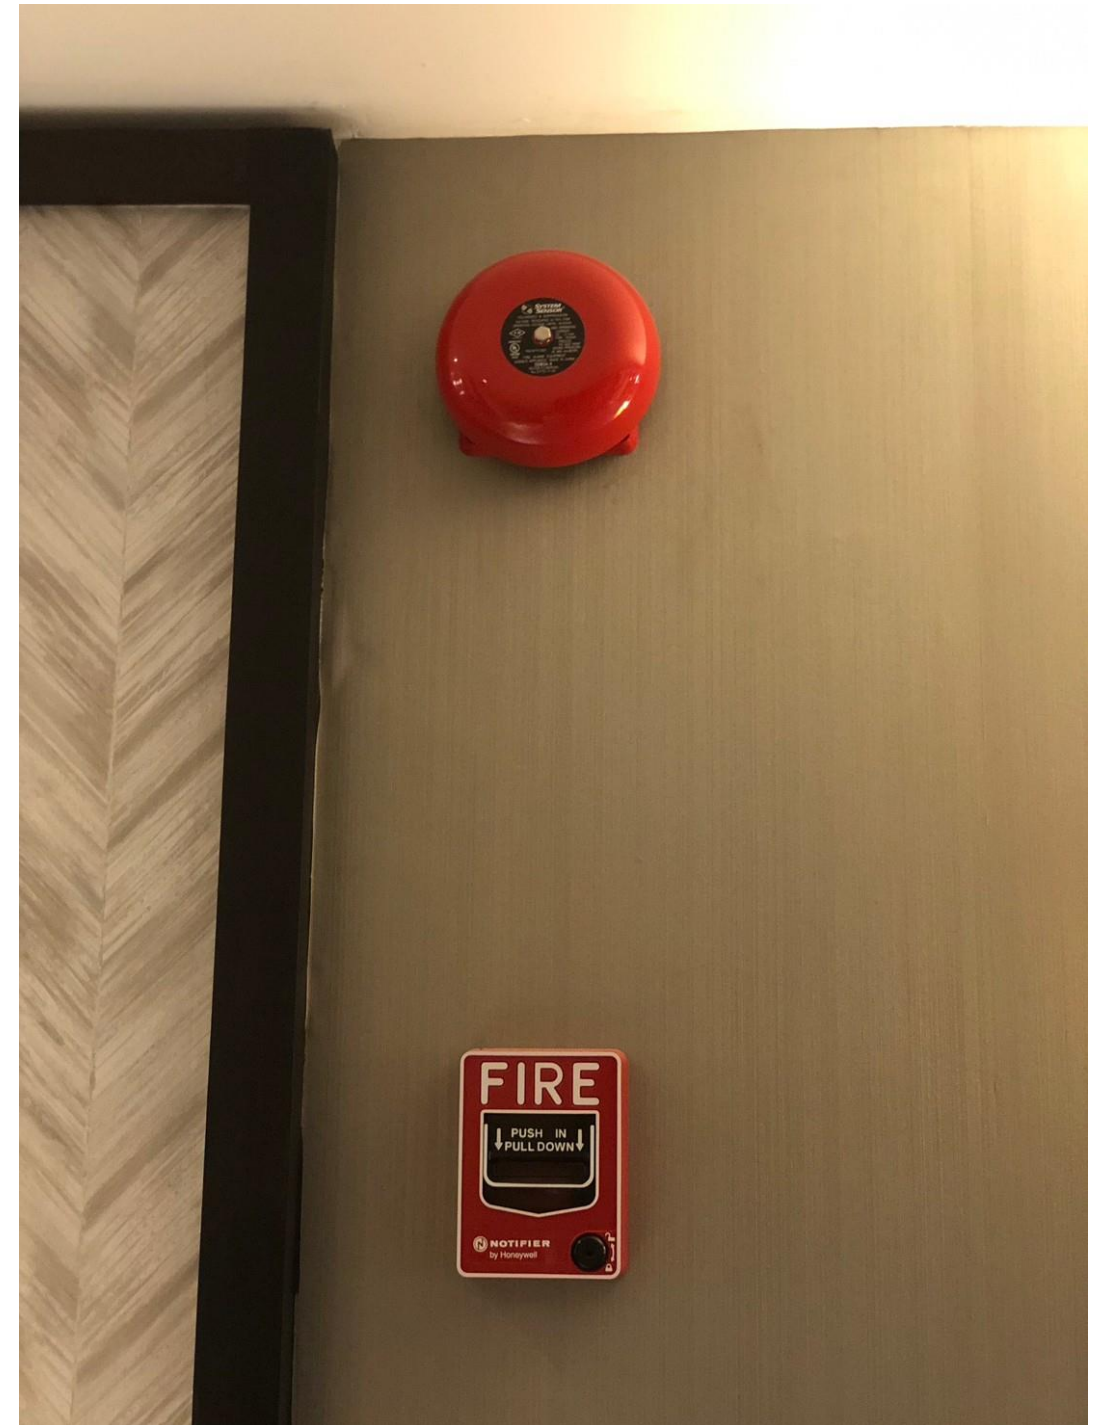

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12-17

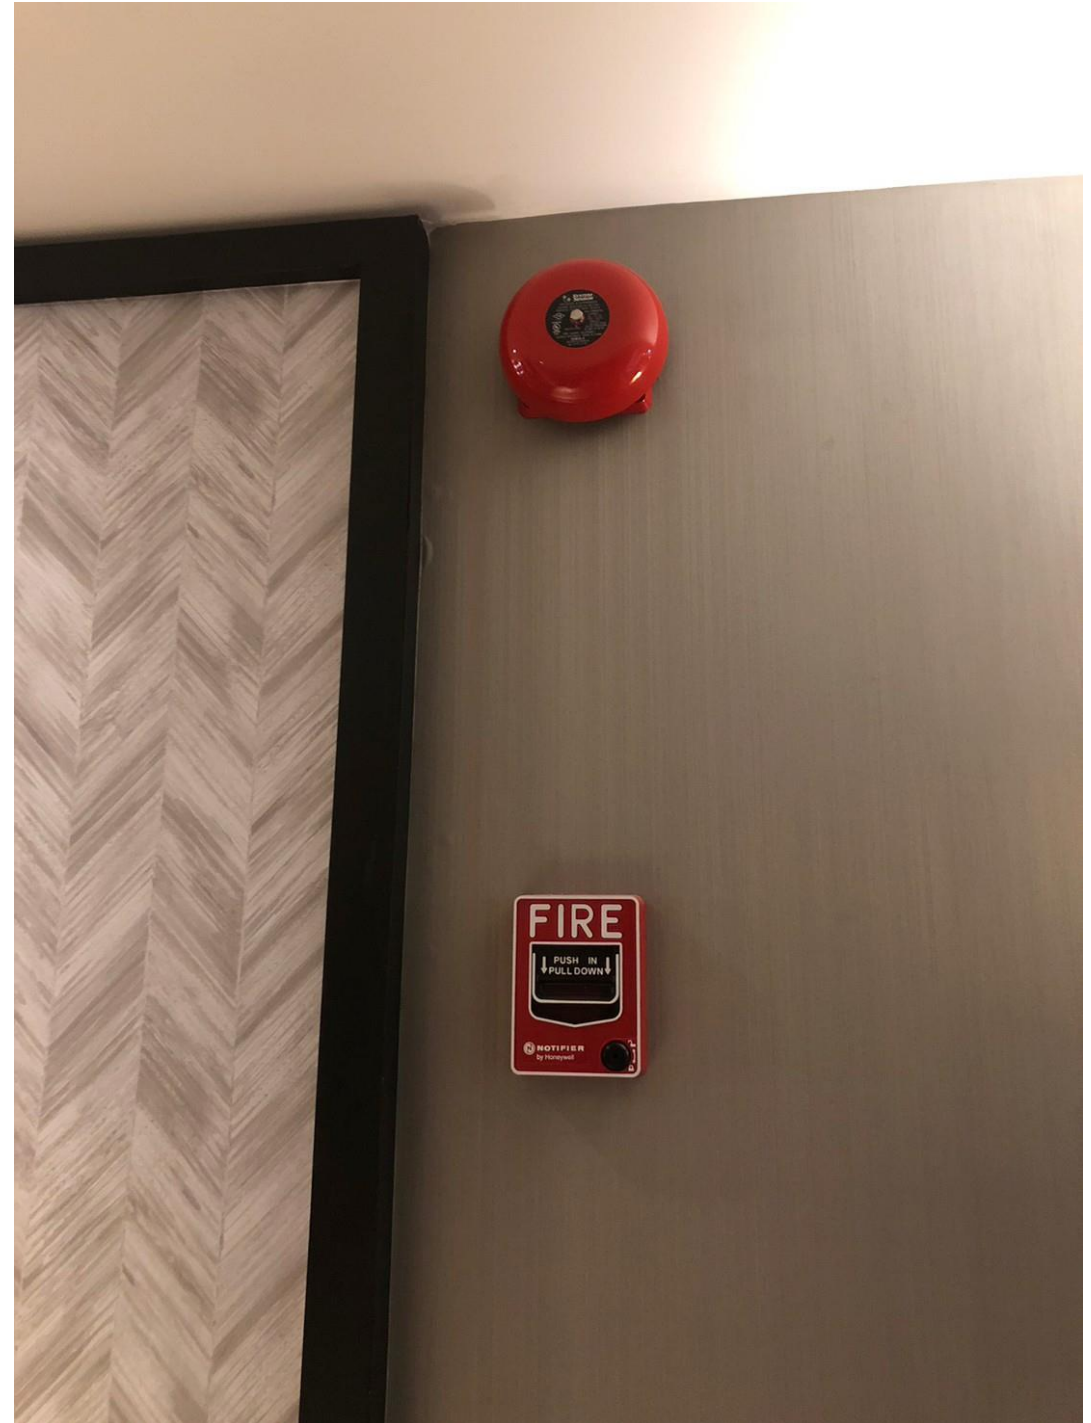

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งาน Test Run ระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งาน Test Run ระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งาน Test Run ระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง
อาคารสยามวิงค์ ชั้นดาดฟ้า



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งาน Test Run ระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง
อาคารสยามวิงค์ ชั้นดาดฟ้า

