



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

14 Sep 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

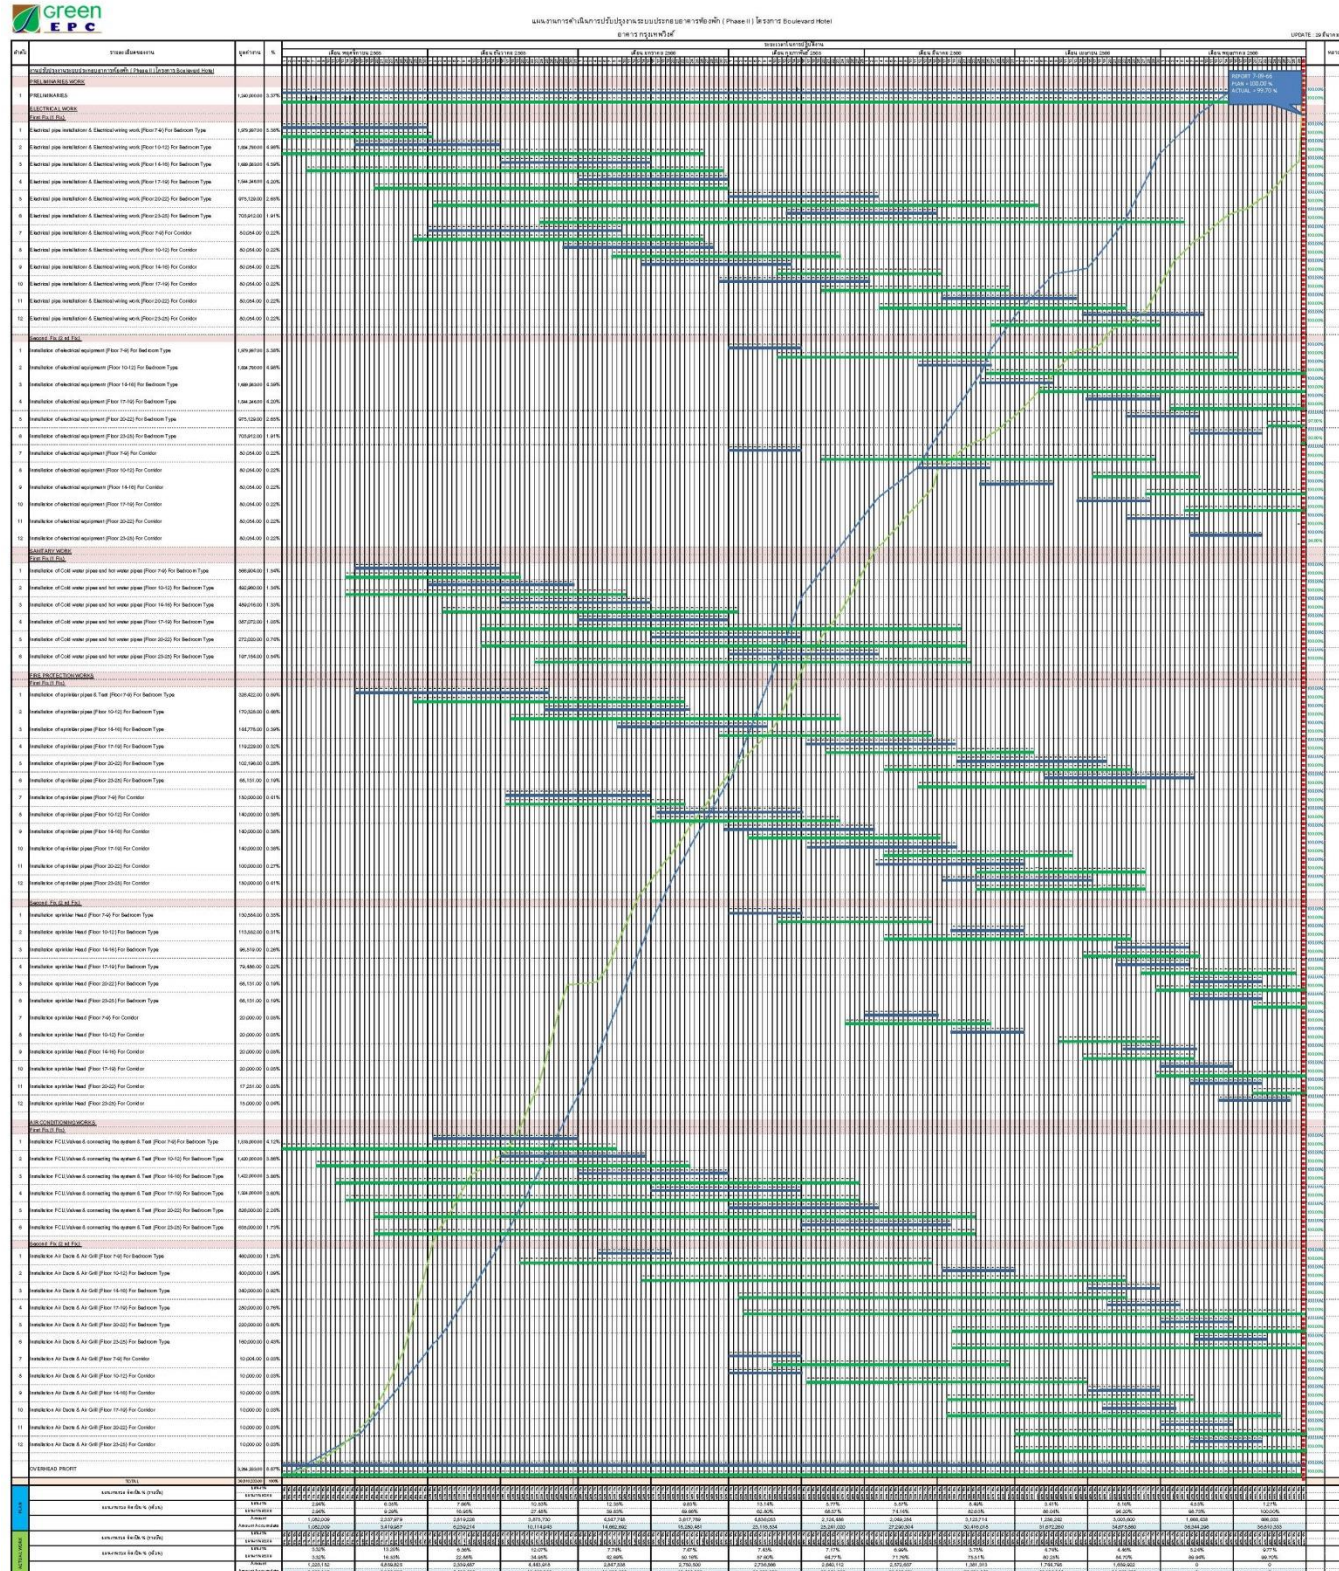

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (14-09-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	99.77%	- %	ล่าช้า 119 วัน


หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel
อาคารสยามวิล์ด

UPD: 16/09/2016

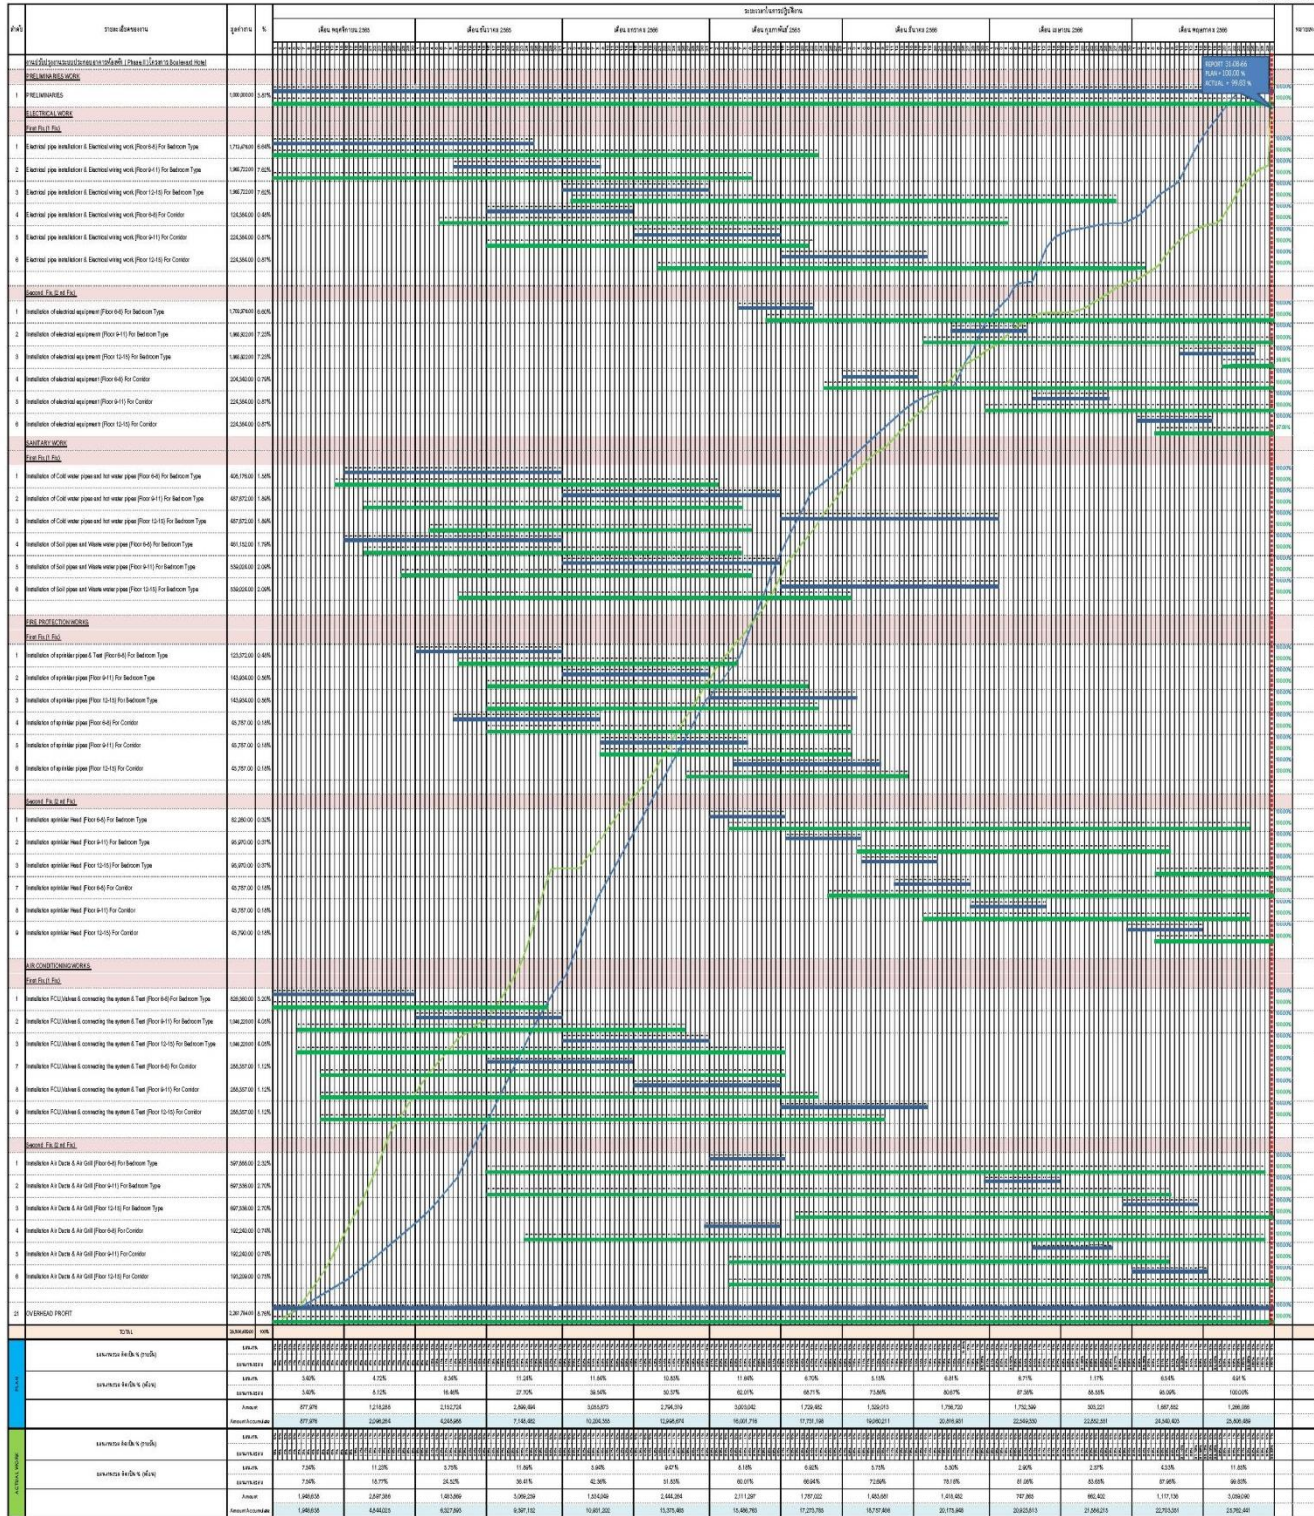

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (14-09-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	100.00%	99.83%	- % ล่าช้า 119 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเดือนกันยายน 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกันยายน 2566																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Project Manager	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-																	
2	Architecture Engineer	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1																	
3	Electrical Engineer	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1																	
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
5	Safety	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1																	
6	Sanitary Foreman	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1																	
7	Electrical Foreman	1	1	-	1	1	1	2	2	2	-	1	1	1																	
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
9	Site Admin	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1																	
10	Electricians	7	5	-	6	6	6	11	12	10	-	5	5	5																	
11	Plumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
12	Sprinkler	-	-	-	5	5	4	3	3	-	-	3	-	3																	
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
14	General Technician	11	8	-	6	6	8	-	-	-	-	3	3	-																	
15	Store	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-																	
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	รวม	24	17	0	21	23	23	23	25	16	0	18	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


หมายเหตุ

วันอาทิตย์



วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์

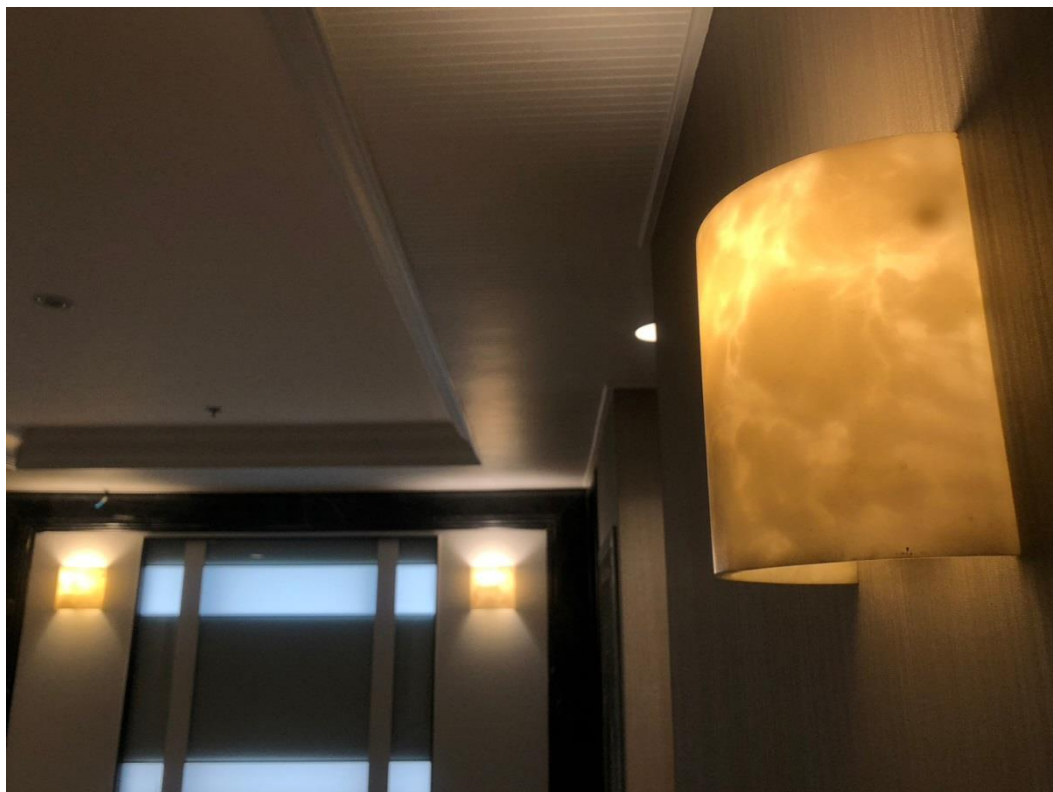


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

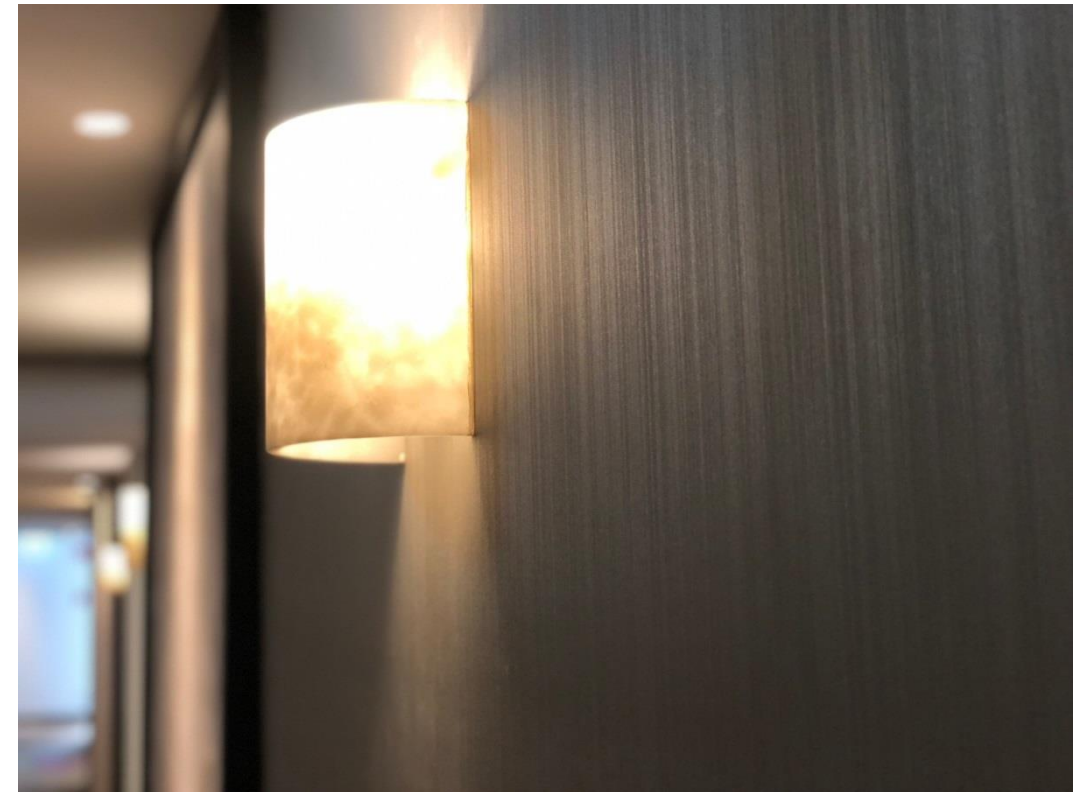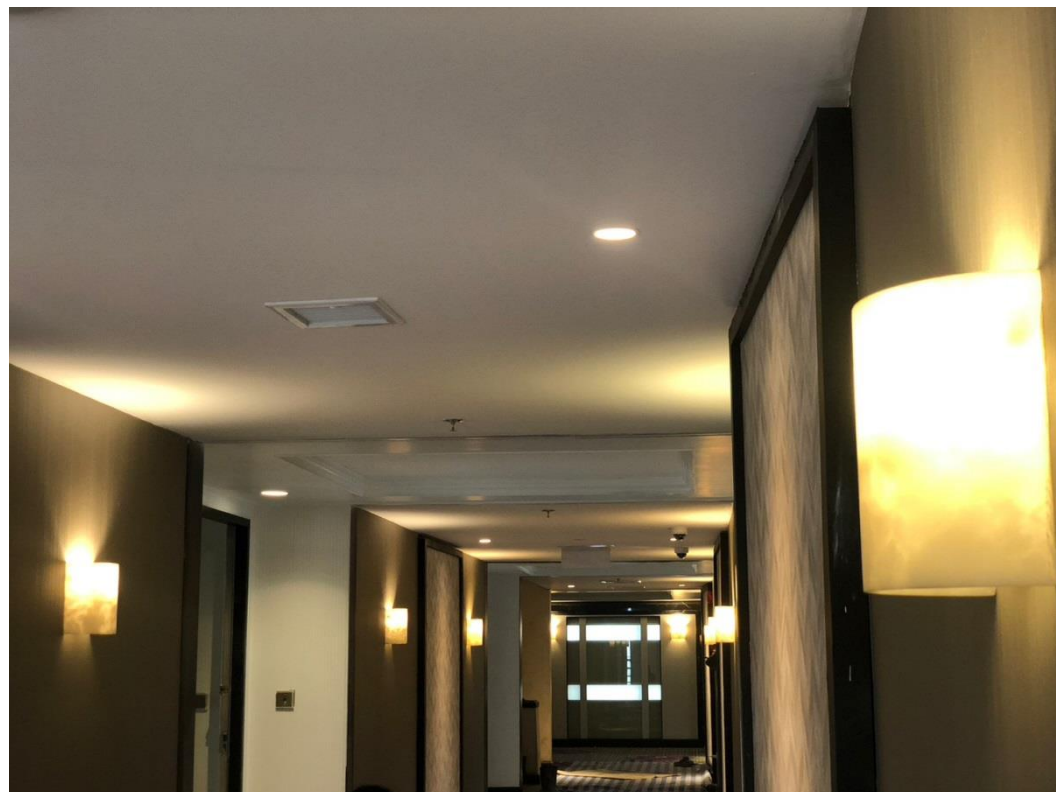

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารสยามวิงค์

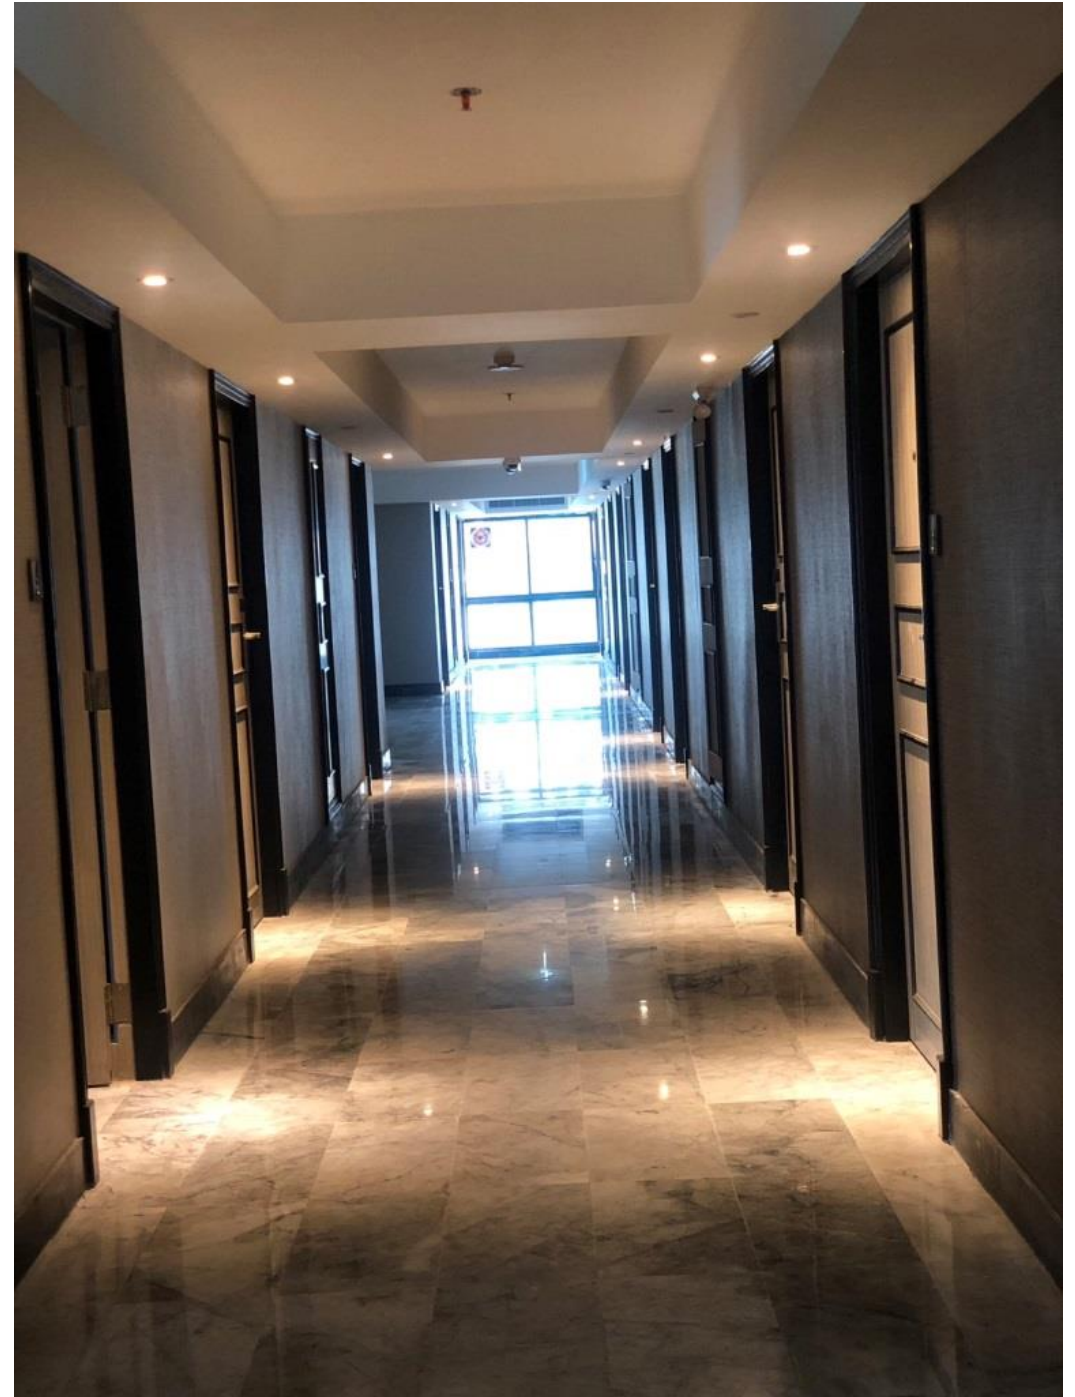

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารสยามวิงค์

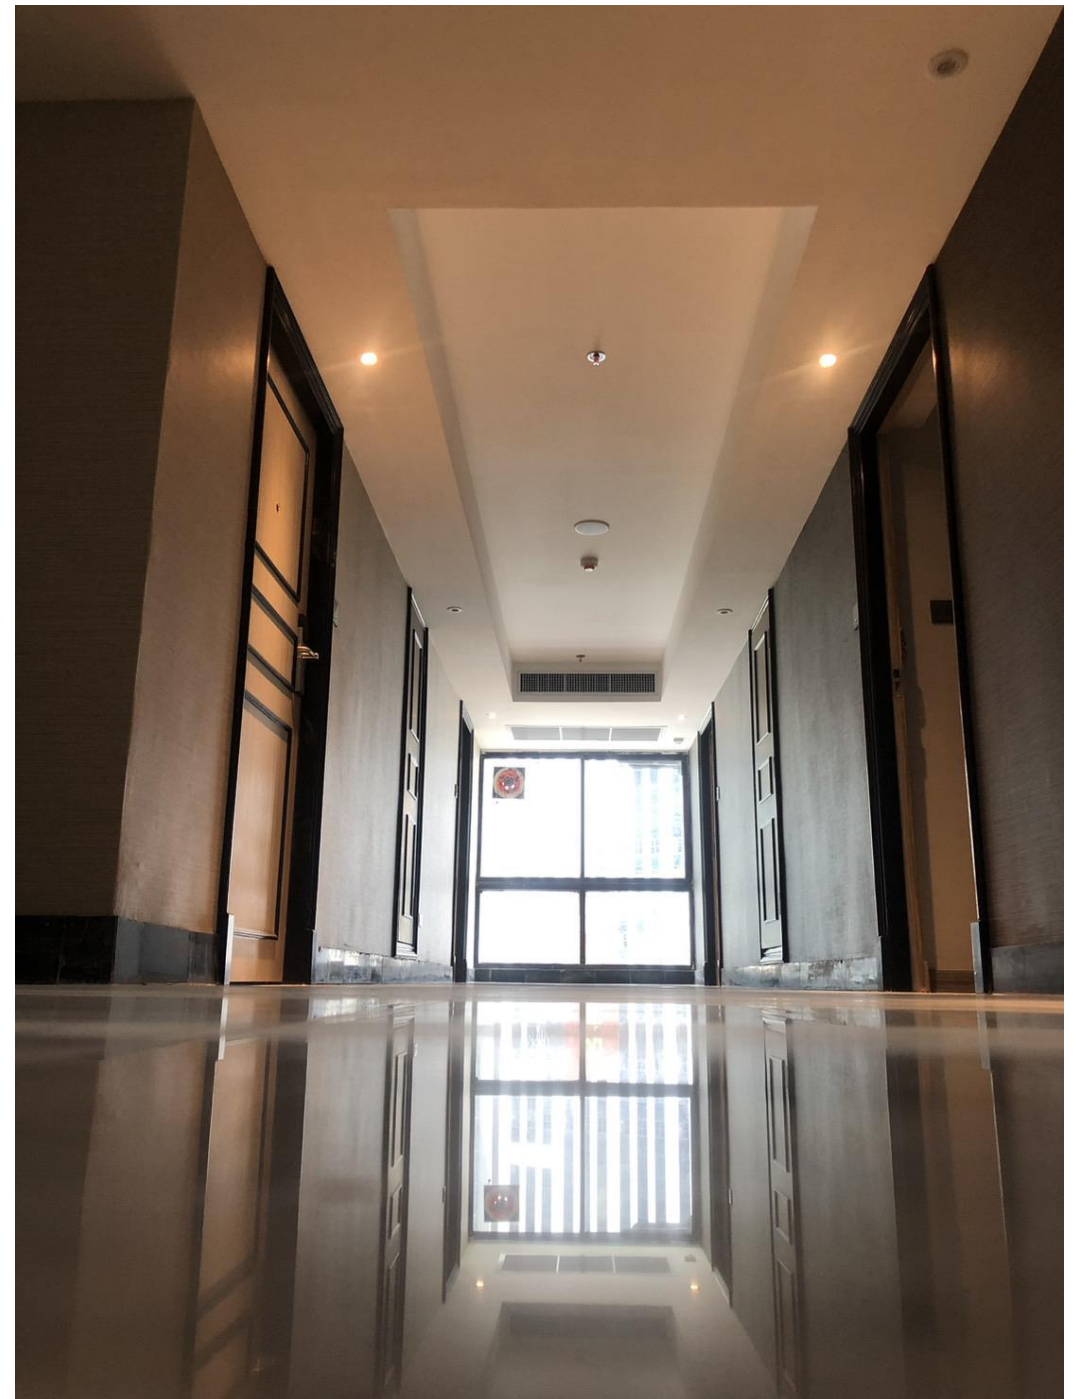

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor
อาคารสยามวิงค์

