



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

18 May 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)

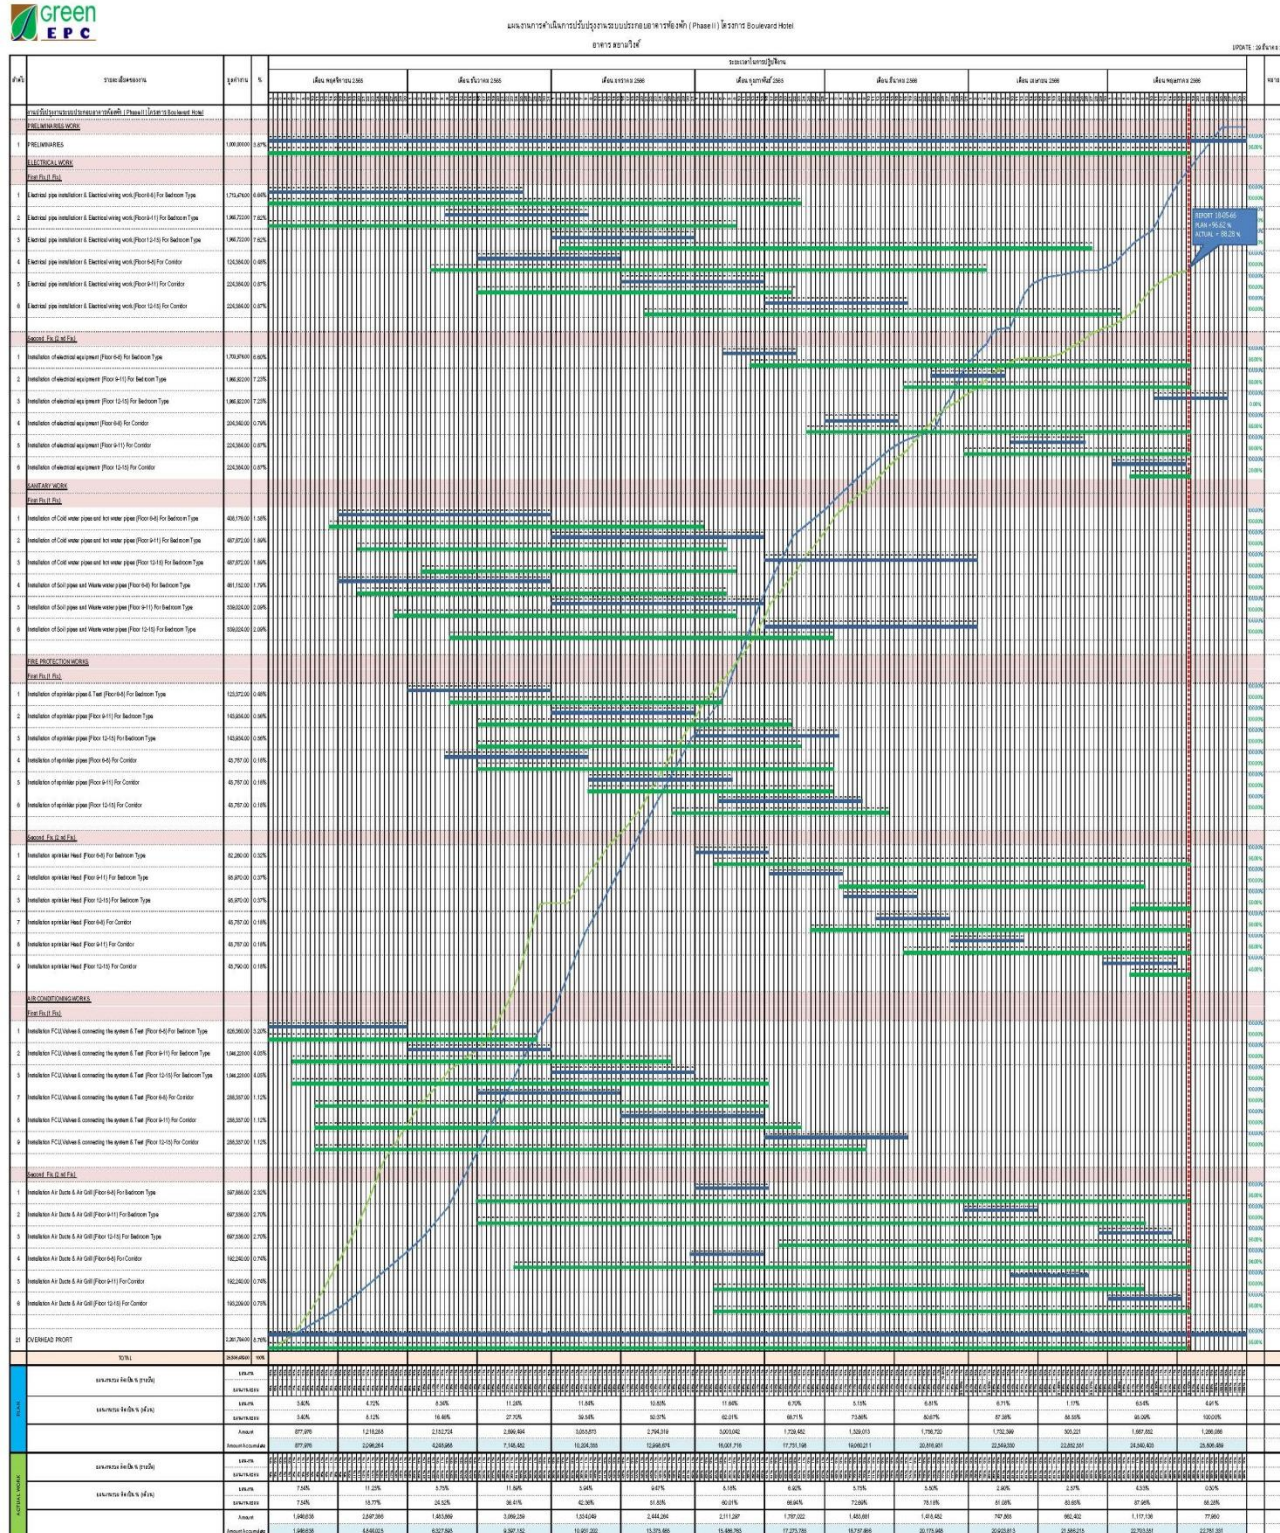

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (18-05-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	99.34%	90.25%	- 9.09 % ล่าช้า 18 วัน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนพฤษภาคม 2566																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Project Manager		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
2	Architecture Engineer		2	1	1	2	1	-	1	1	3	2	1	2	1	3	2	3															
3	Electrical Engineer		1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1																
4	Air Conditioning Engineer		1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1																
5	Safety		1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1															
6	Sanitary Foreman		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1															
7	Electrical Foreman		2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	2	2	2																
8	Air Foreman		-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	2	2															
9	Site Admin		1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1																
10	Electricians		22	26	20	22	6	3	18	17	17	13	20	17	-	19	21	19															
11	Plumber		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	4	6															
12	Sprinkler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
13	Air Conditioner		-	-	-	7	-	-	-	-	3	3	11	11	-	3	10	10															
14	General Technician		4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3																
15	Store		3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	2	-	-	2	3															
16	Tiler		11	11	11	11	16	14	15	12	12	13	11	14	12	12	13	14															
17	Skim Coat		2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	-	-	2	2	2															
	รวม	0	57	61	53	65	46	35	53	49	55	51	65	53	14	47	64	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ

 วันอาทิตย์

 วันหยุดนักขัตฤกษ์


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18

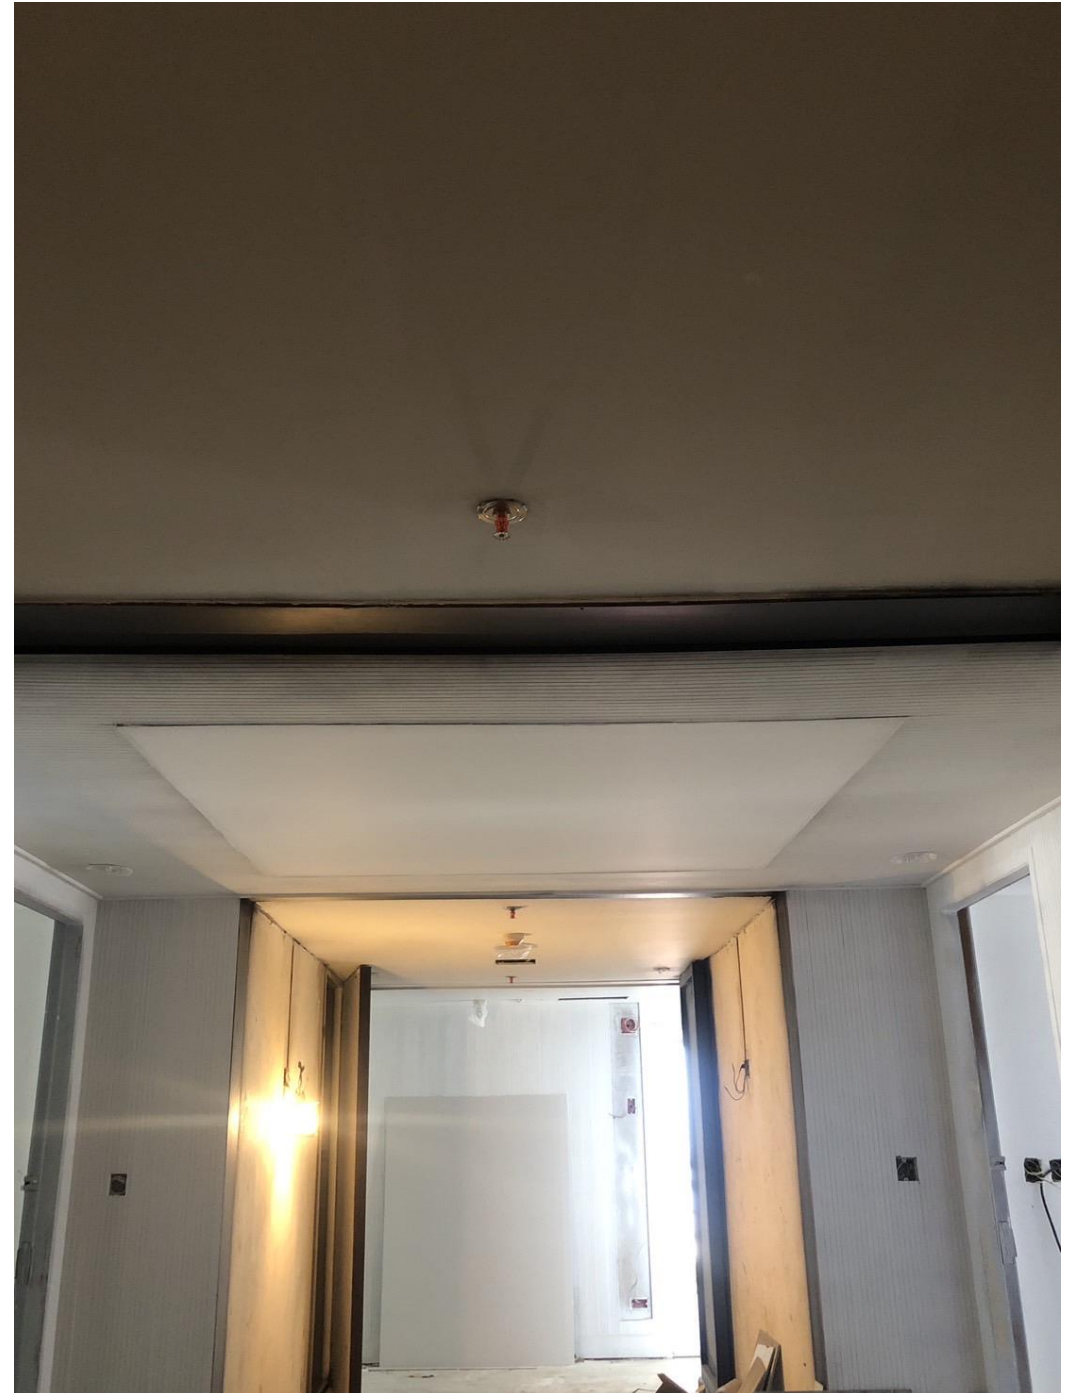


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18-20



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 18-20

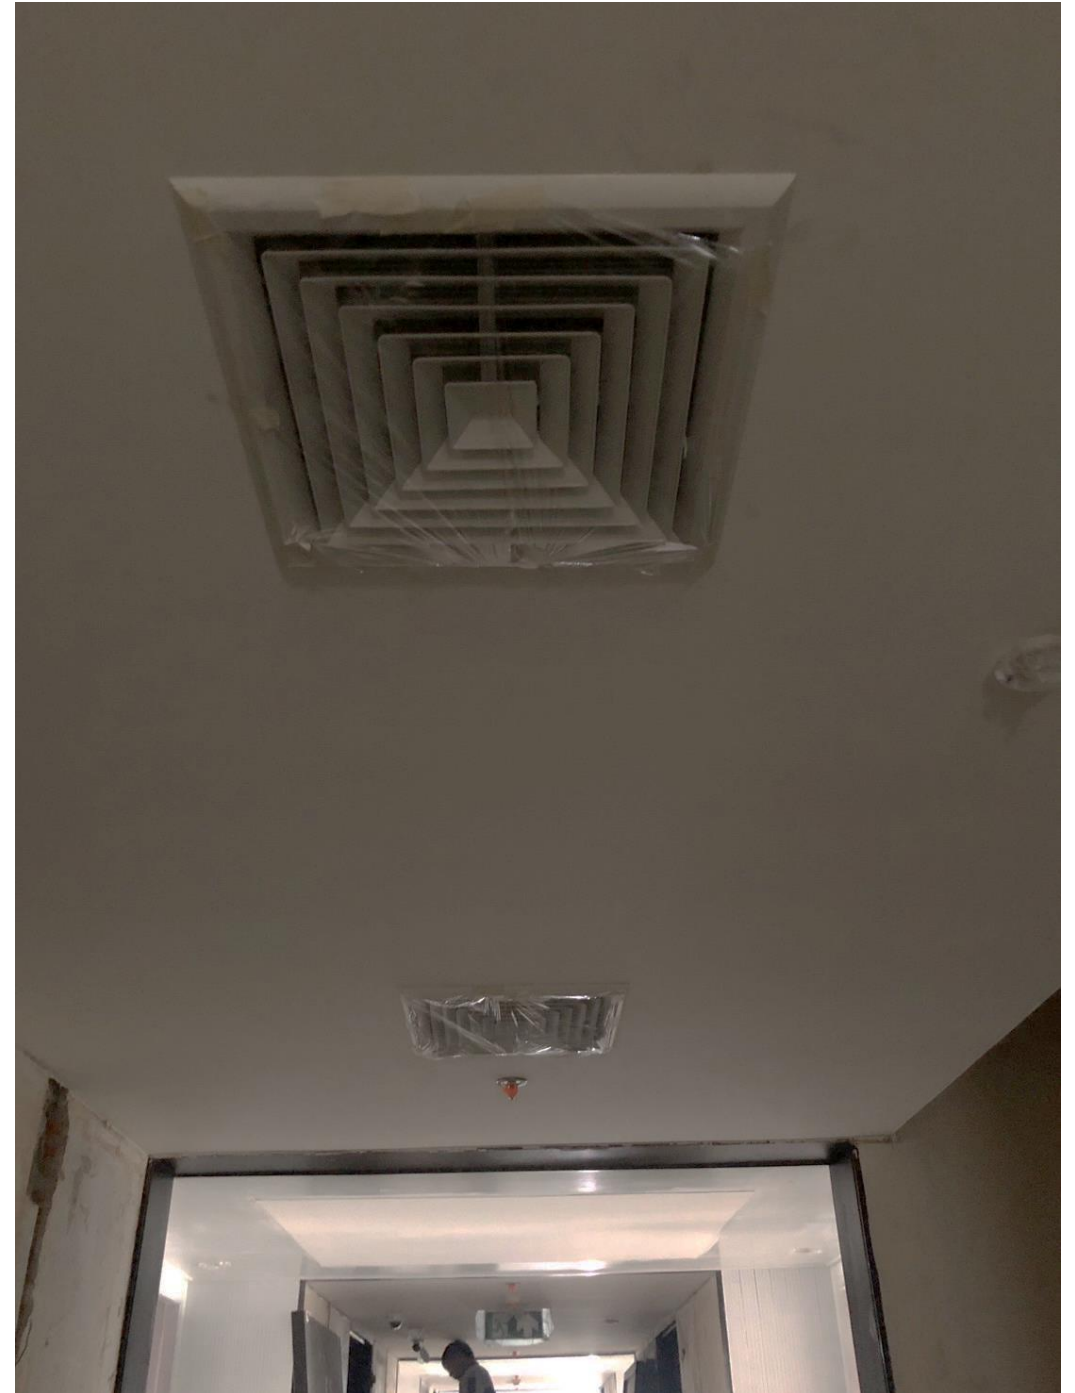

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบและปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำ ระบบปรับอากาศ อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 6-25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



ตัวอย่างงานขัดหินบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7

