



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY


**R**EPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

20 April 2023

## แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II


# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

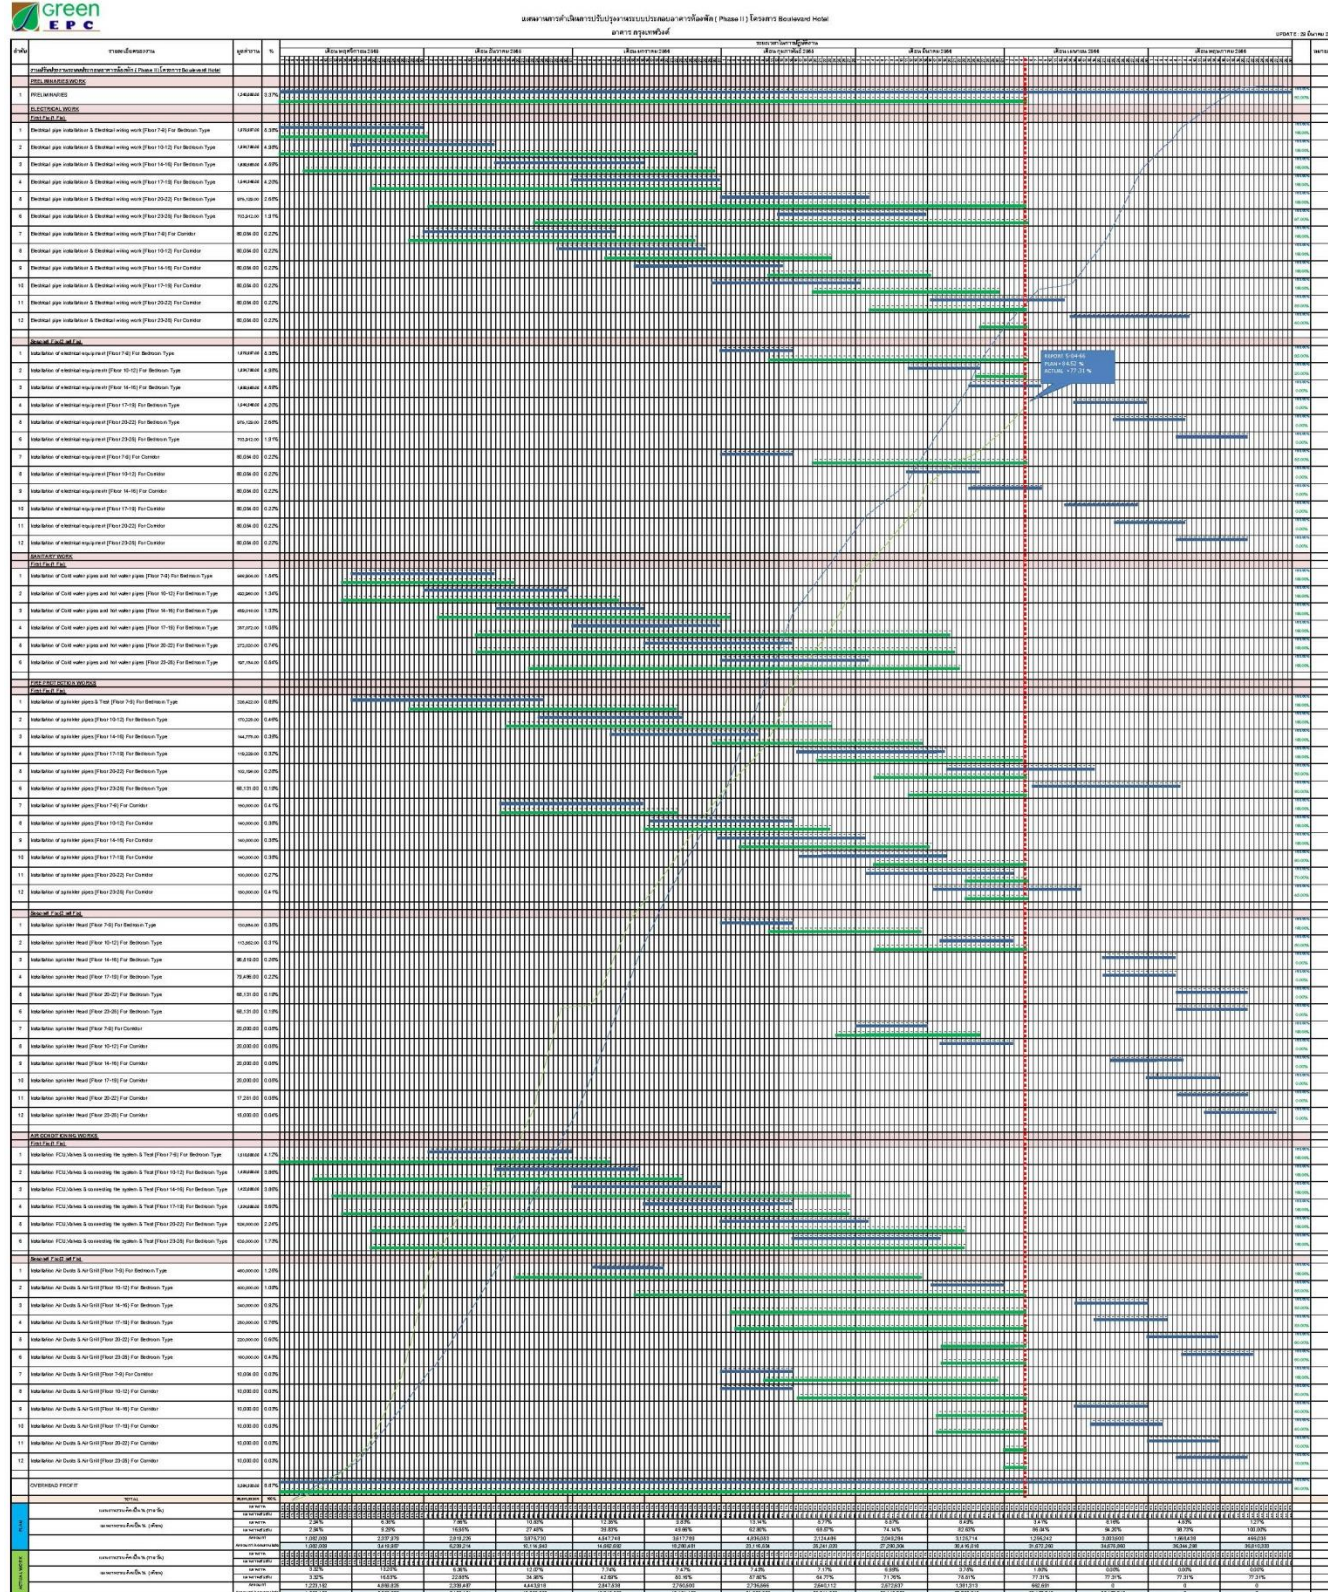

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-04-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	84.52%	77.31%	-7.21% ล่าช้า 14 วัน

# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)

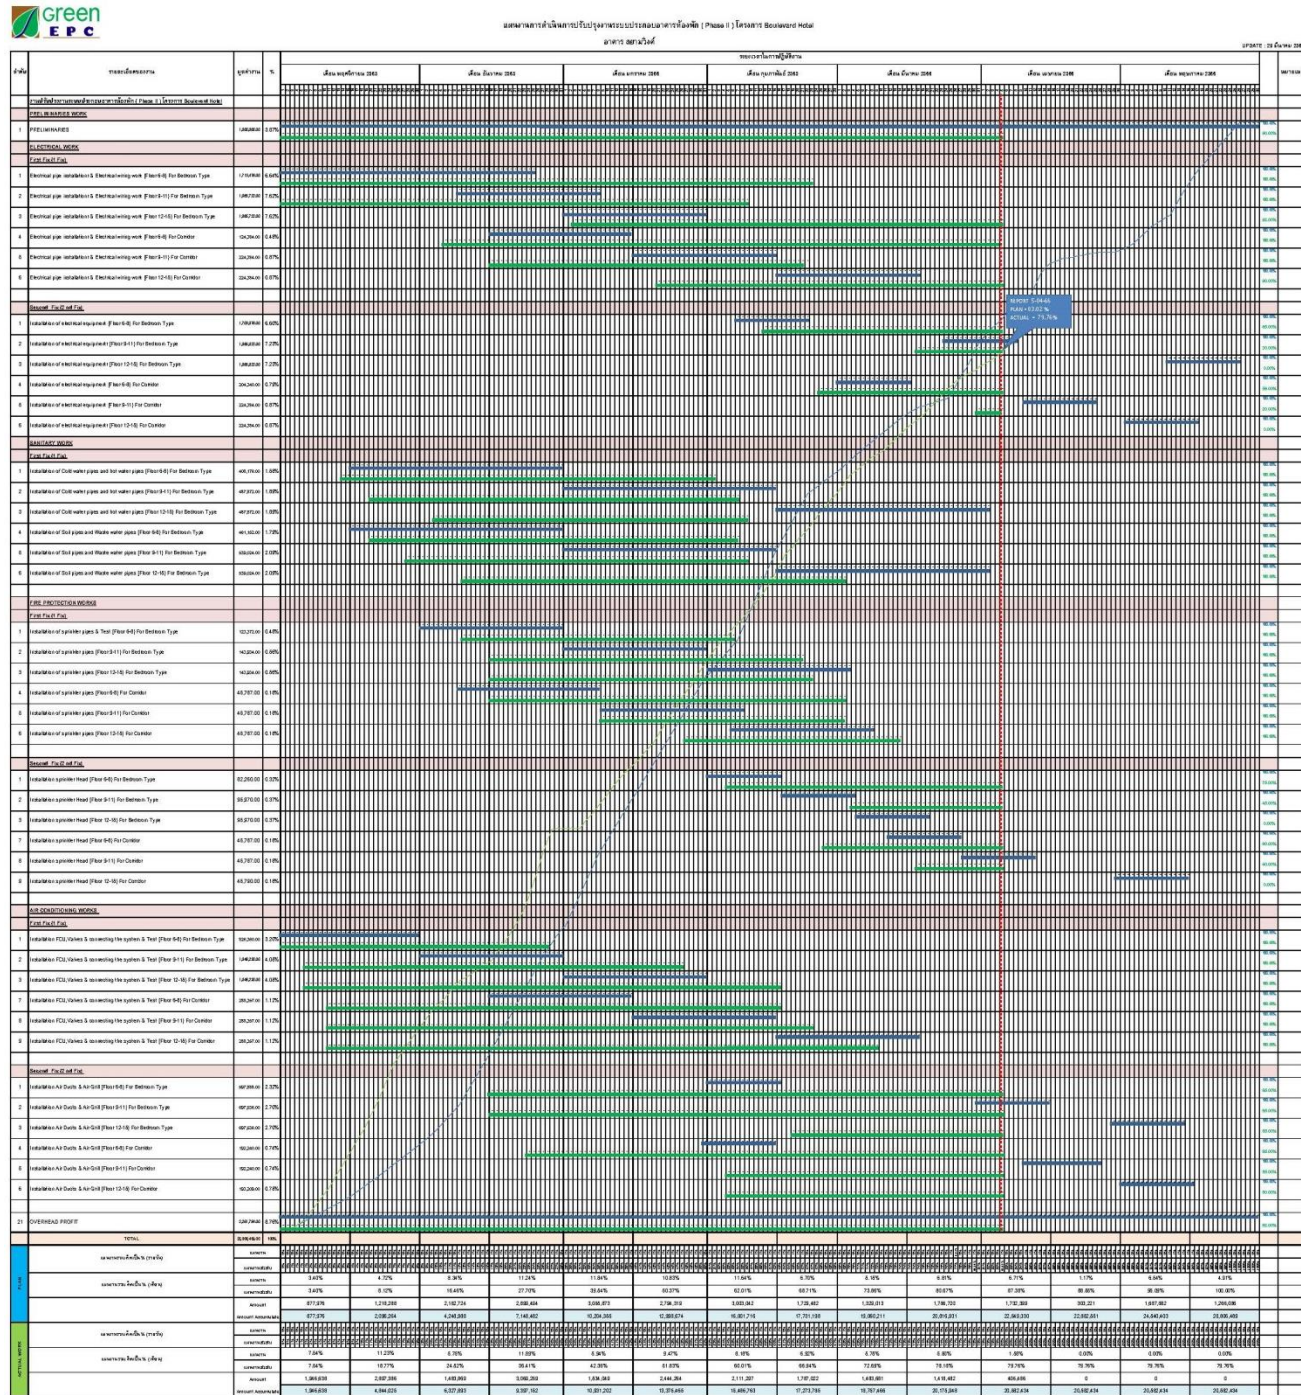

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (5-04-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	83.02%	79.76%	- 3.26 % ล่าช้า 6 วัน

**MAN POWER**

# ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเมษายน 2566



## ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนเมษายน 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Project Manager	1	-	1	1																											
2	Sanitation Engineer	-	-	1	1																											
3	Electrical Engineer	1	1	1	1																											
4	Air Conditioning Engineer	-	1	1	1																											
5	Safety	1	-	1	1																											
6	Sanitary Foreman	-	-	1	1																											
7	Electrical Foreman	1	-	1	1																											
8	Air Foreman	2	-	-	1																											
9	Site Admin	1	-	1	1																											
10	Electricians	16	-	26	21																											
11	Plumber	-	-	-	-																											
12	Sprinkler	-	-	-	-																											
13	Air Conditioner	-	-	5	5																											
14	General Technician	4	-	-	-																											
15	Store	2	-	2	2																											
16	Tiler	19	13	20	24																											
17	Skim Coat	4	-	-	-																											
	<b>รวม</b>	52	15	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเดินท่อไฟและร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 25



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา











งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าบริเวณทางเดิน  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 12





# รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

# ตรวจสอบงานทดสอบวงจร Lighting & Power Reception บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 23-25

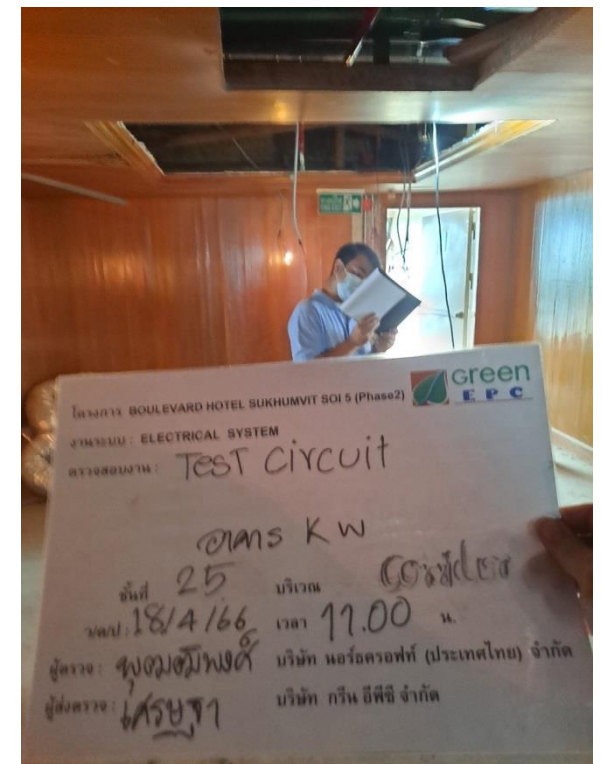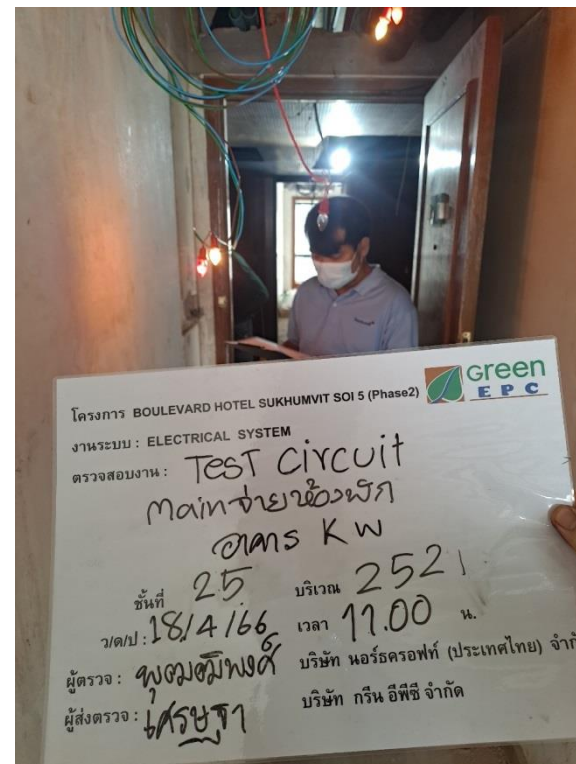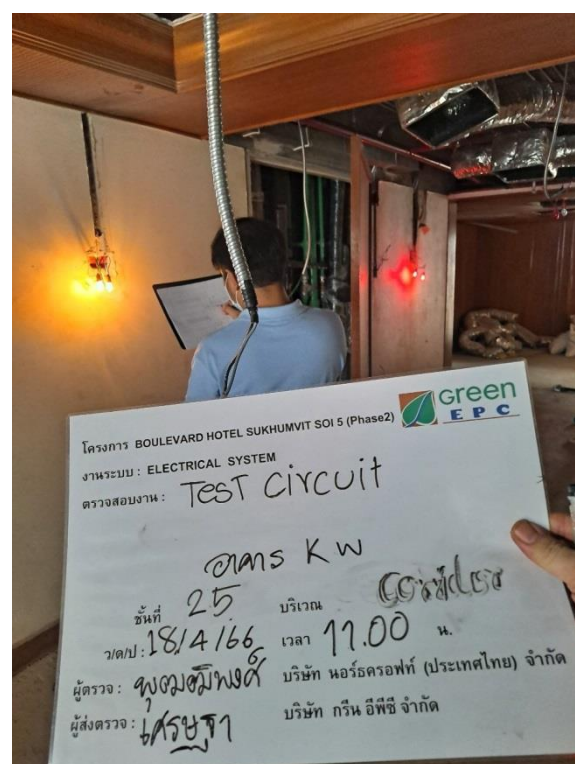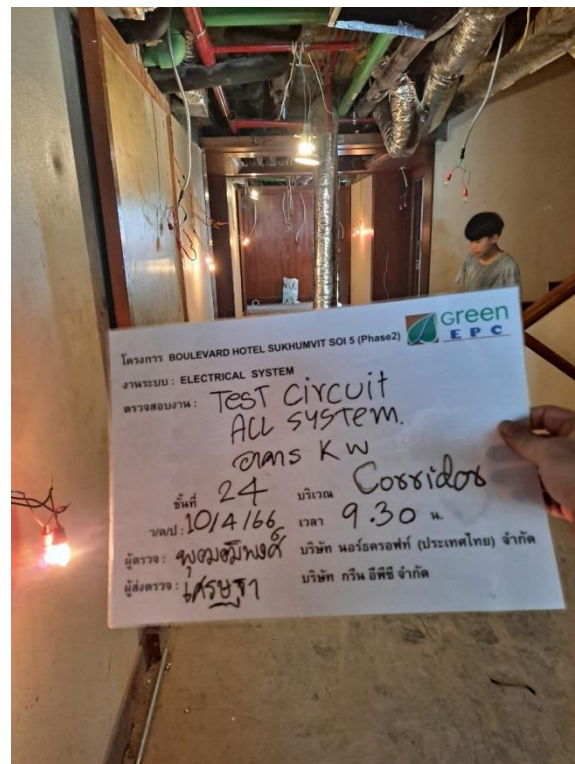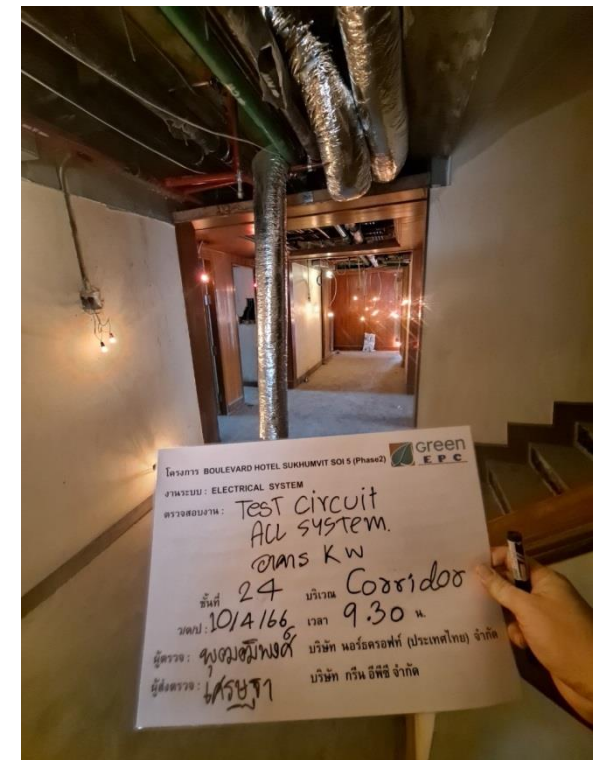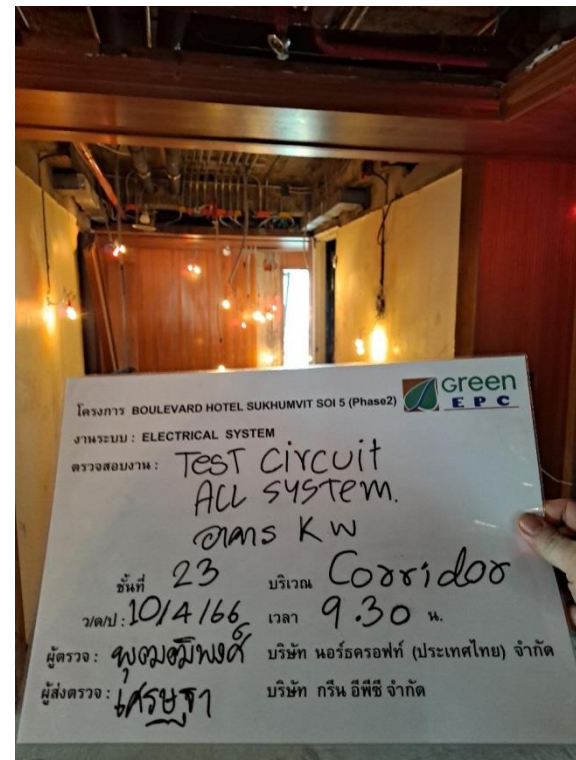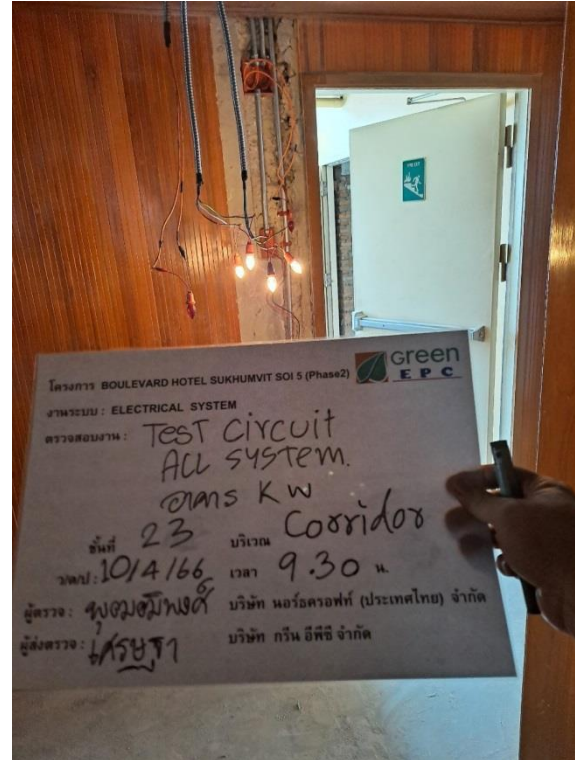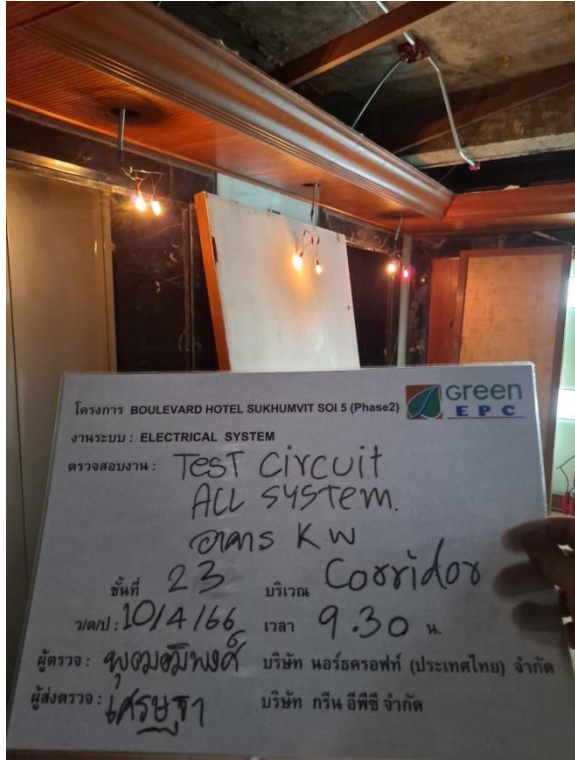

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานใส่หัวสปริงเกอร์บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 14,15,16



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานใส่หัวสปริงเกอร์บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 14,15,16




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 11,10

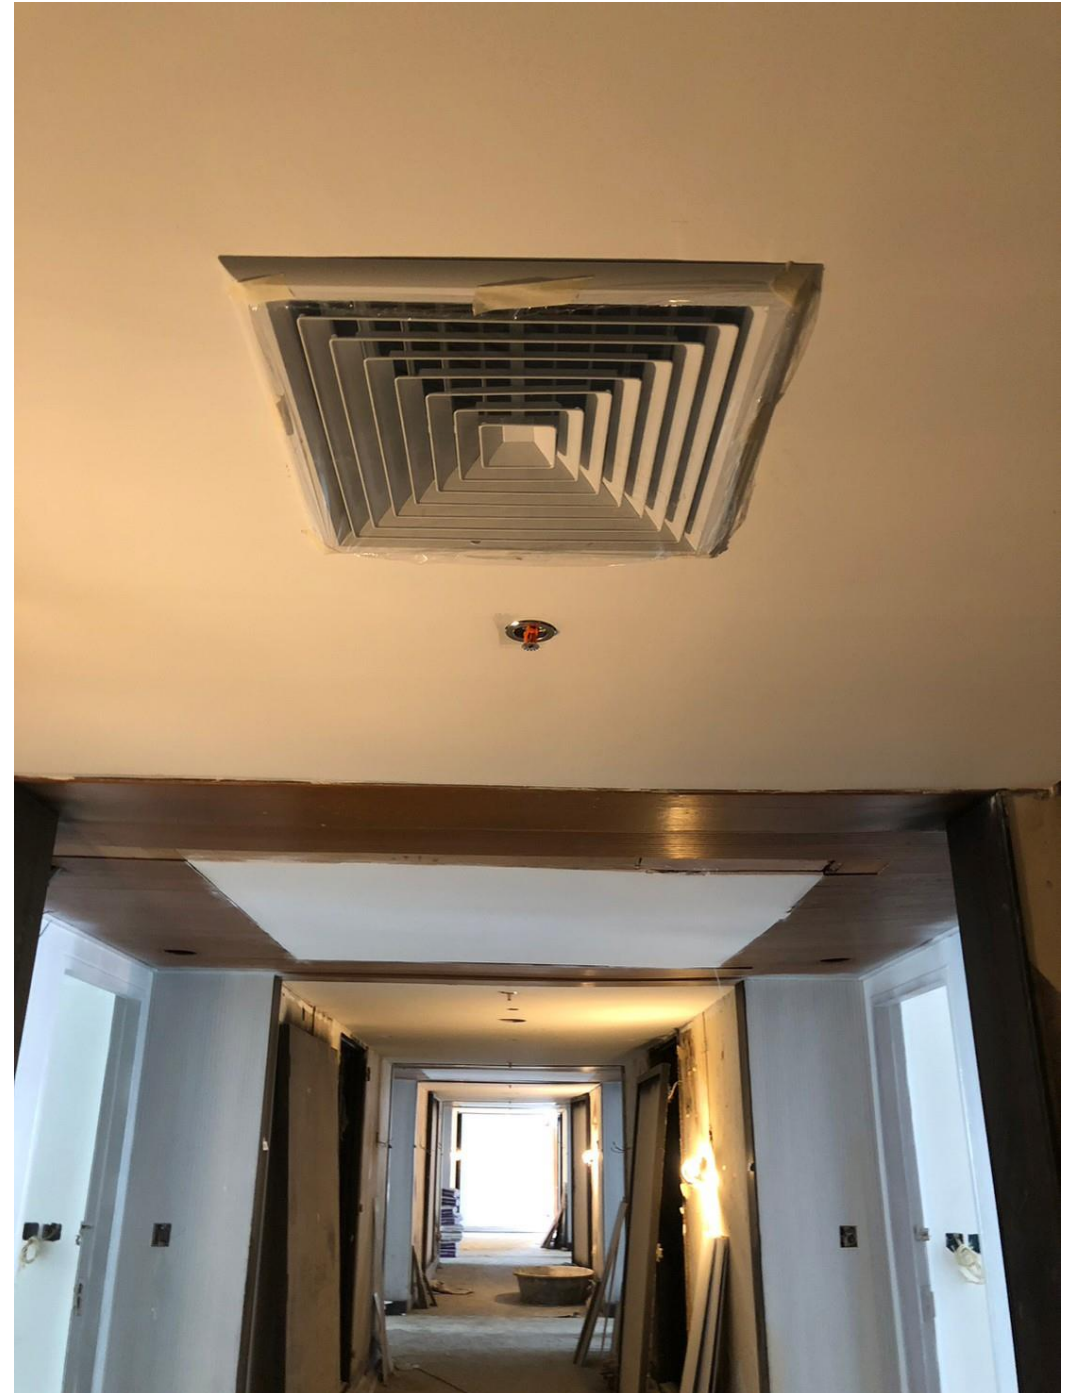

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 11,10

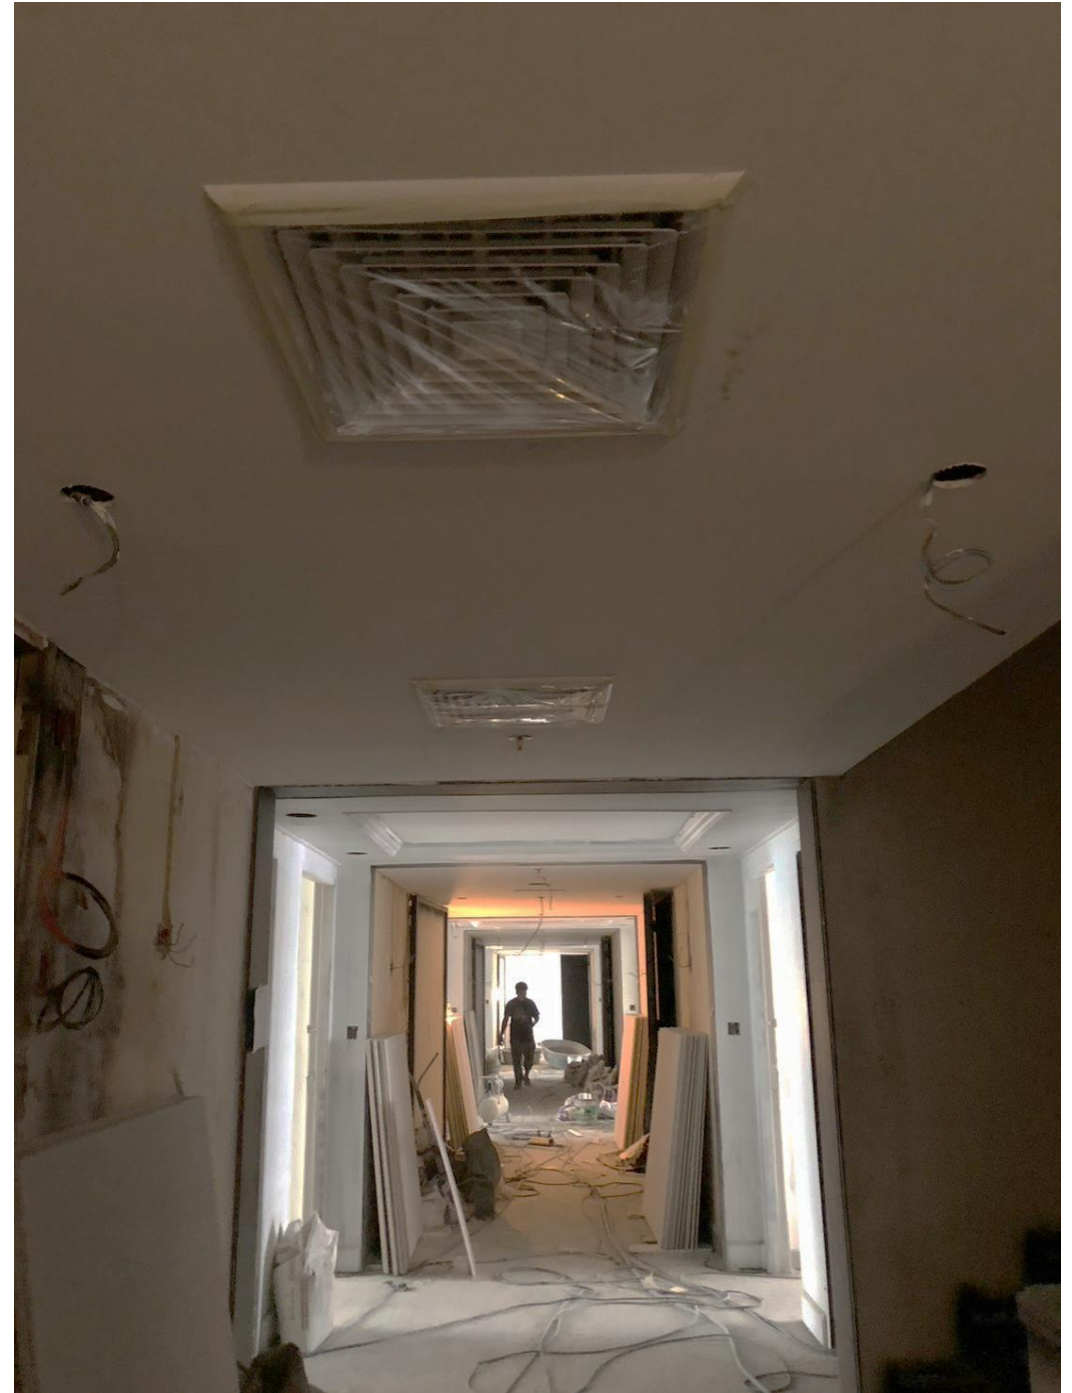

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเดินท่อและร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์  
ชั้น 15

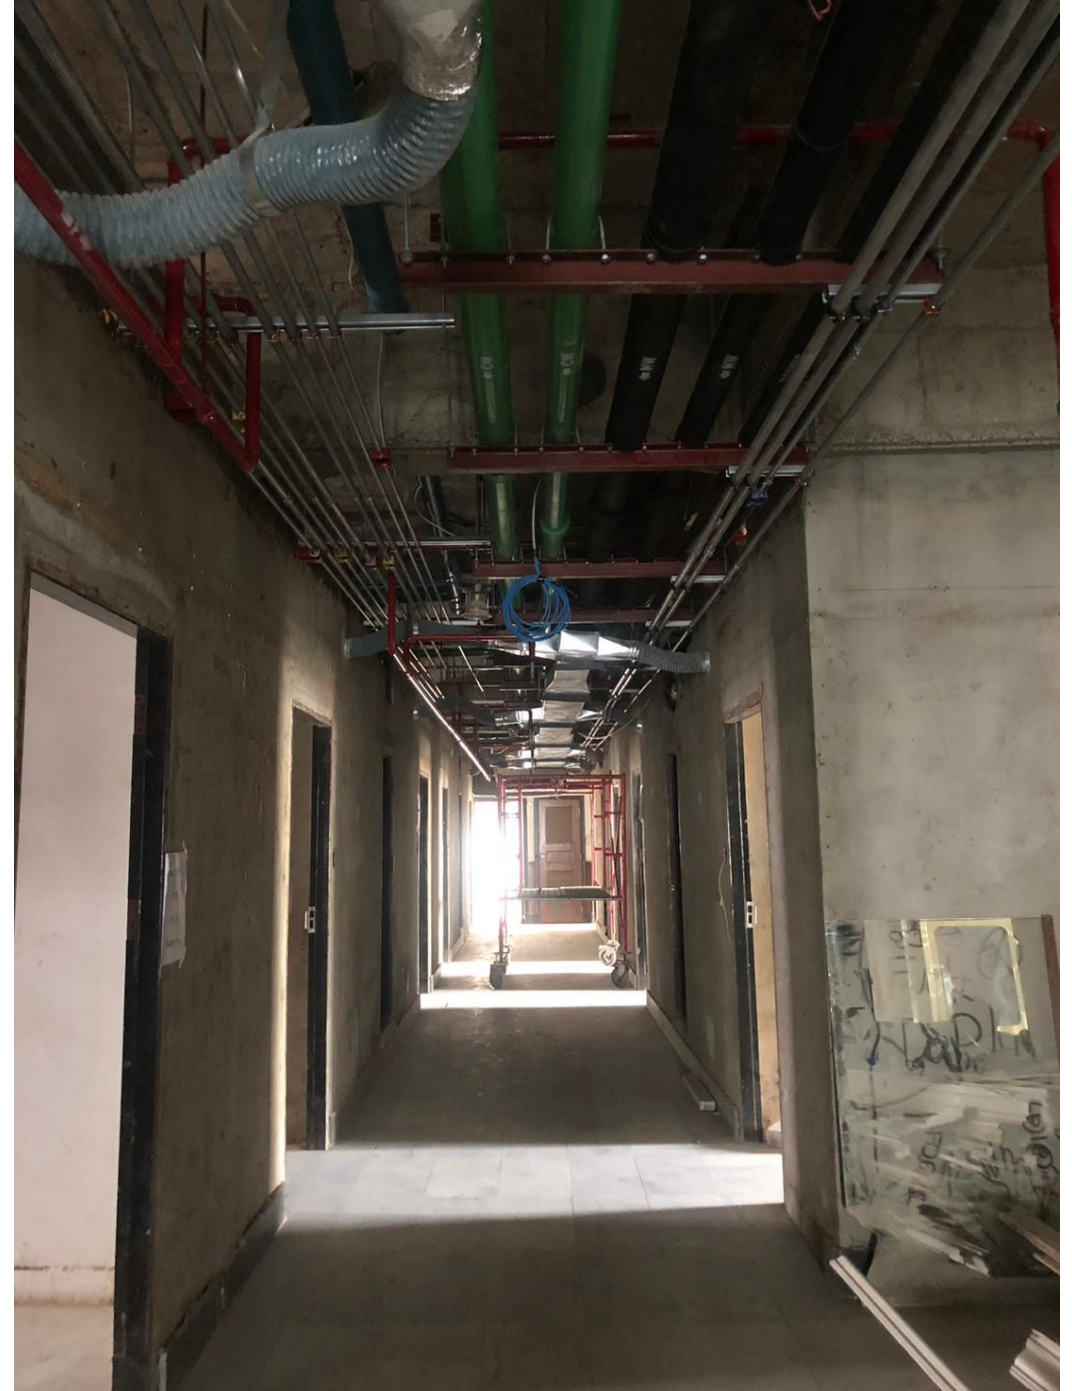

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานใส่หัวสปริงเกอร์บริเวณทางเดิน  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 10

