



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด


WEEKLY

Report

BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5

20 JULY 2023

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

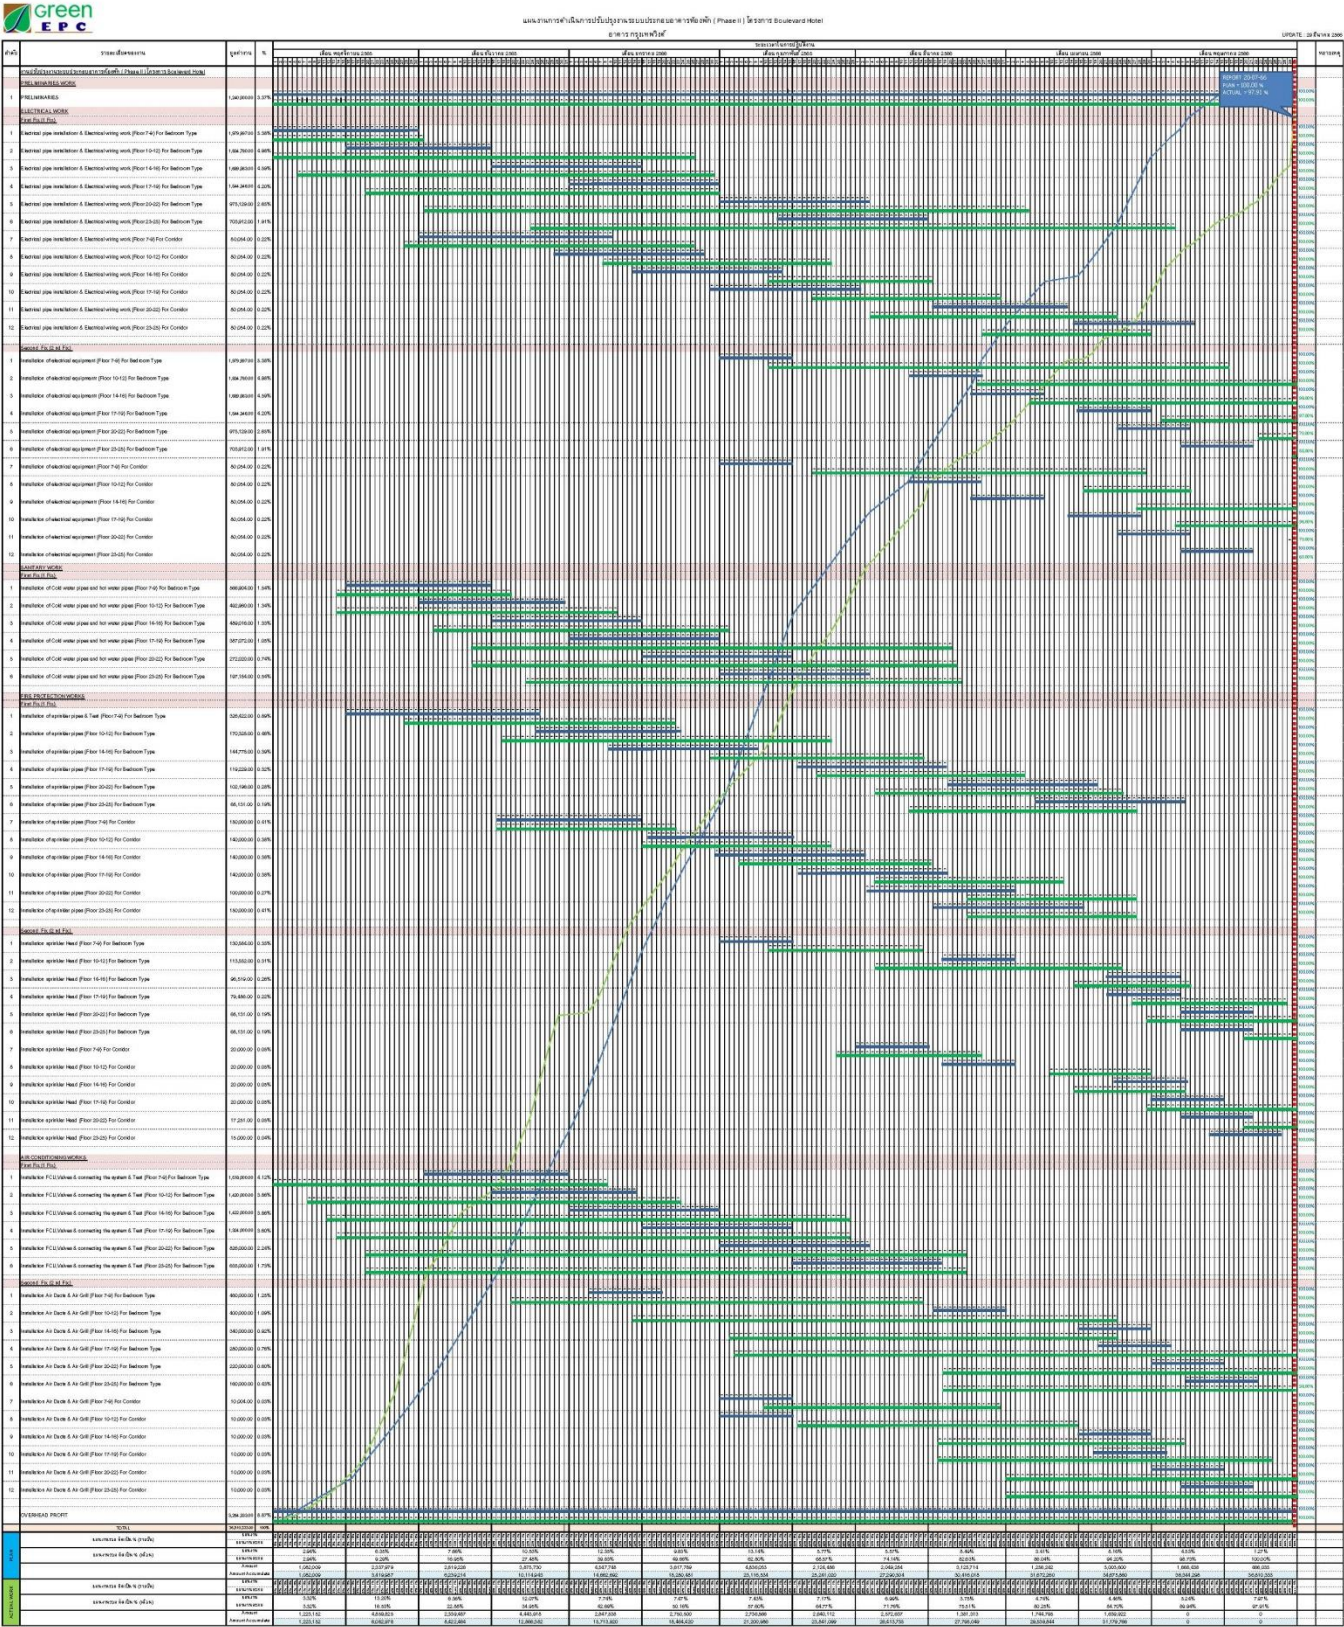

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS
CURRENT (20-07-66)

PLAN (%)

ACTUAL (%)

DELAY

100.00%

97.91%

- %

ล่าช้า 63 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักรักษาตัวผู้ป่วย (Phase II)



Task Summary Table:

Task Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date	Resource Usage (Peak)
Electrical (Floor 4-12)	12	2023-01-01	2023-01-12	12
Plumbing (Floor 4-12)	12	2023-01-01	2023-01-12	12
HVAC (Floor 4-12)	12	2023-01-01	2023-01-12	12

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS
CURRENT (20-07-66)

PLAN (%)

ACTUAL (%)

DELAY

100.00%

98.28%

- %
ล่าช้า 63 วัน

หมายเหตุ ถ้าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่ทำงาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

หมายเหตุ ถ้าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่ทำงาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกรกฎาคม 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Project Manager	1		1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1													
2	Architecture Engineer	1		2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	-	2	2													
3	Electrical Engineer	-		1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1													
4	Air Conditioning Engineer	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
5	Safety	1		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1													
6	Sanitary Foreman	-		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1													
7	Electrical Foreman	2		2	2	1	2	2	1	-	2	2	2	2	2	2	-	1	1													
8	Air Foreman	1		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-													
9	Site Admin	1		1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1													
10	Electricians	12		14	14	7	14	13	7	-	16	15	15	12	12	15	-	4	9													
11	Plumber	-		6	6	6	6	6	6	-	6	6	6	6	6	6	-	6	6													
12	Sprinkler	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
13	Air Conditioner	6		6	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-													
14	General Technician	3		-	4	4	10	10	6	6	6	7	3	4	4	4	-	-	4													
15	Store	2		1	3	1	3	3	1	-	3	3	1	3	3	3	-	3	3													
16	Tiler	4		4	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
17	Skim Coat	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	รวม	34	0	41	39	35	41	47	26	7	40	39	34	34	36	40	0	21	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา





งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 15

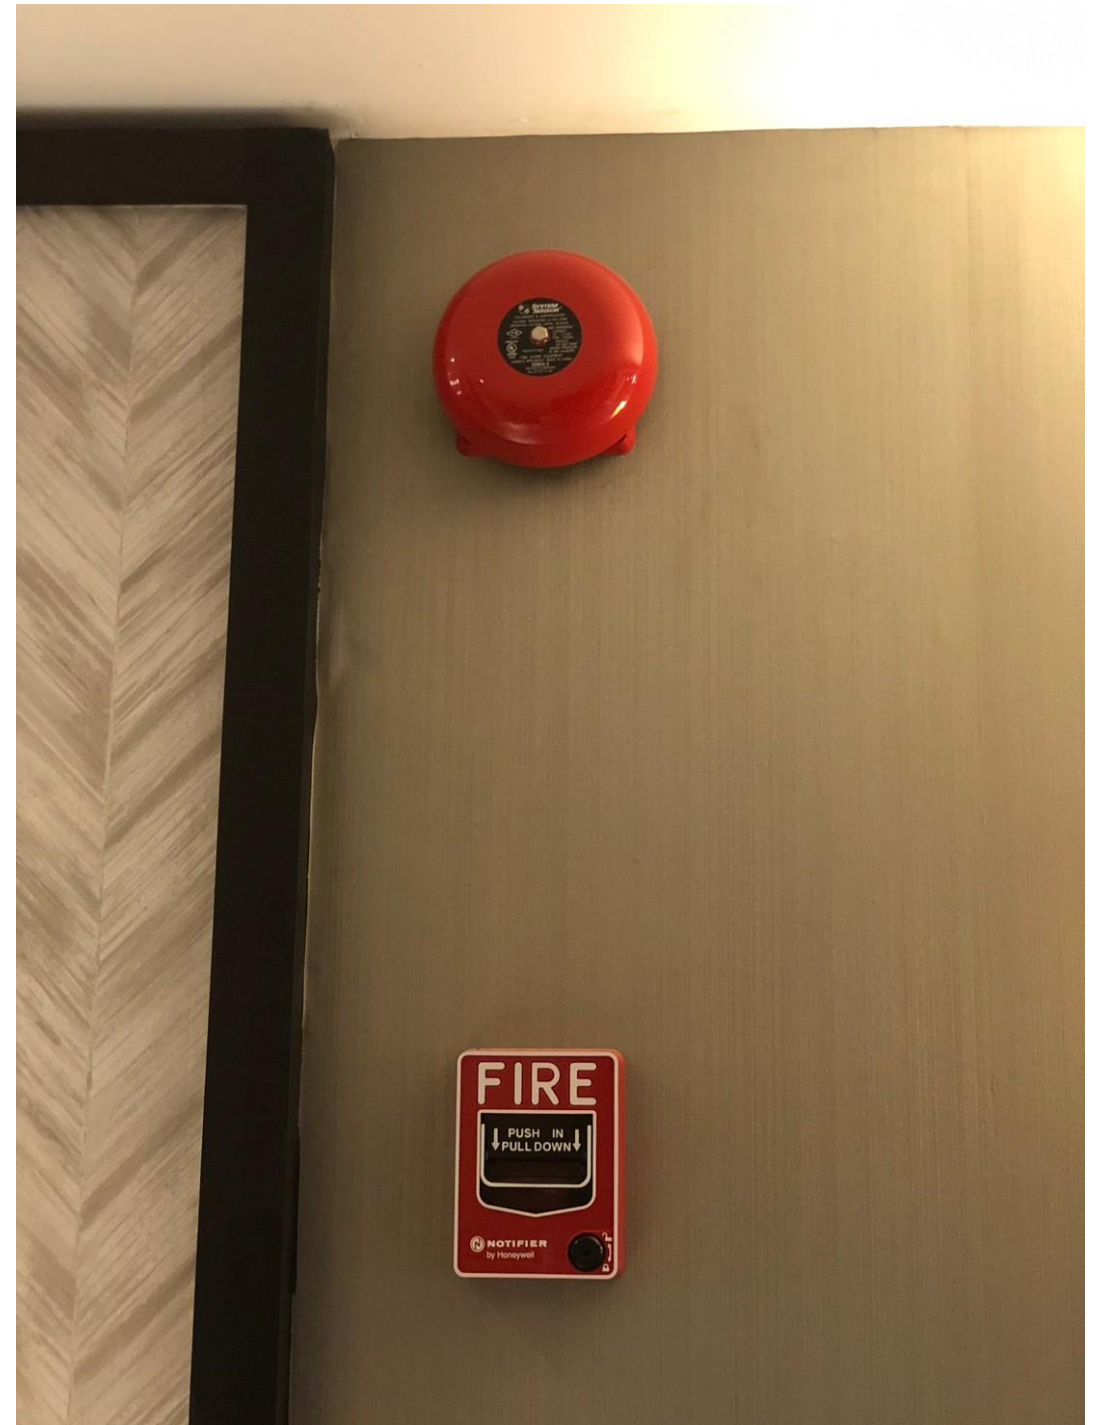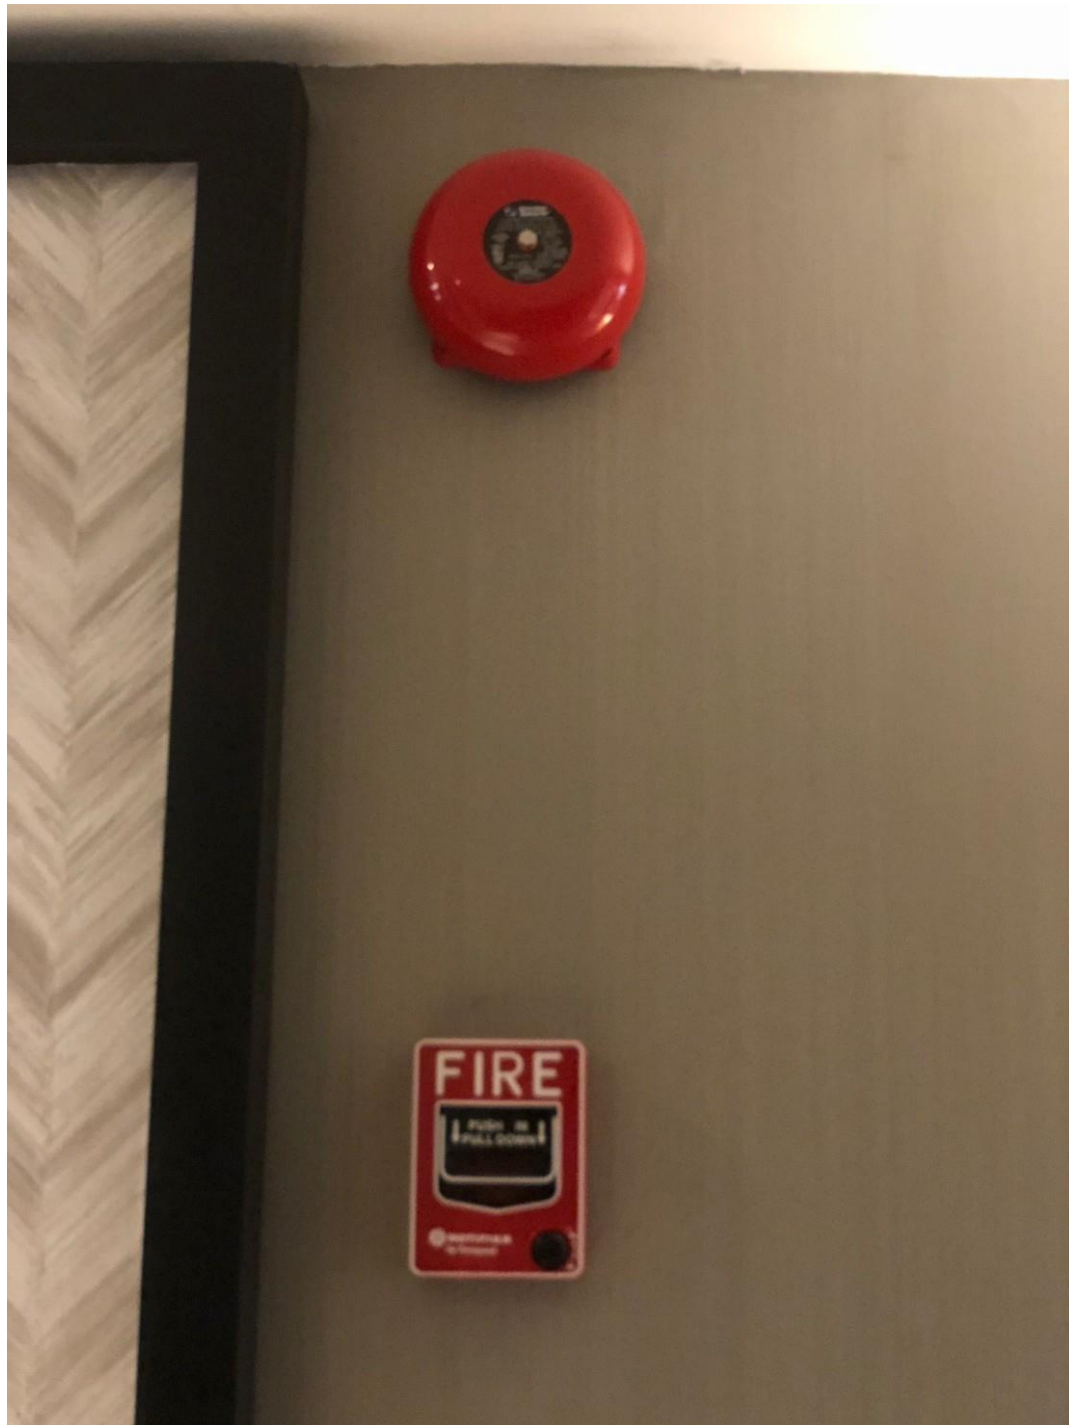

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานเติมน้ำยาระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้นดาดฟ้า

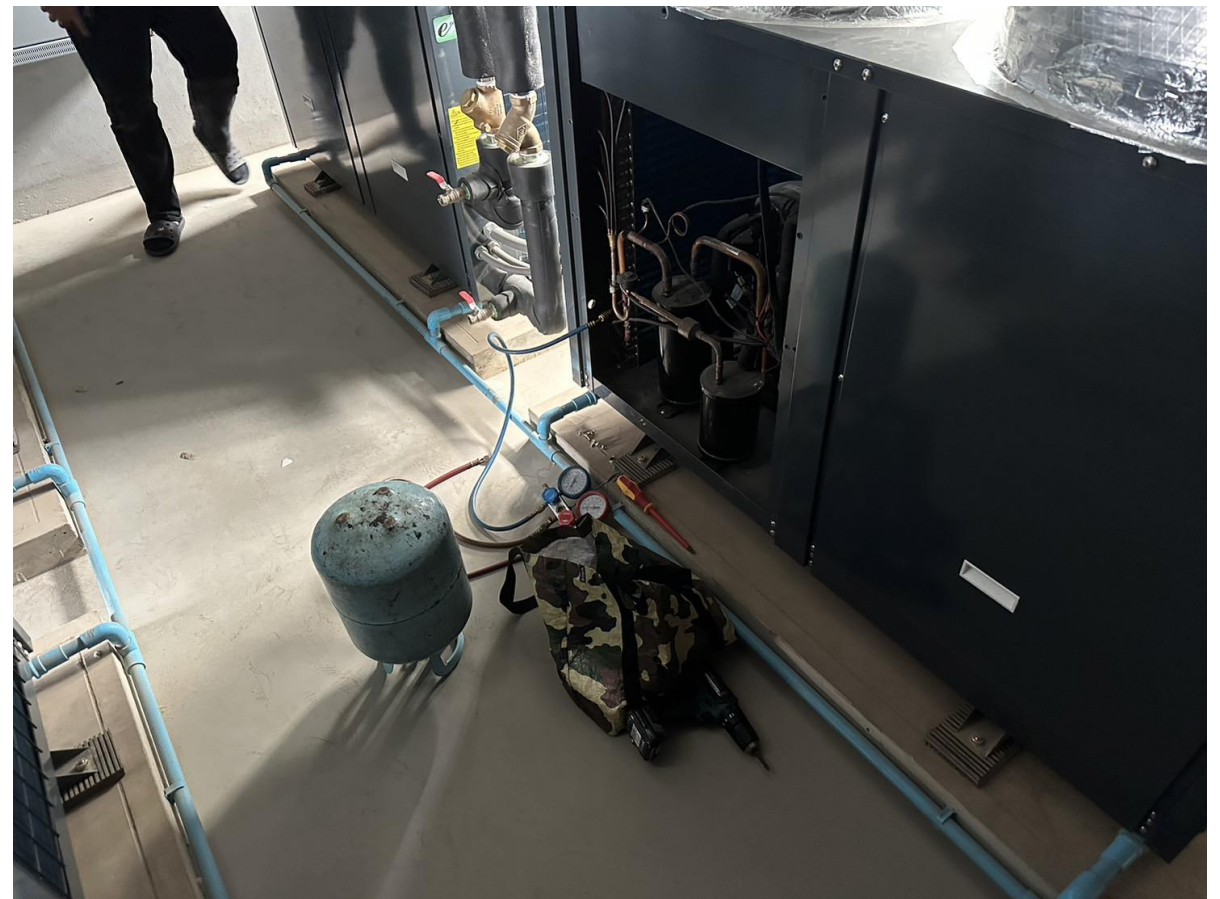

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเติมน้ำยาระบบ Heat Pump บริเวณห้องเครื่อง
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้นดาดฟ้า




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานทดสอบระบบ Fire Alarm ทั้งอาคารกรุงเทพและอาคารสยาม



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

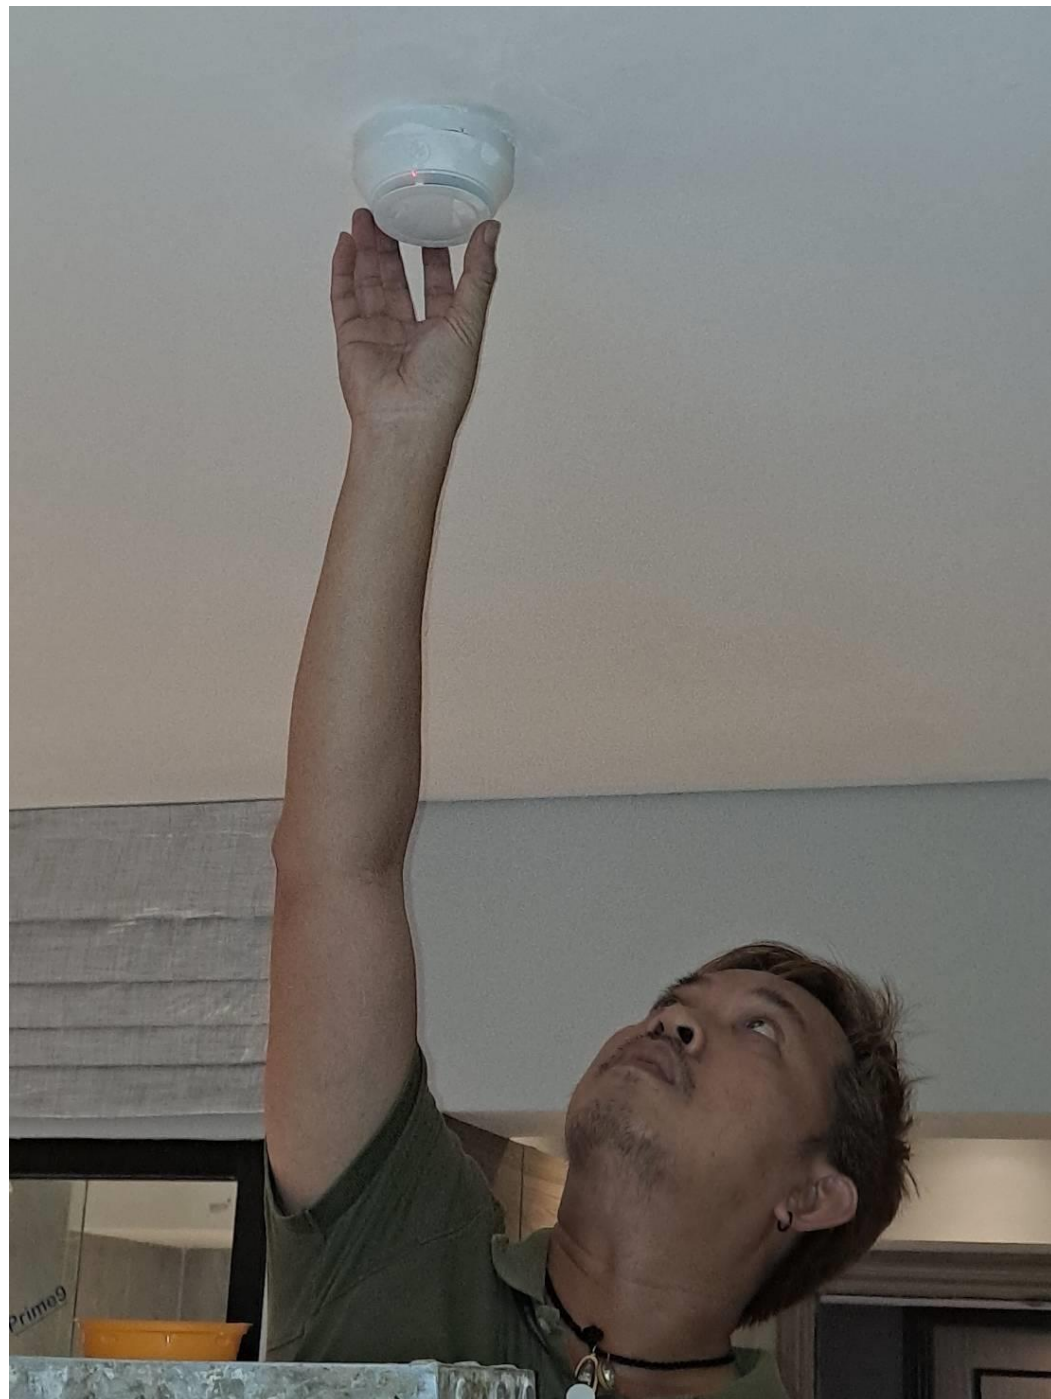

งานทดสอบระบบ Fire Alarm ทั้งอาคารกรุงเทพและอาคารสยาม



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟและลำโพงบริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 15

