



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY


**R**EPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

21 Sep 2023

## แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

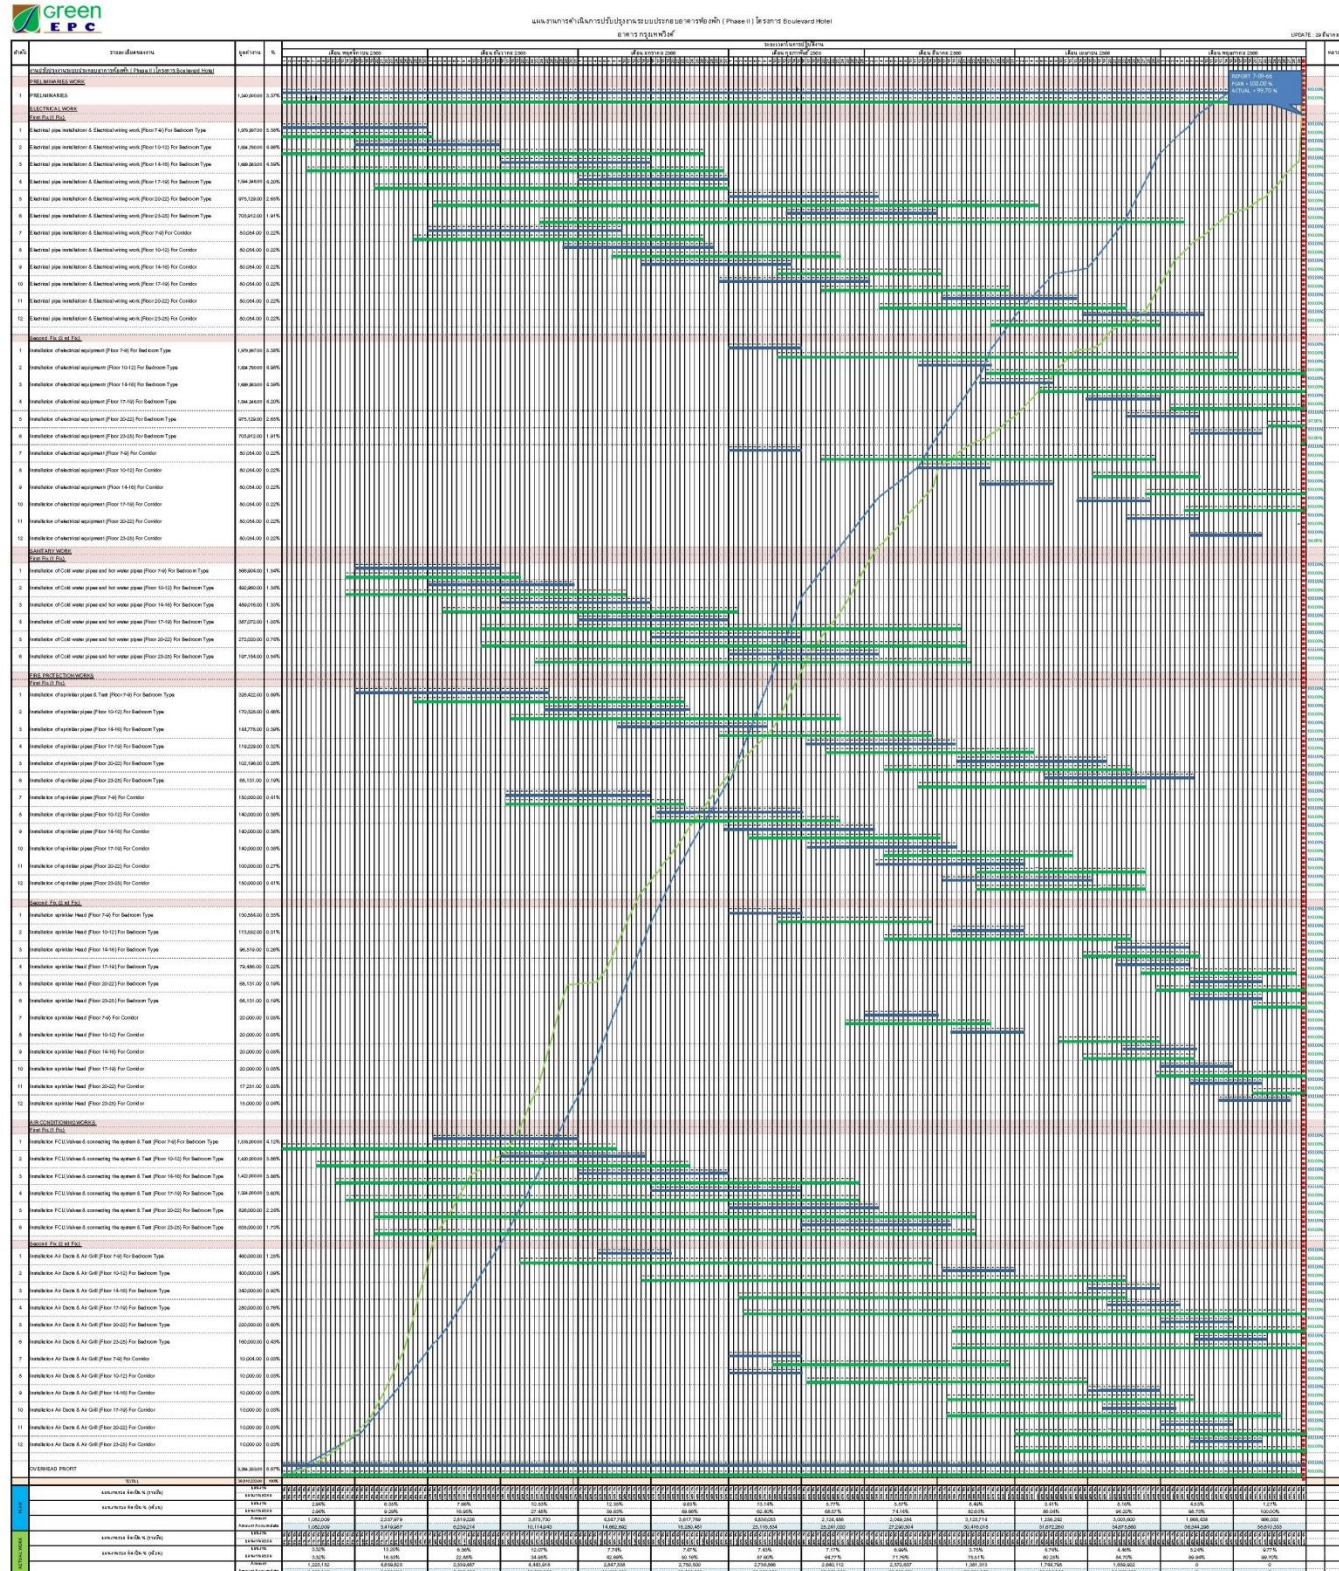

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (21-09-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	100.00%	99.83%	- % ล่าช้า 126 วัน


หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel  
อาคารสยามวิล์ด

UPD DATE : 28 กันยายน 2566

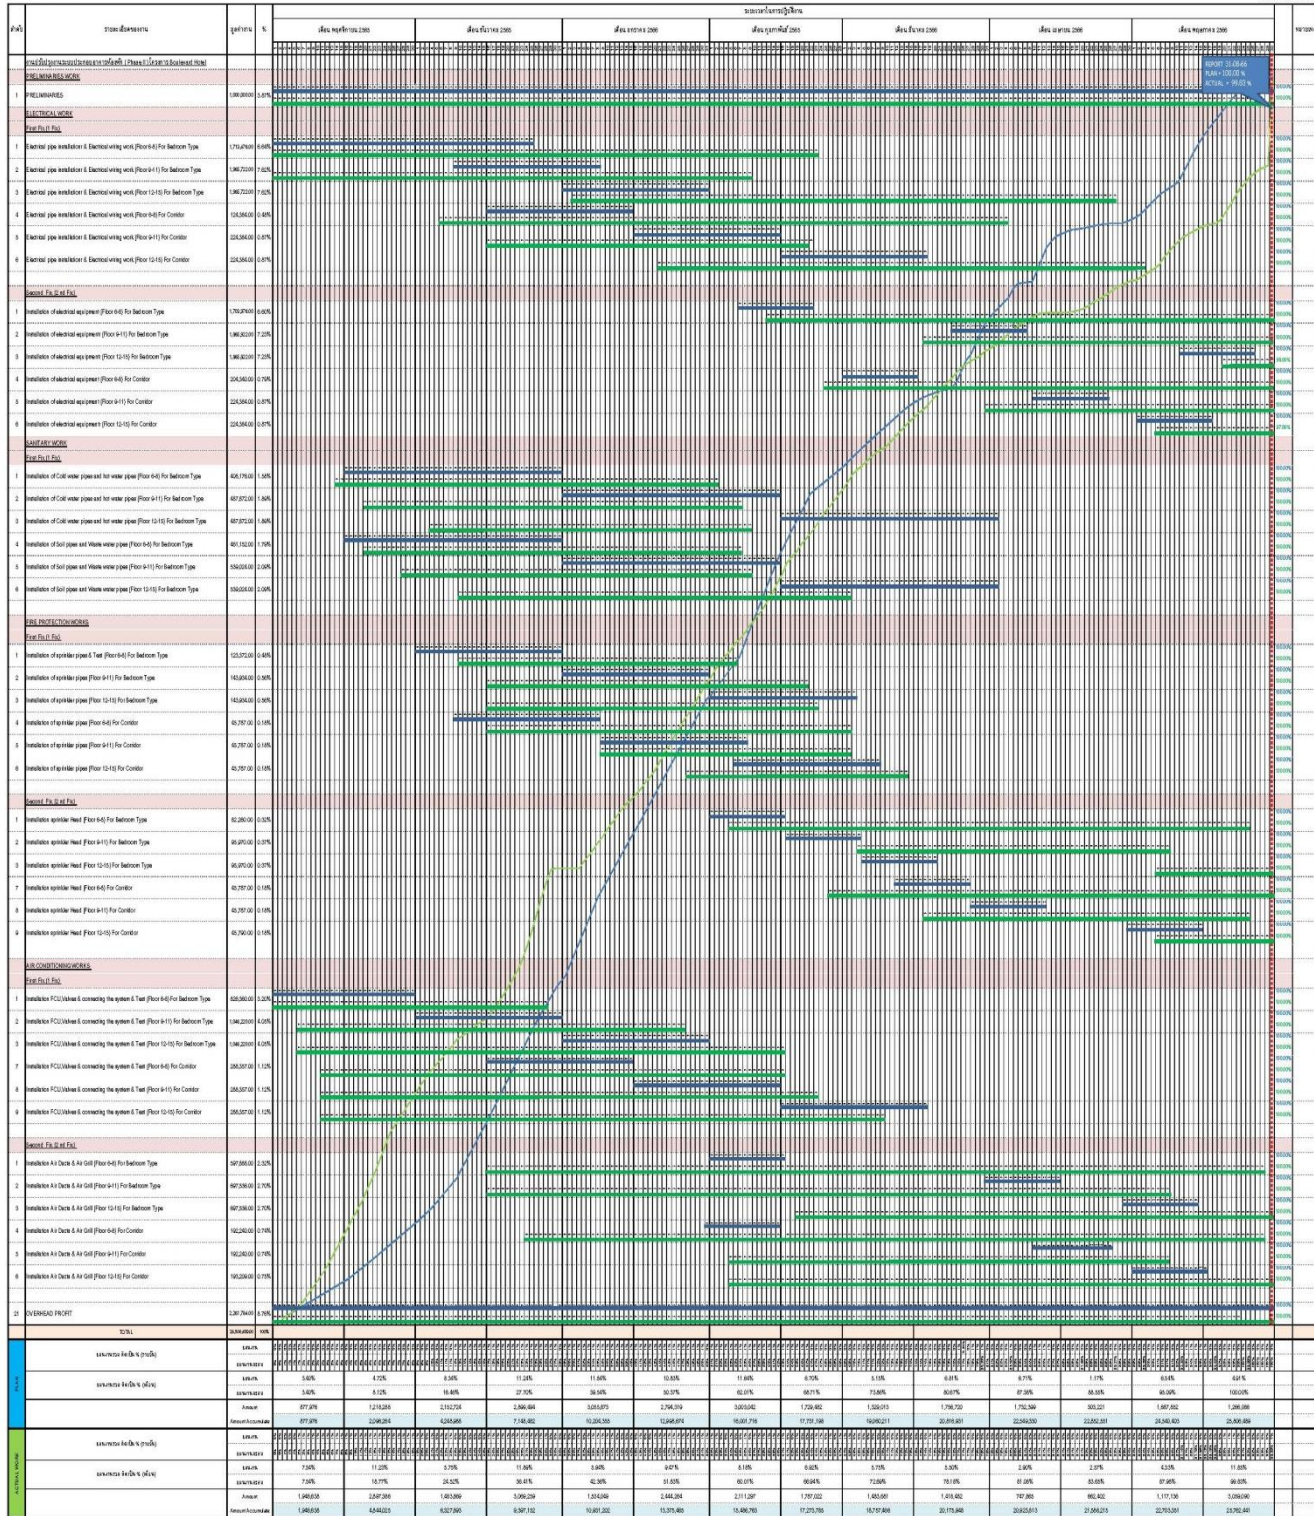

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (21-09-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.84%	- % ล่าช้า 126 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

**MAN POWER**

# ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเดือนกันยายน 2566



## ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกันยายน 2566																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Project Manager	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-										
2	Architecture Engineer	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1										
3	Electrical Engineer	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1										
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Safety	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1										
6	Sanitary Foreman	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1										
7	Electrical Foreman	1	1	-	1	1	1	2	2	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1										
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Site Admin	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1										
10	Electricians	7	5	-	6	6	6	11	12	10	-	5	5	5	-	4	4	-	6	5	6										
11	Plumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Sprinkler	-	-	-	5	5	4	3	3	-	-	3	-	3	3	3	3	-	3	3	3										
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	General Technician	11	8	-	6	6	8	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Store	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	2										
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	<b>รวม</b>	24	17	0	21	23	23	23	25	16	0	18	13	14	9	15	16	0	17	13	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


หมายเหตุ

  วันอาทิตย์

  วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่งบริเวณ Corridor  
ชั้น 24-25 อาคารกรุงเทพวิงค์

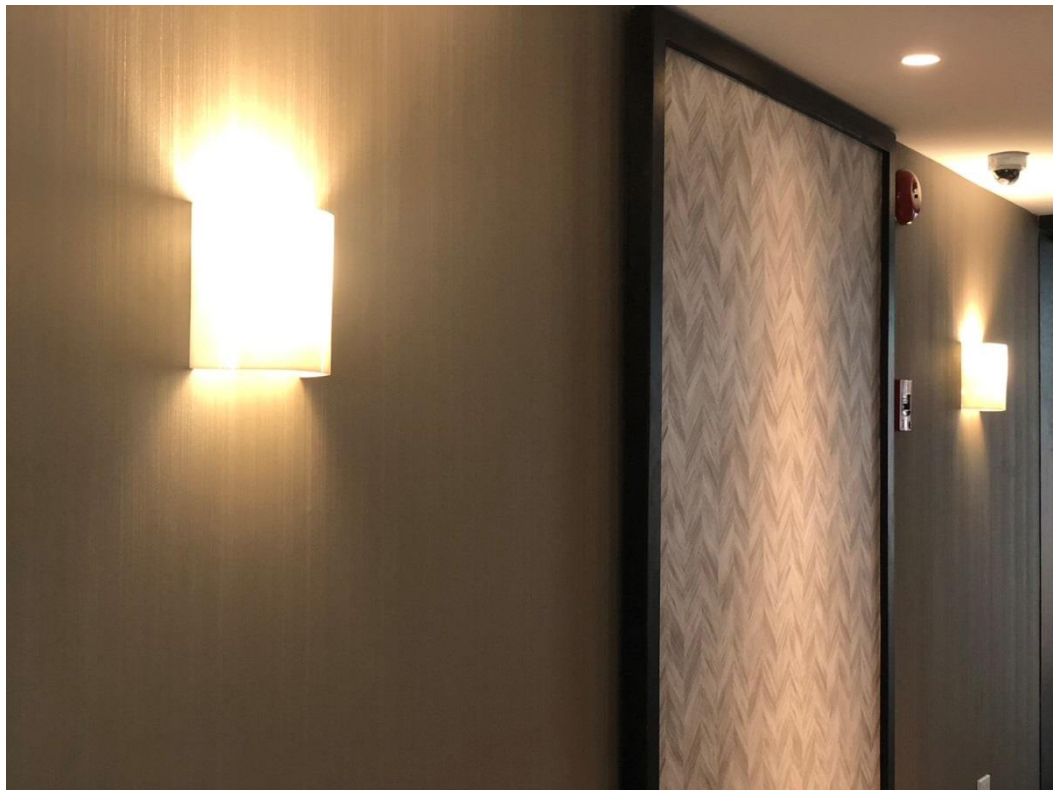

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่งบริเวณ Corridor  
ชั้น 24-25 อาคารกรุงเทพวิงค์






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณห้องเครื่อง Heat Pump  
ชั้นดาดฟ้า อาคารกรุงเทพวิงค์

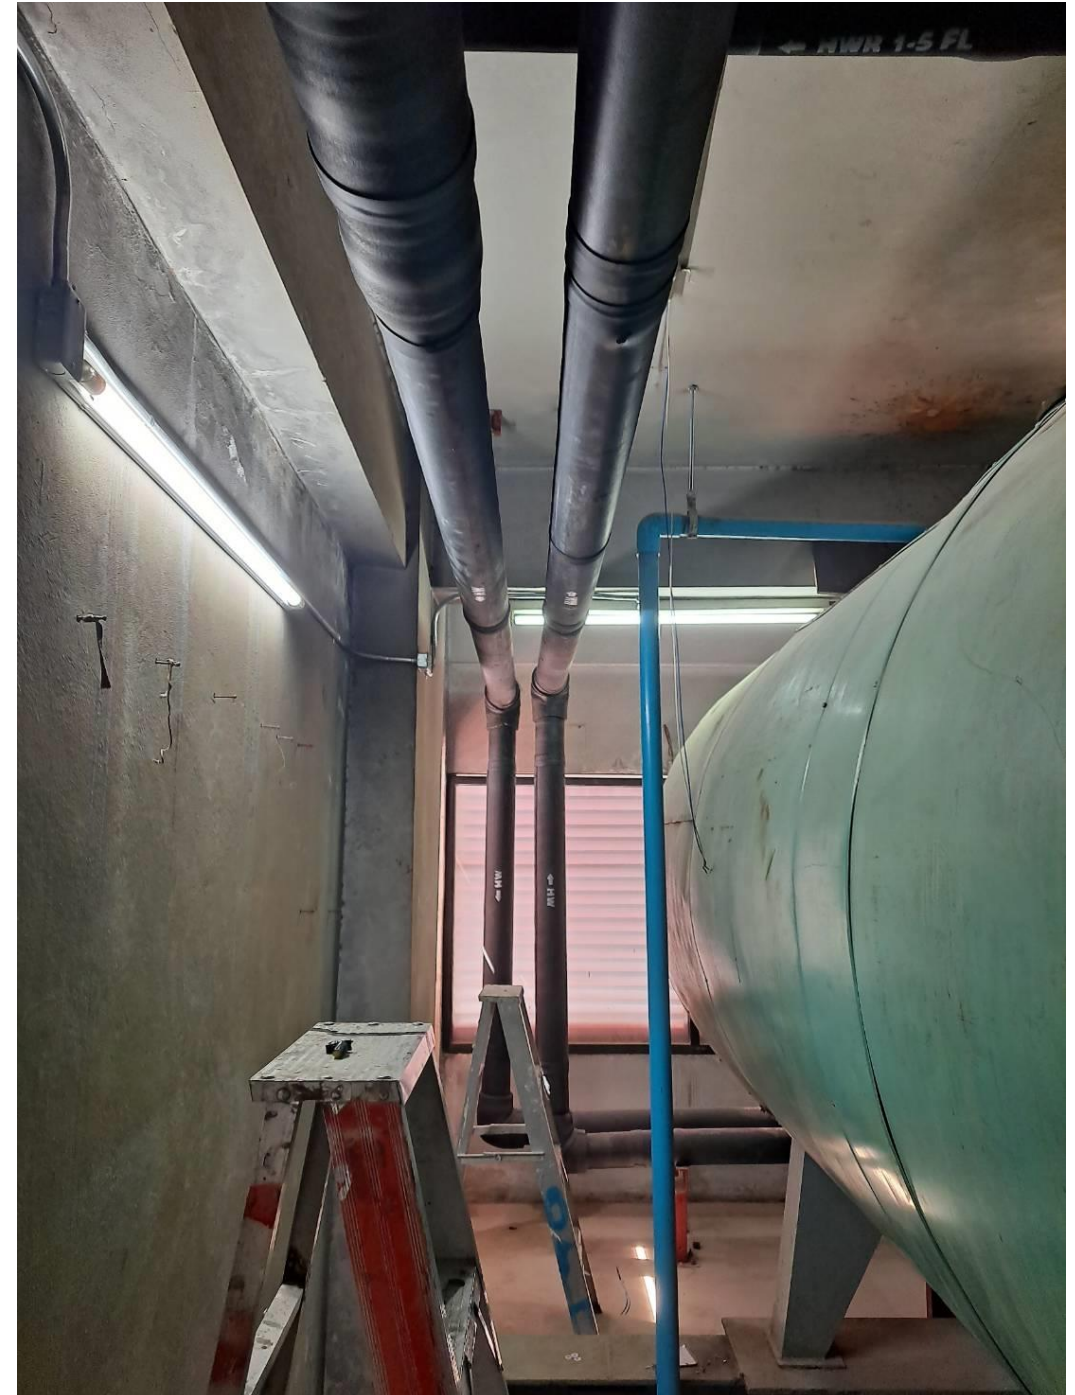

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณห้องเครื่อง Heat Pump  
ชั้นดาดฟ้า อาคารกรุงเทพวิงค์




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเดินท่อไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby  
ชั้น 1 อาคารกรุงเทพวิงค์

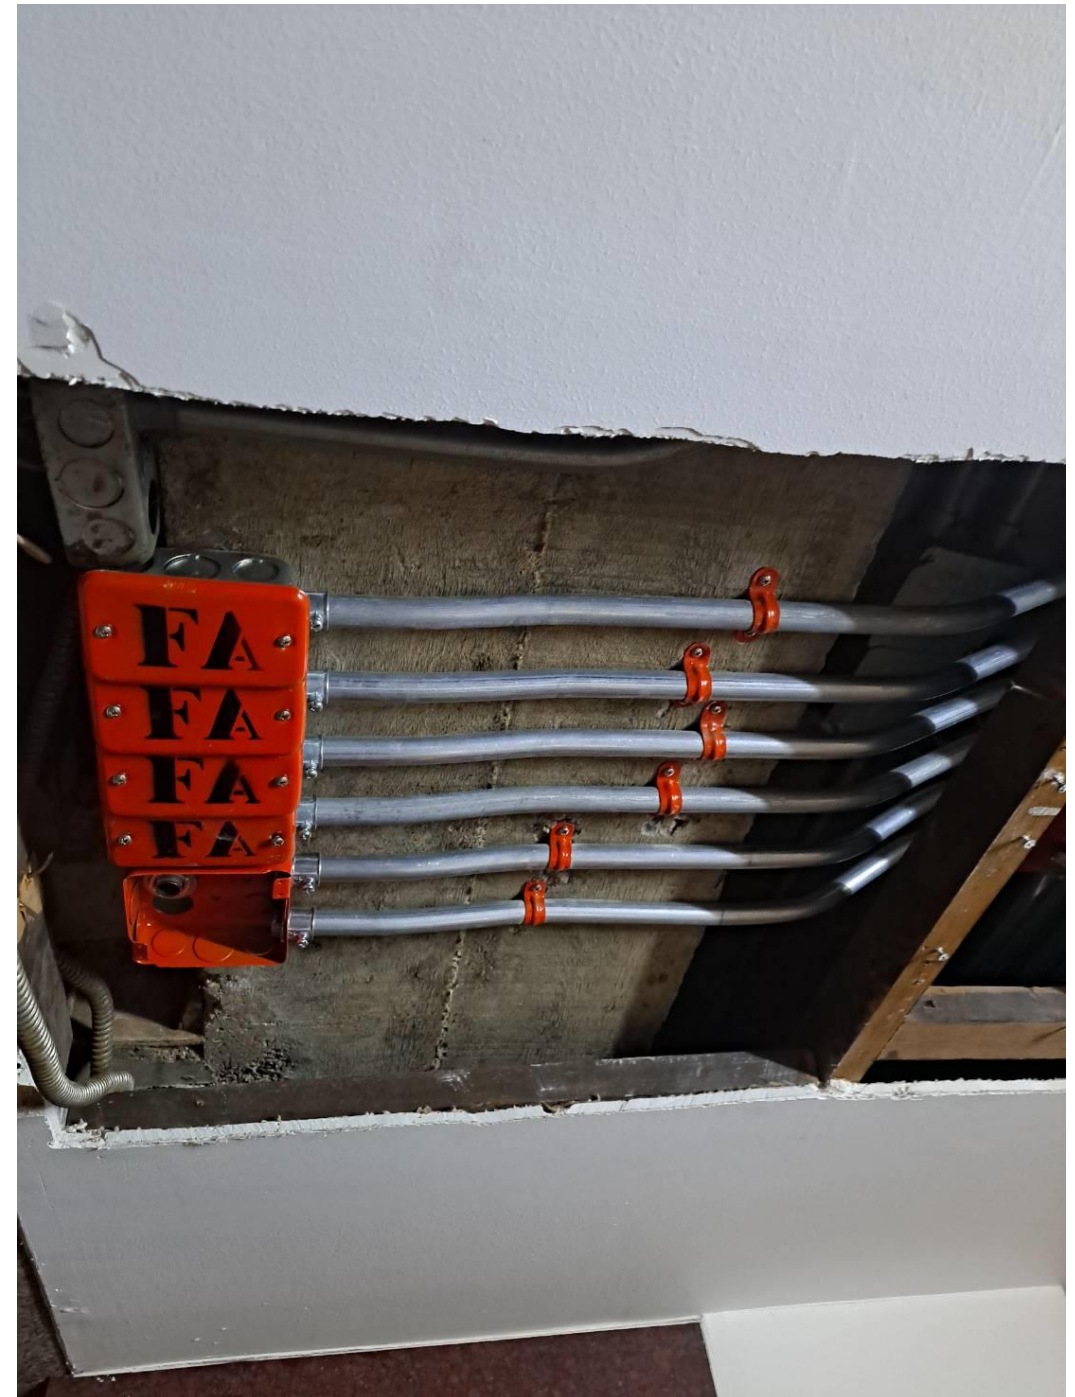


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor  
อาคารสยามวิงค์

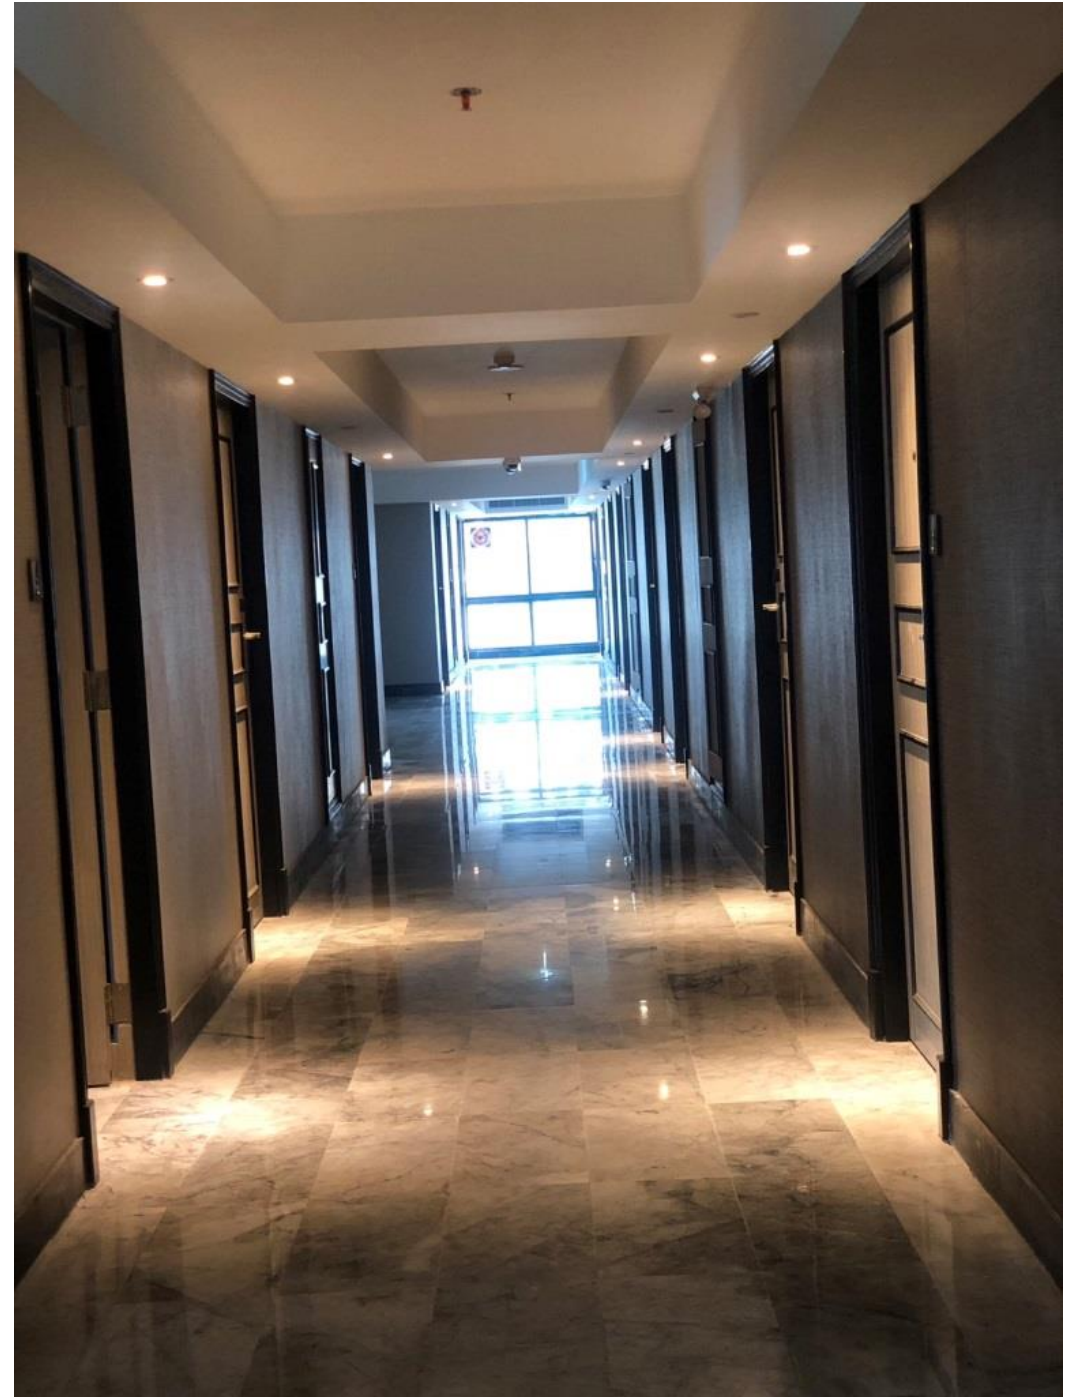

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor  
อาคารสยามวิงค์

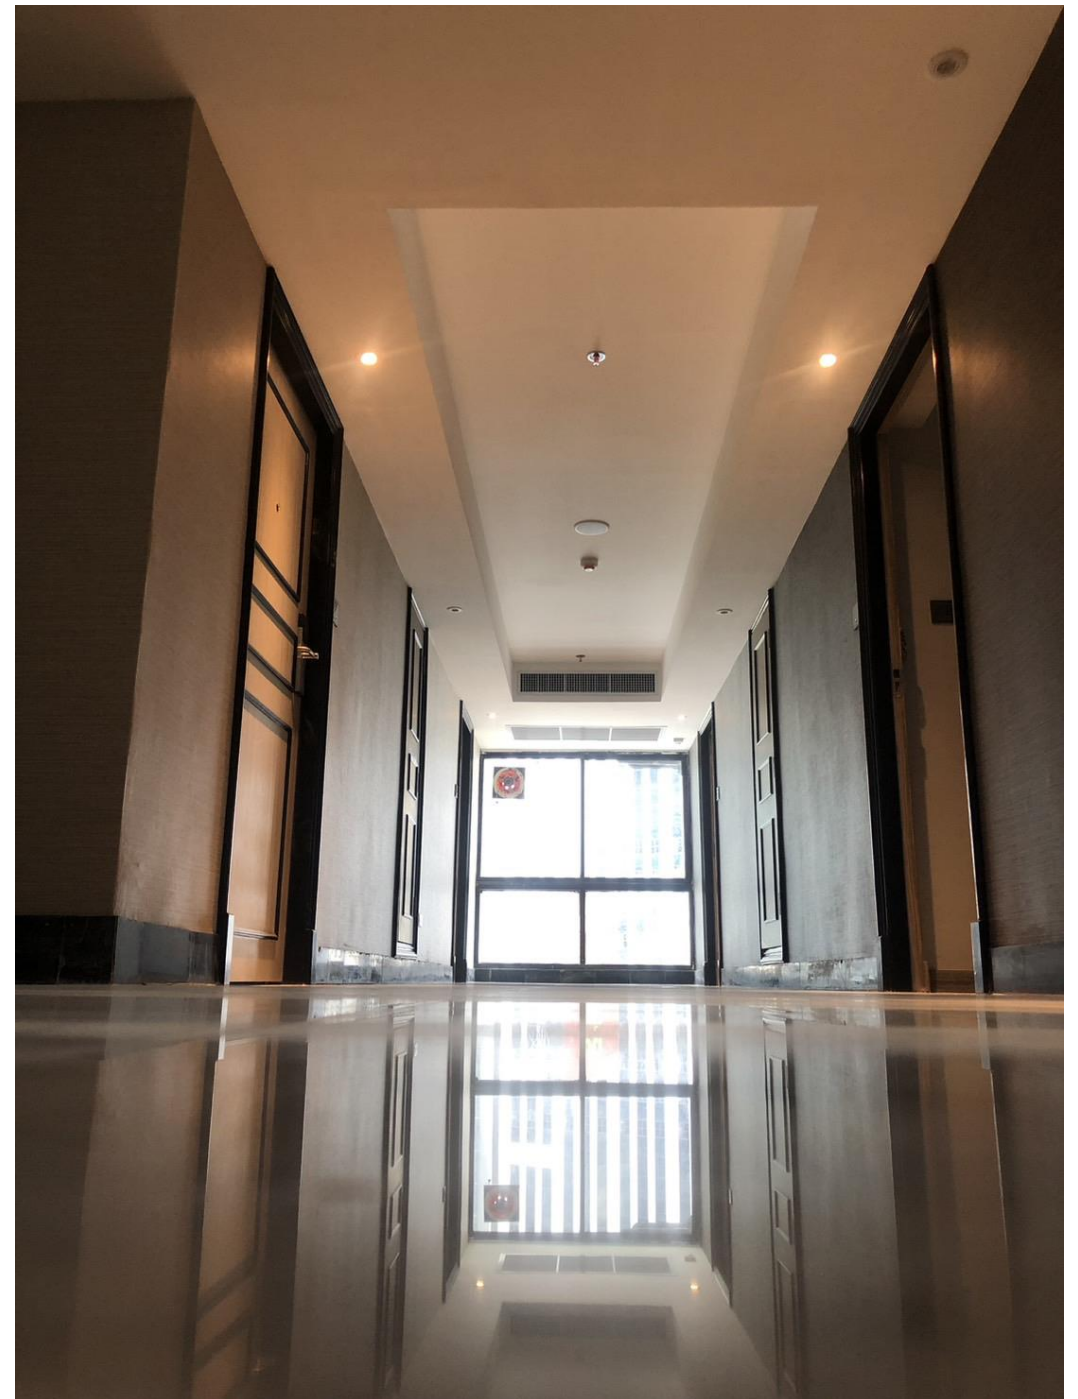

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานไฟแสงสว่างบริเวณ Corridor  
อาคารสยามวิงค์

