



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY

REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**


23 February 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารกรุงเทพฯ (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel
อาคาร กรุงเทพพรีเว็ลล์

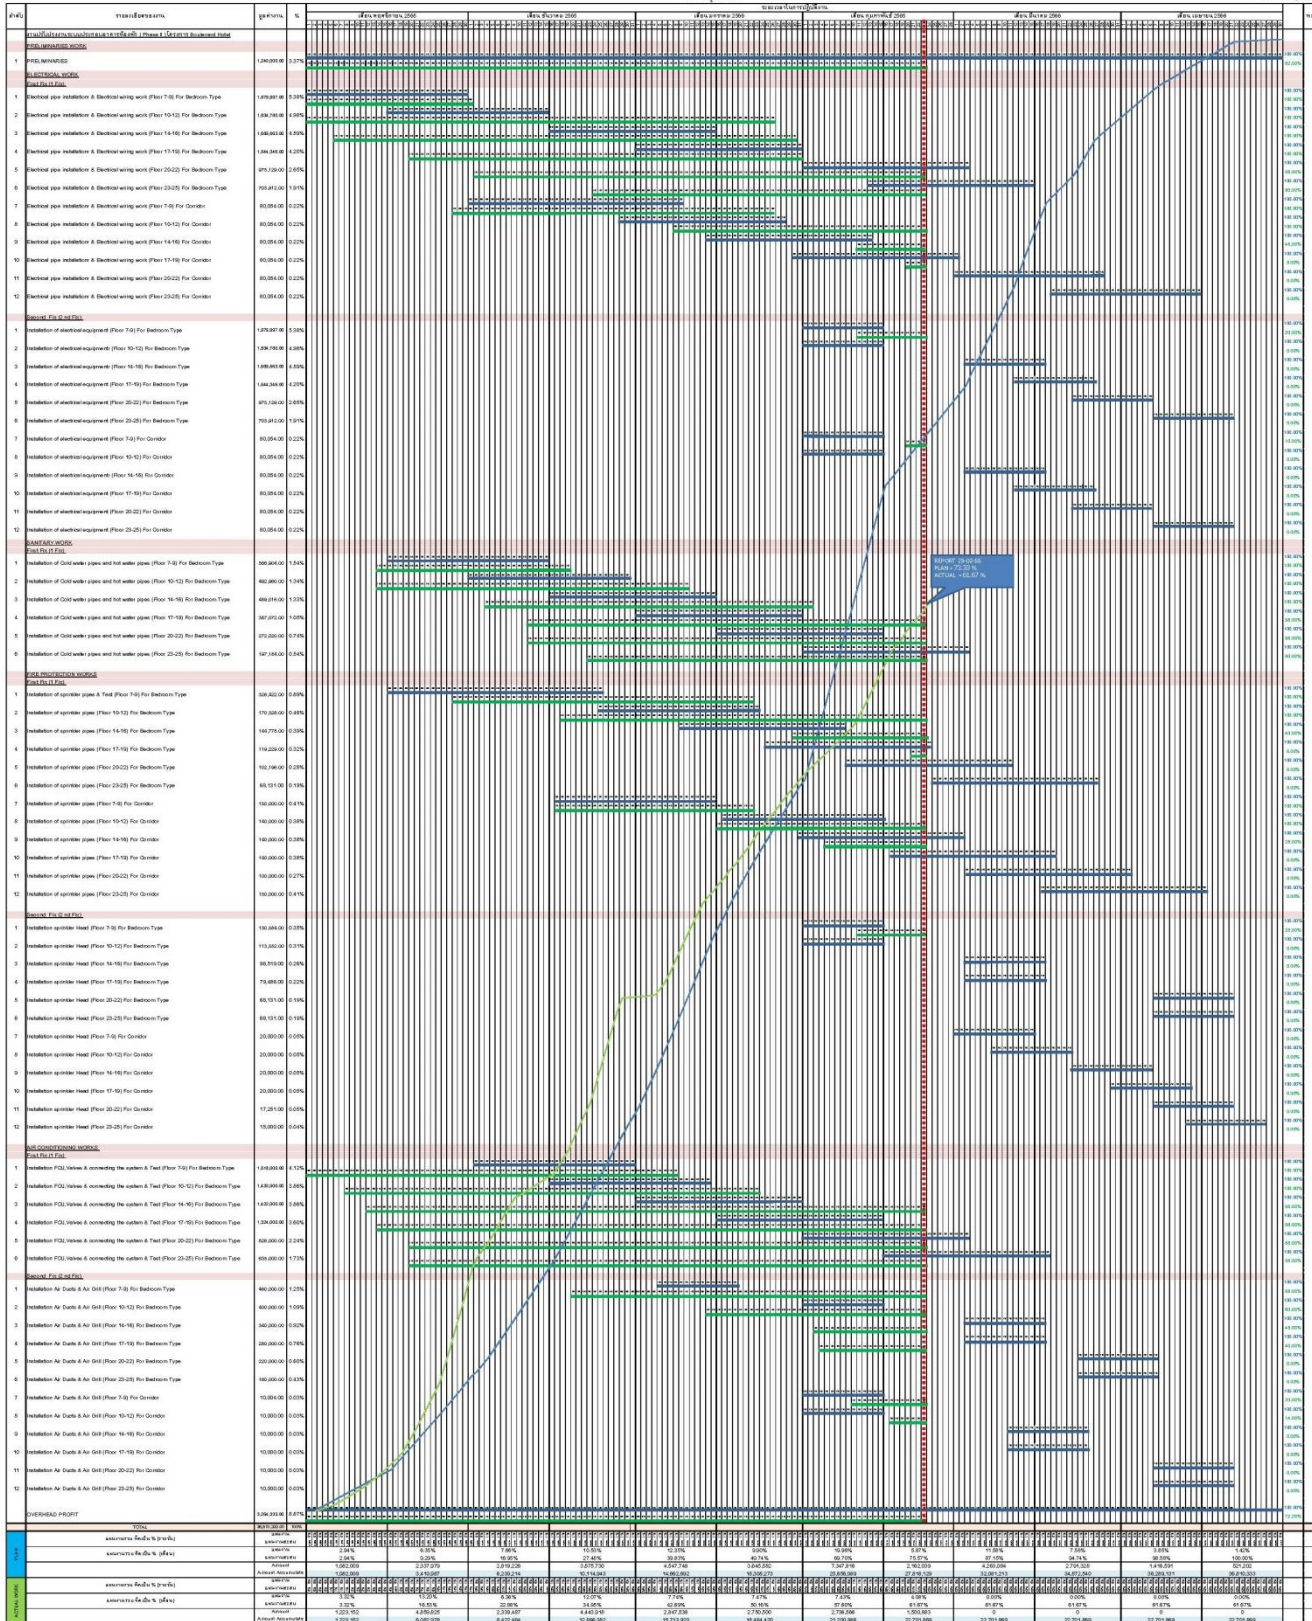

WEEKLY PROGRESS REPORT


PROGRESS CURRENT (23-02-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	73.33%	61.67%	-11.66 % ล่าช้า 19 วัน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารที่พัก (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel
อาคาร สยามวิทย์

UPDATE 08/01/2016

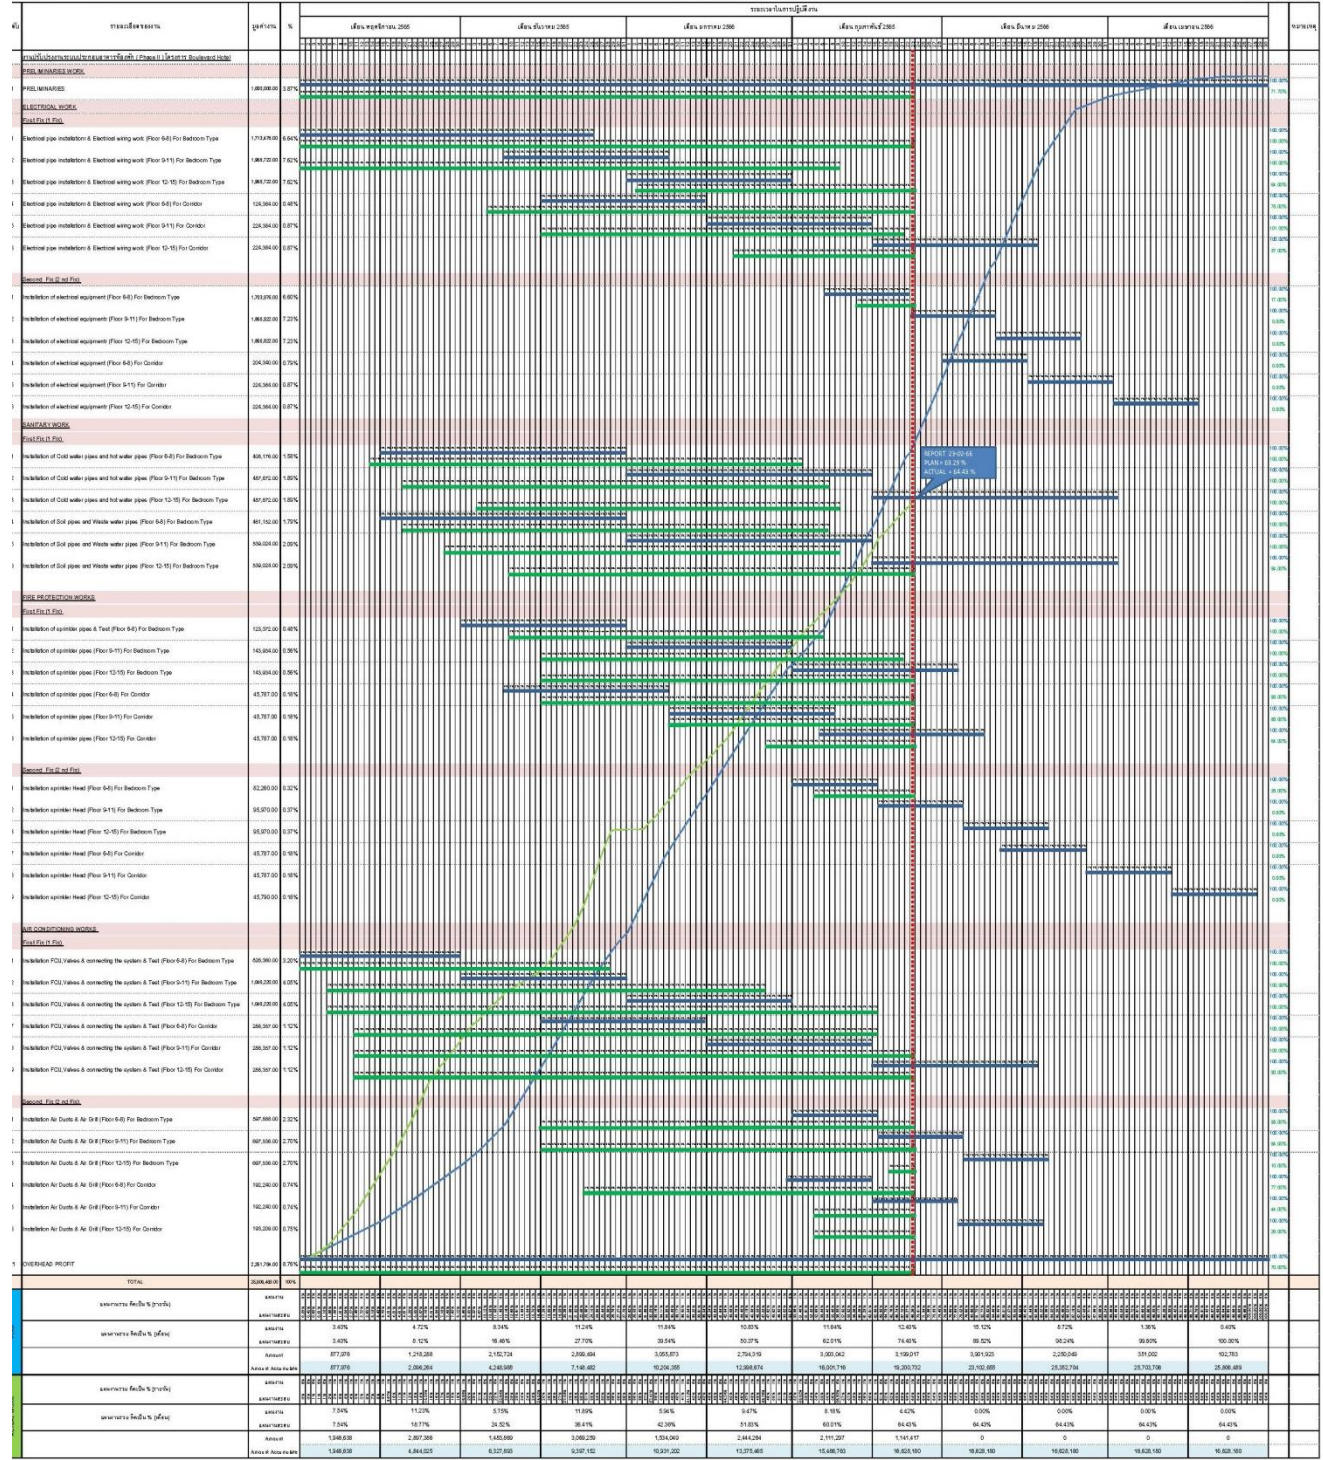

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (26-01-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
69.29%		64.43%	- 4.86 % ล่าช้า 8 วัน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกุมภาพันธ์ 2566																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Project Manager	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1						
2	Sanitation Engineer	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-						
3	Electrical Engineer	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	-	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2						
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1						
5	Safety	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1						
6	Sanitary Foreman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-						
7	Electrical Foreman	2	2	2	2	-	1	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2						
8	Air Foreman	1	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1						
9	Site Admin	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1						
10	Electricians	38	39	37	35	14	34	37	35	33	42	42	4	42	38	39	33	34	35	-	33	37	37						
11	Plumber	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-						
12	Sprinkler	5	5	5	5	-	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	3	3						
13	Air Conditioner	23	18	11	7	-	13	18	25	15	19	13	-	13	11	11	9	9	4	-	10	11	11						
14	General Technician	4	4	4	4	-	3	4	3	3	3	3	-	3	4	4	3	3	3	-	4	3	3						
15	Store	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	2	2						
	รวม	88	82	73	69	22	73	83	86	73	88	81	16	82	77	78	65	66	62	12	69	65	65	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ

 วันอาทิตย์

 วันหยุดนักขัตฤกษ์
