



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT


**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

24 Aug 2023

## แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II



# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

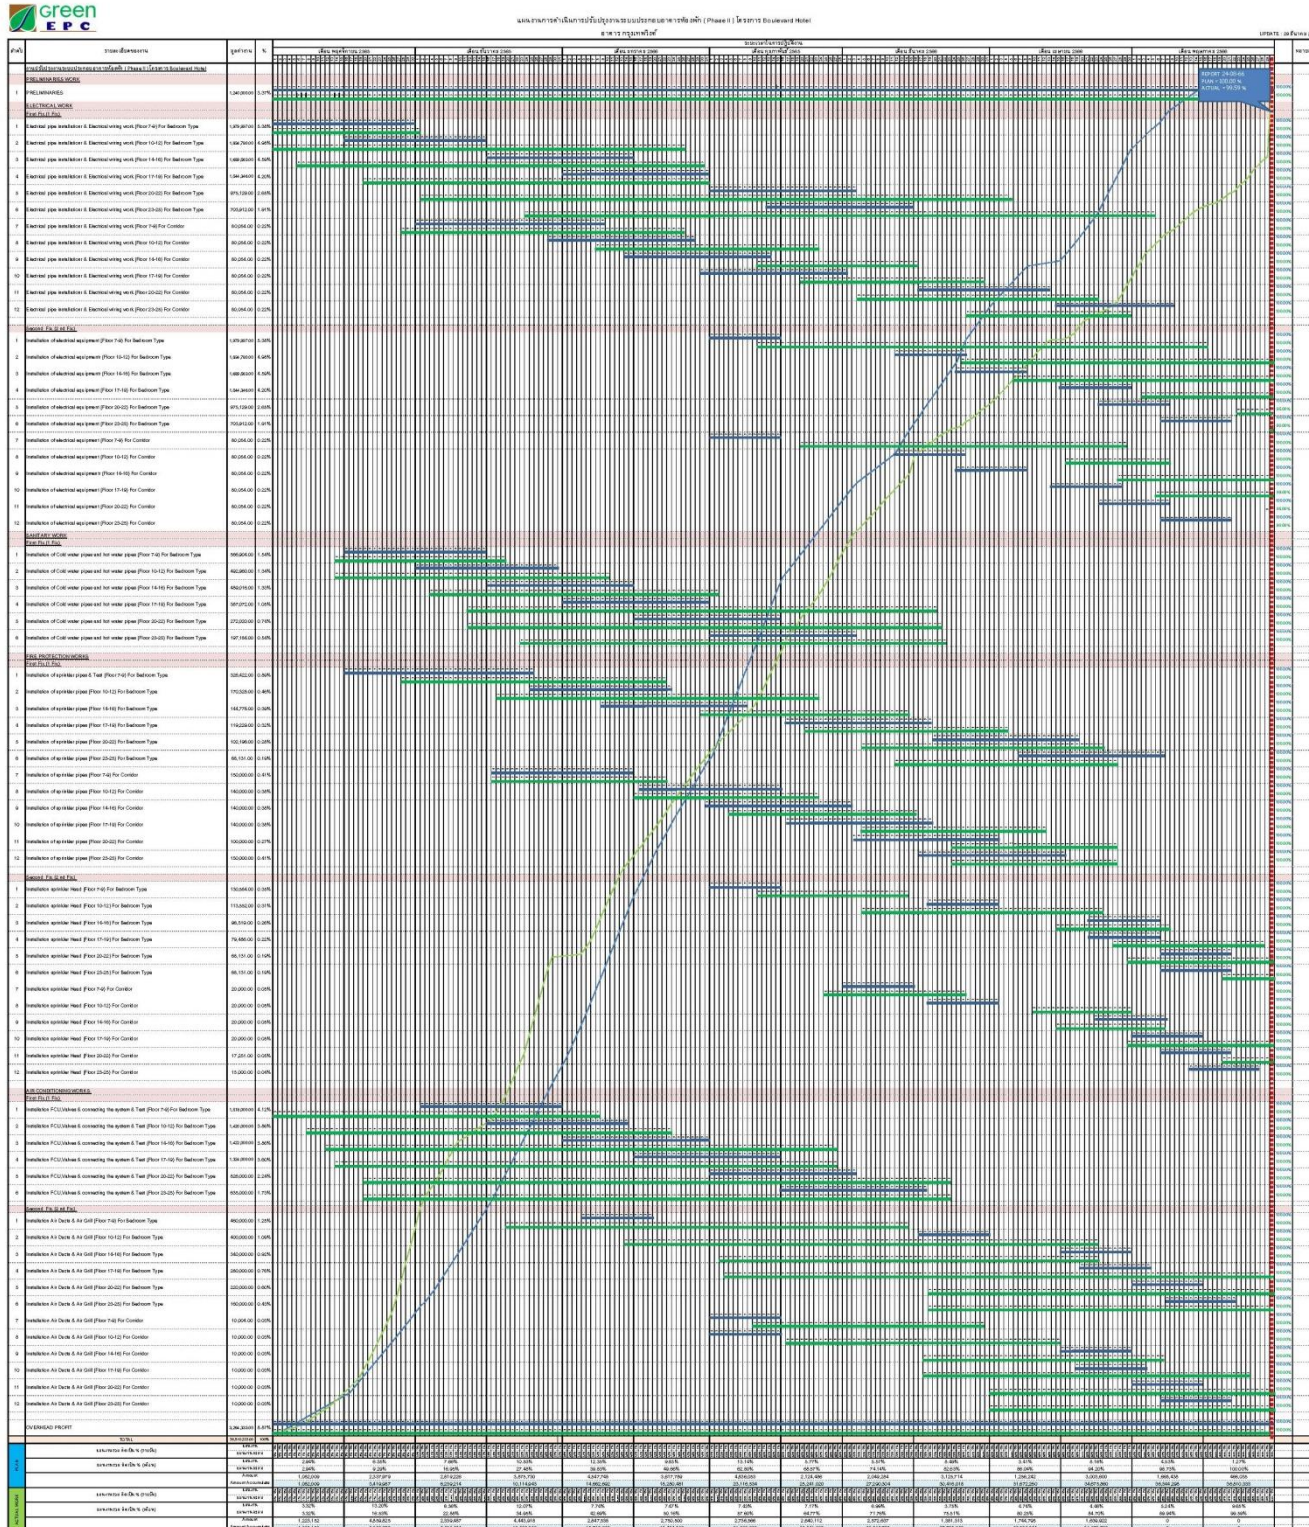

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (24-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.59%	- % ล่าช้า 98 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน




# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) | โครงการ Boulevard Hotel  
อาคาร สยามวิเศษ

UPDATE : 25 สิงหาคม 2566

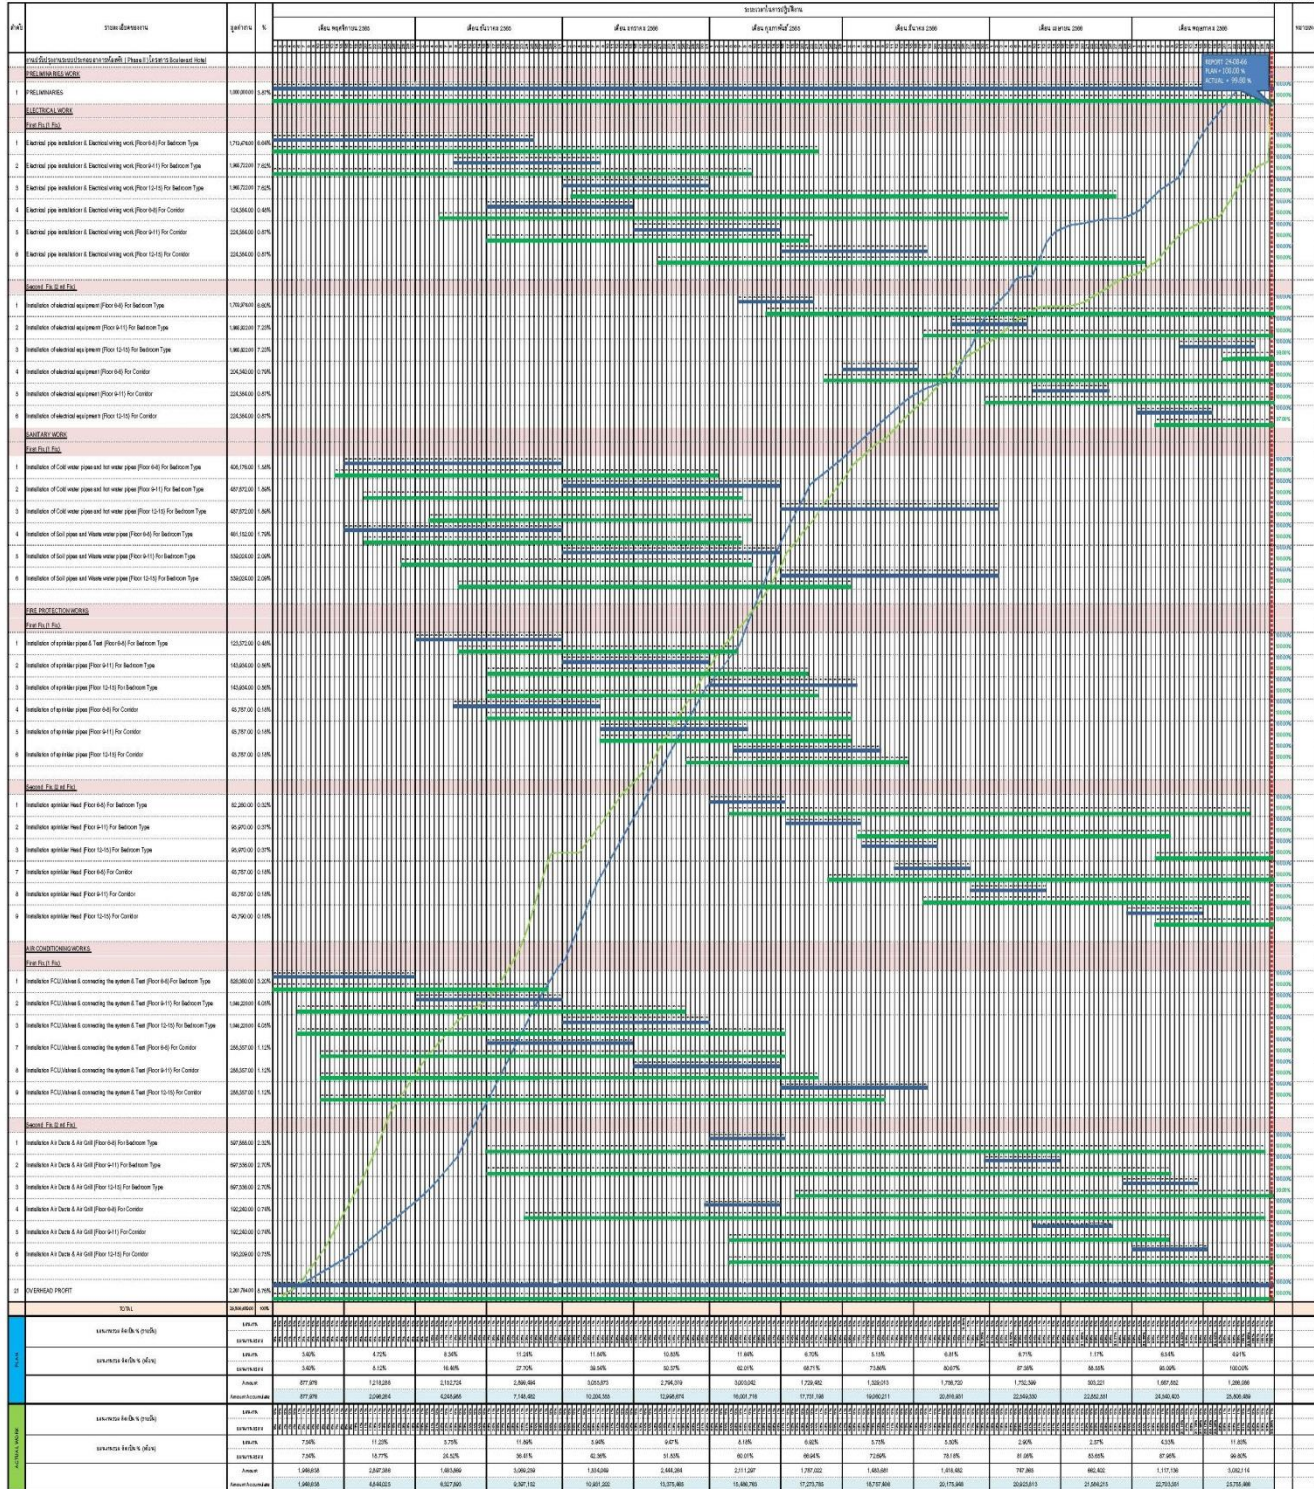

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (24-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.80%	- % ล่าช้า 98 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน


**MAN POWER**





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้ง Alarm Bell อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16-23

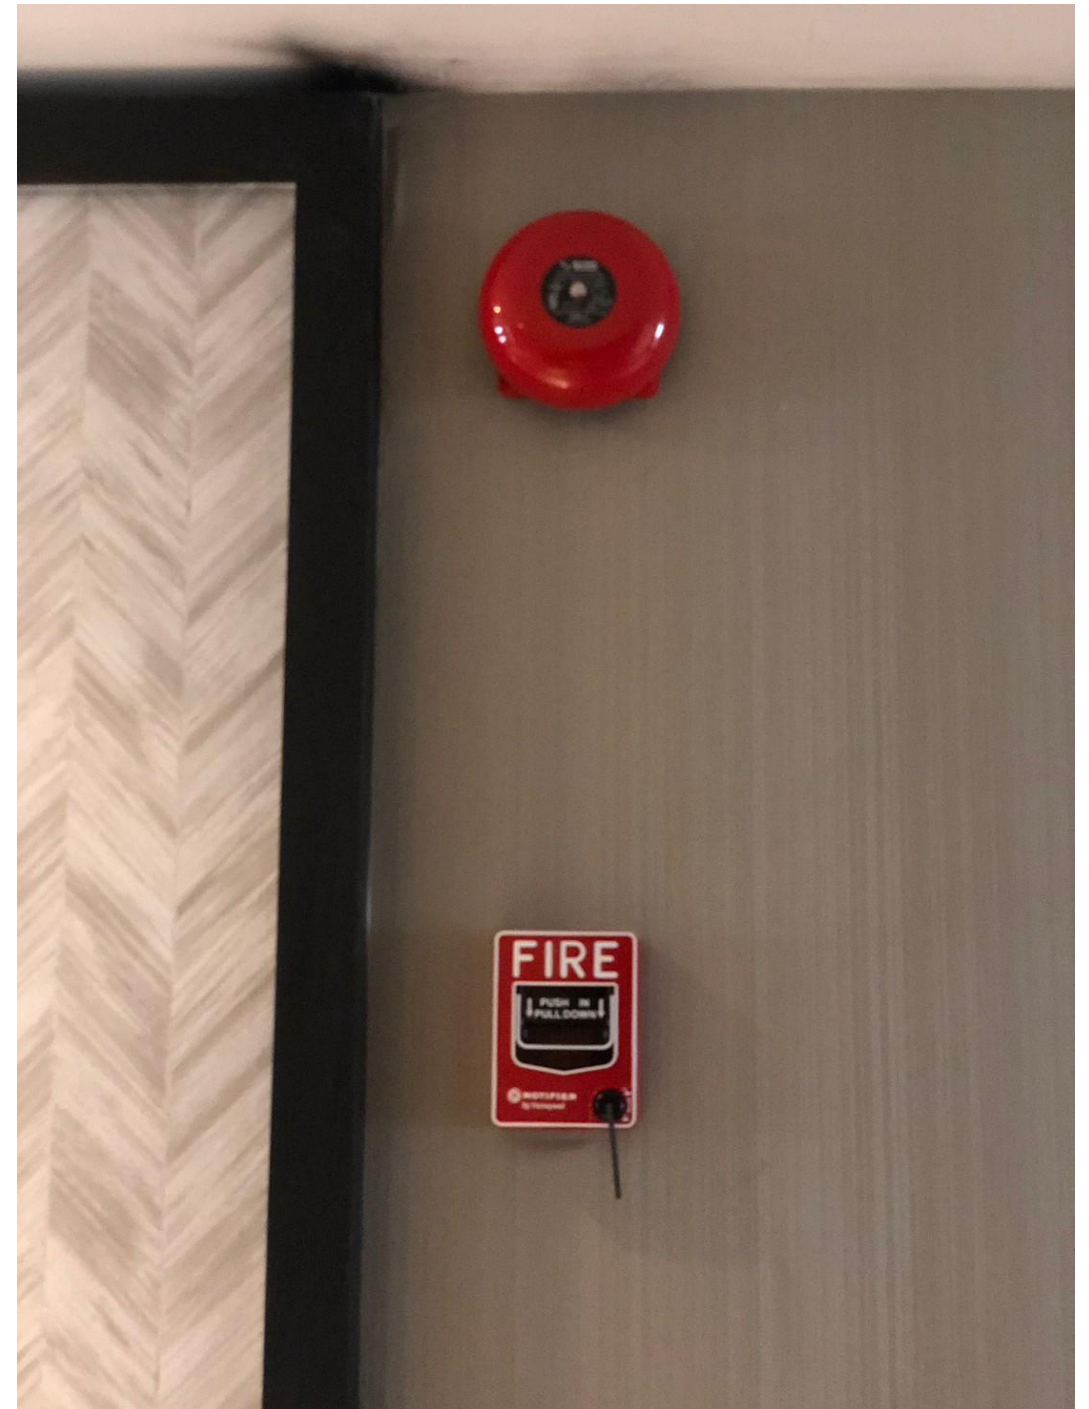



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้ง Alarm Bell อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 16-25

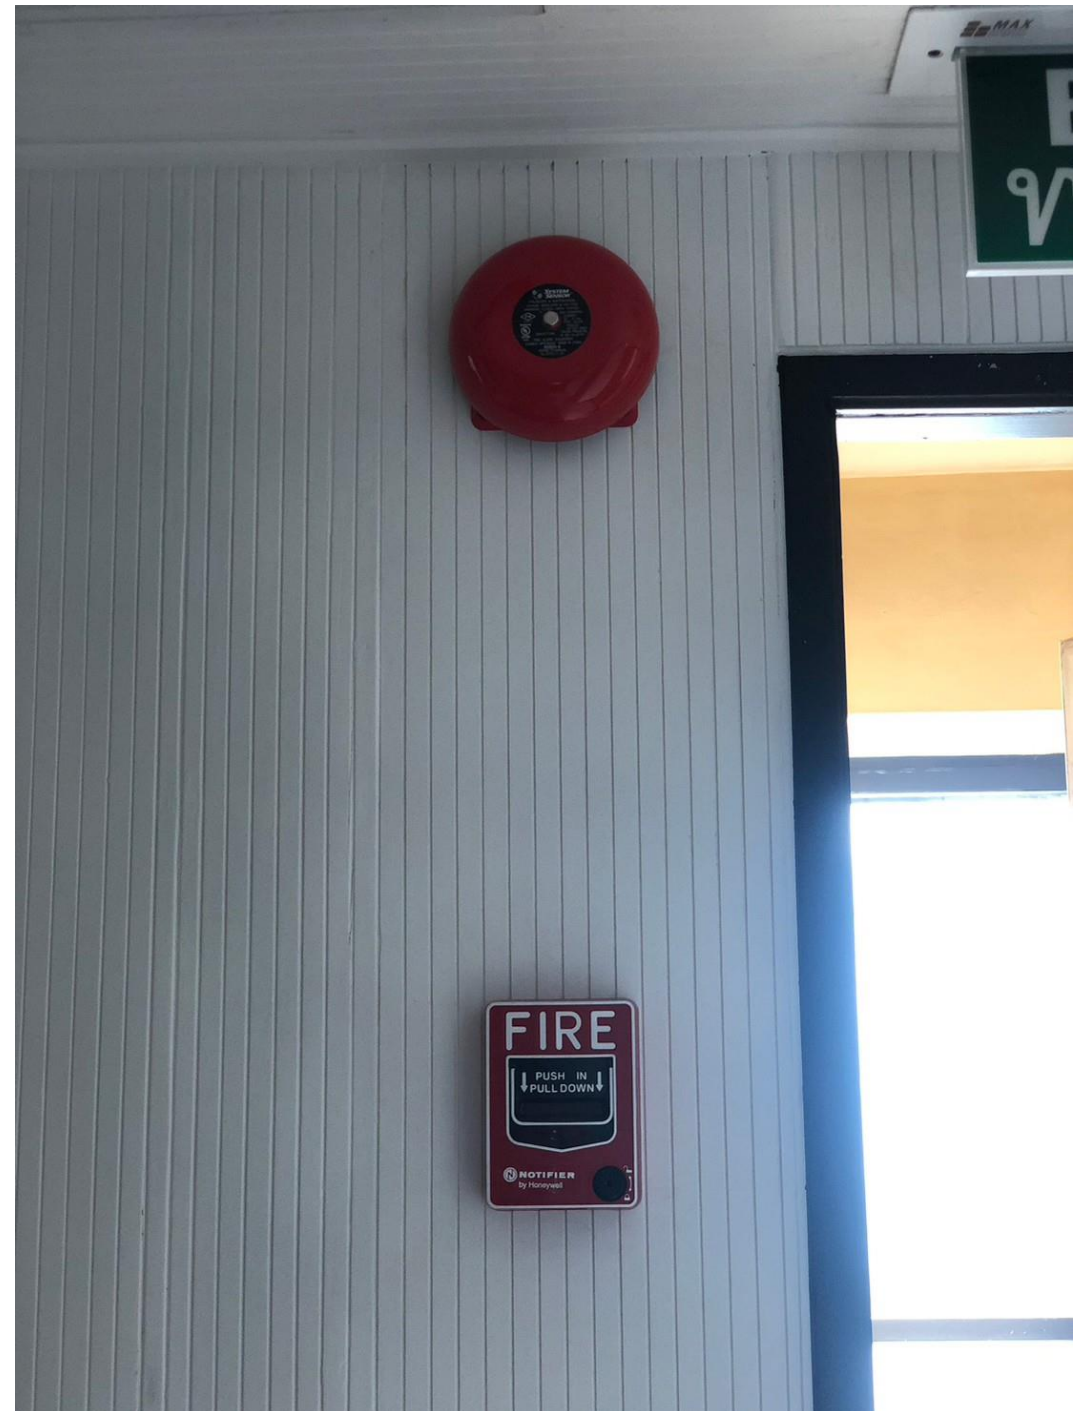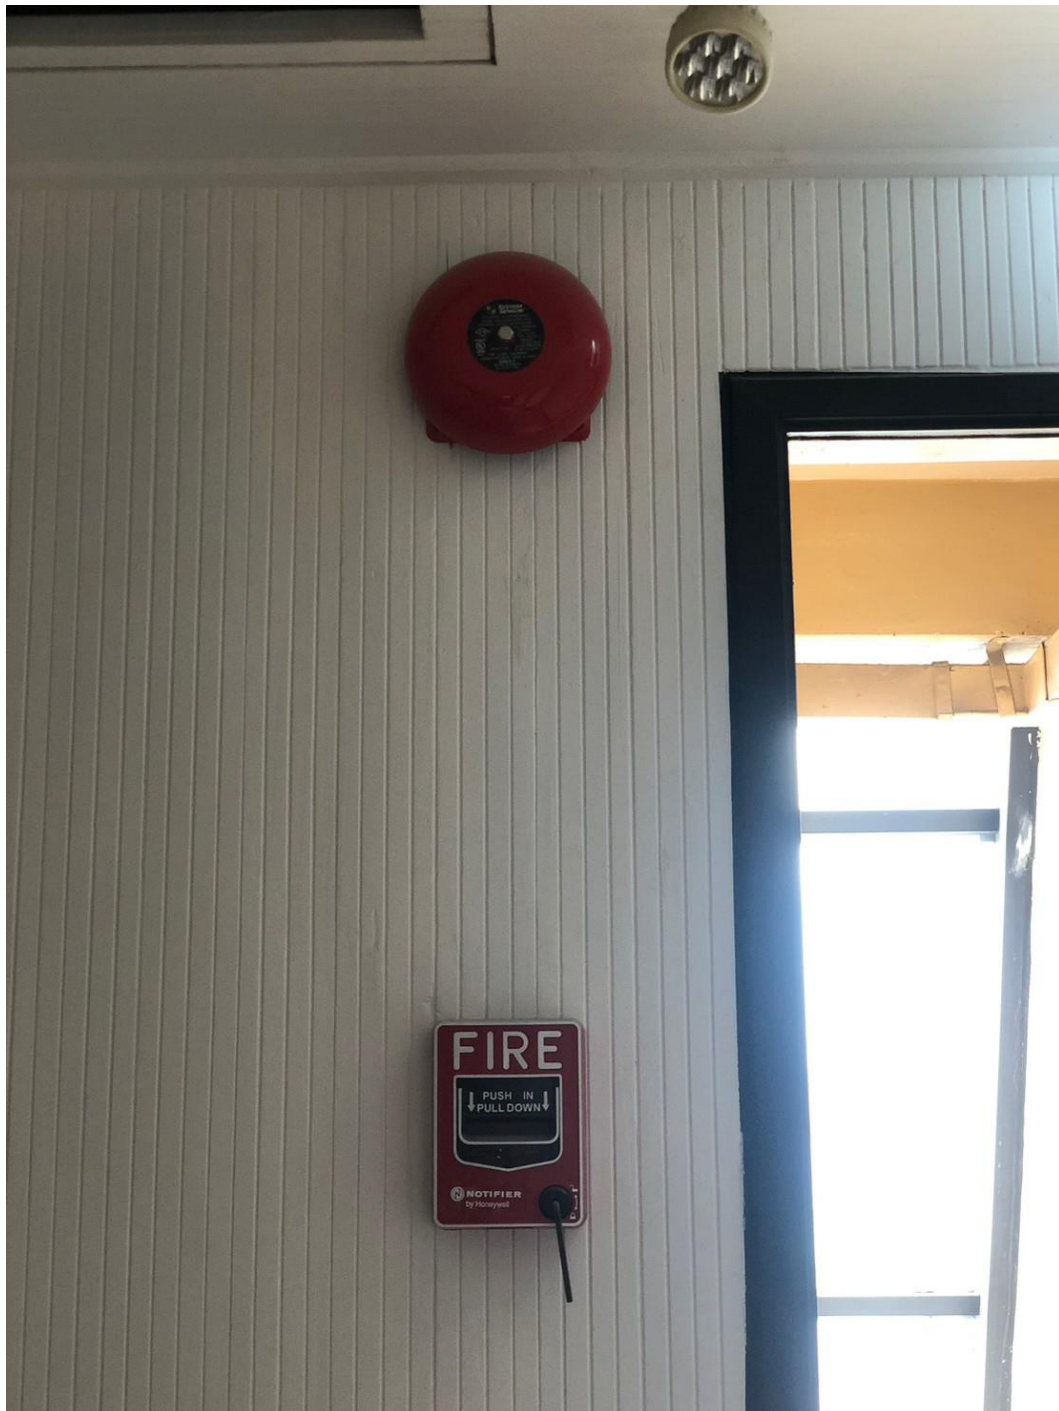



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17-18

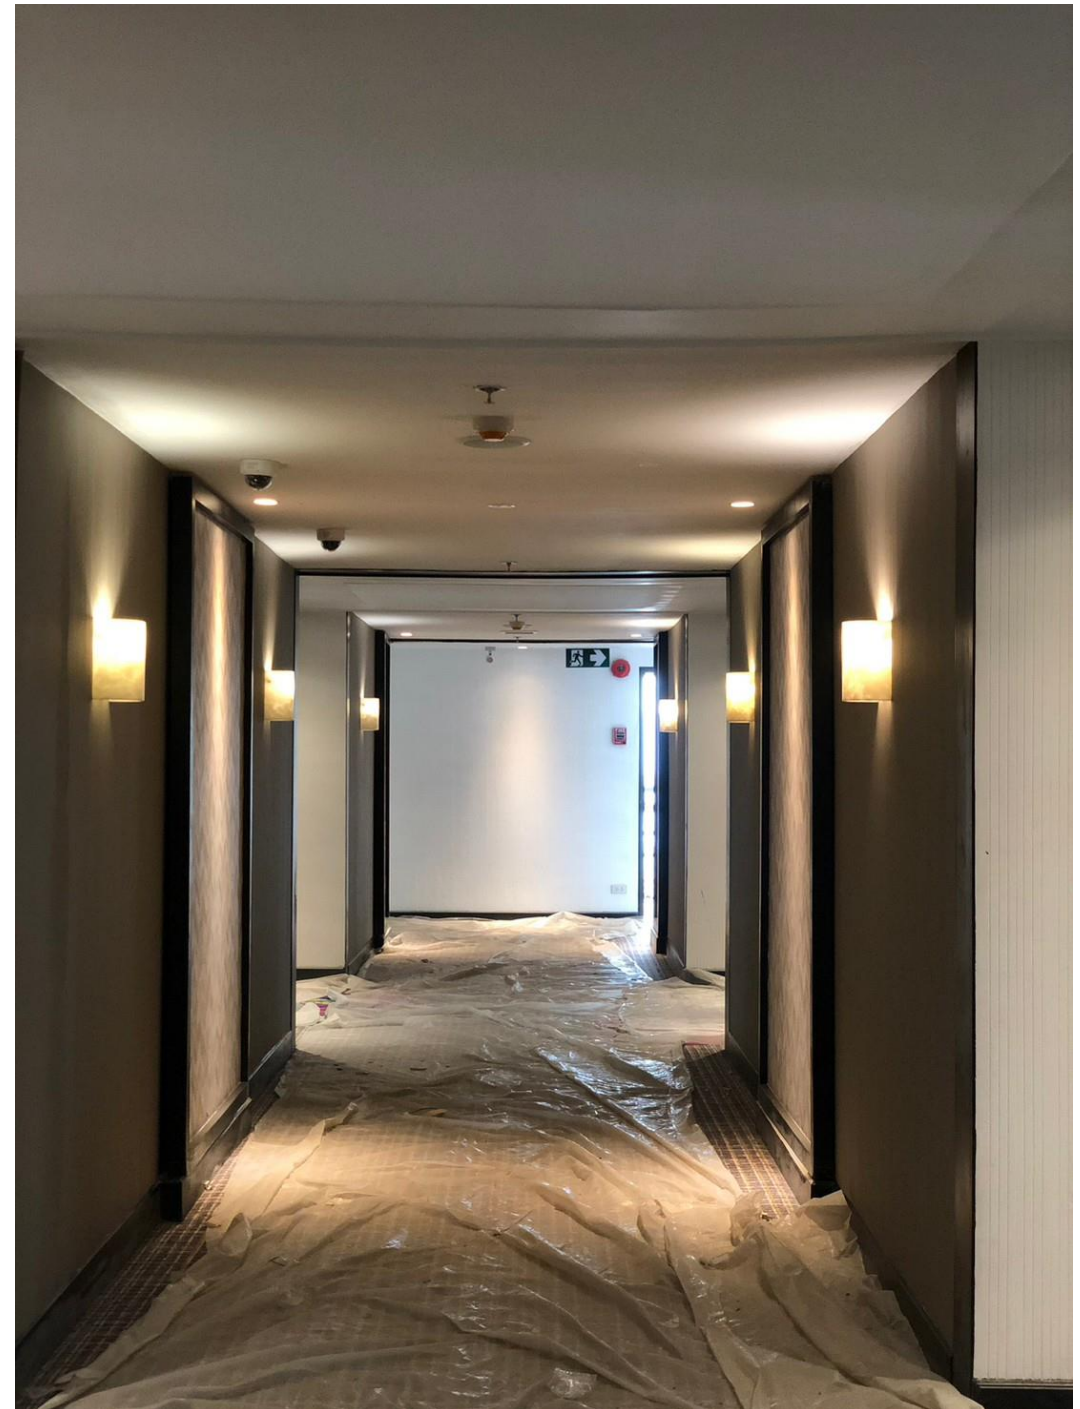



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกึ่ง บริเวณ Corridor  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17-18





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 17-18

