



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

25 May 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

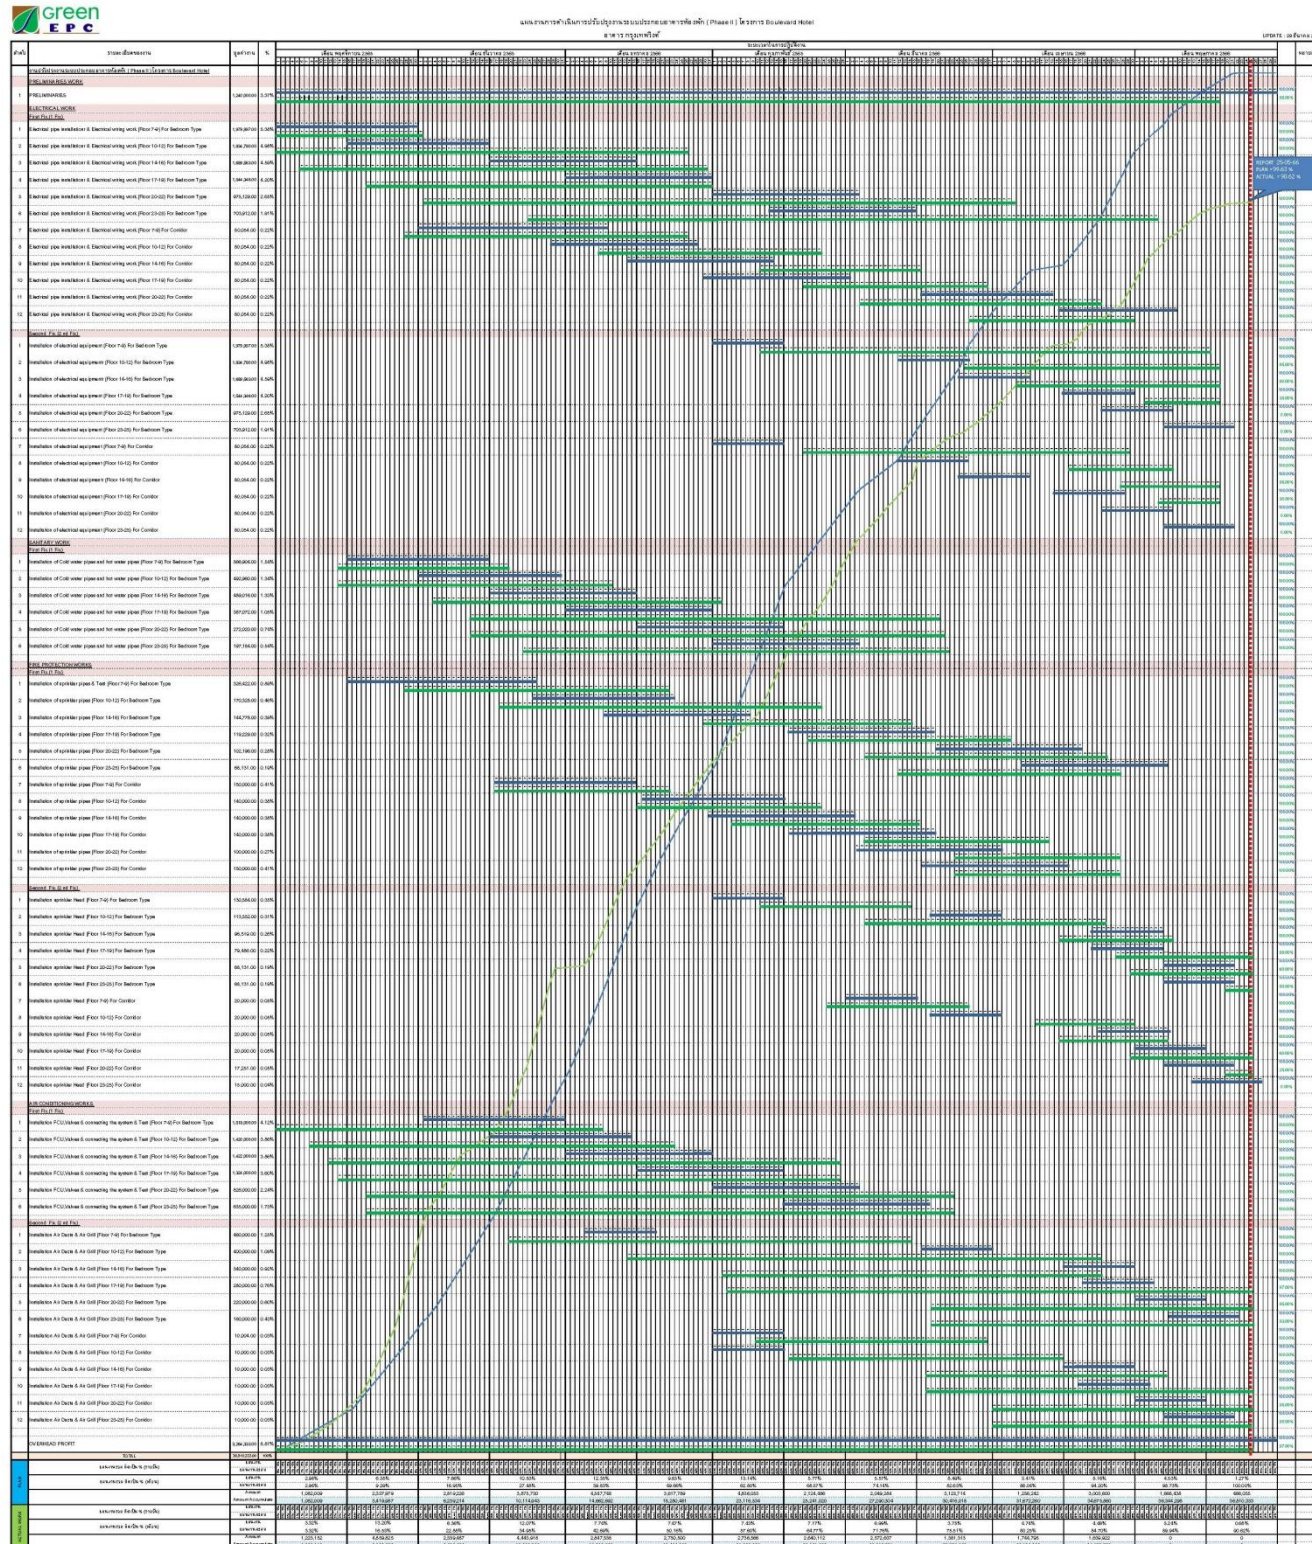

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (25-05-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
99.63%	90.62%	-9.01 %	ล่าช้า 18 วัน


แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ บ้านเอมวานิช หนอง

อาคาร สยามวิเศษ

วันที่: 25/05/2024

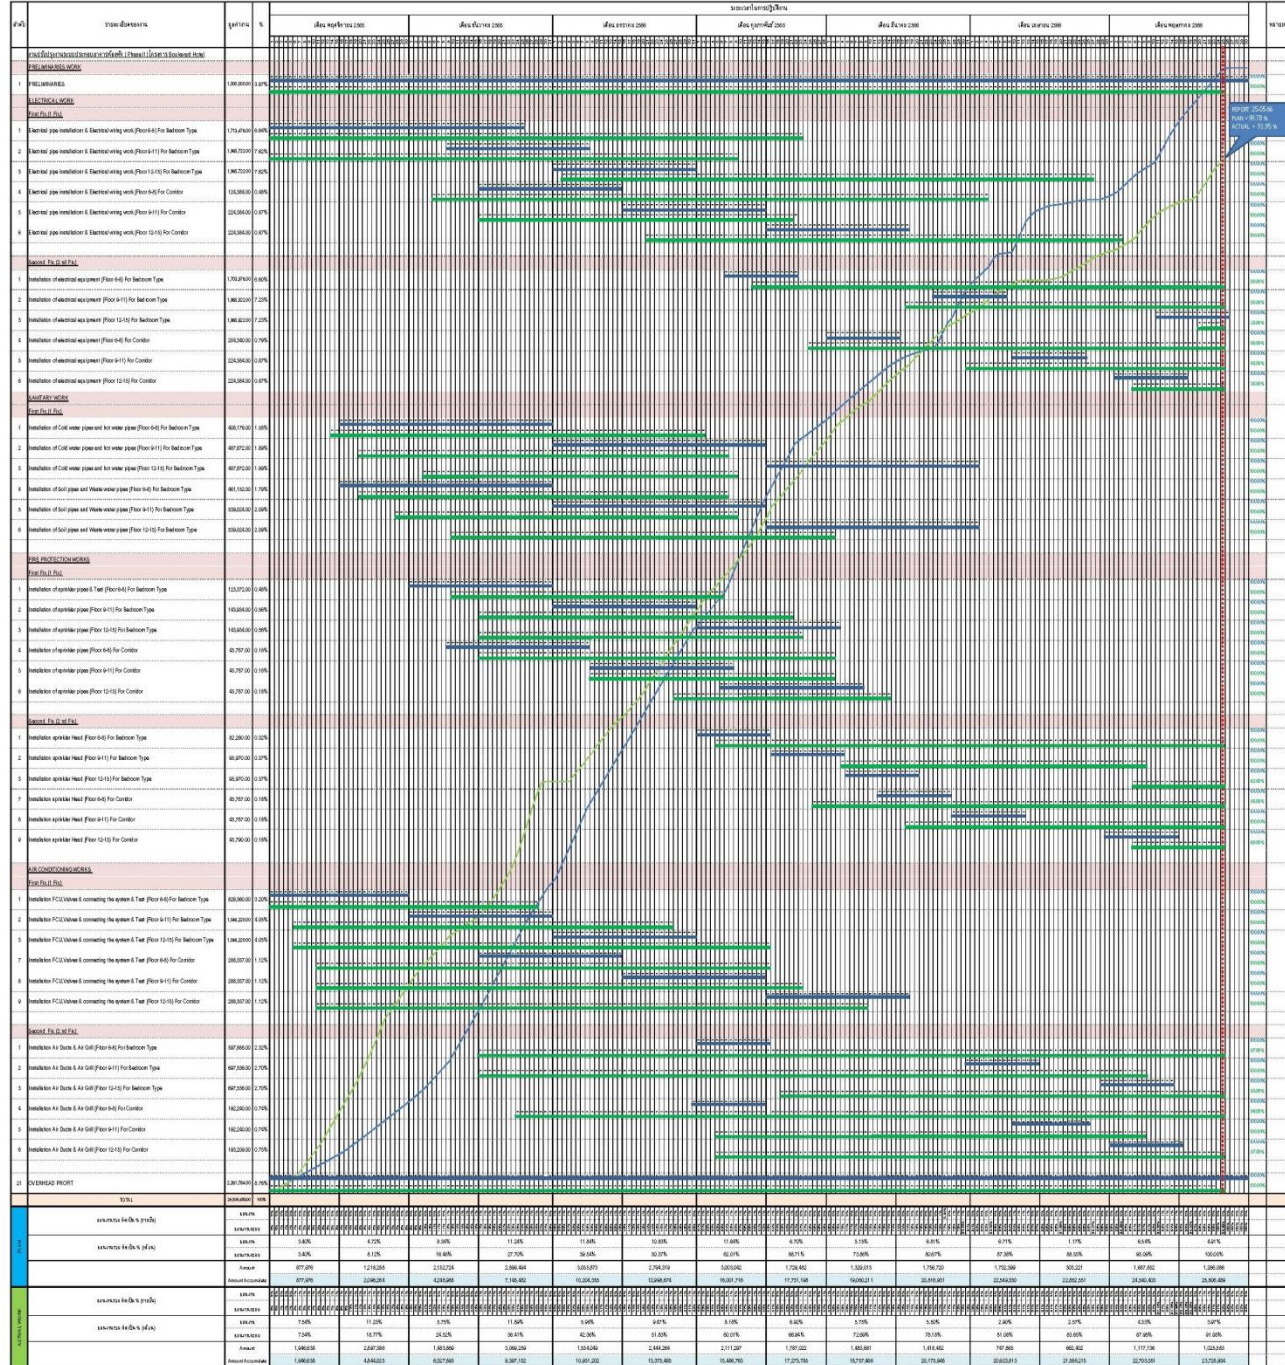

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (25-05-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
99.78%		91.95%	- 7.83 % ล่าช้า 16 วัน

MAN POWER


ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนพฤษภาคม 2566																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Project Manager		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Architecture Engineer		2	1	1	2	1	-	1	1	3	2	1	2	1	3	2	3	2	2	3	-	3	3	1								
3	Electrical Engineer		1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Air Conditioning Engineer		1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1							
5	Safety		1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1								
6	Sanitary Foreman		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Electrical Foreman		2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2							
8	Air Foreman		-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-							
9	Site Admin		1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1								
10	Electricians		22	26	20	22	6	3	18	17	17	13	20	17	-	19	21	19	15	19	19	-	15	20	20								
11	Plumber		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
12	Sprinkler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Air Conditioner		-	-	-	7	-	-	-	-	3	3	11	11	-	3	10	10	6	-	-	-	7	-	-								
14	General Technician		4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	4	4	-	4	8	4								
15	Store		3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	2	-	-	2	3	3	3	3	1	3	3	3								
16	Tiler		11	11	11	11	16	14	15	12	12	13	11	14	12	12	13	14	13	13	14	9	11	11	11								
17	Skim Coat		2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	-	-	2	2	2	2	2	-	-	3	3	3								
	รวม	0	57	61	53	65	46	35	53	49	55	51	65	53	14	47	64	74	59	56	56	19	61	62	56	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ



วันอาทิตย์



วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-20



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งคอมไฟ, Smoke Detector, ลำโพง และป้าย Exit Sign
บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-20



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานเข้าสายตู้โหนดประจำชั้นบริเวณหน้าลิฟต์ Service
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14-22



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-16




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 7-16



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟบริเวณทางเดิน
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 12

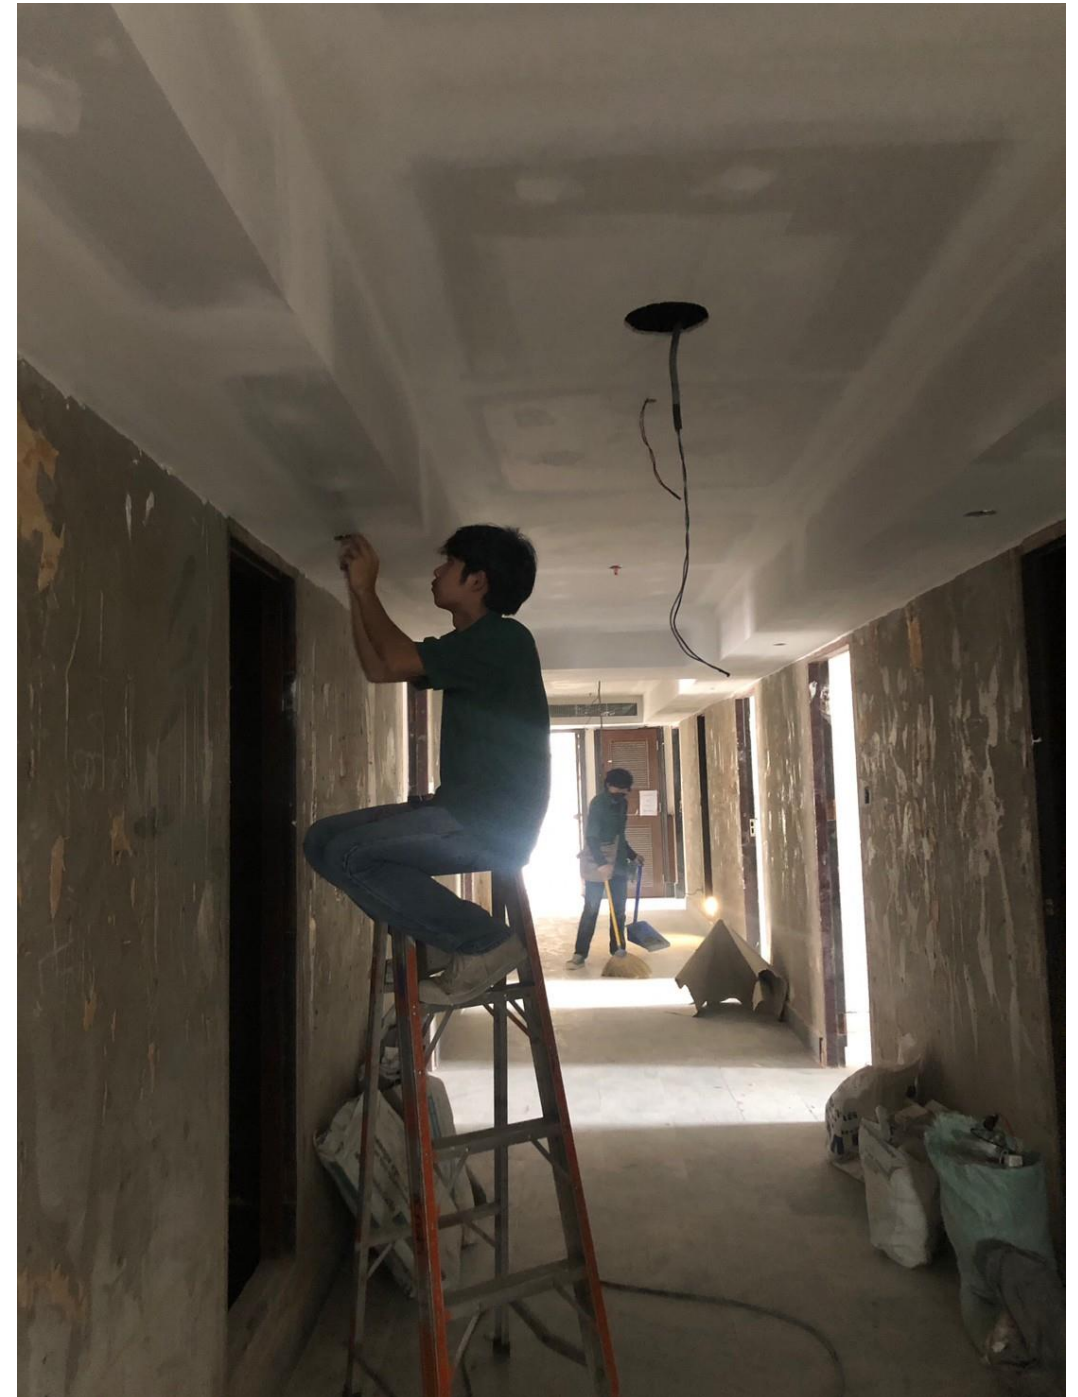

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานขัดหน้าหินบริเวณห้องพักและทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานขัดน้ำหินบริเวณห้องพักและทางเดิน อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7

