



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

26 Oct 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

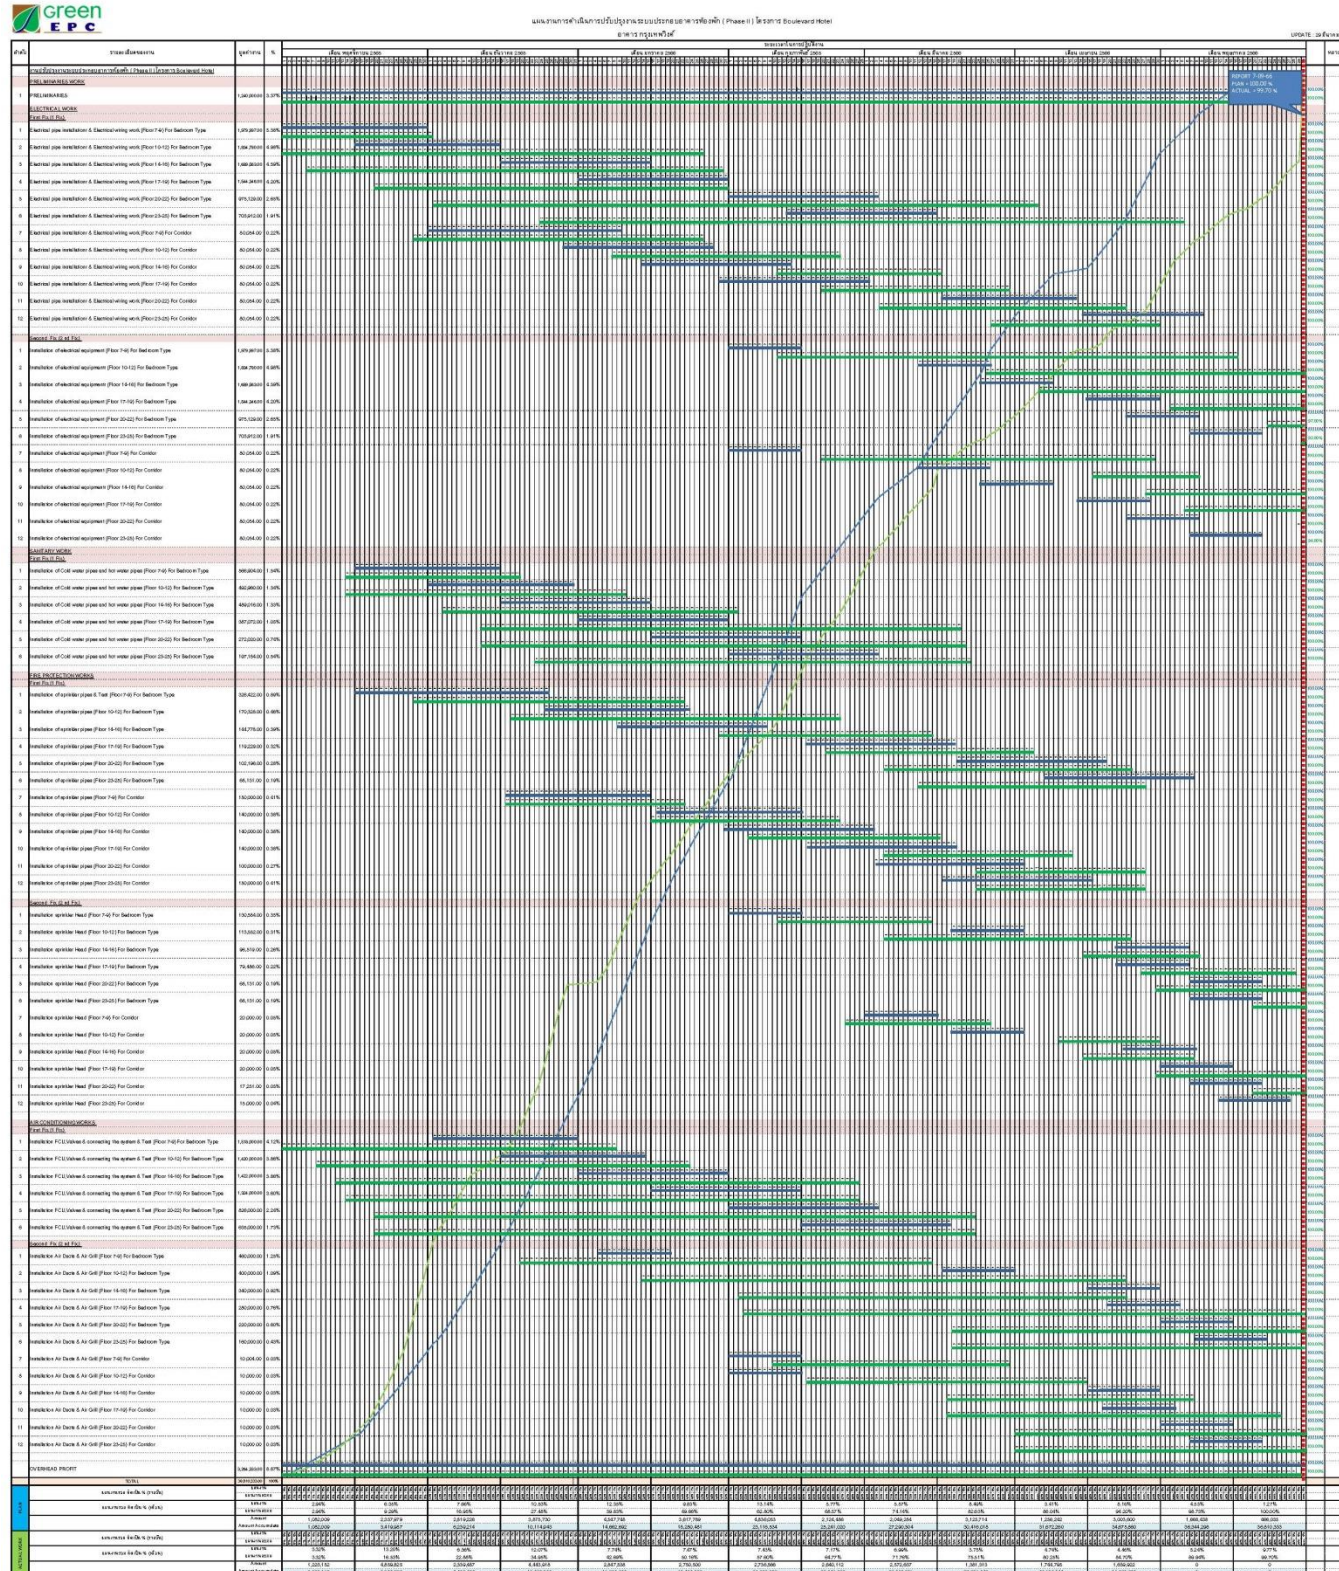

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (26-10-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	100.00%	100.00%	- % ล่าช้า 161 วัน


หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel
อาคารสยามวิเศษ

UPD: 16 Nov 2016

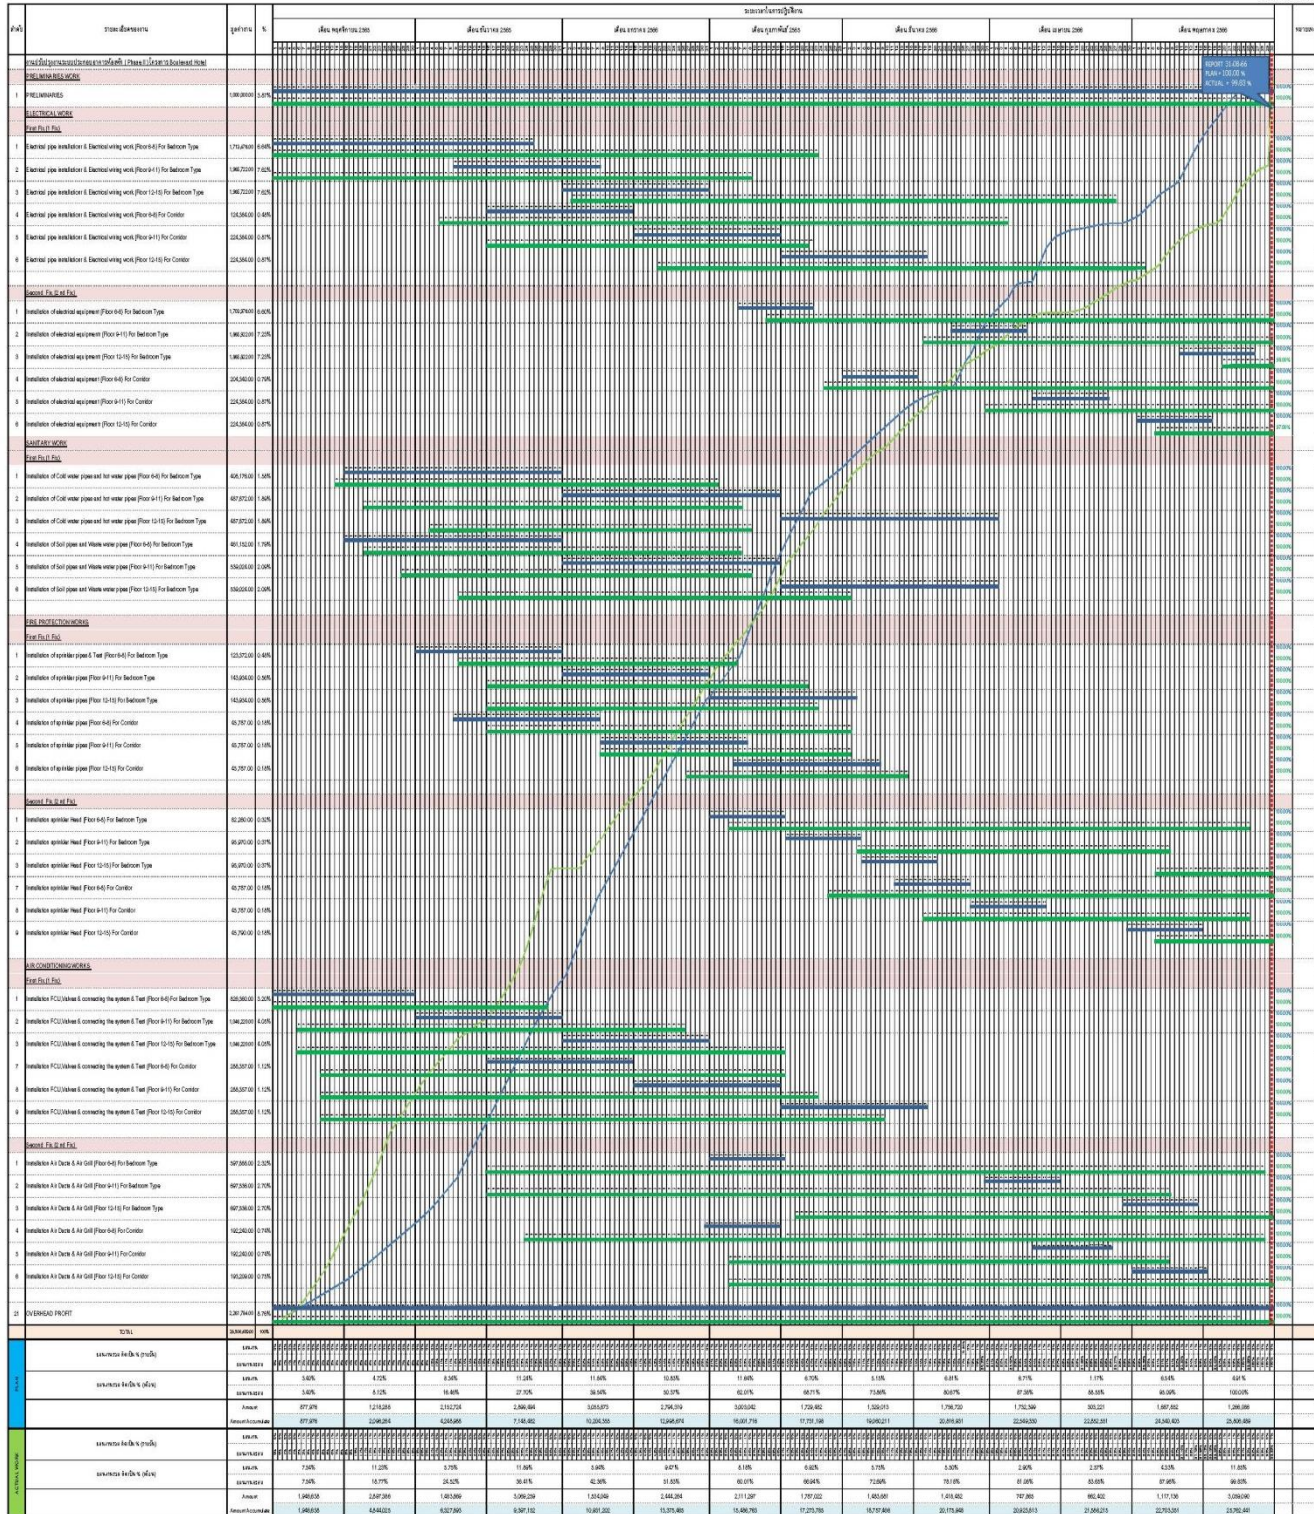

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (26-10-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
			- %
	100.00%	100.00%	ล่าช้า 161 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเดือนตุลาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนตุลาคม 2566																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Project Manager	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-									
2	Architecture Engineer	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-								
3	Electrical Engineer	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-									
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	Safety	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1								
6	Sanitary Foreman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1								
7	Electrical Foreman	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1									
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-									
9	Site Admin	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1								
10	Electricians	-	7	6	-	7	6	6	-	7	7	4	4	-	7	-	7	7	6	6	2	6	-	-	6	5									
11	Plumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	2									
12	Sprinkler	2	3	3	3	3	3	3	2	2	-	4	4	-	-	-	2	2	2	2	2	4	4	4	4	5									
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-									
14	General Technician	-	-	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4								
15	Store	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2									
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	รวม	3	16	20	10	23	17	14	3	15	16	14	16	0	12	0	17	18	16	17	10	32	5	5	15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ

 วันอาทิตย์

 วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby ชั้น 1




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby ชั้น 1

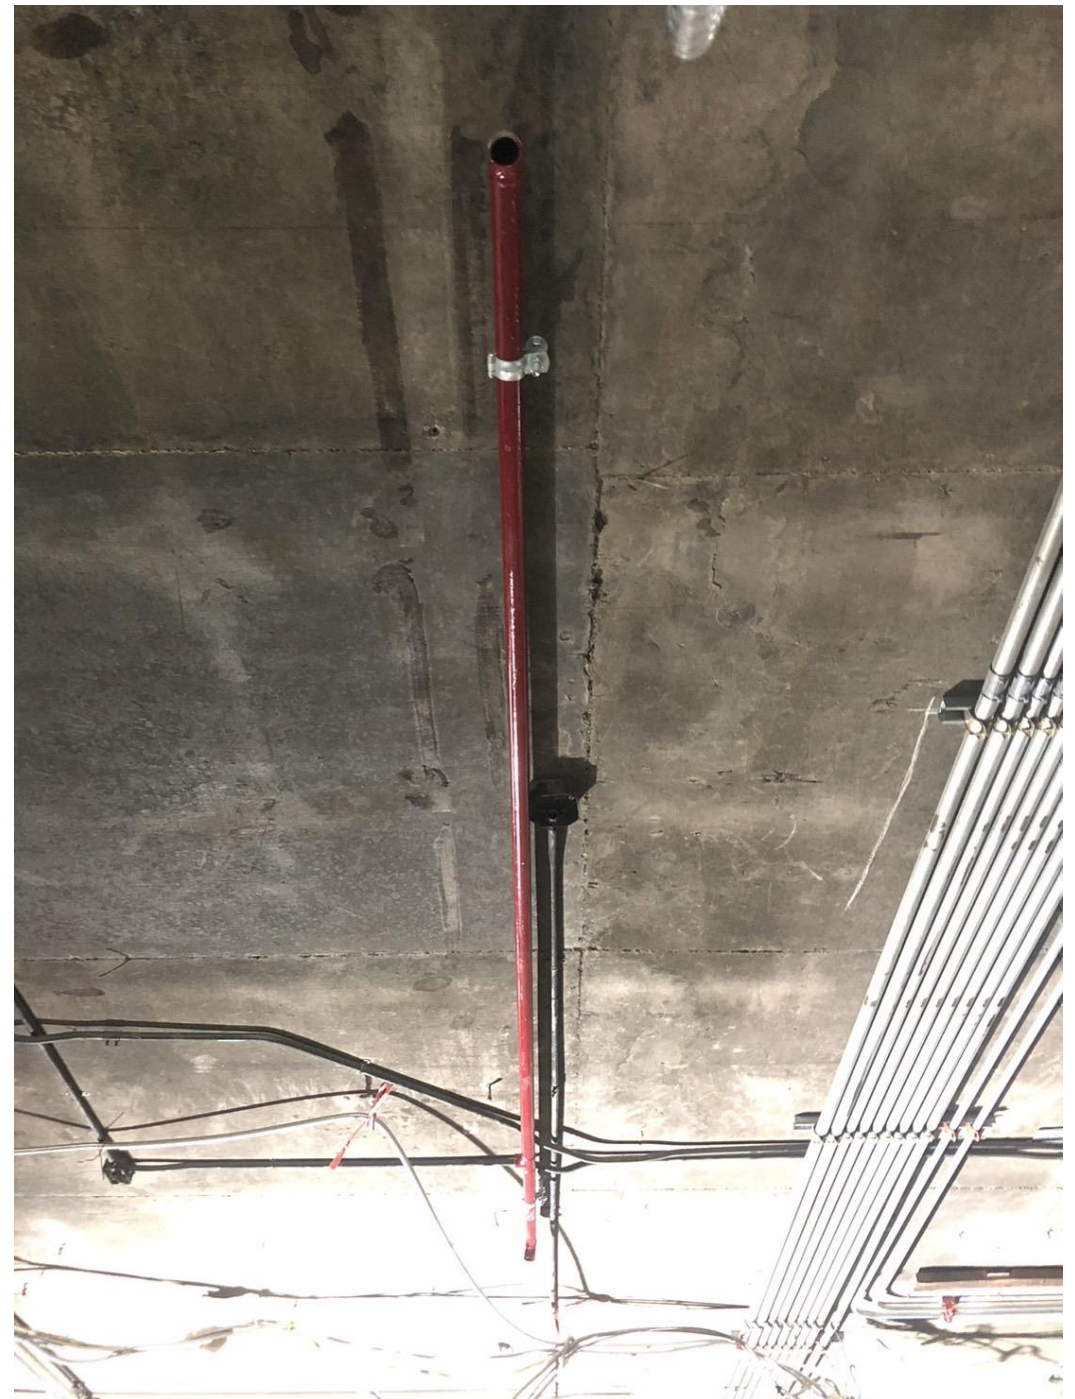

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

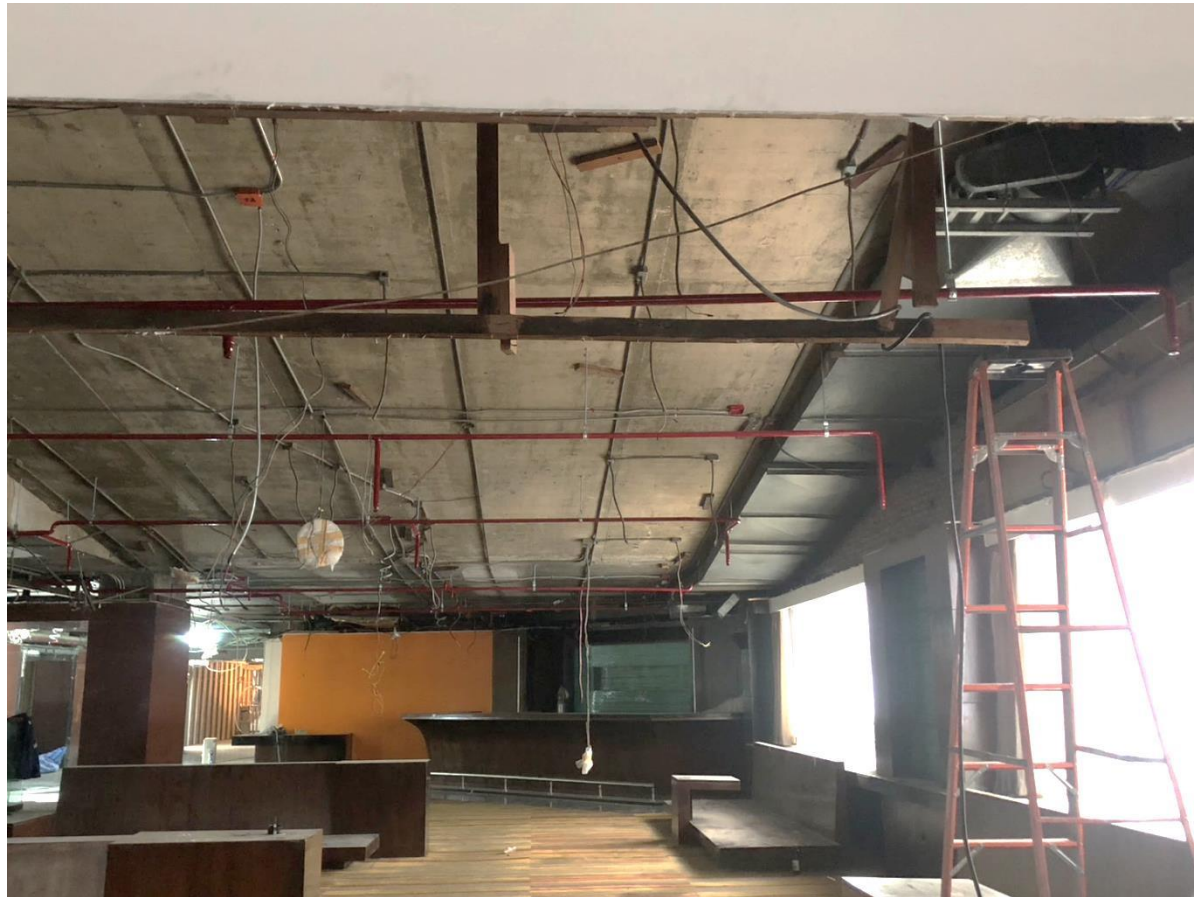


งานติดตั้งท่อสปริงเกอร์บริเวณ Lobby ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานเดินท่อและร้อยสายไฟระบบ Fire Alarm บริเวณ Lobby ชั้น 1

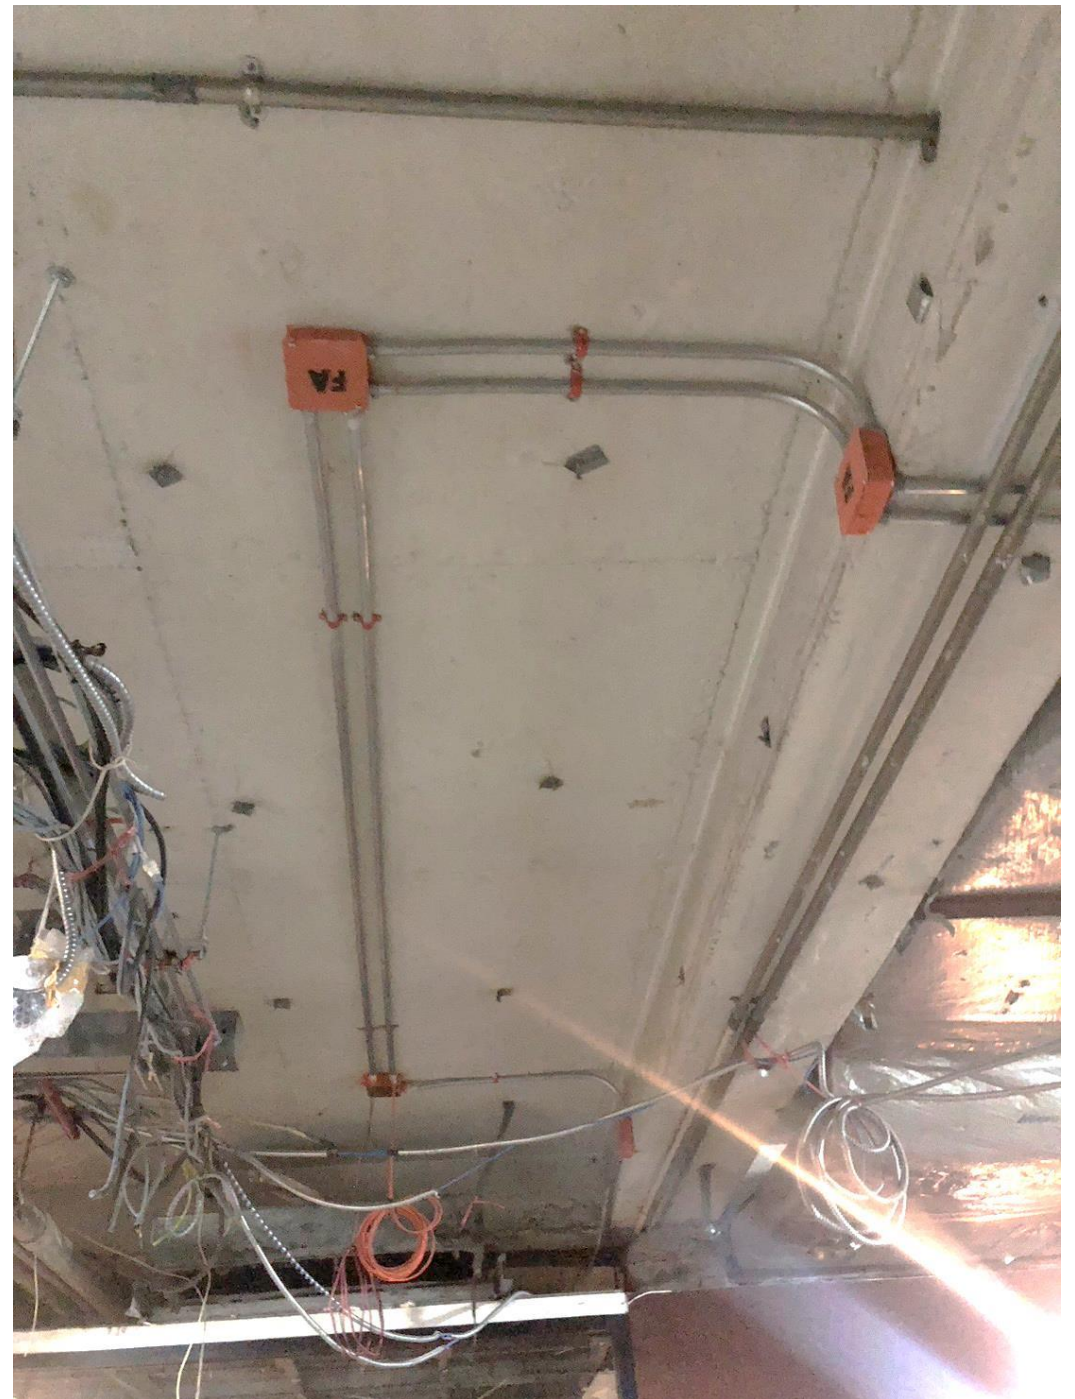

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานเดินท่อไฟระบบแสงสว่างบริเวณ Lobby ชั้น 1

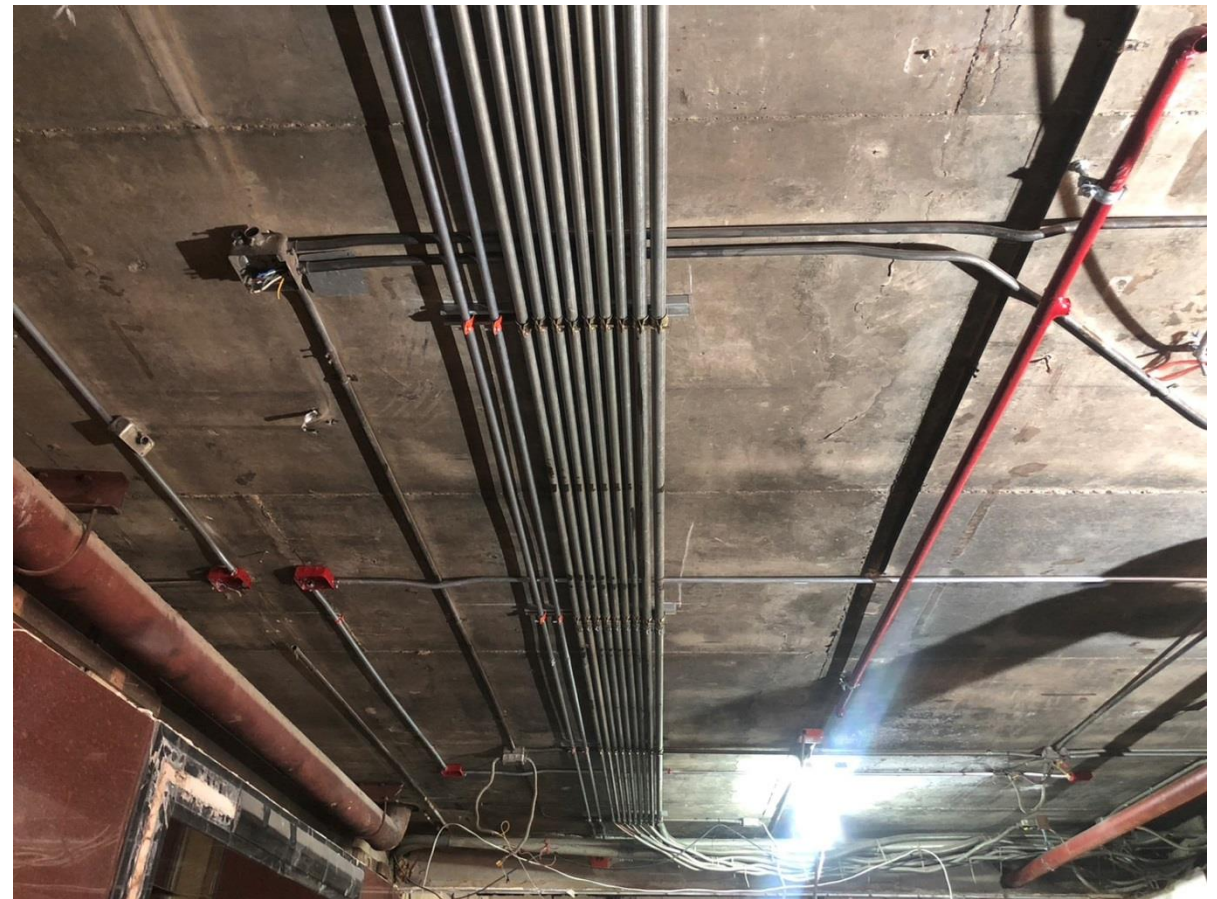

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานเดินท่อไฟระบบแสงสว่างบริเวณ Lobby ชั้น 1

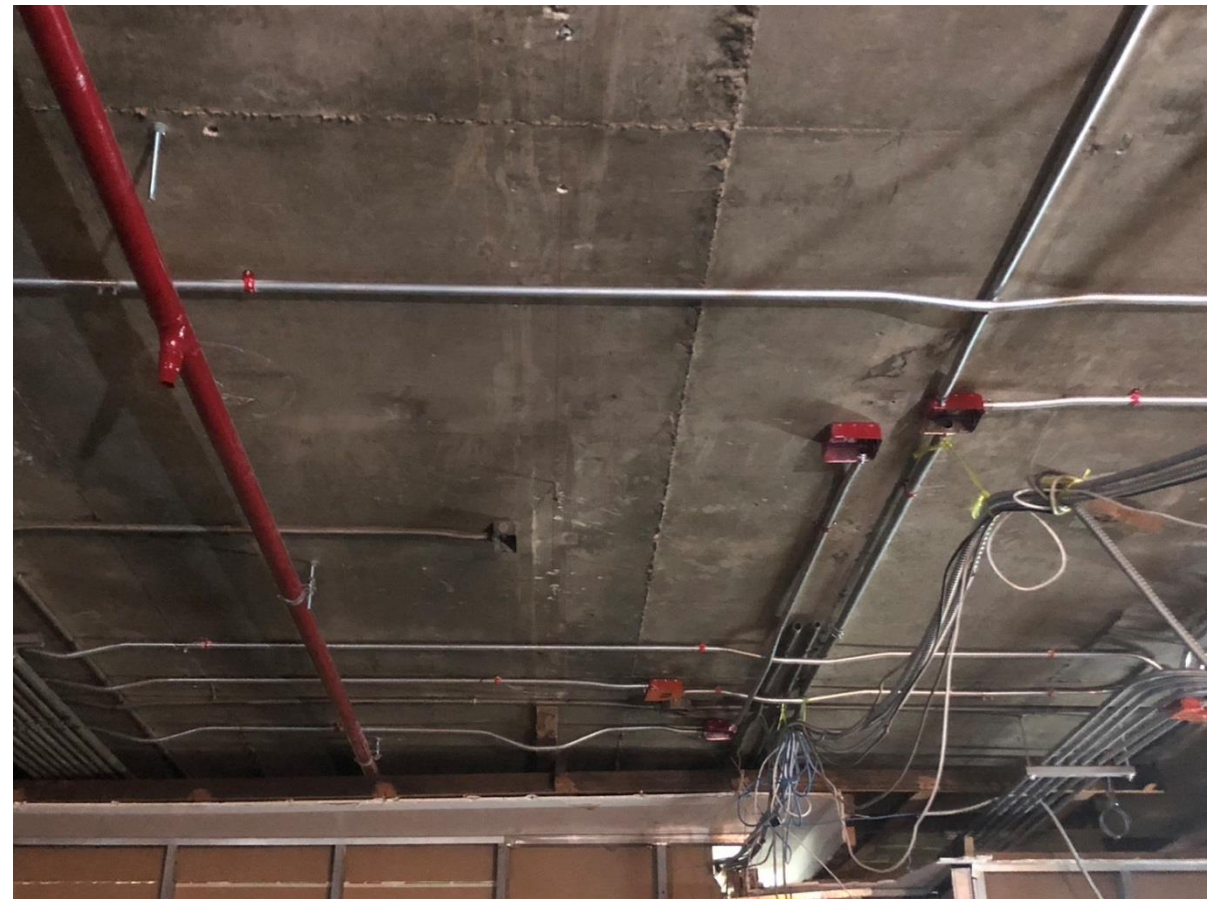

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานรื้อถอนท่อตัดก๊าซของเดิมบริเวณ Lobby ชั้น 1

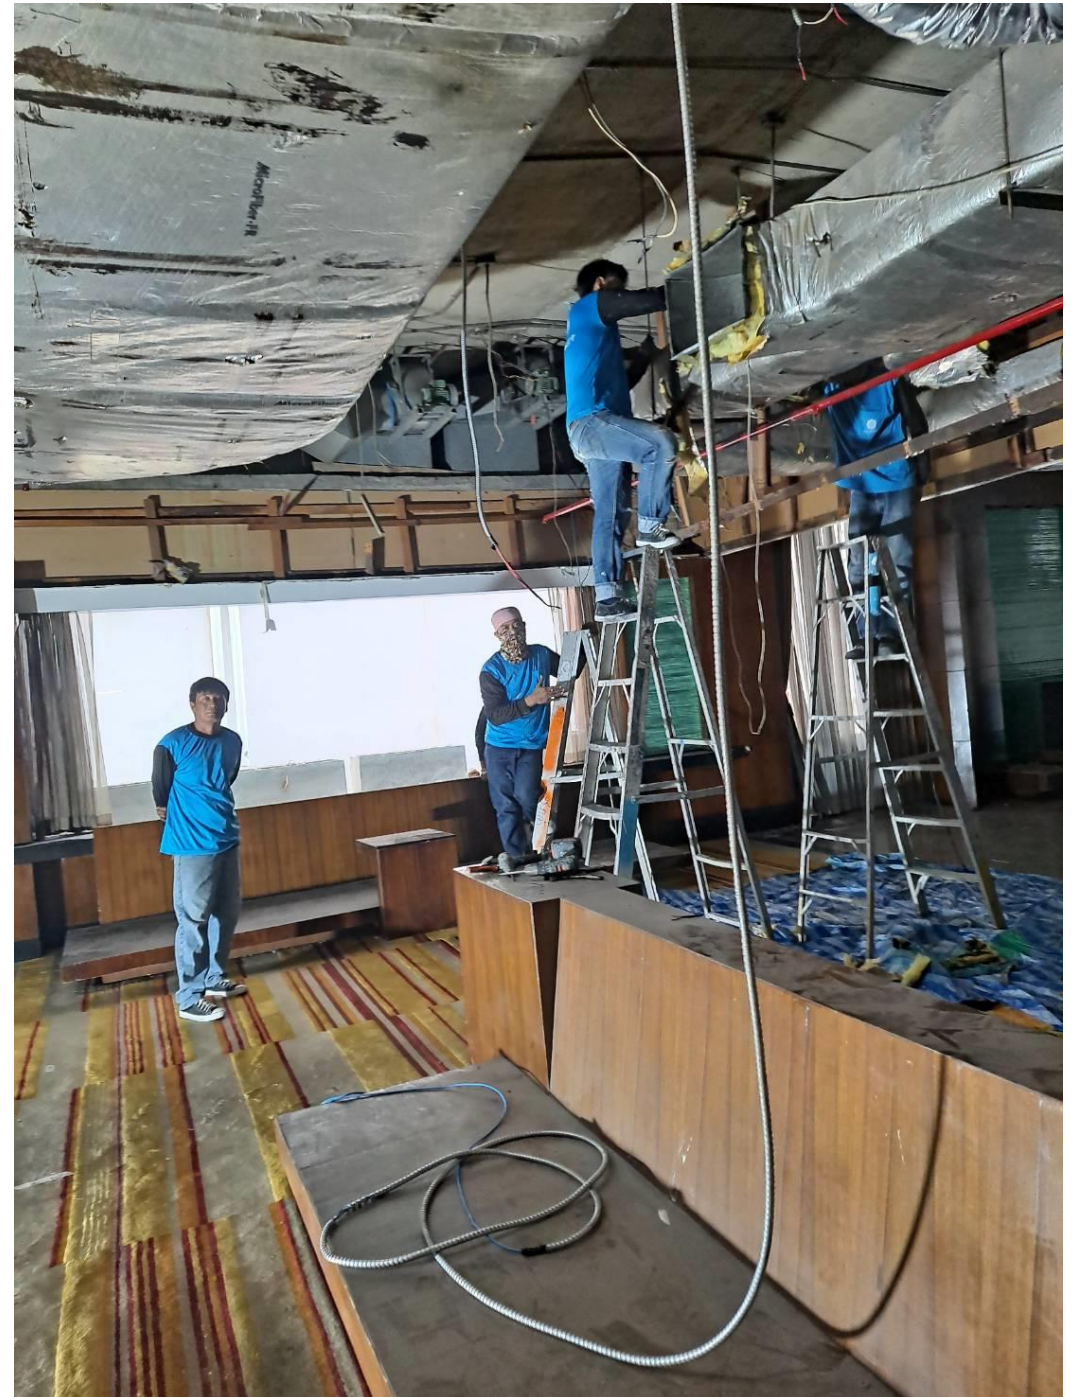

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานรื้อถอนท่อดักน้ำของเดิมบริเวณ Lobby ชั้น 1

