



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



**W**EEKLY

**R**EPORT


**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL  
SUKHUMVIT SOI 5**

27 April 2023

## แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II



# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

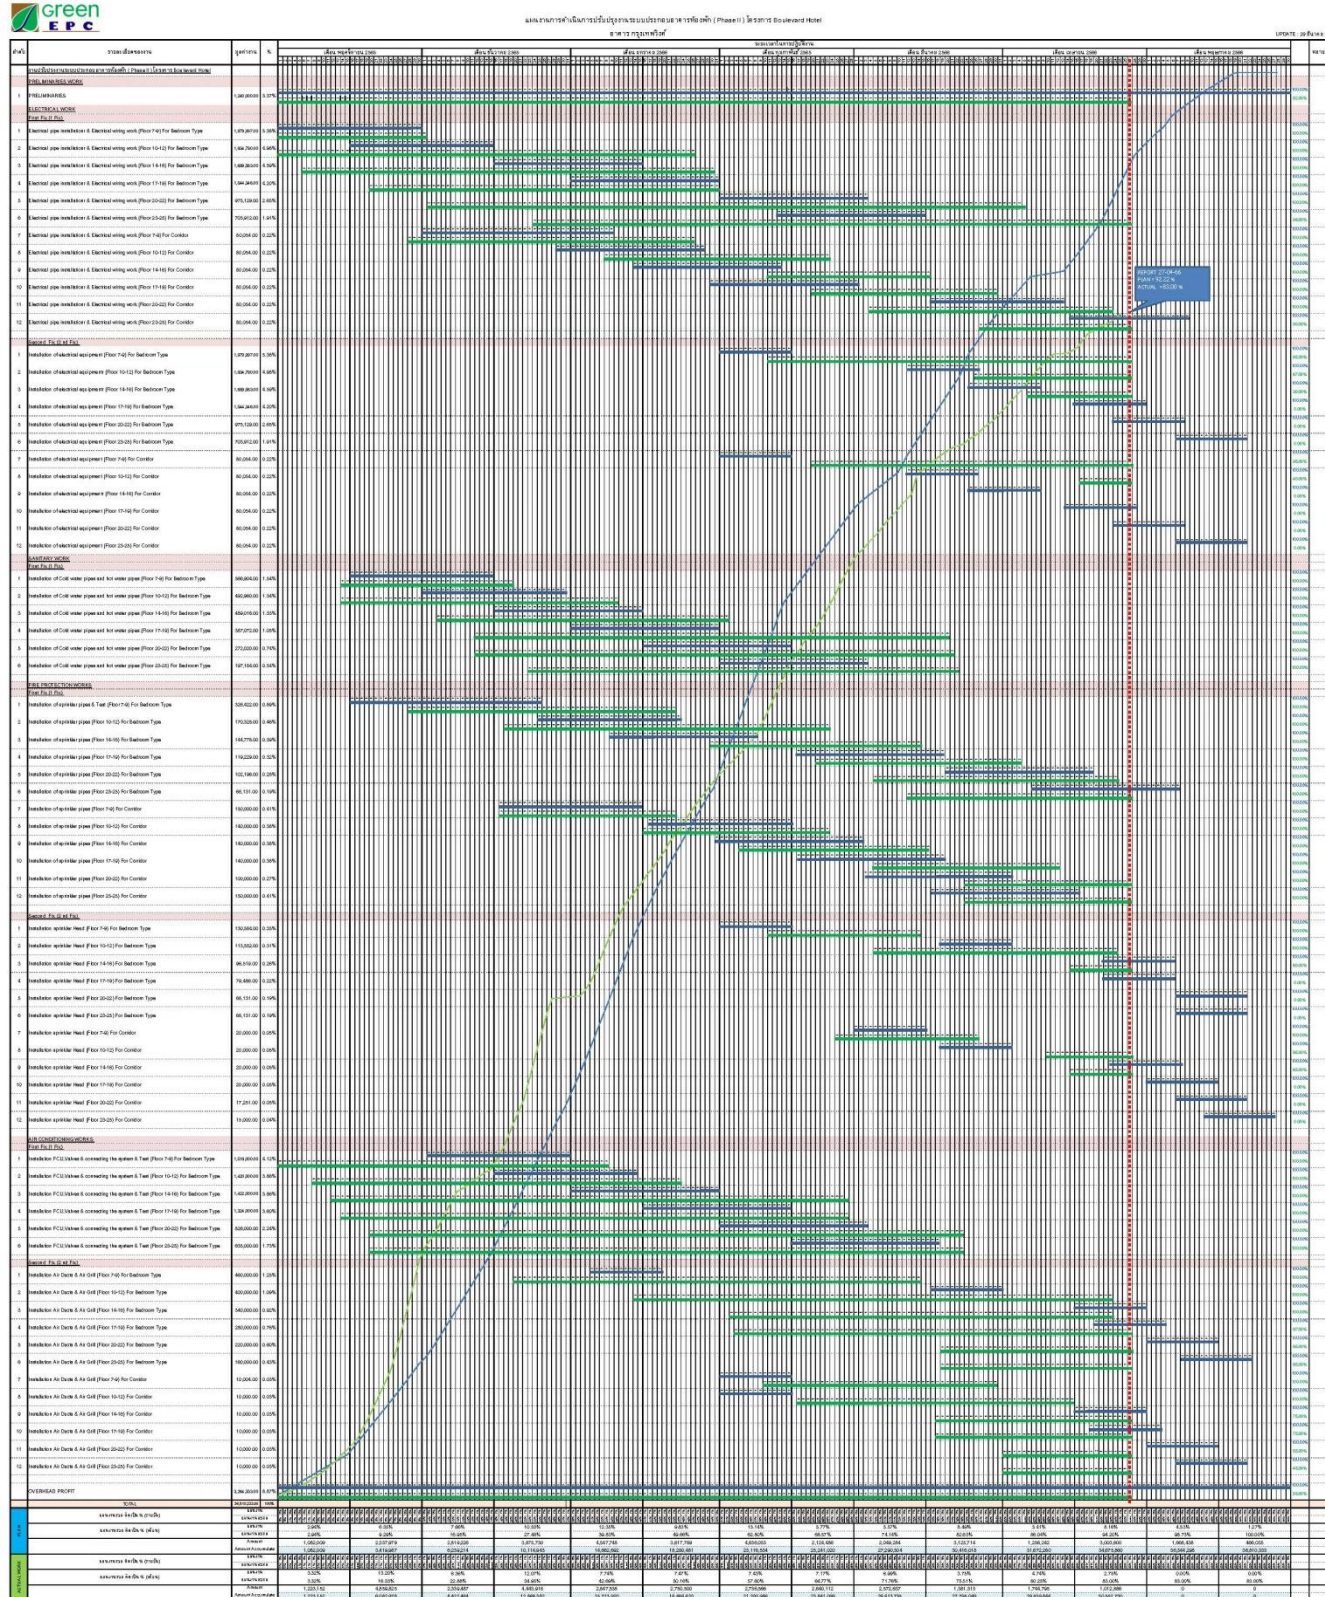

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (27-04-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	92.22%	83.00%	- 9.22 % ล่าช้า 18 วัน




# แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โรงแรม Boulevard Hotel

อาคาร สยามนิเวศ

UPDATE: 20/04/2020

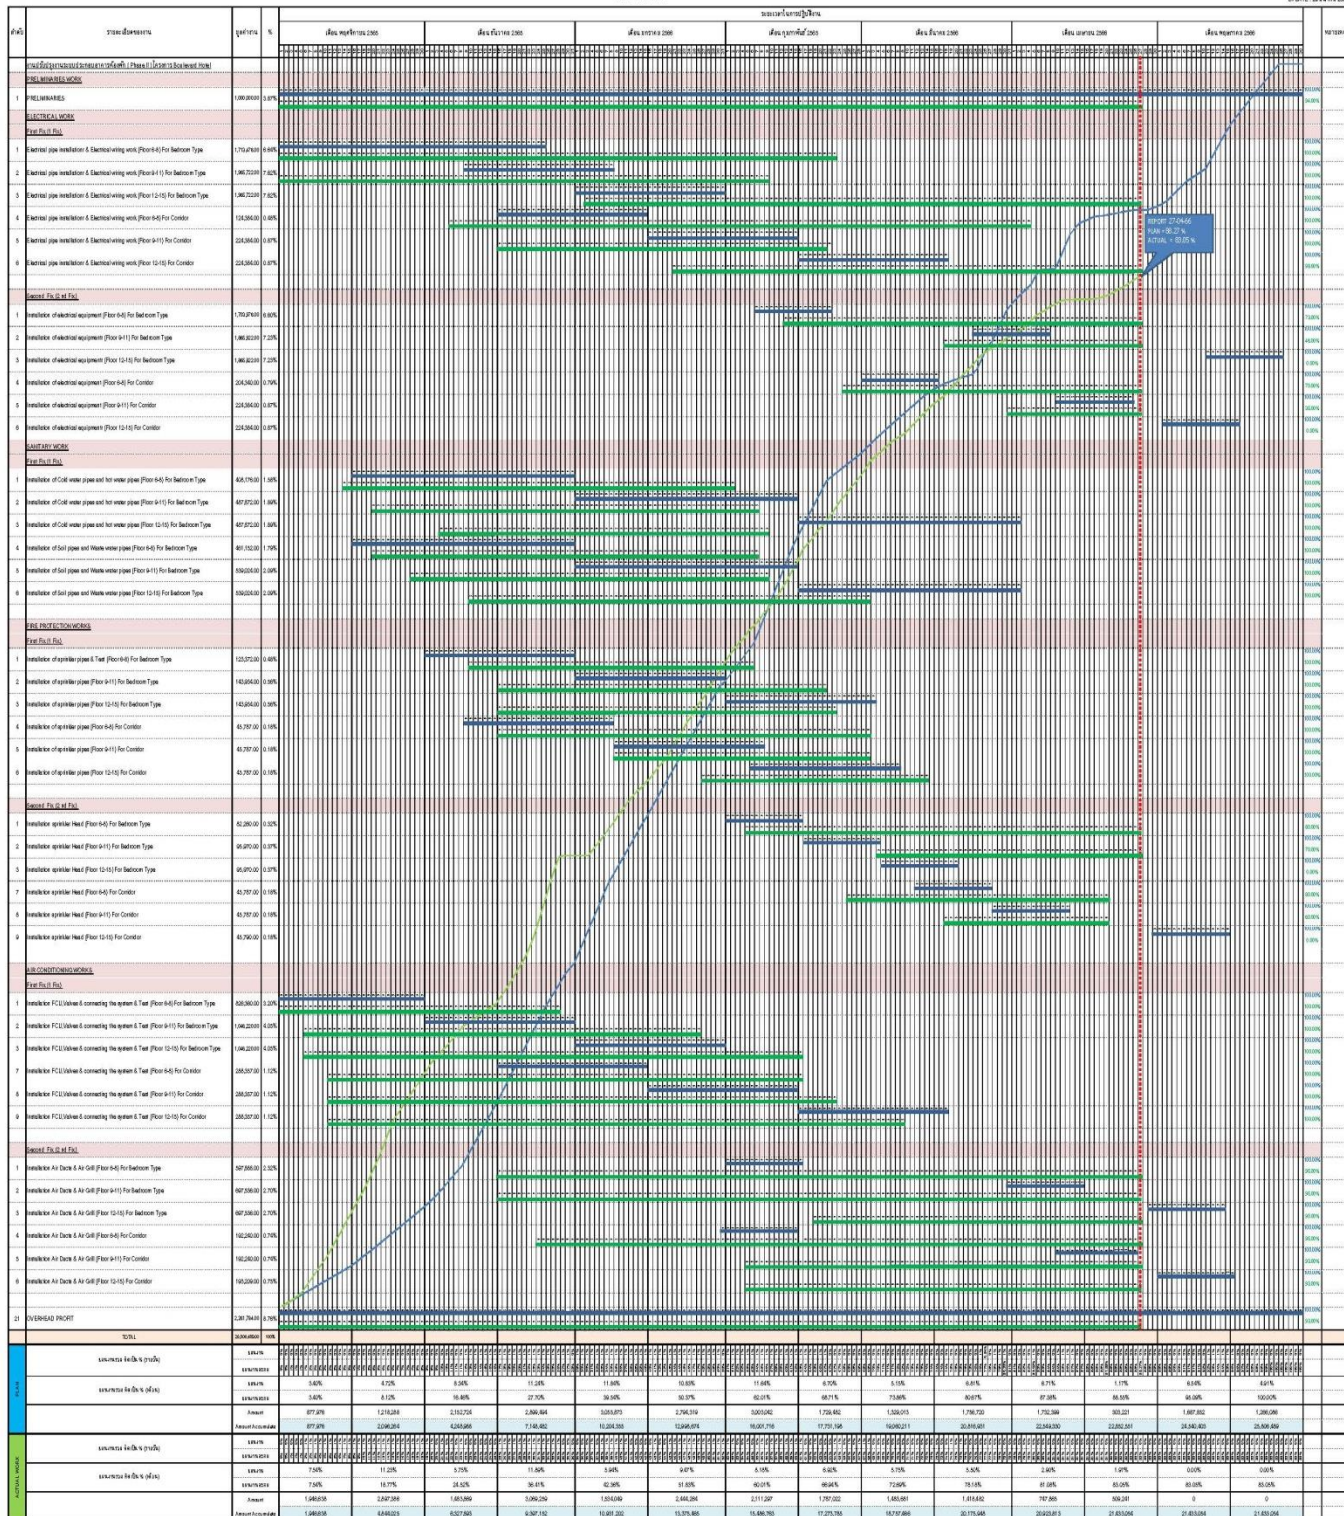

## WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (20-04-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
88.27%	88.27%	83.05%	- 5.22 % ล่าช้า 10 วัน

**MAN POWER**

# ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนเมษายน 2566



## ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนเมษายน 2566																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Project Manager	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1						
2	Sanitation Engineer	-	-	1	1	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	2	2	2						
3	Electrical Engineer	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
4	Air Conditioning Engineer	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1						
5	Safety	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1					
6	Sanitary Foreman	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-					
7	Electrical Foreman	2	-	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	1	1						
8	Air Foreman	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-						
9	Site Admin	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1						
10	Electricians	16	-	26	21	21	30	31	30	26	22	9	9	4	4	4	-	10	6	13	21	19	14	13	23	13	21						
11	Plumber	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	2	-	3	-	3	-	3	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-					
12	Sprinkler	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-					
13	Air Conditioner	-	-	5	5	5	-	7	6	-	7	-	-	-	-	-	-	7	9	9	9	-	-	-	7	5	-						
14	General Technician	4	-	-	-	3	3	3	3	-	2	3	3	-	-	-	-	-	3	3	3	-	3	-	3	-	4						
15	Store	2	-	2	2	3	3	3	3	1	1	-	-	1	-	1	-	1	3	3	3	3	3	1	3	2	2						
16	Tiler	19	13	20	24	23	23	25	22	15	23	15	15	-	-	-	6	6	10	11	12	16	13	6	12	10	10						
17	Skim Coat	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	5	-	4	2	2						
	<b>รวม</b>	53	15	61	61	73	74	87	81	52	69	38	30	9	4	9	7	35	46	57	66	57	55	30	69	41	47	0	0	0	0	0	

หมายเหตุ

  วันอาทิตย์

  วันหยุดนักขัตฤกษ์




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟบริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 14,15



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งคอมไฟบริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 14,15

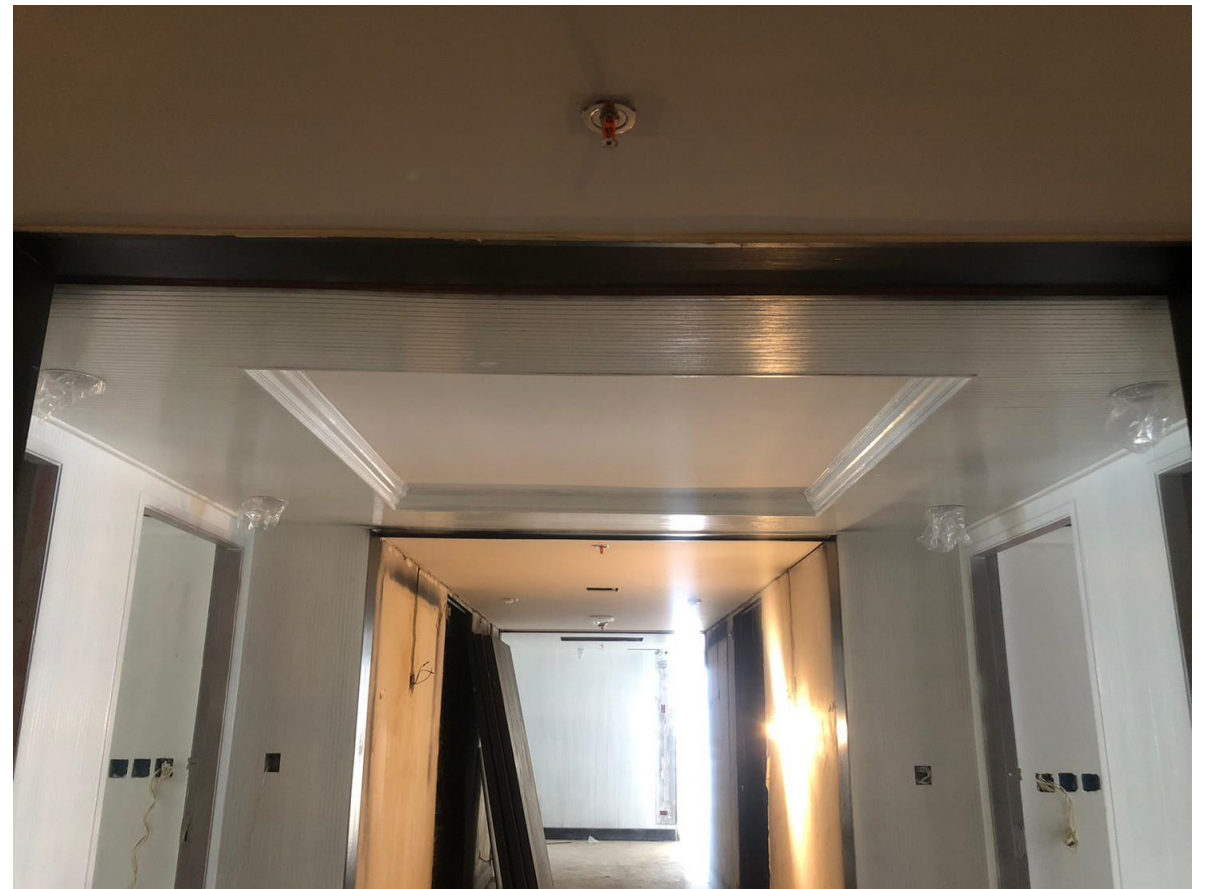




รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งลำโพง , Smock Detector และป้าย Exit  
บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14,15

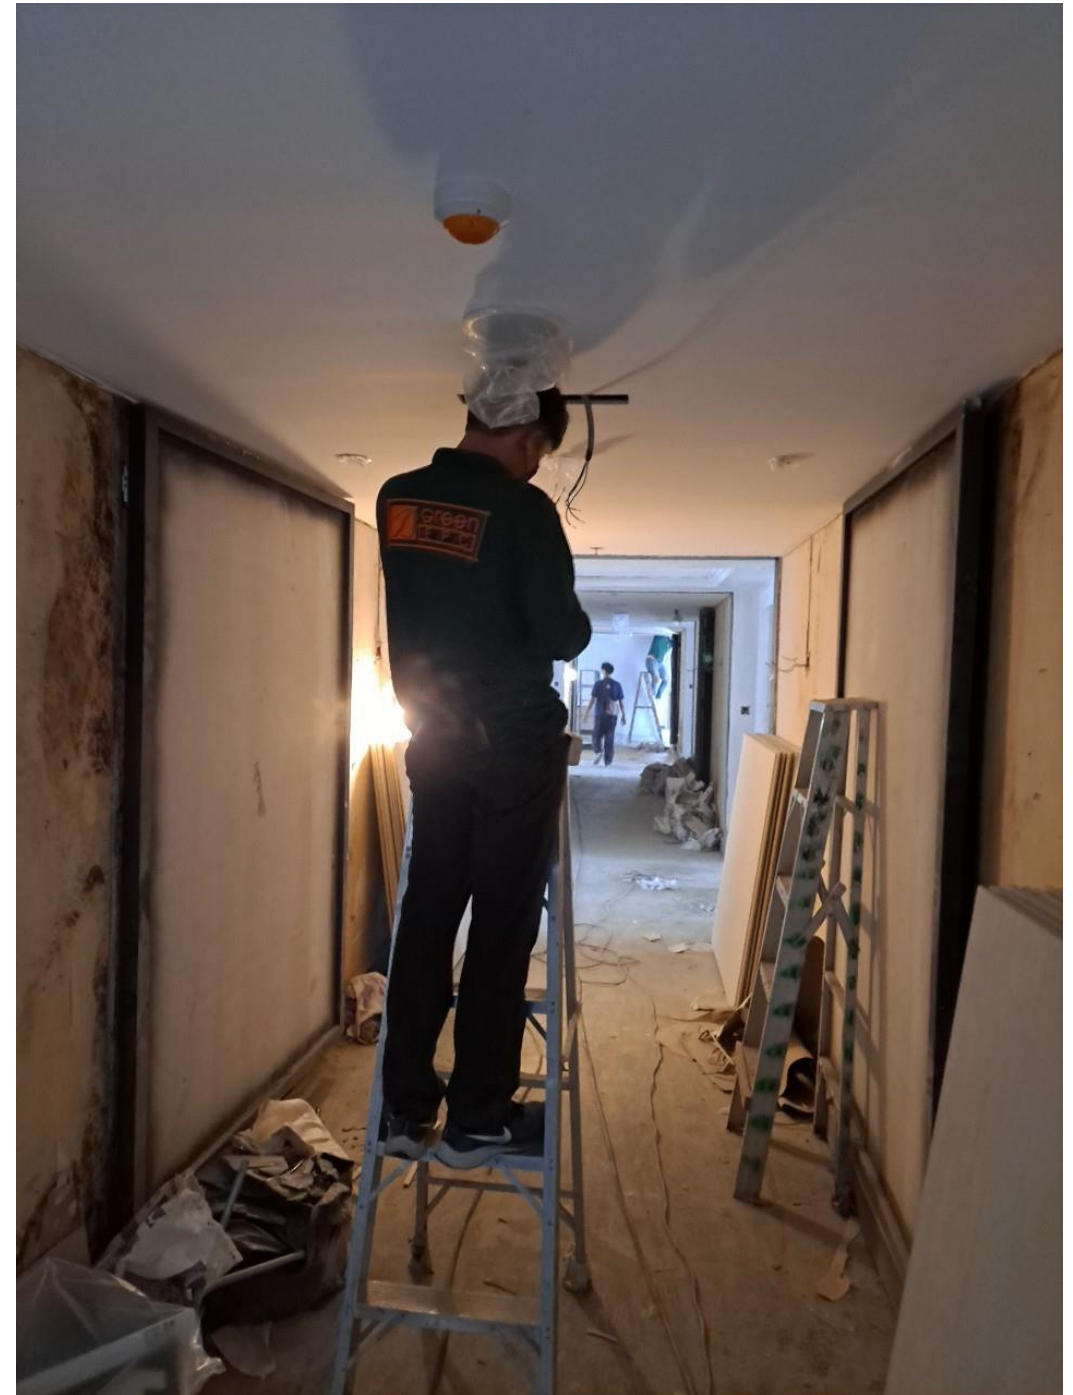

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งลำโพง , Smoke Detector และป้าย Exit  
บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14,15






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้งลำโพง , Smock Detector และป้าย Exit  
บริเวณ Corridor อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14,15

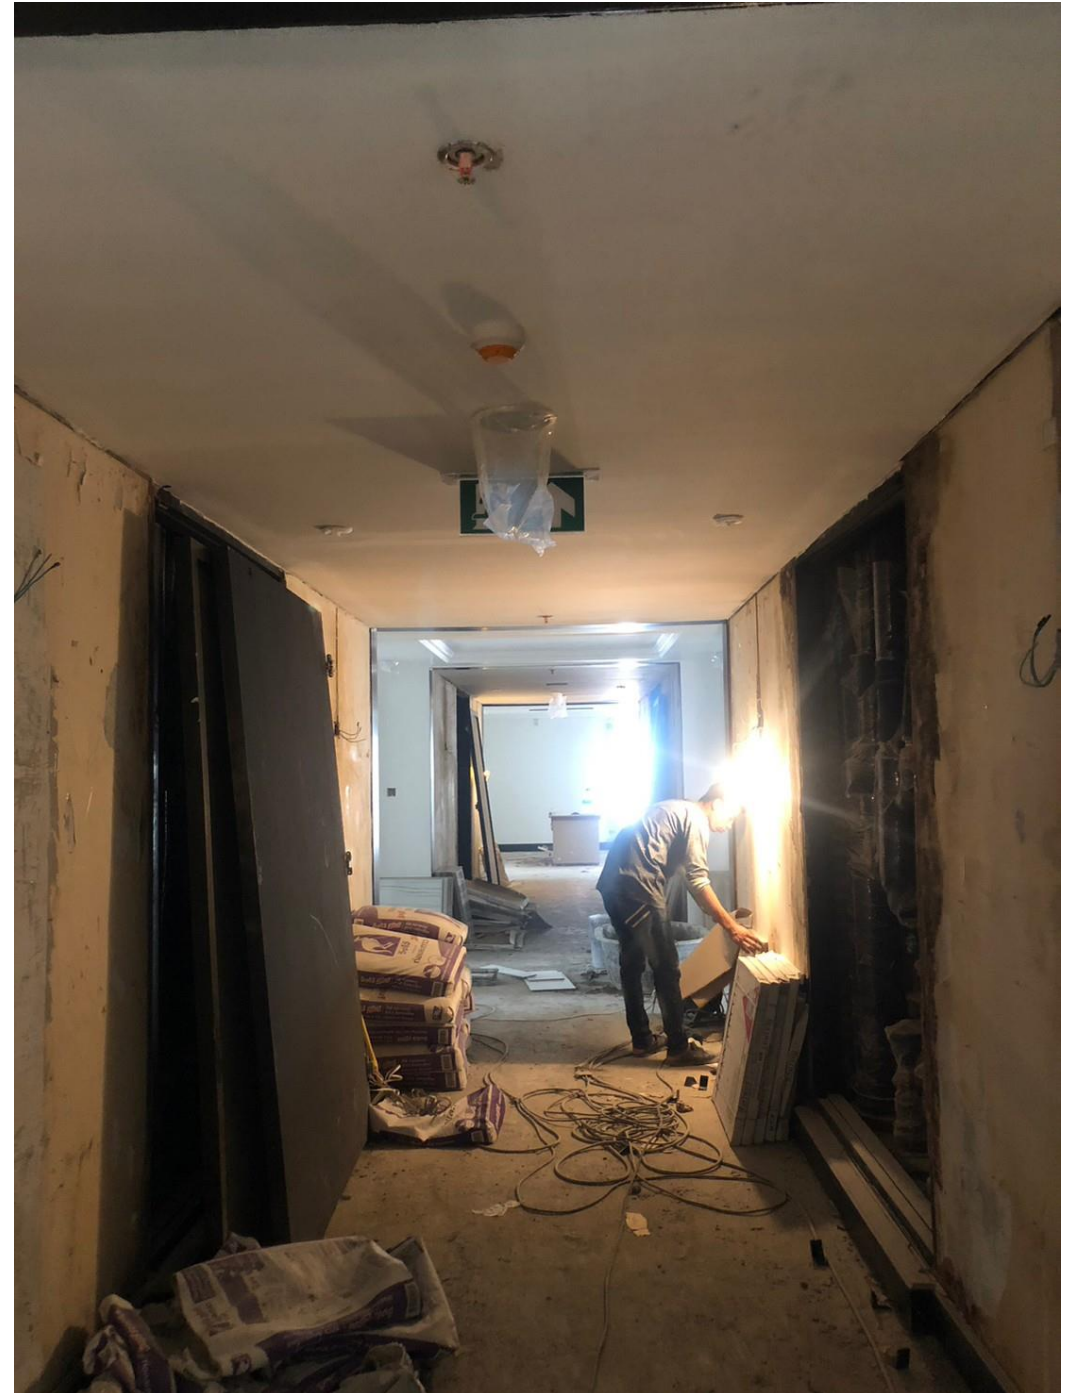

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 12-16

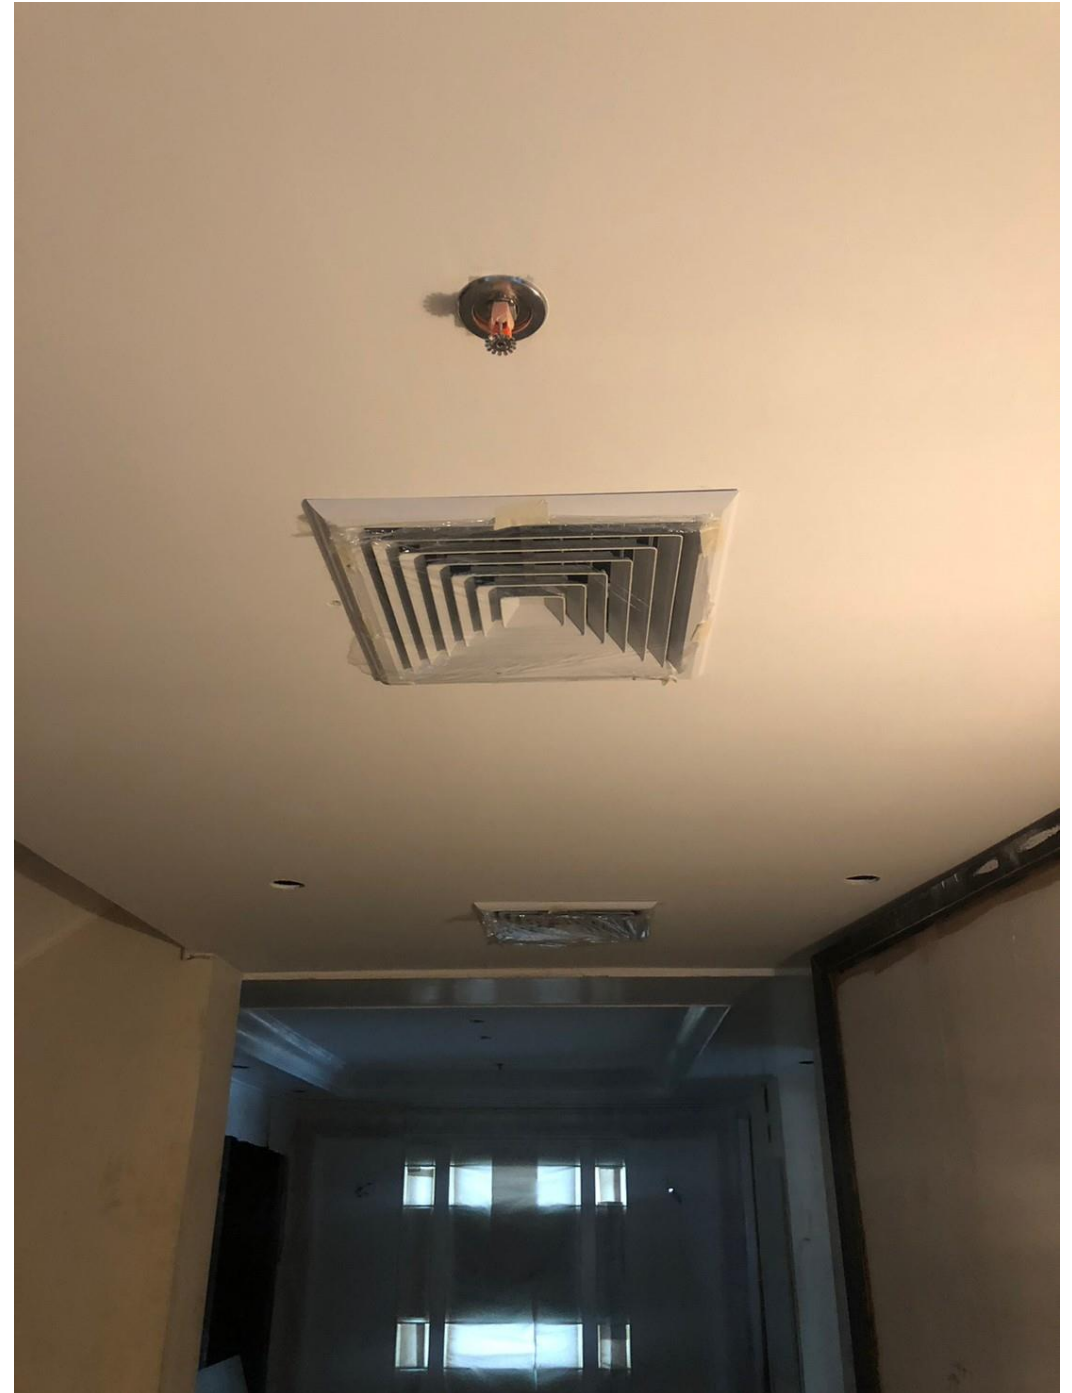



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Supply Air Grille บริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์  
ชั้น 12-16

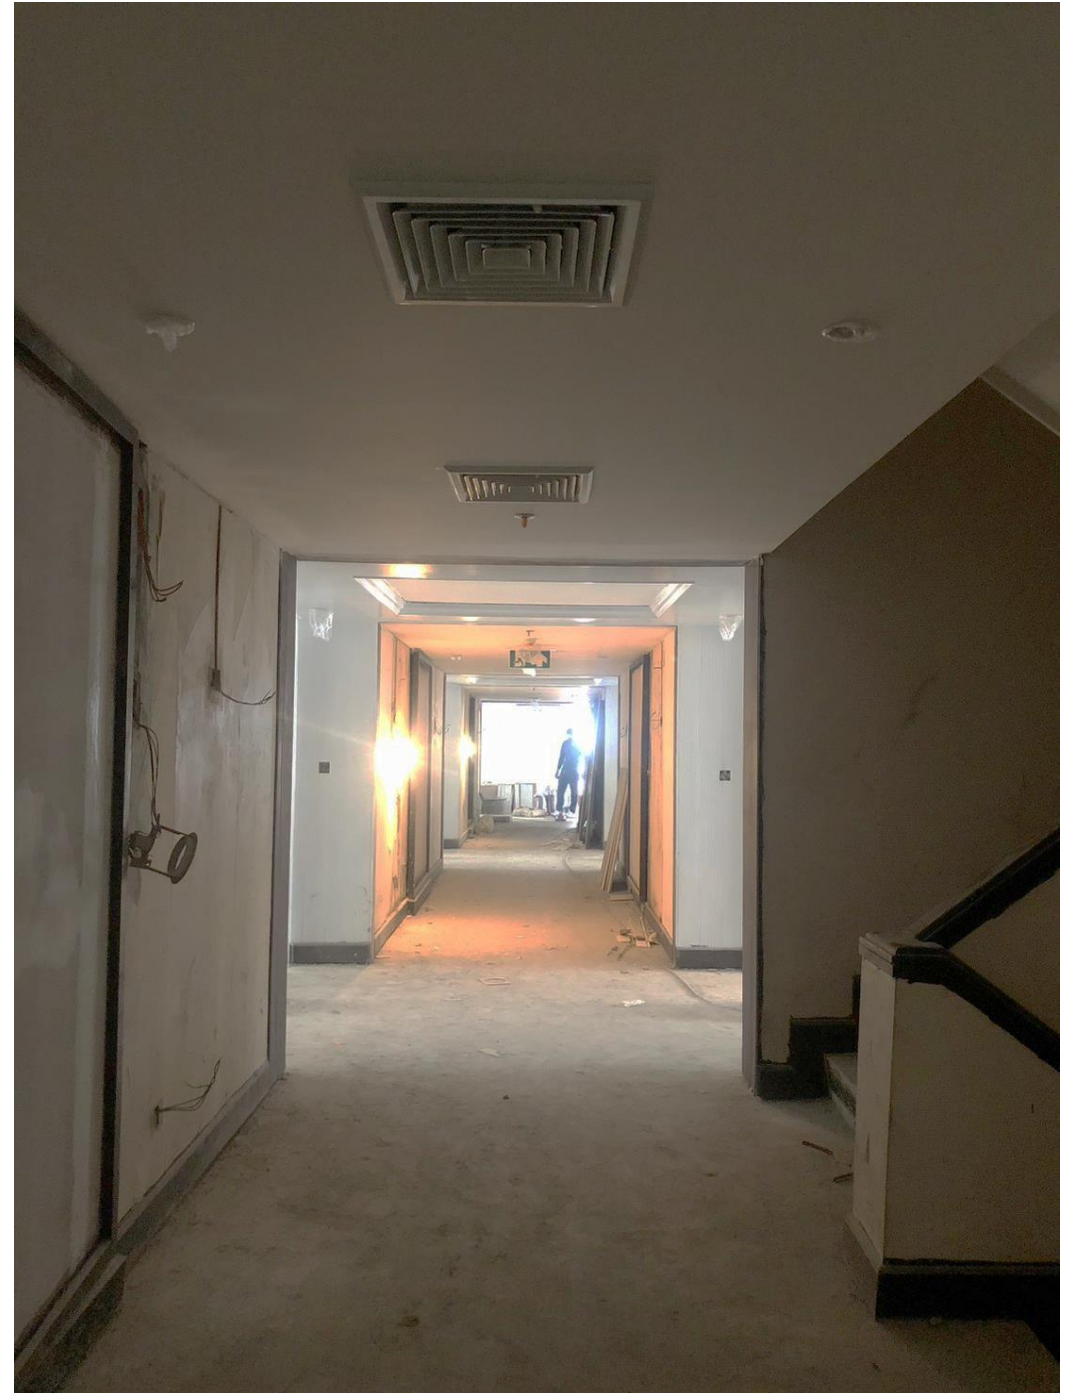



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ  
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 14





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งท่อดักส้วมบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-25





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานติดตั้งท่อดักส้วบริเวณทางเดิน อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 22-25





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

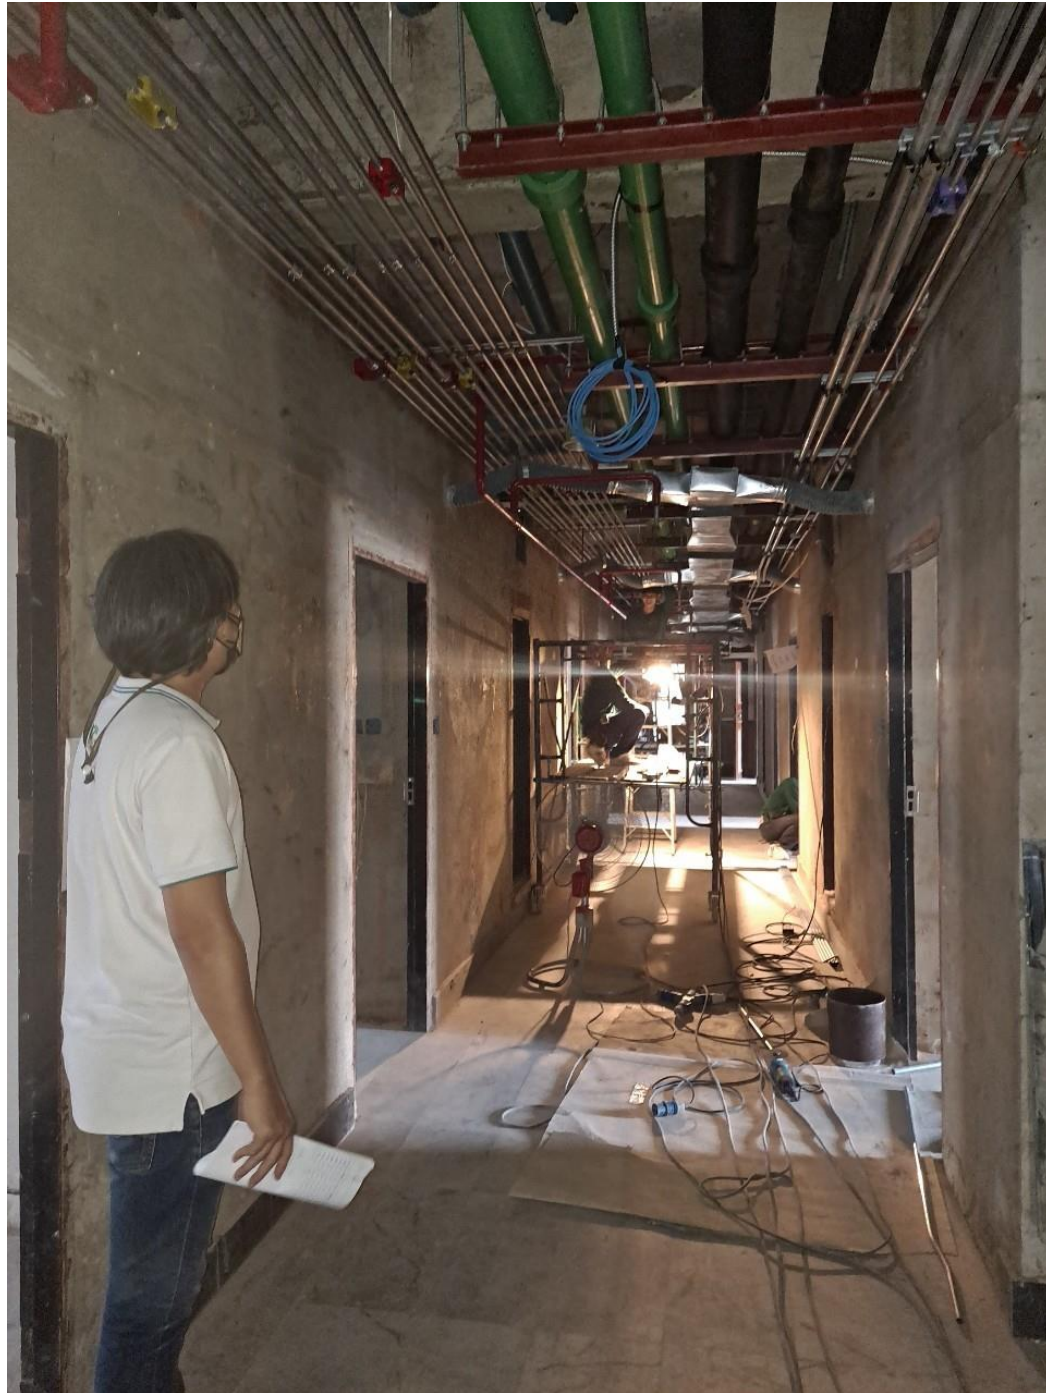

งานเดินท่อและร้อยสายไฟบริเวณทางเดิน อาคารสยามวิงค์  
ชั้น 15





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งคอมไฟ, ลำโพง , Smock Detector และป้าย Exit  
บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งคอมไฟ, ลำโพง , Smock Detector และป้าย Exit  
บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งคอมไฟ, ลำโพง , Smock Detector และป้าย Exit  
บริเวณ Corridor อาคารสยามวิงค์ ชั้น 11





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-10



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Exhaust Air Grille บริเวณห้องน้ำ  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-10






รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานติดตั้งพัดลม Exhaust บริเวณบันไดหนีไฟ  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-15

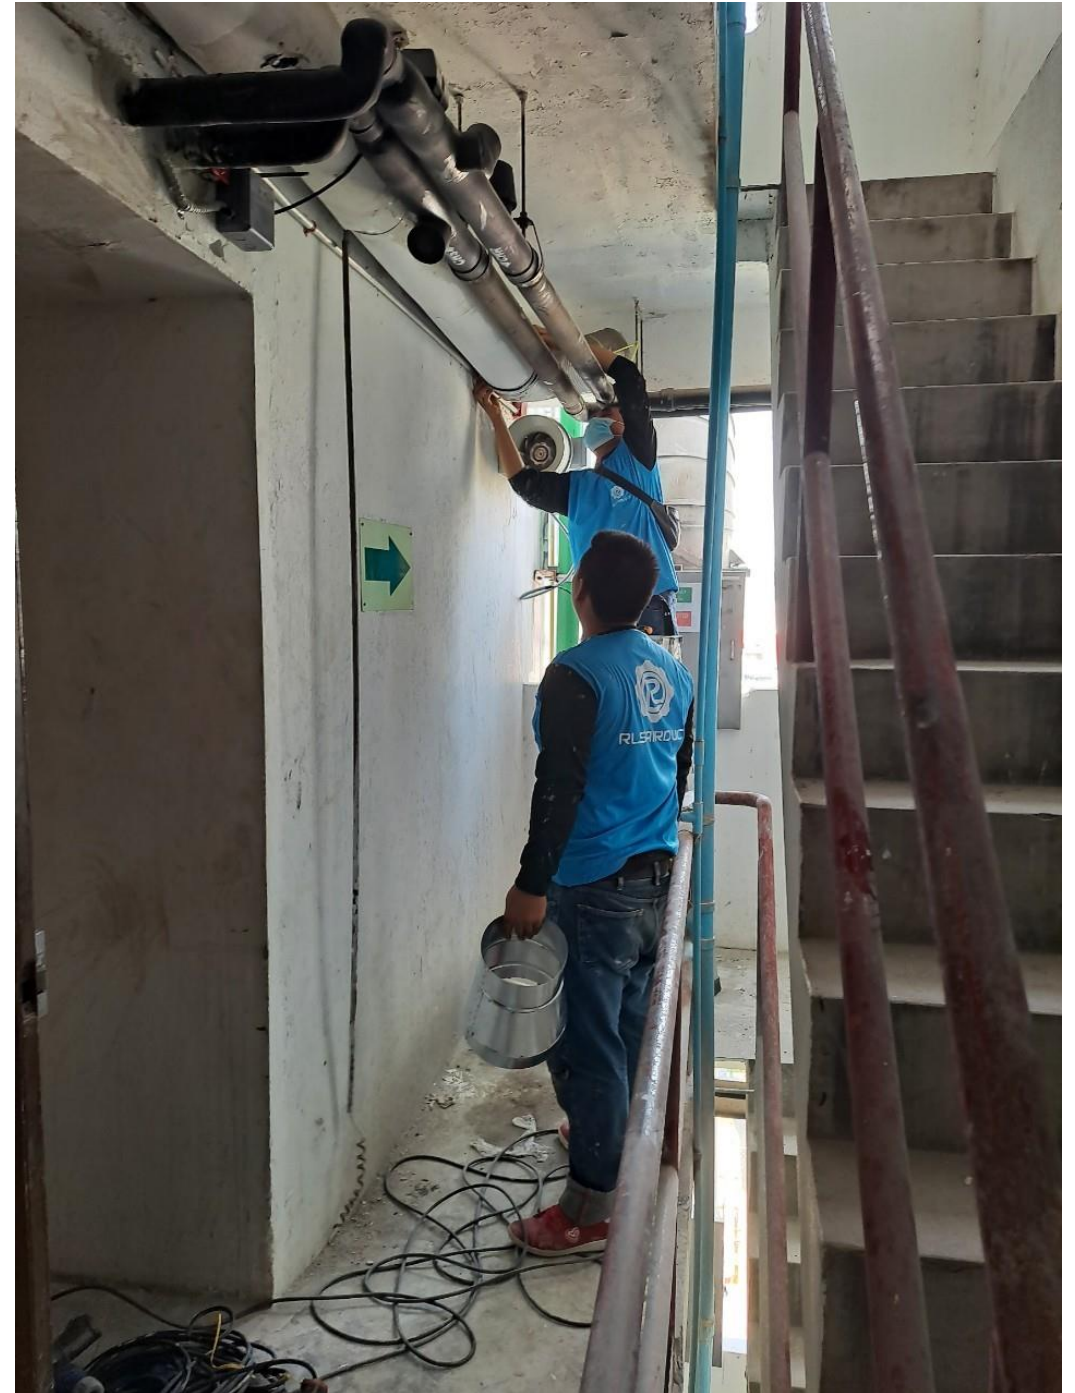



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งพัดลม Exhaust บริเวณบันไดหนีไฟ  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-15





รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้งพัดลม Exhaust บริเวณบันไดหนีไฟ  
อาคารสยามวิงค์ ชั้น 7-15

