



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

31 Aug 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

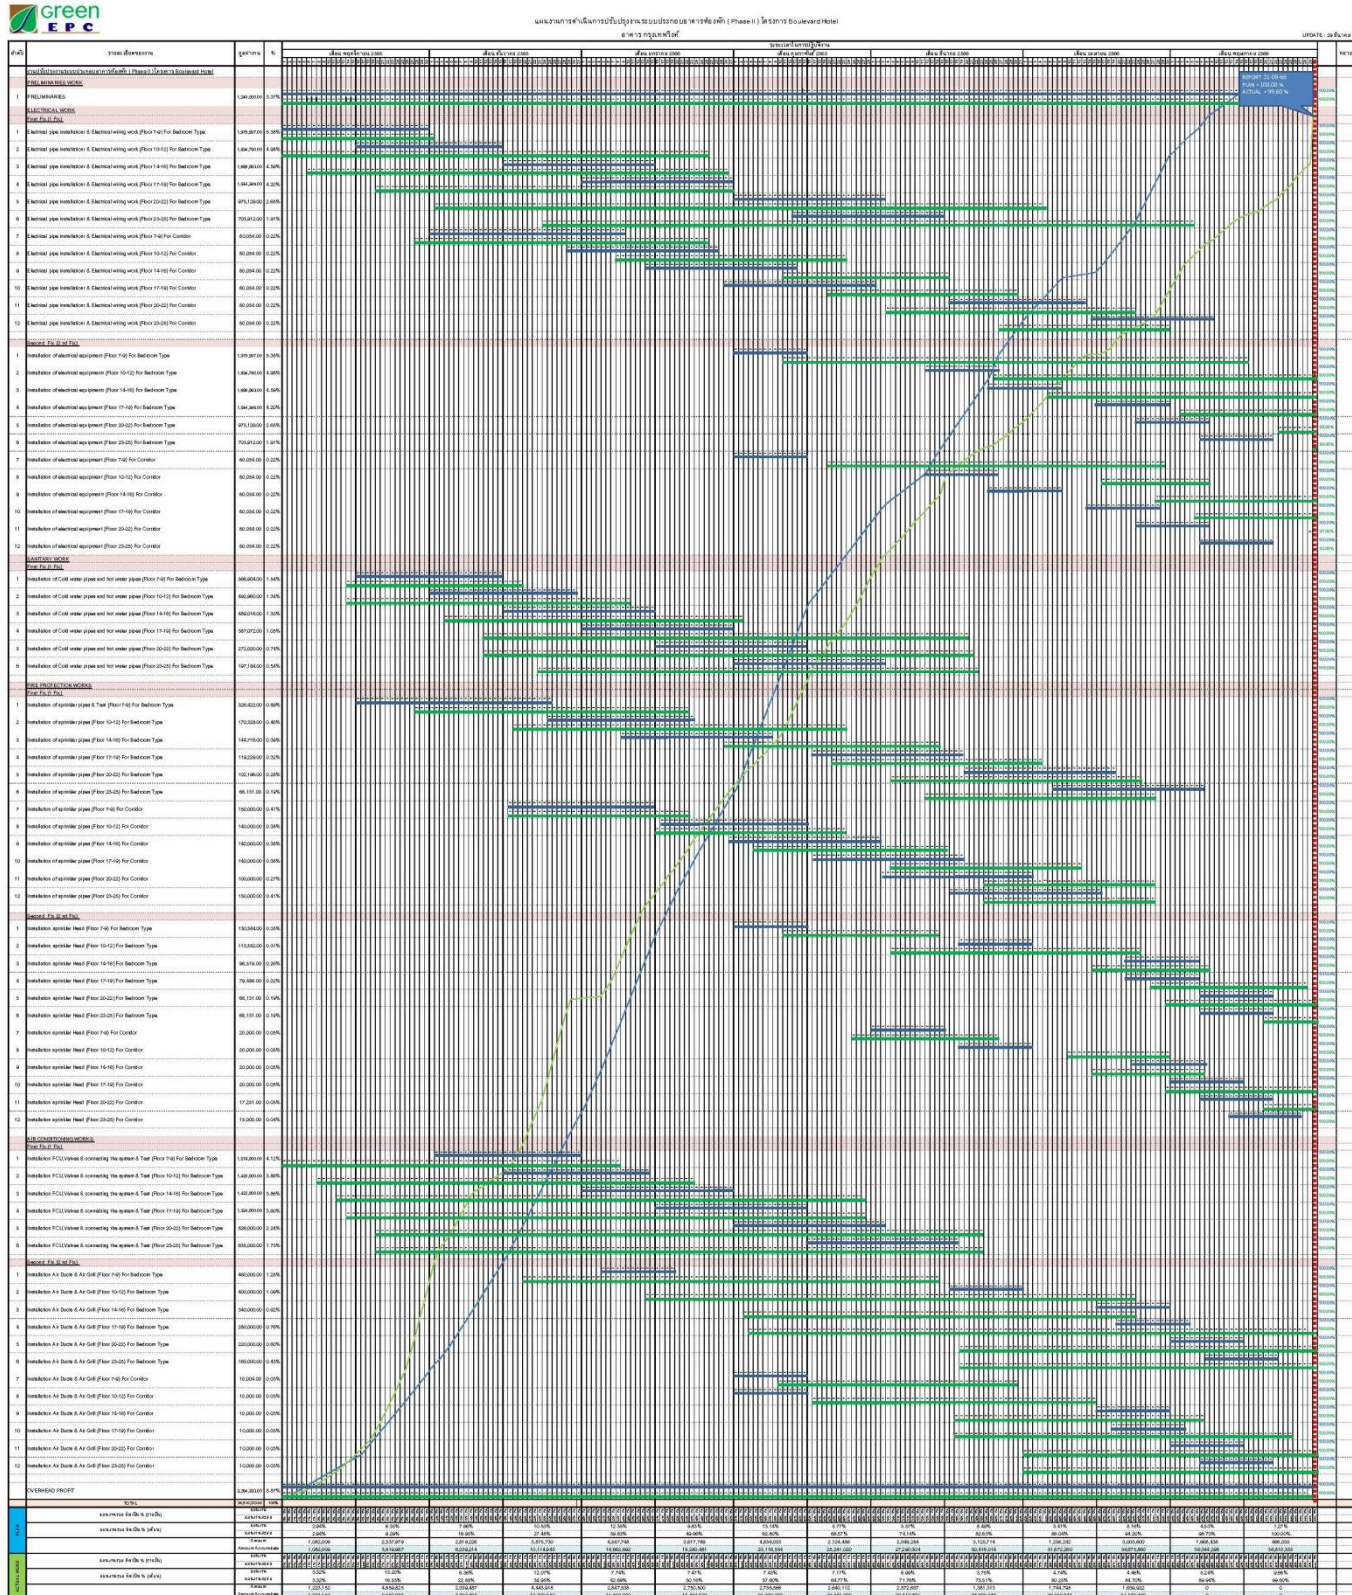

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (31-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
100.00%	99.60%	- %	ล่าช้า 105 วัน


หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)



แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบอาคารสยามฯ (Phase II) โครงการ Boulevard Hotel
อาคารสยามวิเศษ

UPD: 16/08/2016

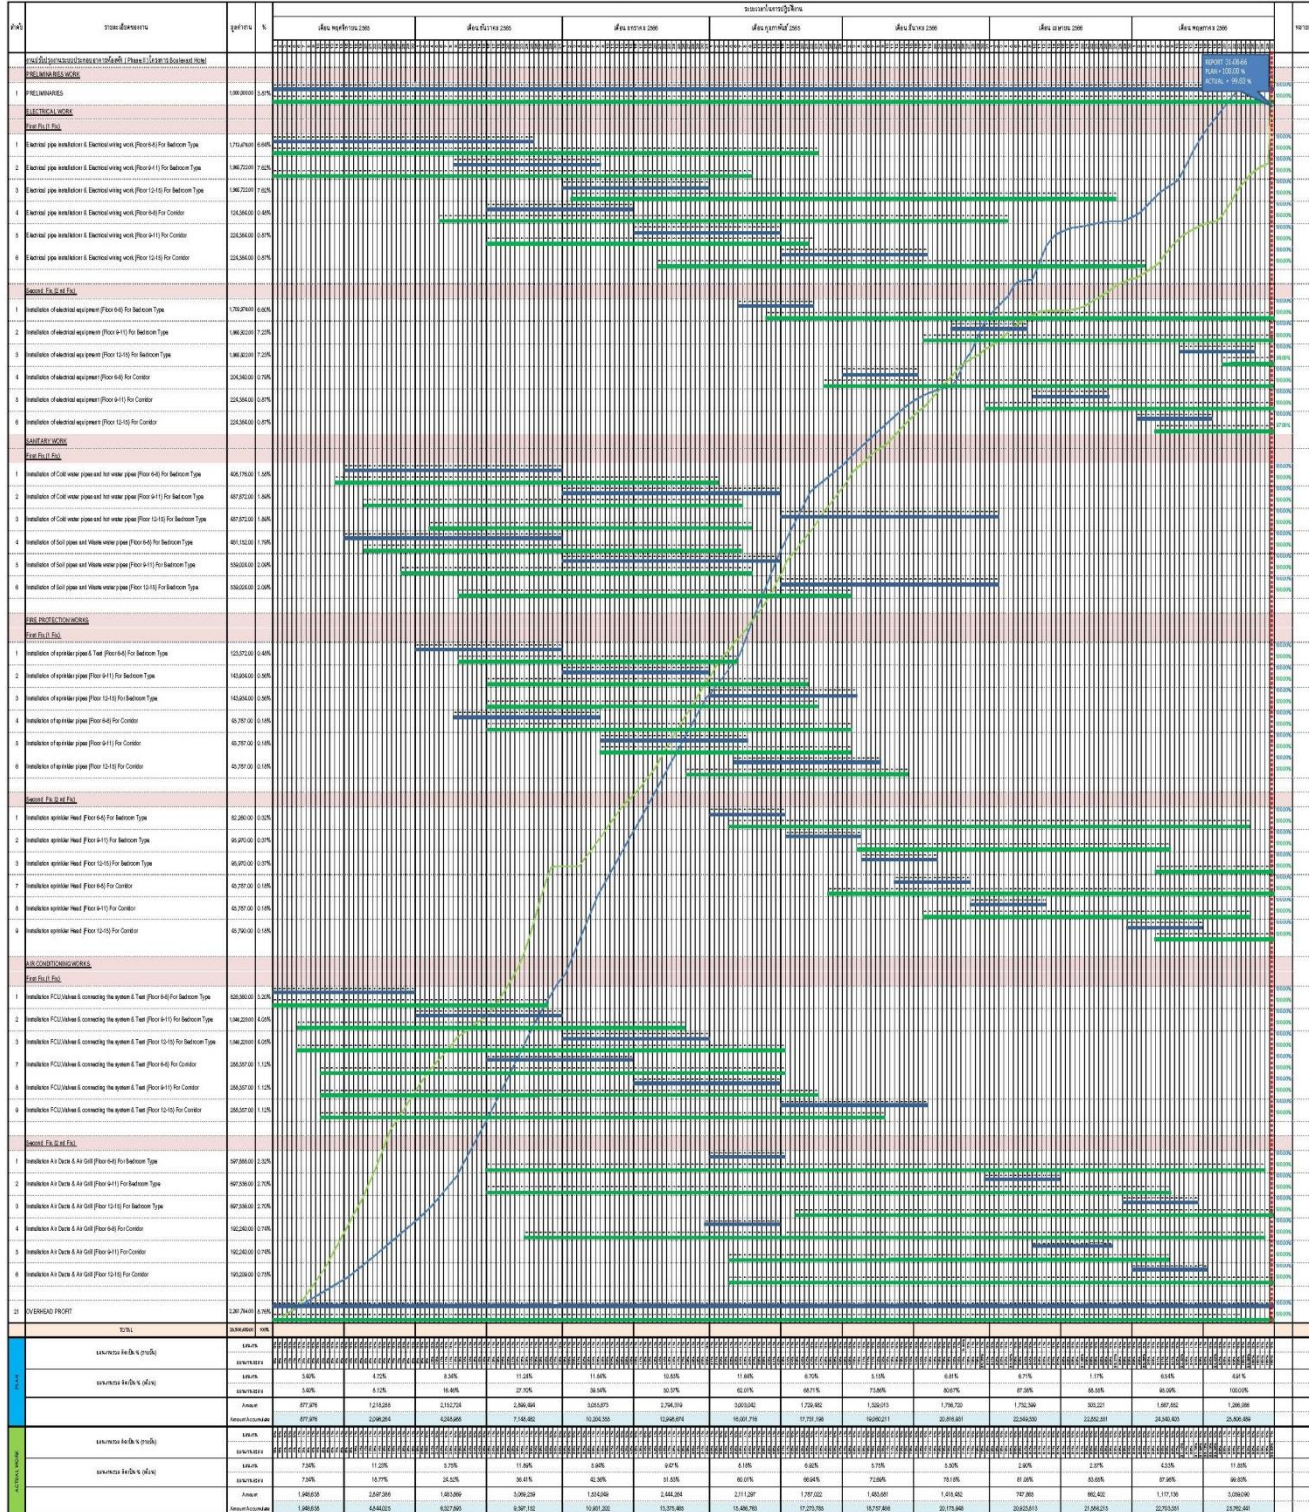

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (31-08-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
	100.00%	99.83%	- % ล่าช้า 105 วัน

หมายเหตุ ล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่เข้างาน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนสิงหาคม 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Project Manager	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	
2	Architecture Engineer	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
3	Electrical Engineer	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Safety	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
6	Sanitary Foreman	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Electrical Foreman	1	1	2	2	2	-	2	2	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	1	1	1
8	Air Foreman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Site Admin	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
10	Electricians	5	7	12	12	11	-	12	12	12	12	7	-	-	13	12	12	11	10	9	-	13	13	14	14	14	14	-	6	6	6	
11	Plumber	5	5	5	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sprinkler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Air Conditioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	10	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	General Technician	4	4	-	4	4	-	4	4	4	-	4	-	-	7	7	7	7	-	3	-	3	6	4	4	4	-	-	4	11	13	
15	Store	3	1	3	3	2	-	2	2	3	1	1	-	-	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
16	Tiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Skim Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	23	24	28	26	23	0	25	25	30	25	21	0	0	29	37	31	38	21	20	0	29	26	26	27	25	21	0	16	23	24	0


หมายเหตุ

วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์


รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-23

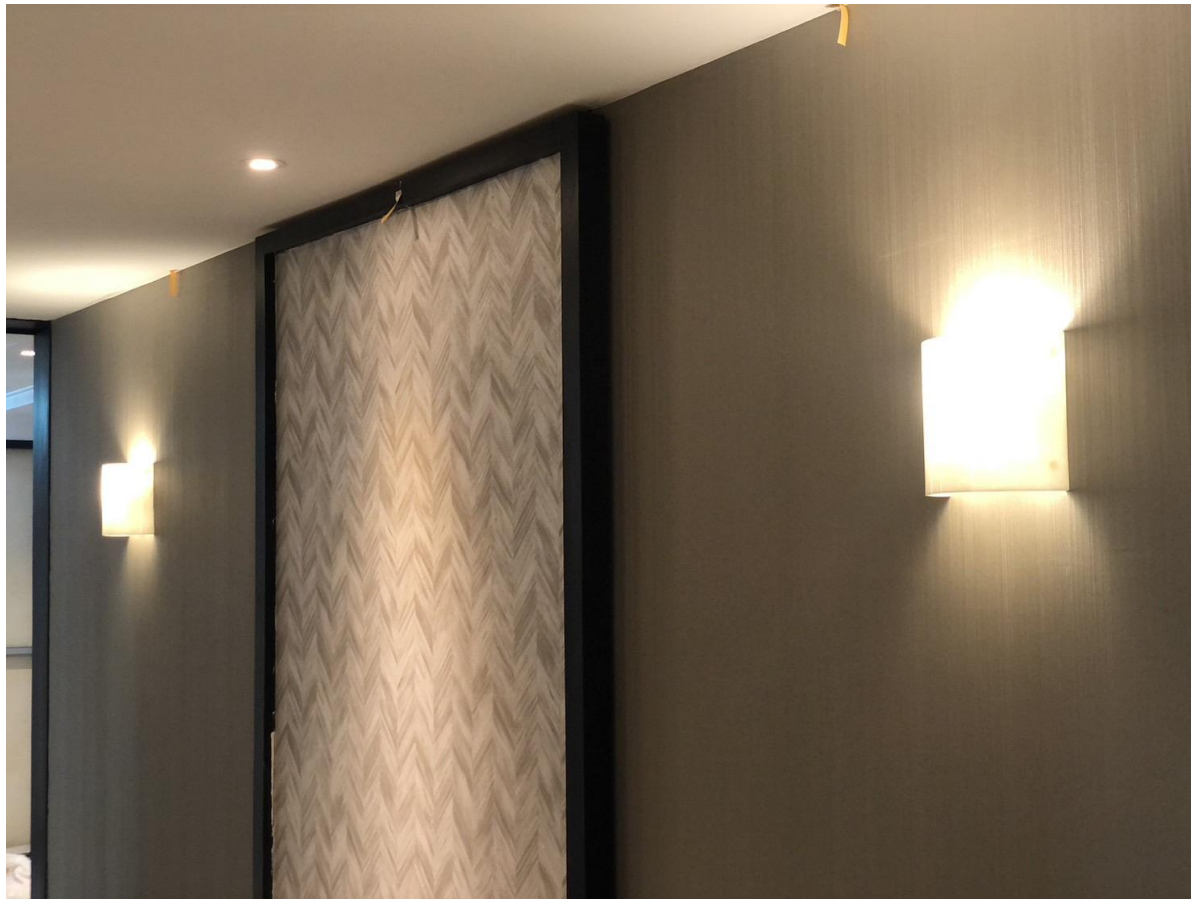

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-23

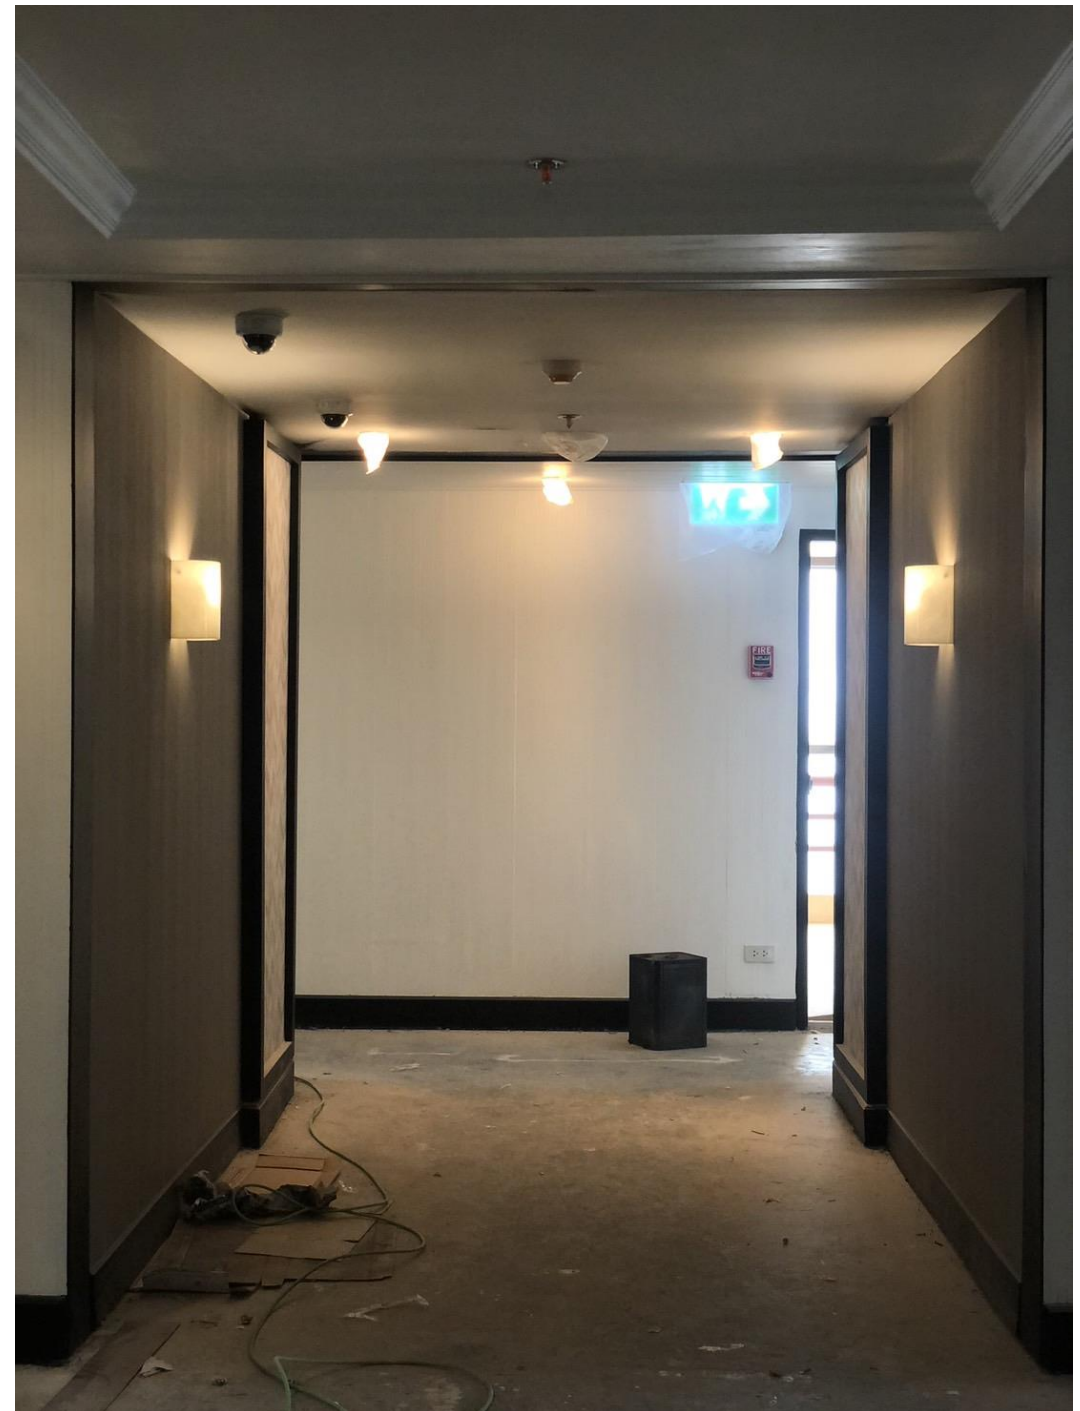

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-23



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานติดตั้ง Wall Lamp ไฟกิ่ง บริเวณ Corridor
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 19-23



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา


งานกันพื้นที่สำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1



รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา




งานกันพื้นสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1

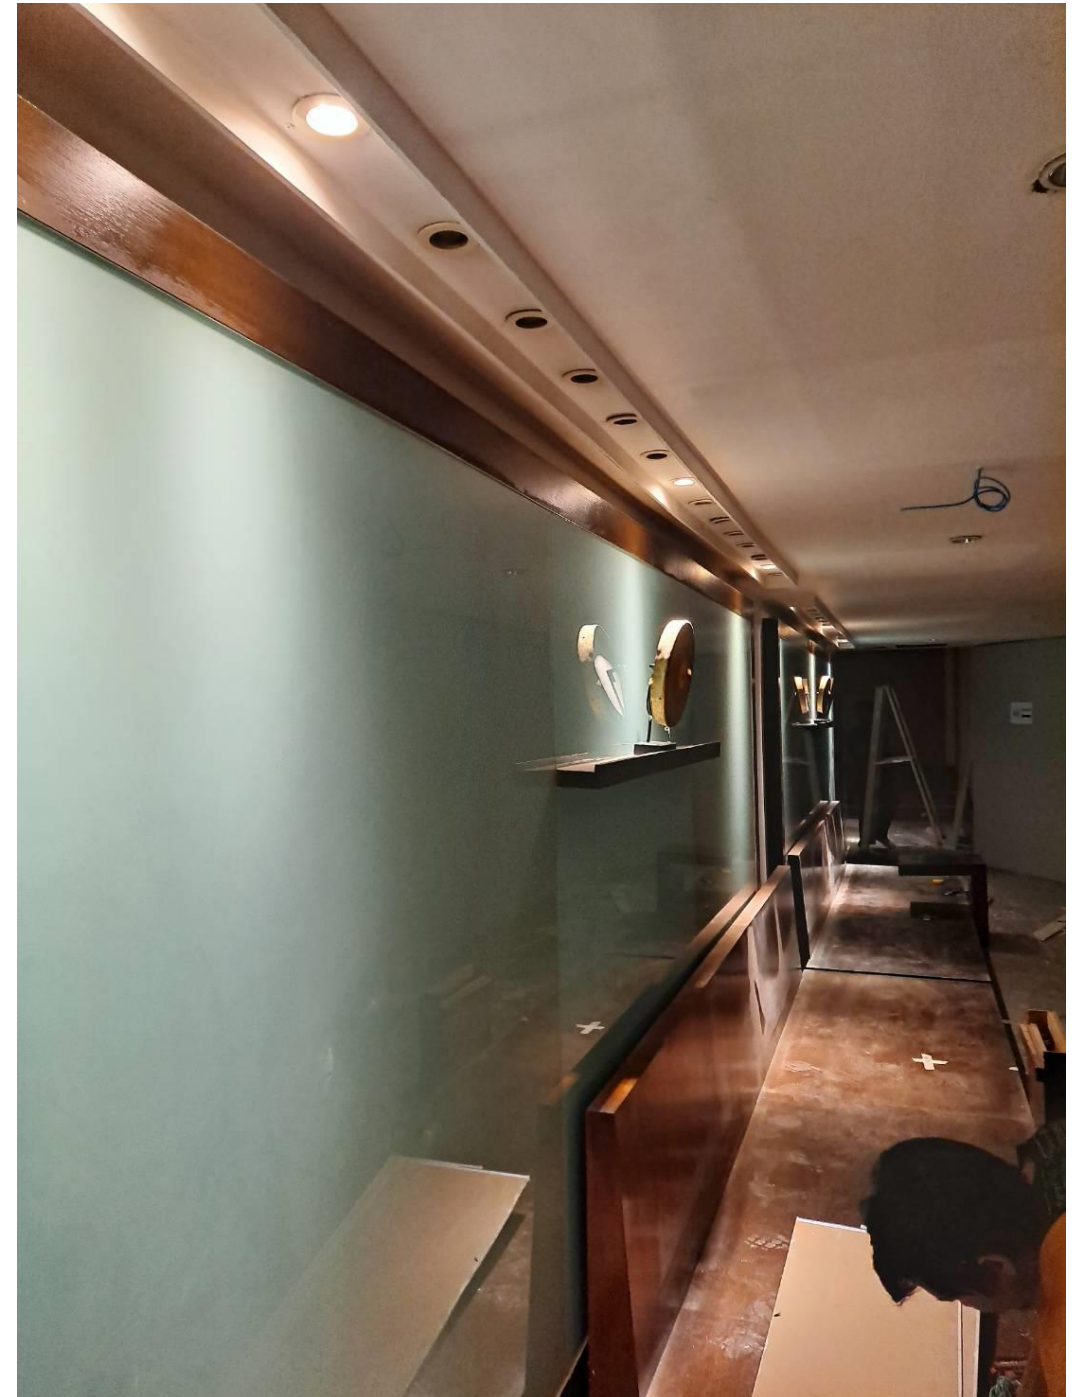

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา



งานกันพื้นสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1

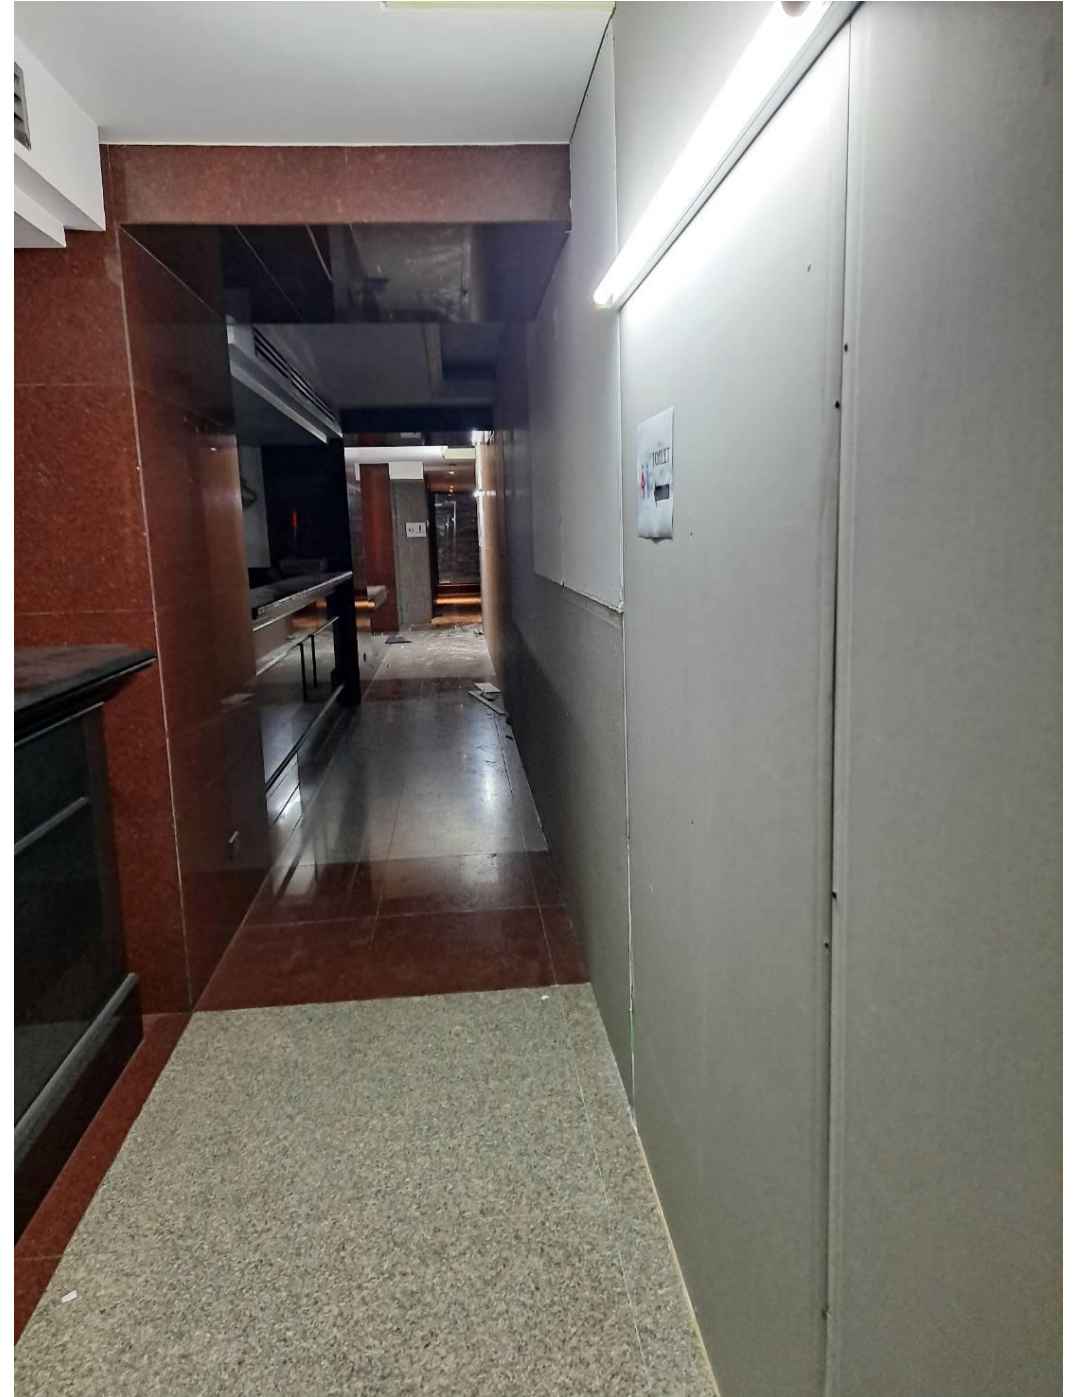

รายงานการทำงานประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานกันพื้นที่สำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ Lobby
อาคารกรุงเทพวิงค์ ชั้น 1

