



บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด



WEEKLY


REPORT

**BOULAEVARD BANGKOK HOTEL
SUKHUMVIT SOI 5**

09 February 2023

แผนงานหลักงานปรับปรุงห้องพัก Phase II


แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารกรุงเทพฯ (Phase II)

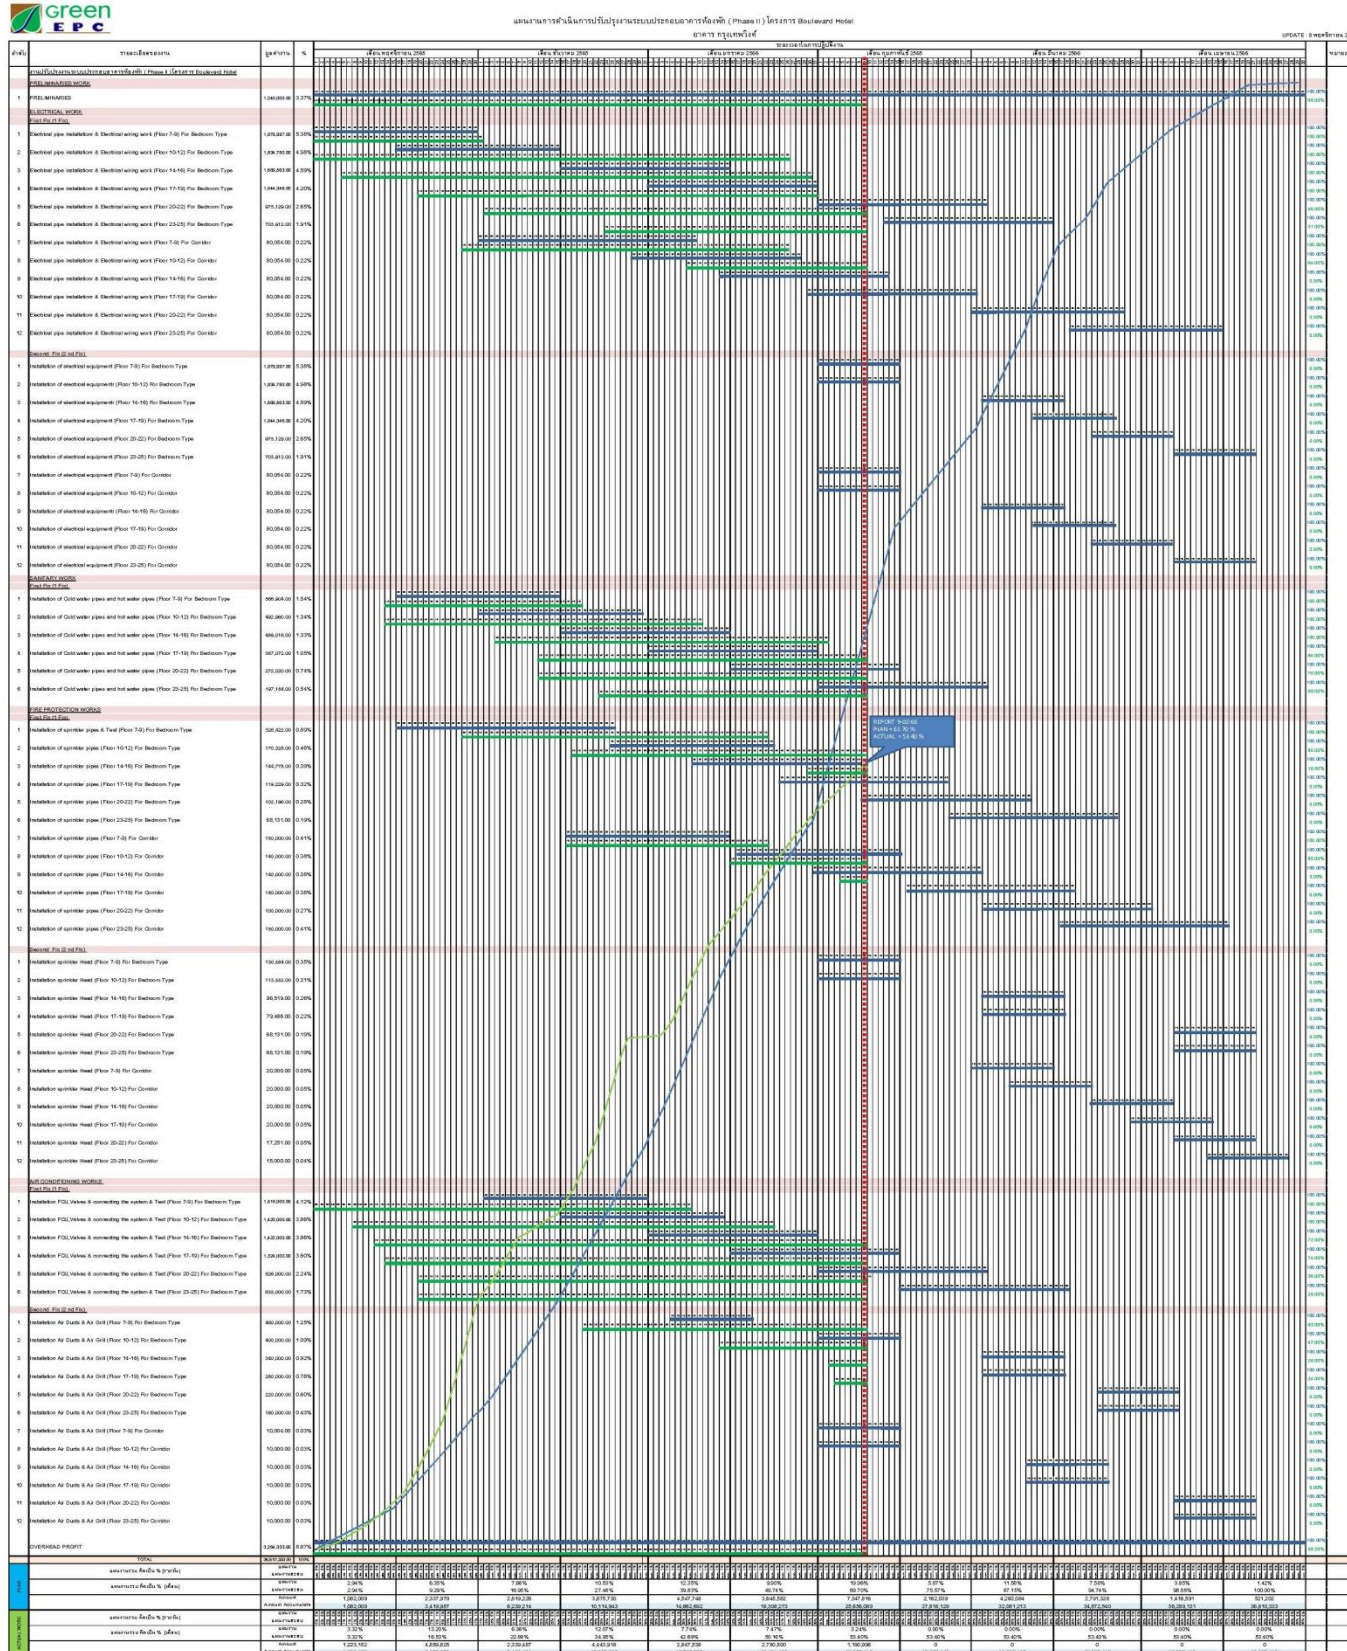

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (9-02-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
			- 8.30 % ล่าช้า 13 วัน
	61.70%	53.40%	

แผนงานการดำเนินการปรับปรุงงานระบบห้องพักอาคารสยามฯ (Phase II)

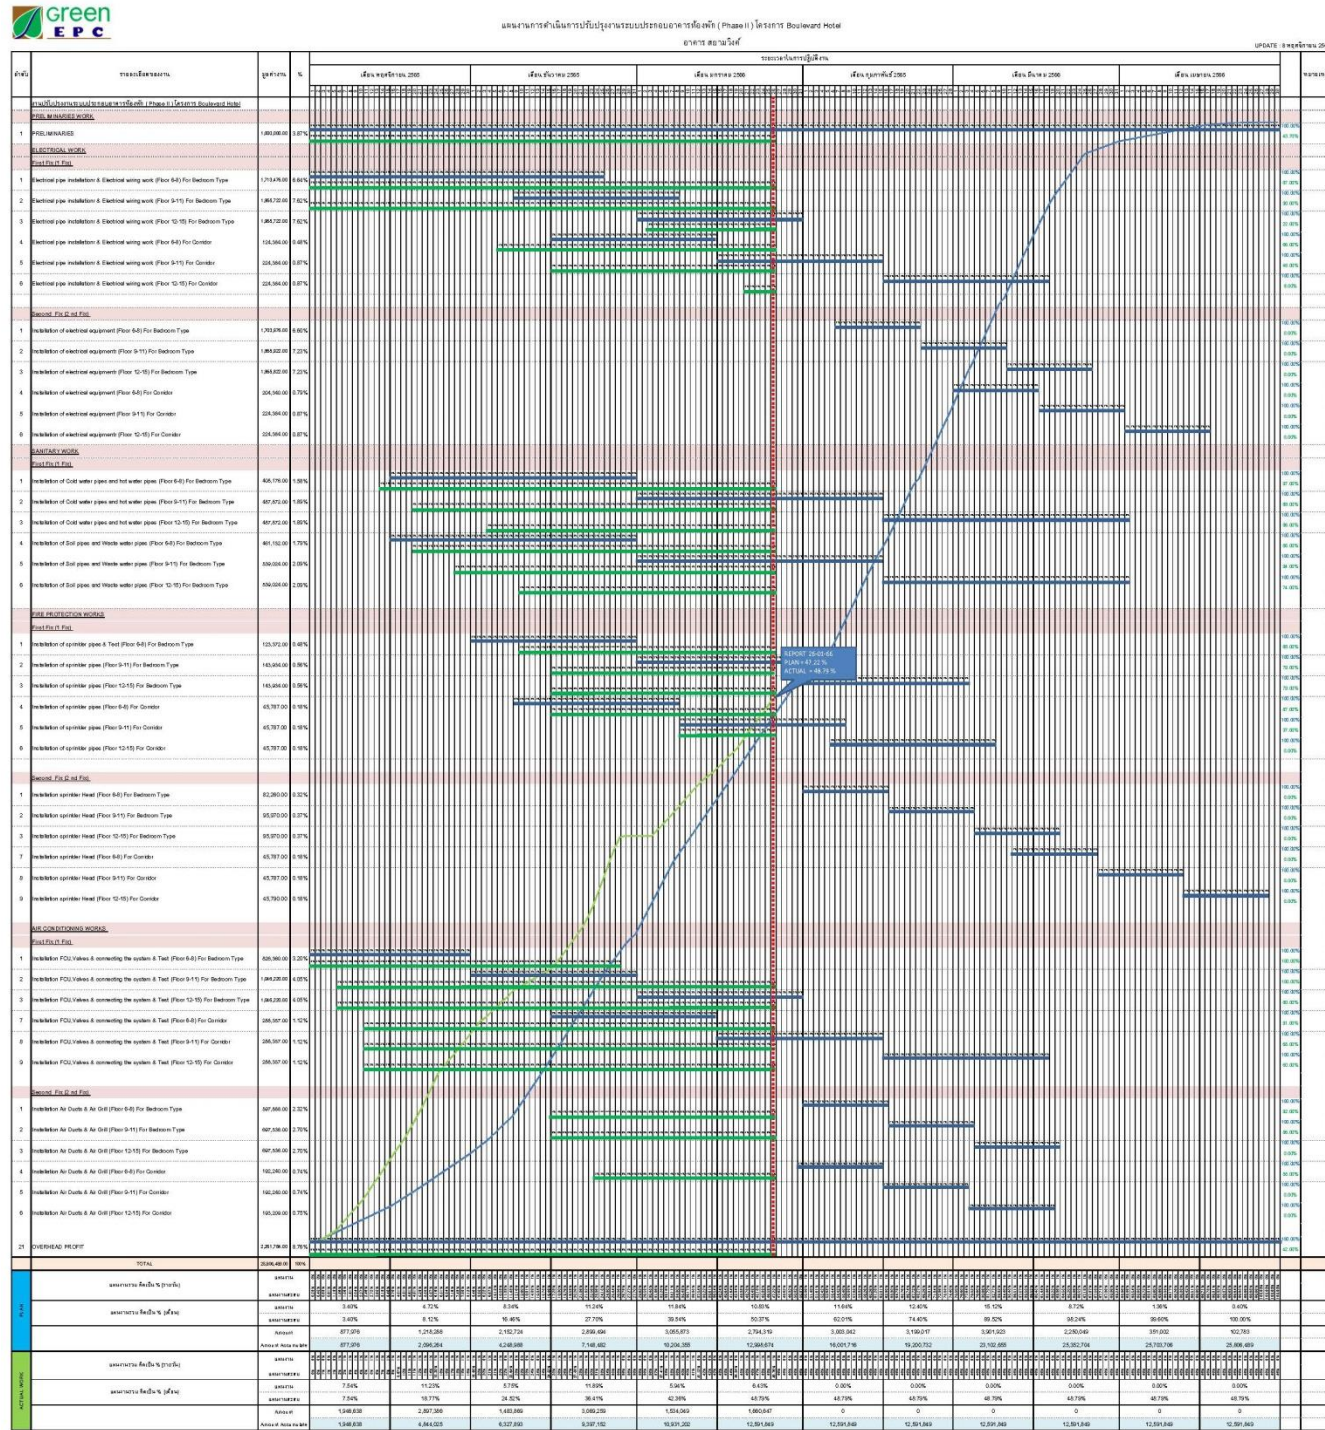

WEEKLY PROGRESS REPORT

PROGRESS CURRENT (26-01-66)	PLAN (%)	ACTUAL (%)	DELAY
56.38%		56.30%	- 0.08 % ล่าช้า 2 วัน

MAN POWER

ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือนมกราคม 2566



ตารางแสดงจำนวนพนักงานประจำเดือน

ลำดับที่	พนักงาน	เดือนกุมภาพันธ์ 2566																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Project Manager	1	1	1	1		1	1	1																				
2	Sanitation Engineer	1	-	1	1		1	1	1																				
3	Electrical Engineer	2	2	1	1		2	2	2																				
4	Air Conditioning Engineer	-	-	-	1		1	1	-																				
5	Safety	1	1	1	1		1	1	1																				
6	Sanitary Foreman	1	1	1	1		1	1	1																				
7	Electrical Foreman	2	2	2	2		1	2	2																				
8	Air Foreman	1	-	-	1		1	1	1																				
9	Site Admin	1	1	1	1		1	1	1																				
10	Electricians	38	39	37	35		34	37	35																				
11	Plumber	5	5	5	5		5	5	5																				
12	Sprinkler	5	5	5	5		5	5	4																				
13	Air Conditioner	23	18	11	7		13	18	25																				
14	General Technician	4	4	4	4		3	4	3																				
15	Store	3	3	3	3		3	3	3																				
	รวม	88	82	73	69	0	73	83	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ

 วันอาทิตย์

 วันหยุดนักขัตฤกษ์
